



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE DE PAGAMENTO DA OBRA SEDE 2017


PROCESSO Nº 1.32.000.000189/2017-28 – CONTRATO Nº 15/2015 – OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA

Mês	% previsto no cronograma	% Medido	Parcela nº	NF	Valor Parcela R\$	Vlr. Reajuste R\$	Total Pago R\$	OB 2017	Glosa/Multa (Valor) - Motivo	Pago em
Execução 2016	14,05	12,89	1 a 8	-	4.400.239,76			-	-	-
Reajuste Dez/2016-Jan/Fev/2017	-	-	8, 9 e 10	827	0,00	81.569,77	81.569,77	173	-	04/5/17
4º Aditivo									Acréscimo de % = + R\$	
									Supressão de % = - R\$	
Janeiro	1,66	2,96	9	817	989.390,01	0,00	989.390,01	057	0,00	21/2/17
Fevereiro	1,48	1,35	10	822	450.784,24	0,00	450.784,24	105	0,00	29/3/17
Março	1,29	1,17	11	826	390.613,03	22.926,33	413.539,36	173	0,00	04/5/17
Abril	1,39	0,63	12	837	208.744,80	12.251,90	220.996,70	225	0,00	02/6/17
Maio	1,46	1,01	13	847	335.764,64	19.707,10	335.764,64	255	0,00	30/6/17
Junho	1,55	1,32	14	852	439.326,65	25.785,48	465.112,13	309	0,00	28/7/17
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total 2017	22,88	21,33			R\$ 2.814.623,37	R\$ 162.240,58	R\$ 2.957.156,85		R\$ 0.00	

Percentuais de alíquotas prevista no contrato: COFINS: 3,00% / PIS: 0,65% / ISS: 2,00% / CPRB: 2,00%

↑ **Total Inicial do Contrato = R\$ 33.398.124,45 (100%)**
Aumento de 0,3282546604200105% Art. 65, §§ 1º e 2º LLC
 ↓ **Novo Total pós 2º Aditivo = R\$ 33.500.806,35 (100%)**
Aumento de 5,088211% (reajuste 2016)
Novo Total pós 3º Aditivo = R\$ 35.205.398,22 (100%)

HISTÓRICO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DO MPF/RR - 2016
VARIAÇÃO DAS PARCELAS

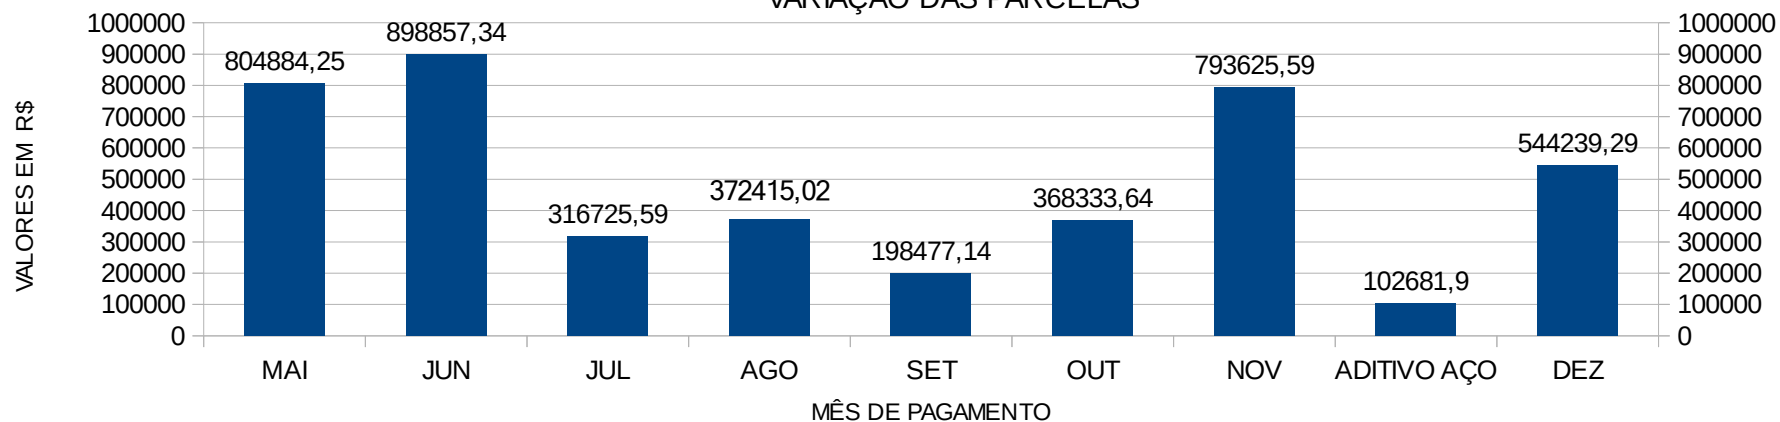

HISTÓRICO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DO MPF/RR - 2017
VARIAÇÃO DAS PARCELAS

