



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR/RR**

**Despacho nº 230/2024**

**Referência:** 1.32.000.000003/2023-89

**Assunto:** Relatório técnico da 14ª medição da obra da Nova Sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Segue em anexo o relatório técnico da 14ª medição

Nota Fiscal Eletrônica de Referência R\$ 885.197,17 (oitocentos e oitenta e cinco mil e cento e noventa e sete reais e dezessete centavos).

Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste R\$ 47.800,65 (quarenta e sete mil e oitocentos reais e sessenta e cinco centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.

Boa Vista, 19 de março de 2024.

(Assinado Eletronicamente)  
**MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA**  
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA  
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

**RELATÓRIO TÉCNICO 14ª MEDIÇÃO**





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA**  
**COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022**

| RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 14/2024                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA:                                        |                                                                                                                                                     | 16 de janeiro de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PERÍODO DO RELATÓRIO                                               |                                                                                                                                                     | De 19 de fevereiro a 16 de março de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SERVIÇOS PREVISTOS PARA DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO                      |                                                                                                                                                     | Instalação de infraestrutura elétrica, combate à incêndio, sistema de climatização, execução de meio fio, emboço e emassamento, cabeamento, caixas de esgoto, caixas de drenagem, revestimento cerâmico, execução de soleiras, forro de gesso acartonado, chapim no muro, concretagem da calçada. E envelopamento dos pilares |
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome:                                                              | Engenheiro Marcos Eduardo Silva Madureira                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Telefone:                                                          | (95) 3198-2005                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-mail:                                                            | <a href="mailto:marcoseduardo@mpf.mp.br">marcoseduardo@mpf.mp.br</a>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome:                                                              | Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portaria:                                                          | SE/PR-RR nº02/2023                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Telefone:                                                          | (95) 3198-2025 / 2073                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E-mail:                                                            | <a href="mailto:prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br">prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br</a> <a href="mailto:prrr-contratos@mpf.mp.br">prrr-contratos@mpf.mp.br</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.0 - ESCOPO E LOCAL                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DADOS DO CONTRATO:                                                 | Nº Contrato: 05/2022                                                                                                                                | PPA/LOA: AÇÃO 110E                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Empresa Contratada                                                 | J. NASSER      ENGNHARIA                                                                                                                            | CNPJ 04.618.096/0001-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                           |                                                                                                                                                          |                                                      |                      |                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                           | LTDA                                                                                                                                                     |                                                      |                      |                       |
| Matrícula CEI da Obra                     | 51.235.89823/71                                                                                                                                          |                                                      |                      |                       |
| Valor Atual do Contrato                   | R\$31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)                 |                                                      |                      |                       |
| Percentual de reajuste                    | 5,40%                                                                                                                                                    |                                                      |                      |                       |
| Saldo de Empenho                          | 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022                                                           |                                                      |                      |                       |
| Local/UF                                  | Boa Vista – RR                                                                                                                                           |                                                      |                      |                       |
| Responsável Técnico                       | José Nasser – ART de Execução: RR20230111507                                                                                                             |                                                      |                      |                       |
| Corresponsável Técnico                    | Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835                                                           |                                                      |                      |                       |
| Nota Fiscal Eletrônica de Referência      | R\$ 885.197,17 (oitocentos e oitenta e cinco mil e cento e noventa e sete reais e dezessete centavos).                                                   |                                                      |                      |                       |
| Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste        | R\$ 47.800,65 (quarenta e sete mil e oitocentos reais e sessenta e cinco centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente. |                                                      |                      |                       |
| DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA                 |                                                                                                                                                          |                                                      |                      |                       |
| Medição nº                                | % Previsto                                                                                                                                               | % Executado                                          | % Previsto Acumulado | % Executado Acumulado |
| 1                                         | 0,07%                                                                                                                                                    | 0,21%                                                | 0,07%                | 0,21%                 |
| 2                                         | 0,17%                                                                                                                                                    | 0,29%                                                | 0,24%                | 0,50%                 |
| 3                                         | 1,16%                                                                                                                                                    | 0,75%                                                | 1,40%                | 1,25%                 |
| 4                                         | 0,88%                                                                                                                                                    | 0,66%                                                | 1,93%                | 1,91%                 |
| 5                                         | 1,64%                                                                                                                                                    | 1,29%                                                | 3,57%                | 3,21%                 |
| 6                                         | 1,94%                                                                                                                                                    | 1,25%                                                | 5,51%                | 4,46%                 |
| 7                                         | 0,95%                                                                                                                                                    | 1,29%                                                | 4,93%                | 5,75%                 |
| 8                                         | 1,17%                                                                                                                                                    | 2,11%                                                | 6,10%                | 7,85%                 |
| 9                                         | 1,83%                                                                                                                                                    | 2,13%                                                | 7,93%                | 9,98%                 |
| 10                                        | 2,86%                                                                                                                                                    | 1,91%                                                | 10,79%               | 11,88%                |
| 11                                        | 4,30%                                                                                                                                                    | 1,40%                                                | 15,08%               | 13,28%                |
| 12                                        | 4,30%                                                                                                                                                    | 1,58%                                                | 19,39%               | 14,86%                |
| 13                                        | 1,34%                                                                                                                                                    | 1,65%                                                | 17,03%               | 16,37%                |
| 14                                        | 3,10%                                                                                                                                                    | 2,78%                                                | 20,12%               | 19,14%                |
| TOTAL EXECUTADO                           |                                                                                                                                                          |                                                      |                      | 19,14%                |
| TOTAL A EXECUTAR                          |                                                                                                                                                          |                                                      |                      | 80,86%                |
| Identificação do processo de fiscalização |                                                                                                                                                          | 1.32.000.000464/2022-71                              |                      |                       |
| Tipo de obra                              |                                                                                                                                                          | Prédio Público                                       |                      |                       |
| Objeto da fiscalização                    |                                                                                                                                                          | Construção da nova sede da Procuradoria da República |                      |                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | no Estado de Roraima                                                     |
| <b>Período abrangido pela fiscalização</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19/02/2024 A 16/03/2024 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo) |
| <b>3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
| <p>Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a serviço de alvenaria/chapisco/emboço, instalações hidrossanitários, instalação de incêndio, sistema de climatização (Exaustão mecânica), instalações de infra de elétrica como interruptor e tomada baixa ou alta, fiação de iluminação e tomada/interruptor, movimentação de terra, confecção das caixas de drenagem de água pluviais, junto com a tubulação do sistema, confecção das caixas de passagem e tubulação de esgoto, revestimento de piso e parede com cerâmica, soleira, chapim de concreto, forro de gesso acartonado (tarugamento), confecção da calçada de visitantes, execução de meio-fio, reaterro das escavações, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).</p> <p>Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades não foram concluídas.</p> |                                                                          |
| <b>4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| <p><b>Constatação do Período nº 1:</b> Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ESTRUTURA DE CONCRETO, ARQUITETURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, SERVIÇOS GERAIS E SPDA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;</p> <p><b>Constatação do Período nº 2:</b> A empresa foi solicitada a fazer o procedimento exigido em norma como abertura de CAT, no dia 06/03/2024 ocorreu um acidente de trabalho.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| <b>5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| <p>A) Na rede de irrigação ficou orientado para a engenharia considerar as bitolas especificada conforme diâmetro na descrição da line do projeto em autocar, por não está na representação da plancha do projeto de irrigação as bitolas dos tubos. Válvulas solenóides e caixas irão seguir a descrição conforme a planilha orçamentária;</p> <p>B) Vamos utilizar nas caixas CATV o item que consta em planilha ( item 9.3.37 caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 30 x 30 x 10 cm - fornecimento e instalação).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
| <b>6.0 – CONCLUSÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| <p>Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada não executou os serviços listados no cronograma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| <b>7.0 – ANEXOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) 13.0 Relatório fotográfico do período                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| <b>8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |
| Boa Vista – Roraima, 19 de março de 2024                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
| <b>9.0 - FÉ DO MEMBRO DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
| Declaramos que as metas estabelecidas na 14ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro não foram atendidas.                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| <p style="text-align: center;"> <br/> <b>Marcos Eduardo Silva Madureira</b><br/> Engenheiro Civil/Membro da Comissão </p> |                                                                                                                                                                                               |
| Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com <b>rubricas em todas as suas folhas</b> .                                                |                                                                                                                                                                                               |
| <b>10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Não foram identificados vícios.<br><br><input type="checkbox"/> Ver Nota Técnica ou Despacho constante da _____ folha _____ de n°. _____                                           | <p style="text-align: center;"> <br/> <b>Igor José Barbosa Duarte Lopes</b><br/> Secretário Estadual </p> |
| Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com <b>rubricas em todas as suas folhas</b> .                                                |                                                                                                                                                                                               |



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA  
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

**RELATÓRIO TÉCNICO 14ª MEDIÇÃO**

**11.0 - A DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO FOI EFETUADA PELO FISCAL DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, MATRÍCULA 31143, NO DIA 18/01/2023**

**11.1 - Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente**

| Serviço                                                                       | Percentual Previsto em Cronograma (%) | Percentual executado <i>in loco</i> (%) | Serviço atrasado em relação ao cronograma | Serviço adiantado em relação ao cronograma |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>                        |                                       |                                         |                                           |                                            |
| PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E PROTEÇÃO            | 92,15%                                | 82,13%                                  | X                                         |                                            |
| <b>SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS</b>                                         |                                       |                                         |                                           |                                            |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 8,49%                                 | 14,68%                                  |                                           | X                                          |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                  |                                       |                                         |                                           |                                            |
| LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO                             | 7,01%                                 | 7,01%                                   |                                           | X                                          |
| <b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>                                                 |                                       |                                         |                                           |                                            |
| GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS | 38,71%                                | 27,36%                                  | X                                         |                                            |

| ARQUITETURA                                                                                                                                                                                  |        |        |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
| VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS, ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS | 17,62% | 17,58% | X |   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                            |        |        |   |   |
| SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                 | 54,65% | 54,65% |   | X |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                |        |        |   |   |
| ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO                                                                                                                                      | 39,80% | 29,85% | X |   |
| PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                               |        |        |   |   |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E SPRINKLERS                                                                       | 38,53% | 29,80% | X |   |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA                                                                                                                                                                  |        |        |   |   |
| SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO                                                                                  | 21,83% | 18,98% | X |   |
| INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                        |        |        |   |   |
| CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV,                                                                                                                       | 33,12% | 40,75% |   | X |
| INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE                                                                                                                                              |        |        |   |   |
| QUADROS, SENSORES E TERMOSTATOS, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO, COMISSIONAMENTO                                                                                                                | 0,00%  | 0,33%  |   | X |
| CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                 |        |        |   |   |
| ÁGUA GELADA, VRF, SPLIT, VENTILAÇÃO MECÂNICA-, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS, LIGACÕES E DUTOS DE AR                                                                                         | 19,36% | 20,04% |   | X |

| SERVIÇOS GERAIS                                                                                          |        |        |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|--|
| TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO | 54,97% | 51,38% | X |  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVO                                                                                  |        |        |   |  |
| INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA                                                                    | 19,96% | 19,34% | X |  |

**12.0 SEGUE ABAIXO A PLANILHA CONTENDO O RESUMO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E PACTUADOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022**

| ITEM   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORES CONTRATADOS |           |                    |                    | 14ª. MEDIÇÃO |               | ACUMULADO NA 14ª |               | SALDO CONTRATUAL |              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                 | QUANT.    | VALOR UNIT SEM BDI | VALOR UNIT COM BDI | QUANT.       | TOTAL COM BDI | QUANT.           | TOTAL COM BDI | QUANT.           | VALOR R\$    |
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |           |                    |                    | 2,14%        | 1.629,99      | 92,93%           | 70.738,74     |                  | 5.377,78     |
| 1.4    | PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |                    |                    |              | 1.629,99      | 100,00%          | 9.600,00      |                  | 0,00         |
| 1.4.1  | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA PROTEÇÕES - ROLO DE 4X100M - 80 MICRAS                                                                                                                                                                                                                         | M²                  | 3.200,00  | 2,43               | 3,00               | 543,33       | 1.629,99      | 3.200,00         | 9.600,00      | 0,00             | 0,00         |
| 2      | SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |                    |                    | 6,64%        | 11.076,43     | 14,68%           | 24.494,57     |                  | 142.400,99   |
| 2.1    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |           |                    |                    |              | 11.076,43     | 14,68%           | 24.494,57     |                  | 142.400,99   |
| 2.1.1  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 11/2017                                                                                                                                                      | M²                  | 4.932,00  | 8,68               | 10,72              | 910,26       | 9.757,98      | 910,26           | 9.757,98      | 4.021,74         | 43.113,06    |
| 2.1.3  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2/MÊS              | 11.160,00 | 4,17               | 5,15               | 50,40        | 259,56        | 302,40           | 1.557,36      | 10.857,80        | 55.916,64    |
| 2.1.5  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE                                                                                                                                                                                                                                                      | M/MÊS               | 640,00    | 12,54              | 15,49              | 68,36        | 1.058,89      | 551,80           | 8.547,35      | 88,20            | 1.366,25     |
| 5      | ARQUITETURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |           |                    |                    | 2,79%        | 303.665,67    | 17,82%           | 1.939.611,26  |                  | 8.944.119,95 |
| 5.2    | PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |                    |                    |              | 230.969,24    | 32,48%           | 1.000.520,10  |                  | 2.079.650,84 |
| 5.2.8  | PISO EM PORCELANATO 90X90CM, SUPERFICIE NATURAL RETIFICADO - REF.: MINERAL OFF WHITE, NATURAL RETIFICADO DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                              | M²                  | 1.960,98  | 315,97             | 390,31             | 566,08       | 220.946,68    | 1.661,70         | 648.578,10    | 299,28           | 116.812,00   |
| 5.2.9  | RODAPÉ DE PORCELANATO 15X90CM - REF.: MINERAL OFF WHITE NATURAL PORTOBELLO OU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                                                                          | M                   | 719,00    | 36,75              | 45,39              | 220,81       | 10.022,56     | 669,41           | 30.384,50     | 49,59            | 2.250,91     |
| 5.3    | REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |                    |                    |              | 4.136,92      | 15,24%           | 361.215,31    |                  | 2.009.599,66 |
| 5.3.4  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60 CM - COM REJUNTE ACRÍLICO - REF.: PORTOBELLO BIANCO ACETINADO RETIFICADO OU EQUIVALENTE                                                                                                                                                        | M²                  | 1.508,70  | 164,25             | 202,89             | 20,39        | 4.136,92      | 1.438,07         | 291.769,99    | 70,63            | 14.330,15    |
| 5.4    | FORROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |                    |                    |              | 28.555,21     | 15,79%           | 65.656,54     |                  | 350.250,59   |
| 5.4.1  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                                                                                                                                                                                                                          | M²                  | 4.539,00  | 71,99              | 88,92              | 274,02       | 24.365,85     | 600,06           | 53.357,31     | 3.938,94         | 350.250,57   |
| 5.4.2  | TABICA PARA FORRO DRYWALL, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | M                   | 775,00    | 12,85              | 15,87              | 263,98       | 4.189,36      | 775,00           | 12.299,23     | 0,00             | 0,02         |
| 5.5    | COBERTURAS E PROTEÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |                    |                    |              | 13.229,54     | 51,44%           | 99.324,92     |                  | 93.768,42    |
| 5.5.3  | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE, COM 23CM, TRIANGULAR, TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA                                                                                                                                                                                                                                | M                   | 518,00    | 59,44              | 73,42              | 180,19       | 13.229,54     | 433,47           | 31.825,35     | 84,53            | 6.206,21     |
| 5.8    | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |           |                    |                    |              | 1.778,87      | 10,06%           | 110.344,36    |                  | 986.316,44   |
| 5.8.2  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                                                                                              | M²                  | 10.594,50 | 2,16               | 2,66               | 54,02        | 143,69        | 6.102,30         | 16.232,06     | 4.492,21         | 11.949,31    |
| 5.8.4  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                                                                                              | M²                  | 5.579,49  | 24,51              | 30,27              | 54,02        | 1.635,18      | 132,05           | 3.997,14      | 5.447,44         | 164.894,02   |
| 5.12   | URBANIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |           |                    |                    |              | 24.995,89     | 2,96%            | 46.130,59     |                  | 1.511.851,06 |
| 5.12.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 07/2016 | M                   | 1.316,93  | 56,68              | 70,01              | 109,75       | 7.683,59      | 370,90           | 25.966,70     | 946,03           | 66.231,56    |
| 5.12.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 07/2016                                                                                                                                                        | M²                  | 2.222,24  | 121,45             | 150,02             | 115,40       | 17.312,30     | 115,40           | 17.312,30     | 2.106,84         | 316.068,14   |
| 7      | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |           |                    |                    | 6,82%        | 64.143,00     | 30,50%           | 286.990,19    |                  | 654.068,81   |
| 7.2    | ESGOTO SANITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |           |                    |                    |              | 3.499,78      | 41,99%           | 73.873,05     |                  | 102.067,39   |
| 7.2.4  | TUBO PVC ESGOTO OU AGUA PLUVIAL PREDIAL DN 100MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                     | M                   | 387,00    | 61,90              | 76,46              | 21,18        | 1.619,42      | 106,34           | 8.130,75      | 280,66           | 21.459,27    |
| 7.2.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018                                                                                                                                                                | UN                  | 20,00     | 761,10             | 940,18             | 2,00         | 1.880,36      | 9,00             | 8.461,62      | 11,00            | 10.341,98    |
| 7.3    | ÁGUAS PLUVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |                    |                    |              | 60.643,22     | 37,20%           | 199.242,72    |                  | 336.336,52   |
| 7.3.2  | TUBO PVC ESGOTO OU AGUA PLUVIAL PREDIAL DN 150MM, SERIE REFORÇADA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                  | M                   | 825,00    | 124,63             | 153,95             | 194,66       | 29.967,90     | 194,66           | 29.967,90     | 630,34           | 97.040,85    |
| 7.3.4  | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO                                                                                                                                            | M                   | 272,00    | 167,85             | 207,34             | 63,13        | 13.089,37     | 63,13            | 13.089,37     | 208,87           | 43.307,11    |
| 7.3.7  | CAIXA DE PASSAGEM 70X70X90CM EM ALVENARIA - COM TAMPA CEGA DE CONCRETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                    | UN                  | 35,00     | 1.166,01           | 1.440,37           | 5,00         | 7.201,85      | 13,40            | 19.300,95     | 21,60            | 31.112,00    |
| 7.3.9  | CAIXA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 90X70 X100 CM EM ALVENARIA - COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO - INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                          | UN                  | 56,00     | 1.031,73           | 1.274,49           | 3,00         | 3.823,47      | 14,00            | 17.842,86     | 42,00            | 53.528,58    |
| 7.3.19 | TUBO PVC ESGOTO OU AGUA PLUVIAL PREDIAL DN 200MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                     | M                   | 105,00    | 173,28             | 214,05             | 30,65        | 6.560,63      | 105,00           | 22.475,24     | 0,00             | 0,01         |
| 8      | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |                    |                    | 4,72%        | 56.360,19     | 31,92%           | 380.792,91    |                  | 812.308,29   |
| 8.3    | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |                    |                    |              | 66,42         | 1,61%            | 66,42         |                  | 4.051,62     |
| 8.3.1  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                                                                                                            | UN                  | 124,00    | 26,89              | 33,21              | 2,00         | 66,42         | 2,00             | 66,42         | 122,00           | 4.051,62     |
| 8.4    | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |           |                    |                    |              | 56.293,77     | 22,04%           | 80.993,52     |                  | 286.452,46   |
| 8.4.1  | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIÂMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                         | M                   | 2.000,00  | 39,33              | 48,58              | 760,51       | 36.945,57     | 1.025,77         | 49.831,88     | 974,23           | 47.328,12    |
| 8.4.4  | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4                                                                                                                                                                                                                                    | UN                  | 476,00    | 36,39              | 44,95              | 168,00       | 7.551,60      | 287,00           | 12.900,65     | 189,00           | 8.495,55     |
| 8.4.5  | SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                   | UN                  | 604,00    | 22,10              | 27,30              | 219,00       | 5.978,70      | 402,00           | 10.974,60     | 202,00           | 5.514,60     |
| 8.4.7  | PINTURA DE TUBOS / ELETRODUTOS COM ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)                                                                                                                                                                                                                          | M                   | 2.000,00  | 6,20               | 7,65               | 760,51       | 5.817,90      | 934,34           | 7.147,69      | 1.065,66         | 8.152,31     |

|          |                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |          |       |            |           |              |           |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 9        | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA                                                                                                                                                |    |           |           |           |          | 0,71% | 37.845,05  | 18,98%    | 1.018.483,41 |           | 4.346.703,28 |
| 9.3      | INFRAESTRUTURA                                                                                                                                                             |    |           |           |           |          |       | 1.916,33   | 47,06%    | 732.030,59   |           | 823.440,39   |
| 9.3.16   | SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                            | UN | 3.302,00  | 22,10     | 27,30     | 58,00    |       | 1.583,40   | 899,00    | 24.542,70    | 2.403,00  | 65.601,90    |
| 9.3.18   | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES, CONTRAPISOS, DIVISÓRIAS E OUTROS ELEMENTOS -                | M  | 1.388,00  | 8,70      | 10,74     | 16,40    |       | 176,13     | 563,63    | 6.053,36     | 824,37    | 8.853,76     |
| 9.3.29   | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                              | UN | 44,00     | 15,87     | 19,60     | 8,00     |       | 156,80     | 12,00     | 235,20       | 32,00     | 627,20       |
| 9.4      | CONDUTORES E CABOS                                                                                                                                                         |    |           |           |           |          |       | 30.893,93  | 23,13%    | 255.308,00   |           | 848.467,66   |
| 9.4.4    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                             | M  | 3.331,00  | 9,83      | 12,14     | 335,00   |       | 4.066,90   | 1.084,25  | 13.162,79    | 2.246,75  | 27.275,55    |
| 9.4.6    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                   | M  | 4.368,00  | 16,80     | 20,75     | 235,00   |       | 4.876,25   | 1.255,65  | 26.054,73    | 3.112,35  | 64.581,27    |
| 9.4.7    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                   | M  | 525,00    | 27,00     | 33,35     | 322,00   |       | 10.738,70  | 322,00    | 10.738,70    | 203,00    | 6.770,05     |
| 9.4.8    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                   | M  | 1.531,00  | 36,60     | 45,21     | 248,00   |       | 11.212,08  | 248,00    | 11.212,08    | 1.283,00  | 58.004,43    |
| 9.7      | ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |          |       | 5.034,79   | 1,87%     | 8.694,37     |           | 457.073,55   |
| 9.7.1    | LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO E REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM LÂMPADAS LED E ACESSÓRIOS, FORMATO: 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | UN | 338,00    | 504,75    | 623,51    | 6,00     |       | 3.741,06   | 9,00      | 5.611,59     | 329,00    | 205.134,79   |
| 9.7.2    | LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO E REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM LÂMPADAS LED E ACESSÓRIOS, FORMATO: 120X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | UN | 207,00    | 468,74    | 579,03    | 1,00     |       | 579,03     | 3,00      | 1.737,09     | 204,00    | 118.122,12   |
| 9.7.3    | LUMINÁRIA EM ACRÍLICO HERMÉTICA COM LÂMPADAS LED E ACESSÓRIOS, FORMATO: 120X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                              | UN | 166,00    | 375,27    | 463,57    | 1,00     |       | 463,57     | 2,00      | 927,14       | 164,00    | 76.025,48    |
| 9.7.4    | PLAFON LED CIRCULAR DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                               | UN | 365,00    | 67,77     | 83,71     | 3,00     |       | 251,13     | 5,00      | 418,55       | 360,00    | 30.135,60    |
| 10       | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                      |    |           |           |           |          | 8,95% | 97.257,73  | 40,75%    | 443.051,21   |           | 644.081,91   |
| 10.1     | CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                     |    |           |           |           |          |       | 97.257,73  | 50,69%    | 442.351,34   |           | 430.239,87   |
| 10.1.1   | CABO CAT.6 U/UTP LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                          | M  | 52.352,00 | 8,77      | 10,83     | 8.980,40 |       | 97.257,73  | 40.845,00 | 442.351,34   | 11.507,00 | 124.620,82   |
| 11       | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE                                                                                                                             |    |           |           |           |          | 0,33% | 8.438,83   | 0,33%     | 8.438,83     |           | 2.531.799,26 |
| 11.3     | INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO                                                                                                                                                |    |           |           |           |          |       | 8.438,83   | 4,24%     | 8.438,83     |           | 190.672,17   |
| 11.3.1   | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIÂMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 1.059,00  | 39,33     | 48,58     | 173,71   |       | 8.438,83   | 173,71    | 8.438,83     | 885,29    | 43.007,39    |
| 12       | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                               |    |           |           |           |          | 5,09% | 226.806,47 | 20,05%    | 893.460,57   |           | 3.562.136,54 |
| 12.9     | DUTOS DE AR                                                                                                                                                                |    |           |           |           |          |       | 76.184,28  | 52,09%    | 294.160,43   |           | 270.511,74   |
| 12.9.3   | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #24                                                                                                               | M² | 2.282,42  | 146,92    | 181,49    | 375,81   |       | 68.205,75  | 1.343,87  | 243.898,93   | 938,55    | 170.337,47   |
| 12.9.4   | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #26                                                                                                               | M² | 384,25    | 110,83    | 136,90    | 58,28    |       | 7.978,53   | 224,51    | 30.735,40    | 159,74    | 21.868,42    |
| 12.12    | ISOLAMENTO TÉRMICO - TUBULAÇÕES E DUTOS                                                                                                                                    |    |           |           |           |          |       | 149.383,97 | 67,39%    | 527.903,78   |           | 255.493,67   |
| 12.12.15 | ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ALUMINIZADA - MANTA DE 15 MM - ARMADUCT OU EQUIVALENTE                                                                                   | M2 | 2.217,00  | 254,98    | 314,97    | 474,28   |       | 149.383,97 | 1.650,42  | 519.832,76   | 566,58    | 178.455,73   |
| 12.13    | SUORTES - TUBULAÇÕES E DUTOS                                                                                                                                               |    |           |           |           |          |       | 1.238,22   | 24,21%    | 14.271,30    |           | 44.677,20    |
| 12.13.1  | SUORTE PARA TUBOS/ DUTOS/ ELETROCALHA HORIZONTAIS (CHUMBADORES, TIRANTES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                             | UN | 750,00    | 55,69     | 68,79     | 18,00    |       | 1.238,22   | 190,00    | 13.070,10    | 560,00    | 38.522,40    |
| 14       | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                            |    |           |           |           |          | 1,33% | 3.105,05   | 53,72%    | 125.800,07   |           | 108.357,31   |
| 14.1     | TRANSPORTE DE MATERIAL                                                                                                                                                     |    |           |           |           |          |       | 1.265,76   | 46,44%    | 24.030,93    |           | 27.714,27    |
| 14.1.1   | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS                                                                                                                     | M³ | 780,00    | 53,71     | 66,34     | 19,08    |       | 1.265,76   | 362,24    | 24.030,93    | 417,76    | 27.714,27    |
| 14.2     | LIMPEZA DA OBRA                                                                                                                                                            |    |           |           |           |          |       | 1.673,19   | 51,25%    | 49.388,93    |           | 46.983,95    |
| 14.2.1   | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA                                                                                                                                                 | %  | 100,00    | 325,60    | 402,21    | 4,16     |       | 1.673,19   | 58,25     | 23.427,34    | 41,75     | 16.793,66    |
| 14.5     | TAXAS DE CONSTRUÇÃO                                                                                                                                                        |    |           |           |           |          |       | 166,10     | 95,83%    | 52.380,21    |           | 2.280,10     |
| 14.5.2   | CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES                                                                                                                                       | UN | 500,00    | 12,23     | 15,10     | 11,00    |       | 166,10     | 349,00    | 5.269,90     | 151,00    | 2.280,10     |
| 15       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                   |    |           |           |           |          | 2,80% | 74.868,76  | 19,34%    | 516.701,54   |           | 2.155.640,46 |
| 15.1     | INSUMOS PÚBLICOS                                                                                                                                                           |    |           |           |           |          |       | 2.835,23   | 19,34%    | 19.567,12    |           | 81.632,88    |
| 15.1.1   | INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA                                                                                                                                        | %  | 100,00    | 819,24    | 1.012,00  | 2,80     |       | 2.835,23   | 19,34     | 19.567,12    | 80,66     | 81.632,88    |
| 15.2     | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                      |    |           |           |           |          |       | 72.033,53  | 19,34%    | 497.134,42   |           | 2.074.007,58 |
| 15.2.1   | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                                                                      | %  | 100,00    | 16.964,81 | 20.956,62 | 2,80     |       | 58.712,41  | 19,34     | 405.199,65   | 80,66     | 1.690.462,35 |
| 15.2.2   | VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H                                                                                                                                  | %  | 100,00    | 3.849,11  | 4.754,80  | 2,80     |       | 13.321,12  | 19,34     | 91.934,77    | 80,66     | 383.545,23   |

|                                                    |  |     |            |     |              |     |               |
|----------------------------------------------------|--|-----|------------|-----|--------------|-----|---------------|
| VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI                |  | R\$ | 885.197,17 | R\$ | 6.108.697,43 | R\$ | 25.483.314,21 |
| VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI E COM REAJUSTE |  | R\$ | 932.997,82 | R\$ | 6.398.581,16 |     |               |



|                                                 |                         | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5         | mês 6         | mês 7         | mês 8         | mês 9         | mês 10        | mês 11        | mês 12        | mês 13        | mês 14        |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 134,22    | R\$ 67,85     | R\$ 29,63     | R\$ 75,87     | R\$ 91,97     | R\$ 66,08     | R\$ 65,69     | R\$ 35,55     | R\$ 93,23     | R\$ 88,02     |
| SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS                  | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 61,26     | R\$ 54,37     | R\$ 72,43     | R\$ 57,18     | R\$ 71,20     | R\$ 71,20     | R\$ 71,20     | R\$ 86,44     | R\$ 86,44     | R\$ 598,13    |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                           | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 635,46    | R\$ 326,33    | R\$ 447,15    | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| ESTRUTURAS DE CONCRETO                          | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 417,79    | R\$ 10,88     | R\$ 441,13    | R\$ 977,61    | R\$ 2.006,97  | R\$ 522,27    | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 213,80    | R\$ -         |
| ARQUITETURA                                     | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.135,51  | R\$ 2.443,01  | R\$ 2.790,71  | R\$ 8.239,92  | R\$ 10.793,27 | R\$ 11.790,82 | R\$ 8.766,76  | R\$ 9.193,34  | R\$ 13.513,85 | R\$ 16.397,95 |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                               | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.929,18  | R\$ 1.798,88  | R\$ 1.785,89  | R\$ 1.347,76  | R\$ 1.503,63  | R\$ 1.342,29  | R\$ 502,00    | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS   | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 89,12     | R\$ 562,29    | R\$ 2.046,83  | R\$ 2.768,67  | R\$ 2.805,46  | R\$ 2.507,14  | R\$ 3.463,72  |
| PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                  | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.231,53  | R\$ 3.815,84  | R\$ 1.885,35  | R\$ 4.812,56  | R\$ 1.448,15  | R\$ 1.171,13  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 544,12    | R\$ 3.043,45  |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA                     | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.323,69  | R\$ 7.761,14  | R\$ 6.995,44  | R\$ 7.429,95  | R\$ 5.435,59  | R\$ 3.610,25  | R\$ 5.617,56  | R\$ 6.062,18  | R\$ 1.924,27  | R\$ 2.043,63  |
| INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO           | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ -         | R\$ 12,61     | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 5.944,70  | R\$ -         | R\$ 25,18     | R\$ 5.786,91  | R\$ 6.903,45  | R\$ 5.251,92  |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE  | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 455,70    |
| CLIMATIZAÇÃO                                    | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 668,01    | R\$ 3.138,60  | R\$ 5.534,02  | R\$ 9.616,83  | R\$ 4.533,54  | R\$ 8.462,00  | R\$ 3.478,71  | R\$ 567,61    | R\$ -         | R\$ 12.247,55 |
| INSTALAÇÕES MECÂNICAS                           | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| SERVIÇOS GERAIS                                 | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 439,88    | R\$ 298,01    | R\$ 292,26    | R\$ 237,95    | R\$ 182,83    | R\$ -         | R\$ 133,98    | R\$ 106,33    | R\$ 287,35    | R\$ 167,67    |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                        | Valor mensal reajustado | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.838,49  | R\$ 1.806,90  | R\$ 1.858,71  | R\$ 3.038,33  | R\$ 3.068,34  | R\$ 2.413,84  | R\$ 2.021,28  | R\$ 2.276,92  | R\$ 2.409,02  | R\$ 4.042,91  |
| Total                                           |                         | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 15.179,54 | R\$ 21.208,09 | R\$ 21.685,56 | R\$ 35.923,08 | R\$ 36.277,93 | R\$ 32.507,28 | R\$ 23.898,18 | R\$ 26.920,73 | R\$ 28.482,67 | R\$ 47.800,65 |

|              |       |
|--------------|-------|
| Reajuste 1 = | 5,40% |
|--------------|-------|

### 13.1 Infraestrutura elétrica e estações de trabalho
















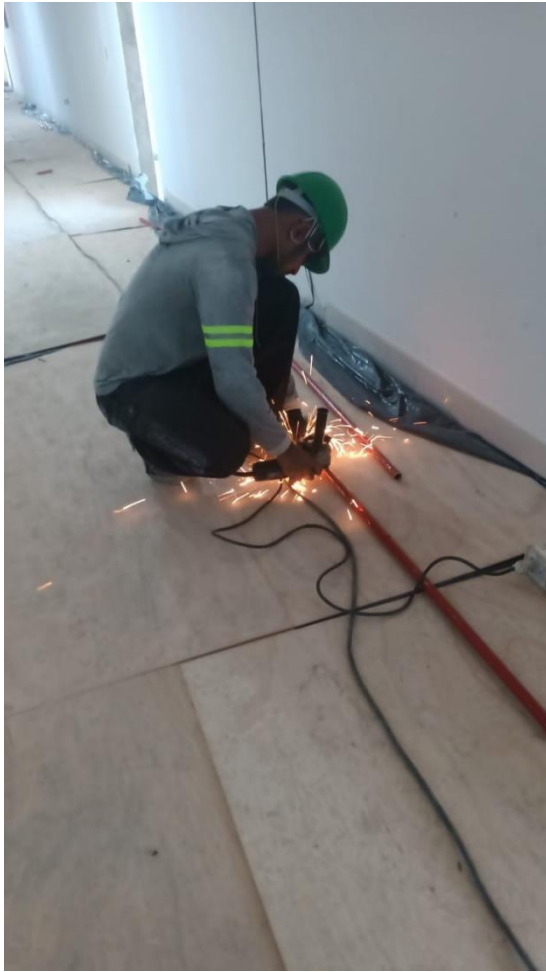














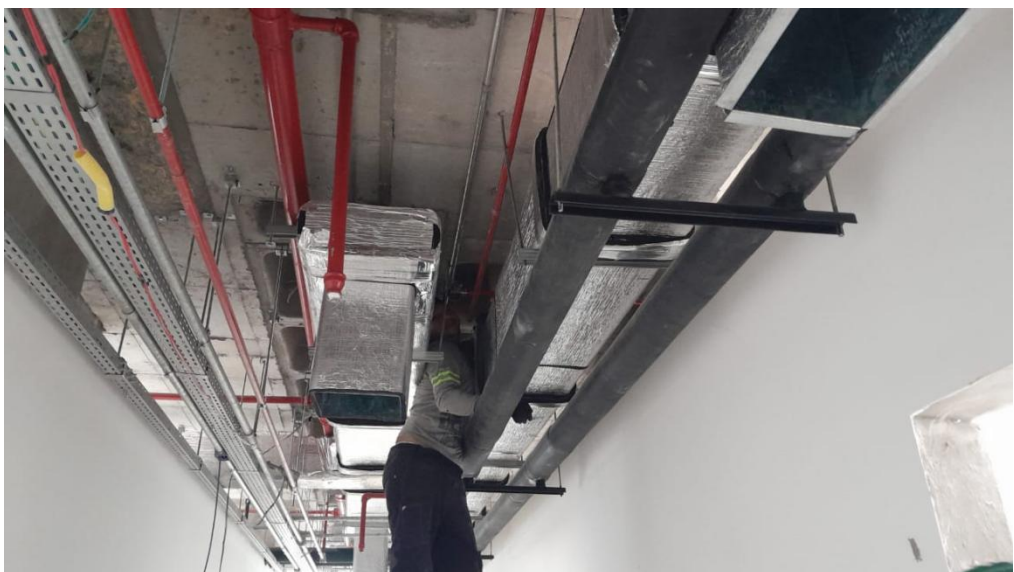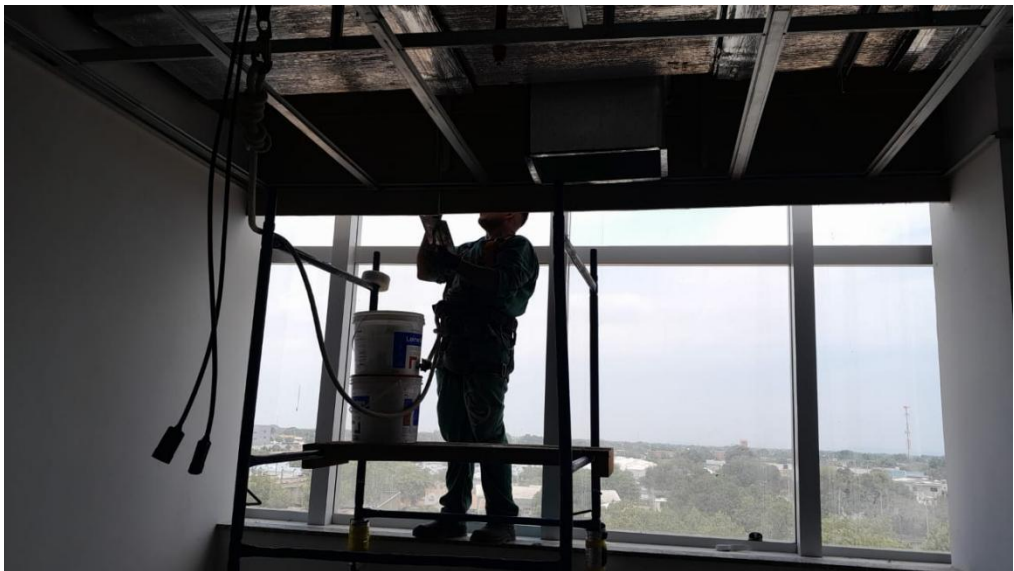

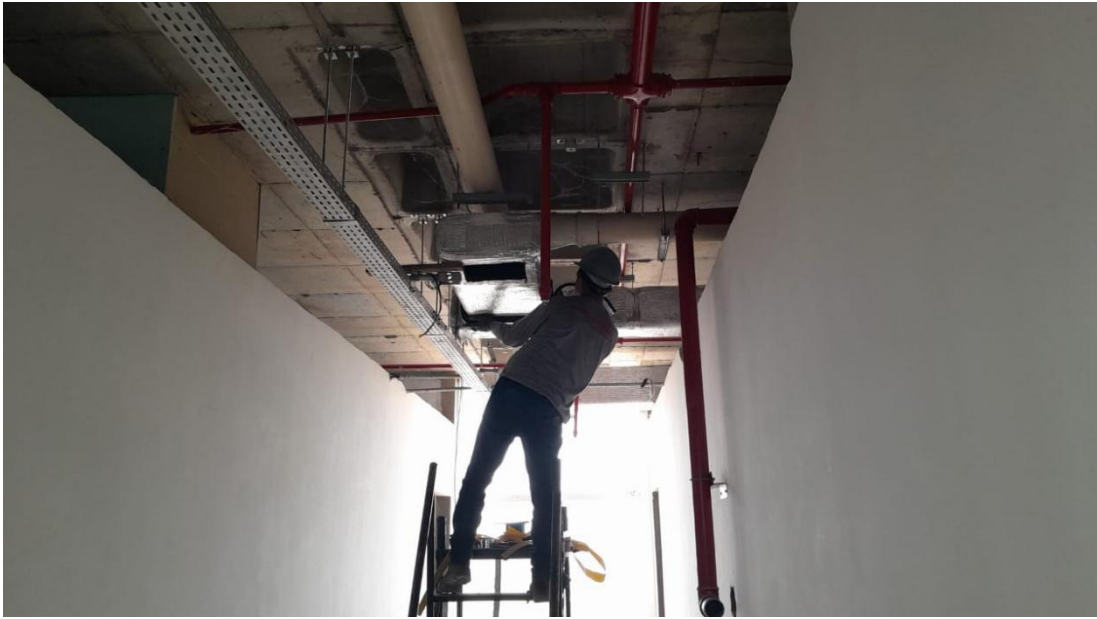
















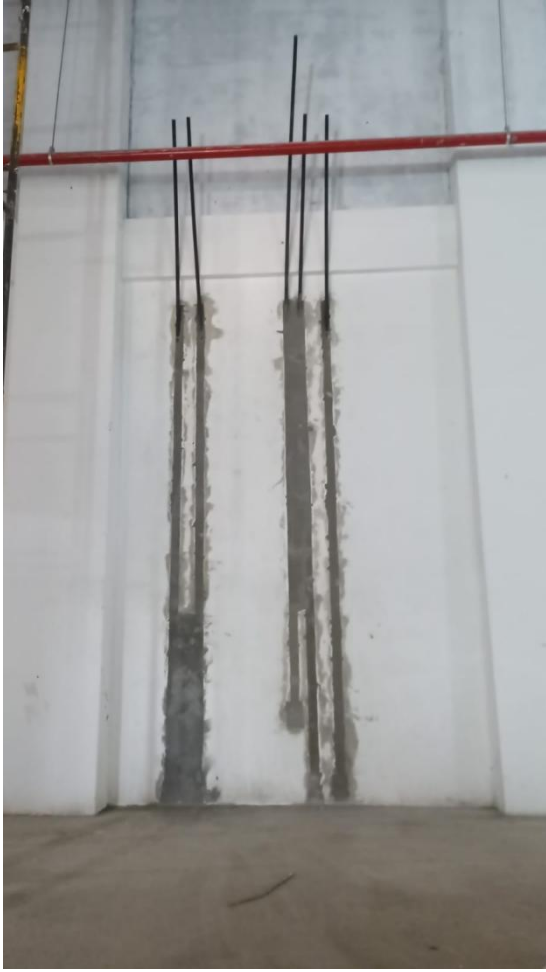







### 13.2 Porcelanato/Soleira
































### 13.3 Climatização







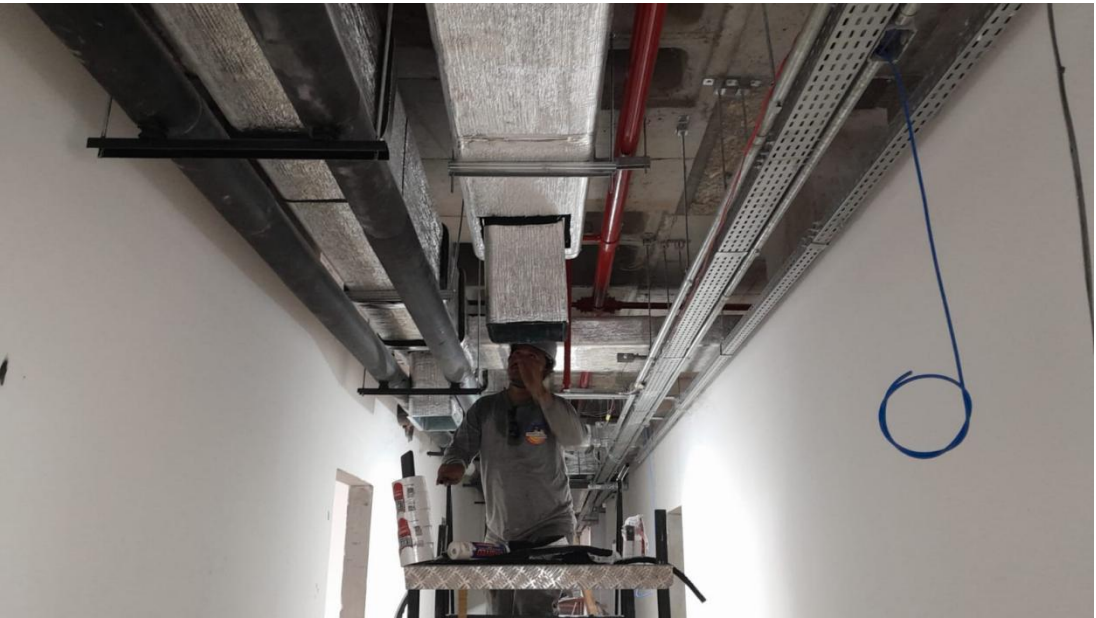















#### 13.4 Forro (tarugamento)












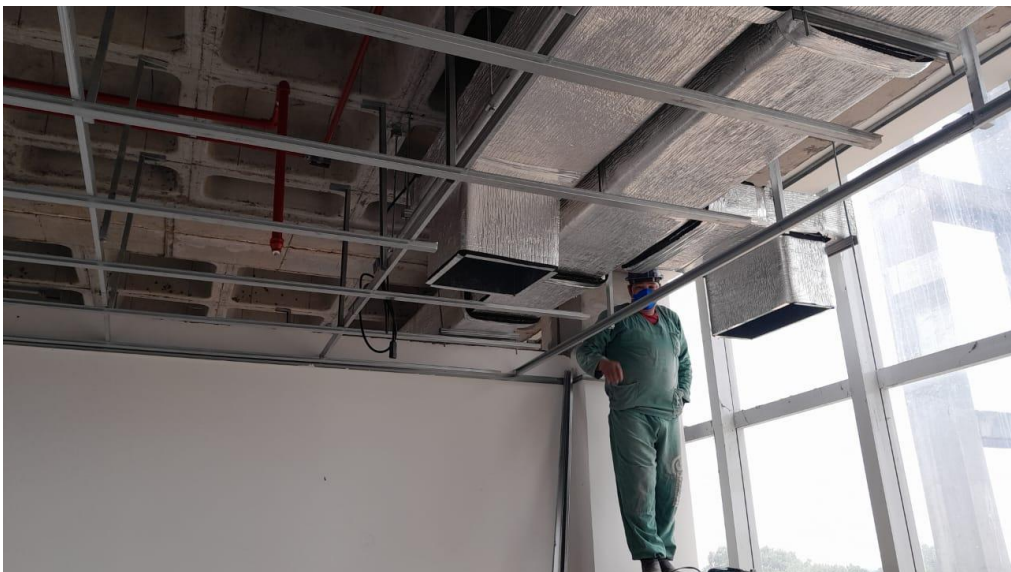









## 13.5 Serviços externo


### 13.5.1 Escavação









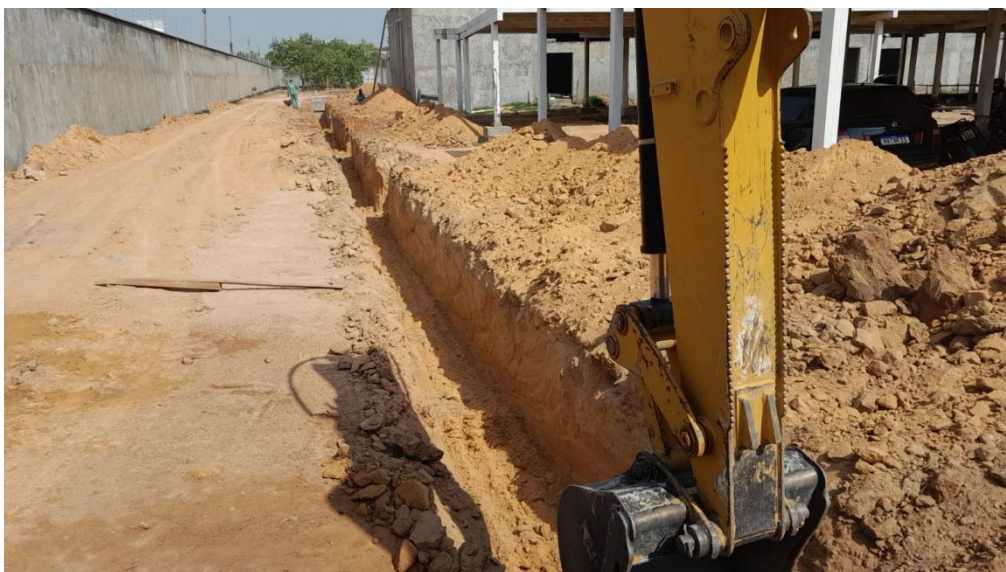







### 13.5.2 Eletrodutos PEAD











### 13.5.3 Caixas de passagem





















#### 13.5.4 Tubulações















### 13.5.5 Calçada de visitantes

























### 13.5.6 Demais serviços























### 13.6 Papa entulho







**14.0 - CONTROLE DE RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA**

| Descrição do item                                                                      | Data da retirada do entulhos da obra |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ . | 22/02/24 - 001227                    |
| CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ . | 13/03/24 - 01386                     |
| CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ . | 15/03/24 - 01394                     |

**15.0 - RELAÇÃO DOS COLABORADORES COM A FUNÇÃO NA EMPRESA J. NASSER ENGENHARIA LTDA**

| Nº | Colaborador                      | Função              |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 1  | ANASTÁCIO FERREIRA GOMES         | GESSEIRO            |
| 2  | ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA      | SERVENTE            |
| 3  | ANANIAS VIEIRA DA SILVA          | SERVENTE            |
| 4  | ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO     | PEDREIRO            |
| 5  | ANTONIES DIEGO DE SOUZA CORDEIRO | SERVENTE            |
| 6  | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA       | ELETRICISTA         |
| 7  | BRUNO SILVA CASTRO               | SERVENTE            |
| 8  | BRUNO GILENO FORTES              | SERVENTE            |
| 9  | CLÁUDIO ROCHA DA SILVA           | TÉC. DE EDIFICAÇÕES |
| 10 | DARLISON COSMOS PENA             | BOMBEIRO HIDRAULICO |
| 11 | DAVI JACKSON FERREIRA SOARES     | VIGIA               |
| 12 | DIEGO SIMAO BURUM                | SERVENTE            |
| 13 | ELIEZIO MEIRELE RODRIGUES        | PEDREIRO            |
| 14 | ELIZEU LIMA DA SILVA             | SERVENTE            |
| 15 | ERIVAN LOURENÇO MACHADO          | PEDREIRO            |
| 16 | EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA       | ENGENHEIRA          |
| 17 | FELIPE GRALHADA OLIVEIRA         | SERVENTE            |
| 18 | FRANCISCO EMICIO                 | BOMBEIRO HIDRAULICO |
| 19 | GILVAN LEITE RIBEIRO             | PEDREIRO            |

|    |                                           |                          |
|----|-------------------------------------------|--------------------------|
| 20 | IGOR ANTONIO PINO                         | PINTOR                   |
| 21 | JOSE MARCELO ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR | MESTRE DE OBRAS          |
| 22 | JOSE RAIMUNDO BRAGA TRINDADE              | PEDREIRO                 |
| 23 | JOSÉ VERAS BARROS                         | OP. BETONEIRA            |
| 24 | JORDÃO DA COSTA CASTRO                    | SERVETE                  |
| 25 | JOÃO BASTISTA BRAGA                       | CARPINTEIRO              |
| 26 | JOSE MARIA FROTA CONRADO                  | PINTOR                   |
| 27 | LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA                | ALMOXARIFE               |
| 28 | MARLON BORGES PEREIRA                     | TECNICO DE SEGURANÇA     |
| 29 | MOISES FERREIRA CHAVES                    | CARPINTEIRO              |
| 30 | NILDO OLIVEIRA DA SILVA                   | PEDREIRO                 |
| 31 | OZIEL LIMA DA SILVA                       | SERVENTE                 |
| 32 | PEDRO PINO MESQUITA                       | OP. DE RESTROESCAVADEIRA |
| 33 | RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE            | PEDREIRO                 |
| 34 | RAUDI RAFAEL MARTINES                     | CARPINTEIRO              |
| 35 | RONNY DE SOUZA ANICETO                    | SERVENTE                 |
| 36 | SEBASTIÃO ASSIS DE FREITAS                | PINTOR                   |
| 37 | SERGIO GOMES DA SILVA                     | SERVENTE                 |
| 38 | SIVANILSON VIERA DA SILVA                 | PEDREIRO                 |
| 39 | THIAGO CARVALHO NEGREIROS                 | VIGIA                    |
| 40 | VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA             | VIGIA                    |
| 41 | YANN PEREIRA NUNES                        | SERVENTE                 |
| 42 | ZEDEQUIAS DOS SANTOS                      | IMPERMEABILIZADOR        |

**15.1 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).**

| Nº | Colaborador           | Função                 |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1  | DANIEL ASSIS CARNEIRO | ENGENHEIRO ELETRICISTA |



|   |                                |                             |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 2 | GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO     | ELETRICISTA                 |
| 3 | GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ      | ELETRICISTA                 |
| 4 | JORGE LUIZ GOZALEZ LOPEZ       | PEDREIRO                    |
| 5 | FÁBIO ROBERTO MESSIAS          | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS     |
| 6 | OSWALDO JOSE GONZALEZ CASTILLO | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS     |
| 7 | SIMON ENRIQUE OLIVEROS LINARES | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS     |
| 8 | FABIO VIEIRA DA SILVA          | TÉCNICO EM<br>ELETROTÉCNICA |

**15.2 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa FERREIRA & FERREIRA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)**

| Nº | Colaborador                    | Função                |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| 1  | ALLAN GUIMARÃES FARIAS         | AUXILIAR DE FUNILARIA |
| 2  | SAMUEL LOBATO                  | FUNILEIRO             |
| 3  | LUIZ MIGUEL MAURERA            | AUXILIAR DE FUNILARIA |
| 4  | MIGUEL ALEXANDER JIMENES RIVAS | AUXILIAR DE FUNILARIA |

**16.0 - A FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO SERÁ DEFINIDA PELA SOMA DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS OCORRÊNCIAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, CONFORME TABELA ABAIXO:**

| PONTUAÇÃO      | ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)       |
|----------------|----------------------------------|
| 0-10           | Sem desconto                     |
| 11-20          | -0,50% sobre da Parcela Faturada |
| 21-30          | -1,00% sobre a Parcela Faturada  |
| 31-40          | -1,50% sobre a Parcela Faturada  |
| 41-50          | -2,00% sobre a Parcela Faturada  |
| 51-60          | -2,50% sobre a Parcela Faturada  |
| 61-70          | -3,00% sobre a Parcela Faturada  |
| 71-80          | -3,50% sobre a Parcela Faturada  |
| 81-90          | -4,00% sobre a Parcela Faturada  |
| A partir de 91 | -5,00% sobre a Parcela Faturada  |

**16.1 - Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:**

| ITEM                                        | INDICADOR                                                                                                       | INCIDÊNCIA                          | PONTUAÇÃO |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER</b> |                                                                                                                 |                                     |           |
| 1                                           | Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização. | Por empregado/colaborador e por dia | 2         |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 2                                               | Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.                                                                                                           | Por dia e por empregado/<br>Colaborador | 2  |
| 3                                               | Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.                                                                                                                                                                                   | Por dia                                 | 5  |
| 4                                               | Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.                                                                                                                                            | Por ocorrência                          | 5  |
| 5                                               | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.                                                                                                                                             | Por ocorrência                          | 5  |
| 6                                               | Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.                                                                                                                                                                          | Por ocorrência.                         | 10 |
| <b>APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |    |
| 7                                               | Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.                                                                                    | Por dia de atraso                       | 3  |
| 8                                               | Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.                                                                                  | Por empregado e por dia                 | 3  |
| 9                                               | Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.                                                                                                                                                               | Por ocorrência                          | 4  |
| 10                                              | Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.                                                                                                                                       | Por ocorrência e por dia.               | 4  |
| 11                                              | Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital. | Por técnico/ profissional e por dia     | 6  |



|                                                         |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                      | Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.                  | Por ocorrência           | 8                                                                             |
| 13                                                      | Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco. | Por ocorrência           | 11                                                                            |
| <b>APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS</b> |                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                               |
| 14                                                      | Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.                 | Por ocorrência (parcela) | 6                                                                             |
| 15                                                      | Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.  | Por ocorrência (parcela) | 12                                                                            |
| 16                                                      | Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro. | Por ocorrência (parcela) | 24                                                                            |
| 17                                                      | Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.          | Por ocorrência (parcela) | 24 +<br>Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção |

**Ocorrência: Sem ocorrências**

#### **17.0 - DO PAGAMENTO**

**17.1 - Pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.**

**17.2 - Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.**

**17.3 - A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme a tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:**

| ITEM                                              | INDICADOR | INCIDÊNCIA | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| -                                                 |           |            |            | 0         |
| SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO                            |           |            |            | 0         |
| PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: |           |            |            |           |



## 18.0 - ANEXO: DIÁRIOS DE OBRA

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 400        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 332        |       |            |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 | DATA  | 19/02/2024 |

400

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 19/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em rodapé do 1º pavimento.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 1º pavimento.
- Confecção de caixas de aguas pluviais.
- Assentamento de tubulação da da rede de aguas pluviais
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Confecção dos dutos de climatização do 1º pavimento.
- Colocação de soleiras das portas 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 019/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECCÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO SEGUNDO E PRIMEIRO PAVIMENTO;  
3.3 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CONTRA INCÊNDIO;  
3.4 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;  
3.5 CONFECCAO DA ESTRUTURA DO FORRO DO TERCEIRO PAVIEMENO;  
3.6 CONFECCÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO/CONCRETAGEM DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;  
3.7 CONFECCÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL;  
3.8 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRIMEIRO PAVIMENTO;  
3.9 COLOCAÇÃO DAS SOLEIRAS DO TERCEIRO PAVIMENTO;  
3.10 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO SEGUNDO PAVIMENTO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 401        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 331        | DATA  | 20/02/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 20/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em rodapé do 1º pavimento.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 1º pavimento.
- Confecção de caixas de aguas pluviais.
- Assentamento de tubulação da da rede de aguas pluviais
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Confecção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Colocação de soleiras das portas 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 402        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 330        | DATA  | 21/02/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 21/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em rodapé do 1º pavimento.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 1º pavimento.
- Confecção de caixas de aguas pluviais.
- Assentamento de tubulação da da rede de aguas pluviais
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Confecção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Colocação de soleiras das portas 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 403        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 329        |       |            |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 | DATA  | 22/02/2024 |

403

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 22/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em rodapé do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Colocação de soleiras das portas 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.
- Compactação de aterro para confecção de calçada do canteiro central.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 22/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECCÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO SEGUNDO E PRIMEIRO PAVIMENTO;  
3.3 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CONTRA INCÊNDIO;  
3.4 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;  
3.5 CONFECCAO DA ESTRUTURA DO FORRO DO TERCEIRO PAVIEMENO;  
3.6 CONFECCÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO/CONCRETAGEM DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;  
3.7 CONFECCÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL;  
3.8 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRIMEIRO PAVIMENTO;  
3.9 COLOCAÇÃO DAS SOLEIRAS DO TERCEIRO PAVIMENTO;  
3.10 CONFECCÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.11 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO SEGUNDO PAVIMENTO;  
3.12 COMPACTAÇÃO DO SOLO DA CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL;  
3.13 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 404        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 328        | DATA  | 23/02/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 23/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em rodapé do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Colocação de soleiras das portas 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.
- Compactação de aterro para confecção de calçada do canteiro central.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 23/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECCÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO SEGUNDO E PRIMEIRO PAVIMENTO;  
3.3 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 3ª PAVIMENTO;  
3.4 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;  
3.5 CONFECCAO DA ESTRUTURA DO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.6 CONFECCÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL;  
3.7 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRIMEIRO PAVIMENTO;  
3.8 COLOCAÇÃO DAS SOLEIRAS DO TERCEIRO PAVIMENTO;  
3.9 CONFECCÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.10 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO SEGUNDO PAVIMENTO;  
3.11 COMPACTAÇÃO DO SOLO DA CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL;  
3.12 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 405        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 327        | DATA  | 24/02/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

|                         |
|-------------------------|
| RELATÓRIO DA CONTRATADA |
|                         |

|                           |
|---------------------------|
| RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO |
|                           |

\_\_\_\_\_  
Fiscalização

\_\_\_\_\_  
Contratada



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 406        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 326        | DATA  | 25/02/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
Fiscalização

\_\_\_\_\_  
Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |            |                                                                                              |            |      |            |     |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----|
| OBRA        |            | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |            |      |            |     |
| CONTRATANTE |            | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |            |      | FOLHA      | 407 |
| EMPRESA     |            |                                                                                              |            |      |            |     |
| CONTRATO Nº | 05-2022    | DIAS FALTANTES                                                                               | 325        |      |            |     |
| INÍCIO      | 16/01/2023 | PRAZO                                                                                        | 15/01/2025 | DATA | 26/02/2024 |     |

407

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 23/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 2º pavimento.  
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.  
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.  
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.  
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .  
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.  
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.  
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.  
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.  
- Compactação de aterro para confeção de calçada do canteiro central.  
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 26/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECCÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO DOS FUNDOS;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 3ª PAVIMENTO;  
3.4 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;  
3.5 CONFECCAO DA ESTRUTURA DO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.6 CONFECCÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL;  
3.7 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRIMEIRO PAVIMENTO;  
3.8 COLOCAÇÃO DAS SOLEIRAS DO TERCEIRO PAVIMENTO;  
3.9 CONFECCÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.10 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO SEGUNDO PAVIMENTO;  
3.11 COMPACTAÇÃO DO SOLO DA CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL;  
3.12 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 408        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 324        | DATA  | 27/02/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 27/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.
- Compactação de aterro para confeção de calçada do canteiro central.
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Impermeabilização das caixas de águas pluviais

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 27/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO DOS FUNDOS;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 3ª PAVIMENTO;  
3.4 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;  
3.5 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL;  
3.6 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 1º PAVIMENTO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.8 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO 2º PAVIMENTO;  
3.9 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.10 COMPACTAÇÃO DO SOLO DA CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL;  
3.11 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 409        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 323        |       |            |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 | DATA  | 28/02/2024 |

409

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 28/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 2º pavimento.
- Compactação de aterro para confeção de calçada do canteiro central.
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Impermeabilização das caixas de águas pluviais.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 28/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO DOS FUNDOS;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 3ª PAVIMENTO;  
3.4 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;  
3.5 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL E ESCAVAÇÃO;  
3.6 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 1º PAVIMENTO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.8 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO 2º PAVIMENTO;  
3.9 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.10 COMPACTAÇÃO DO SOLO DA CALÇADA DO CANTEIRO CENTRAL;  
3.11 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 410        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 322        | DATA  | 29/02/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 29/02/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 2º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Impermeabilização das caixas de águas pluviais.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 29/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO DOS FUNDOS;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 3ª PAVIMENTO;  
3.4 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 2º PAVIMENTO;  
3.5 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL E ESCAVAÇÃO;  
3.6 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 1º PAVIMENTO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.8 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO 2º PAVIMENTO;  
3.9 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.10 CONFECÇÃO DE MEIO FIO.

4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 411        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 321        | DATA  | 01/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 01/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 3º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 2º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Impermeabilização das caixas de águas pluviais.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 01/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO DOS FUNDOS;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 3ª PAVIMENTO;  
3.4 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 2º PAVIMENTO;  
3.5 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL E ESCAVAÇÃO;  
3.6 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 1º PAVIMENTO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;  
3.8 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO 2º PAVIMENTO;  
3.9 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.10 CONFECÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;  
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO (REPARO);  
3.12 CONFECÇÃO DE MEIO FIO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 412        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 320        | DATA  | 02/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_

Fiscalização

\_\_\_\_\_

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 413        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 319        | DATA  | 03/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

|                         |
|-------------------------|
| RELATÓRIO DA CONTRATADA |
|                         |

|                           |
|---------------------------|
| RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO |
|                           |

\_\_\_\_\_

Fiscalização

\_\_\_\_\_

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |            |                                                                                              |            |      |            |     |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----|
| OBRA        |            | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |            |      |            |     |
| CONTRATANTE |            | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |            |      | FOLHA      | 414 |
| EMPRESA     |            |                                                                                              |            |      |            |     |
| CONTRATO Nº | 05-2022    | DIAS FALTANTES                                                                               | 318        |      |            |     |
| INÍCIO      | 16/01/2023 | PRAZO                                                                                        | 15/01/2025 | DATA | 04/03/2024 |     |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 04/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO DOS FUNDOS;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 EXECUÇÃO DE TUDO DE ÁGUA PLUVIAL 150mm  
3.4 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 2º PAVIMENTO;  
3.5 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;  
3.6 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.7 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.9 CONFECÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;  
3.10 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO (REPARO);  
3.11 CONFECÇÃO DE MEIO FIO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |            |                                                                                              |            |      |            |     |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----|
| OBRA        |            | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |            |      |            |     |
| CONTRATANTE |            | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |            |      | FOLHA      | 415 |
| EMPRESA     |            |                                                                                              |            |      |            |     |
| CONTRATO Nº | 05-2022    | DIAS FALTANTES                                                                               | 317        |      |            |     |
| INÍCIO      | 16/01/2023 | PRAZO                                                                                        | 15/01/2025 | DATA | 05/03/2024 |     |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 04/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 2º pavimento.  
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.  
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.  
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.  
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .  
- Confeção de estrutura de forro do 2º pavimento.  
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.  
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.  
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 2º pavimento.  
- Infraestrutura do detecção e alarme do 2º pavimento.  
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)  
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.  
- Impermeabilização das caixas de águas pluviais.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 05/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;

01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

## 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

## 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

## 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confecção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confecção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confecção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confecção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 2º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 2º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Impermeabilização das caixas de águas pluviais.

4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 05/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO DOS FUNDOS;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 EXECUÇÃO DE TUDO DE ÁGUA PLUVIAL 150mm  
3.4 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 2º PAVIMENTO;  
3.5 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;  
3.6 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.7 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.9 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO (REPARO).

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|-----|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |     |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 416 |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |     |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 316        |       |     |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 | DATA  |     |

416

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 06/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 2º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 2º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Impermeabilização das caixas de águas pluviais.

### 4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 06/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 2º PAVIMENTO;  
3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 2º PAVIMENTO;  
3.5 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;  
3.6 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.7 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.9 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DO NOVO LAYOUT NO TÉRREO;  
3.10 CAPIAÇO NO 2º PAVIMENTO;  
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO (REPARO).

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 417        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 315        | DATA  | 07/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 07/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 1º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 1º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Confeção de chicote das luminárias do 2º pavimento.

4 - Ocorrências: Informamos que houve acidente de trabalho com leves escoriações no dedo no dia 06/03/2024 com o funcionário Alan Jaime Freitas caldeira. A empresa esta fazendo o processo exigido em norma como abertura de CAT, assistência médica, compra de medicamentos e etc. O funcionário está trabalhando normalmente não houve afastamento do trabalho conforme atestado médico.

Rede de Irrigação - Conforme orientação dos Fiscais Marcos Madureira e Antônio da SEA, os bitolas consideradas nas tubulações em projeto serão especificadas conforme diâmetro descrito na line ( projeto em autocad), sempre em concordância com planilha orçamentária. Válvulas Solenoides e Caixas para válvulas irão seguir descrição conforme planilha orçamentária, pois não tem especificação em projeto. As tubulações a serem executadas serão:

Line Projeto 50 PN 80 / Tubulação adotada conforme planilha orçamentária TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 80 Ø 50MM, LINHA IRRIGA-LF.  
Line Projeto 50 PN 60 / Tubulação adotada conforme planilha orçamentária TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 40 Ø 50MM, LINHA IRRIGA-LF  
Line Projeto 32mm/ Tubulação adotada conforme planilha orçamentária TUBO DE PVC RÍGIDO AZUL PARA IRRIGAÇÃO DE 32 MM LF - PN 40  
Line Projeto 25mm/ Tubulação adotada conforme planilha orçamentária TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 60 Ø 25MM, LINHA IRRIGA  
Line Projeto 40mm/ Tubulação adotada conforme planilha orçamentária TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF - Ø 40MM, LINHA IRRIGA

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 07/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 2º PAVIMENTO;  
3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 2º PAVIMENTO;  
3.5 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.6 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO 2º PAVIMENTO;  
3.9 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.10 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DO NOVO LAYOUT NO TÉRREO;  
3.11 CAPIAÇO NO 2º PAVIMENTO;  
3.12 CONFECÇÃO DE MEIO FIO;  
3.13 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO (REPARO).

4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |  |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        |  | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |  | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            | FOLHA | 418        |
| EMPRESA     |  |                                                                                              |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº |  | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 314        |       |            |
| INÍCIO      |  | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 | DATA  | 08/03/2024 |

418

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 08/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 1º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 1º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Confeção de chicote das luminárias do 2º pavimento.
- Lançamento de concreto em Calçadas - canteiro central.

4 - Ocorrências: Conforme orientação dos Fiscais Marcos Madureira e Gabriel da SEA a caixa que será utilizada no sistema de SOM e ANTENA conforme planilha orçamentária no item 9.3.37.

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 08/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 2º PAVIMENTO;  
3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 2º PAVIMENTO;  
3.5 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.6 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.9 EXECUÇÃO DA CALÇADA;  
3.10 CAPIAÇO NO 2º PAVIMENTO;  
3.11 CONFECÇÃO DE MEIO FIO;  
3.12 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO (REPARO).

4.0 - OCORRÊNCIAS:

4.1 A EMPRESA FOI SOLICITADA A FAZER O PROCEDIMENTO EXIGIDO EM NORMA COMO ABERTURA DE CAT, NO DIA 06/03/2024;  
4.2 NA REDE DE IRRIGAÇÃO FICOU ORIENTADO PARA A ENGENHARIA CONSIDERAR AS BITOLAS ESPECIFICADA CONFORME DIÂMETRO NA DESCRIÇÃO DA LINE DO PROJETO EM AUTOCAR. POR NÃO ESTÁ NA REPRESENTAÇÃO DA PLANCHA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO AS BITOLAS DOS TUBOS. VÁLVULAS SOLENOÍDES E CAIXAS IRÃO SEGUIR A DESCRIÇÃO CONFORME A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;  
4.3 VAMOS UTILIZAR NAS CAIXAS CATV O ITEM QUE CONSTA EM PLANILHA ( ITEM 9.3.37 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 419        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 313        | DATA  | 09/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
Fiscalização

\_\_\_\_\_  
Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 420        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 312        | DATA  | 10/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
Fiscalização

\_\_\_\_\_  
Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 421        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 311        |       |            |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 | DATA  | 11/03/2024 |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 11/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de tubulação da rede detecção e alarme do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 1º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 1º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Confeção de chicote das luminárias do 2º pavimento.
- Lançamento de concreto em Calçadas - canteiro central.

### 4 - Ocorrências: sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 11/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 1º PAVIMENTO;  
3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 1º PAVIMENTO;  
3.5 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.6 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE PLUVIAIS E ESCAVAÇÃO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 1º E 2º PAVIMENTO;  
3.9 EXECUÇÃO DA CALÇADA;  
3.10 CAPIAÇO NO 2º PAVIMENTO;  
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO (REPARO).

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 422        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 310        | DATA  | 12/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| RELATÓRIO DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |
|                         |  |  |  |  |  |

|                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO                                                                        |  |  |  |  |  |
| 1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 12/03/2024                   |  |  |  |  |  |
| 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:                                 |  |  |  |  |  |
| 1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)                                                            |  |  |  |  |  |
| 1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO                                                                          |  |  |  |  |  |
| 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO                                                              |  |  |  |  |  |
| 1 MESTRE DE OBRA                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 1 ALMOXARIFE                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 5 PEDREIRO                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 12 SERVENTE                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 1 IMPERMEABILIZADOR                                                                              |  |  |  |  |  |
| 1 ELETRICISTA                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO                                                                            |  |  |  |  |  |
| 1 OPERADOR DE BETONEIRA                                                                          |  |  |  |  |  |
| 2 VIGIA                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 2 PINTOR                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 1 OPERADOR DE CALDEIRA                                                                           |  |  |  |  |  |
| 2.1- SUBCONTRATAÇÃO:                                                                             |  |  |  |  |  |
| 2.1.1-RR DOMÓTICA                                                                                |  |  |  |  |  |
| 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                                         |  |  |  |  |  |
| 3 ELETRICISTA                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 3 AUX. DE SERVIÇO GERAL                                                                          |  |  |  |  |  |
| 2.2 FERREIRA E FERREIRA                                                                          |  |  |  |  |  |
| 03 - AUX. DE FUNILARIA                                                                           |  |  |  |  |  |
| 01 - FUNILEIRO                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:                                                                     |  |  |  |  |  |
| 3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;                                             |  |  |  |  |  |
| 3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO E RODAPÉ NO PAVIMENTO TÉRREO;                               |  |  |  |  |  |
| 3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 1º PAVIMENTO;                                         |  |  |  |  |  |
| 3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 1º PAVIMENTO;                            |  |  |  |  |  |
| 3.5 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;                                          |  |  |  |  |  |
| 3.6 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE PLUVIAIS E ESCAVAÇÃO;                              |  |  |  |  |  |
| 3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO; |  |  |  |  |  |
| 3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 1º E 2º PAVIMENTO;                                      |  |  |  |  |  |
| 3.9 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO (REPARO).      |  |  |  |  |  |
| 4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS                                                               |  |  |  |  |  |
| ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.                                         |  |  |  |  |  |

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 423        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 309        |       |            |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 | DATA  | 13/03/2024 |

423

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 12/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

#### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

#### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de forro (cortineiro) de 3º pavimento.  
- Confecção de caixas de aguas pluviais e drenagem.  
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.  
- Confecção de chapim de concreto do muro do fundo .  
- Confecção de estrutura de forro do 2º pavimento.  
- Confecção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.  
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 1º pavimento.  
- Infraestrutura do detecção e alarme do 1º pavimento.  
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.  
- Confecção de chicote das luminárias do 2º pavimento.

#### 4 - Ocorrências: sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 13/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas



01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesso  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

## 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

## 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

## 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de forro (cortineiro) de 3º pavimento.
- Confeção de caixas de águas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de águas pluviais.
- Confeção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confeção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 1º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 1º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Confeção de chicote das luminárias do 2º pavimento.
- Lançamento de concreto em Calçadas - canteiro central.

4 - Ocorrências: sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 13/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO E RODAPÉ NO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 1º PAVIMENTO;  
3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 1º PAVIMENTO;  
3.5 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.6 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE PLUVIAIS E ESCAVAÇÃO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 1º E 2º PAVIMENTO;  
3.9 EXECUÇÃO DA CALÇADA;  
3.10 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO (REPARO).

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 424        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 308        | DATA  | 14/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

424

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 14/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

#### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

#### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de forro (cortineiro) de 3º pavimento.
- Confecção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confecção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confecção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confecção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 1º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 1º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Confecção de chicote das luminárias do 2º pavimento.
- Lançamento de concreto em Calçadas - canteiro central.

#### 4 - Ocorrências: sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 14/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO E RODAPÉ NO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 1º PAVIMENTO;  
3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 1º PAVIMENTO;  
3.5 COLOCAÇÃO DE RABICHO DA ILUMINAÇÃO NO 2º PAVIMENTO;  
3.6 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE PLUVIAIS E ESCAVAÇÃO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 1º E 2º PAVIMENTO;  
3.9 COMPACTAÇÃO DO SOLO DA CALÇADA EM FRENTE DA SUBESTAÇÃO;  
3.10 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO (REPARO).

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 425        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 307        |       |            |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 | DATA  | 15/03/2024 |

425

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 15/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

#### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

#### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de forro (cortineiro) de 3º pavimento.
- Confecção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais.
- Confecção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confecção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confecção dos dutos de climatização do 1º e 2º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 1º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 1º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Confecção de chicote das luminárias do 2º pavimento.
- Calçada em frente a Subestação - Forma, lona e armação.

#### 4 - Ocorrências: sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 15/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO E RODAPÉ NO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 1º PAVIMENTO;  
3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 1º PAVIMENTO;  
3.5 PASSAGEM DE CABO DOS ALIMENTADORES DO QUADRO GERAL PARA OS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PAVIMENTOS;  
3.6 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE PLUVIAIS E ESCAVAÇÃO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 1º E 2º PAVIMENTO;  
3.9 CALÇADA EM FRENTE DA SUBESTAÇÃO (COLOCAÇÃO DE LONA/TELA);  
3.10 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO (REPARO).

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 426        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 306        | DATA  | 16/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
Fiscalização

\_\_\_\_\_  
Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 427        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 305        | DATA  | 17/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

\_\_\_\_\_  
Fiscalização

\_\_\_\_\_  
Contratada

# DIÁRIO DE OBRAS

|             |                                                                                              |                |            |       |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|------------|
| OBRA        | EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA. |                |            |       |            |
| CONTRATANTE |                                                                                              |                |            | FOLHA | 428        |
| EMPRESA     | J NASSER ENGENHARIA LTDA                                                                     |                |            |       |            |
| CONTRATO Nº | 05-2022                                                                                      | DIAS FALTANTES | 304        | DATA  | 18/03/2024 |
| INÍCIO      | 16/01/2023                                                                                   | PRAZO          | 15/01/2025 |       |            |

## RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 18/03/2024

### 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA ( TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

### 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA ( FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;  
01 - Técnico em Edificações;  
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;  
01 - Mestre de Obra;  
01 - Almoxarife;  
03 - Carpinteiro;  
08 - Pedreiro;  
10 - Servente;  
01 - Eletricista  
03 - Pintor;  
02 - Bombeiro Hidráulico;  
01 - Operador de maquinas Pesadas  
01 - Op. Betoneira;  
01 - Impermeabilizador;  
01 - Gesseiro  
01 - Rejuntador  
02 - Vigia.

### 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista  
02 - Eletricista  
01 - Técnico em Eletrotécnica  
03 - Aux. de serviços gerais  
01 - Pedreiro

### 2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria  
01 - Funileiro

### 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura de forro (cortineiro) de 2º pavimento.
- Confecção de caixas de aguas pluviais e drenagem.
- Assentamento de tubulação da rede de aguas pluviais. no estacionamento.
- Confecção de chapim de concreto do muro do fundo .
- Confecção de estrutura de forro do 2º pavimento.
- Confecção dos dutos de climatização do 1º pavimento.
- Infraestrutura do Sistema de Automação do 1º pavimento.
- Infraestrutura do detecção e alarme do 1º pavimento.
- Assentamento de meio-fio ( Lateral do prédio)
- Assentamento de revestimento em piso do Térreo.
- Malha inferior da Subestação.

### 4 - Ocorrências: sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos



## RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 18/03/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)  
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO  
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO  
1 MESTRE DE OBRA  
1 ALMOXARIFE  
5 PEDREIRO  
12 SERVENTE  
1 IMPERMEABILIZADOR  
1 ELETRICISTA  
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO  
1 OPERADOR DE BETONEIRA  
2 VIGIA  
2 PINTOR  
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
3 ELETRICISTA  
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - AUX. DE FUNILARIA  
01 - FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;  
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO E RODAPÉ NO PAVIMENTO TÉRREO;  
3.3 INFRAESTRUTURA DO DETECÇÃO E ALARME DO 1º PAVIMENTO;  
3.4 CONTRA INCÊNDIO INFRAESTRUTURA DO SISTEMA AUTOMAÇÃO 1º PAVIMENTO;  
3.5 ESCAVAÇÃO DA VALA DO SPDA DA SUBESTAÇÃO;  
3.6 CONFECÇÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE PLUVIAIS E ESCAVAÇÃO;  
3.7 CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO;  
3.8 CONFECÇÃO DE DUTO DE CLIMATIZAÇÃO NO 1º E 2º PAVIMENTO;  
3.10 APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 2º PAVIMENTO (REPARO).


4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

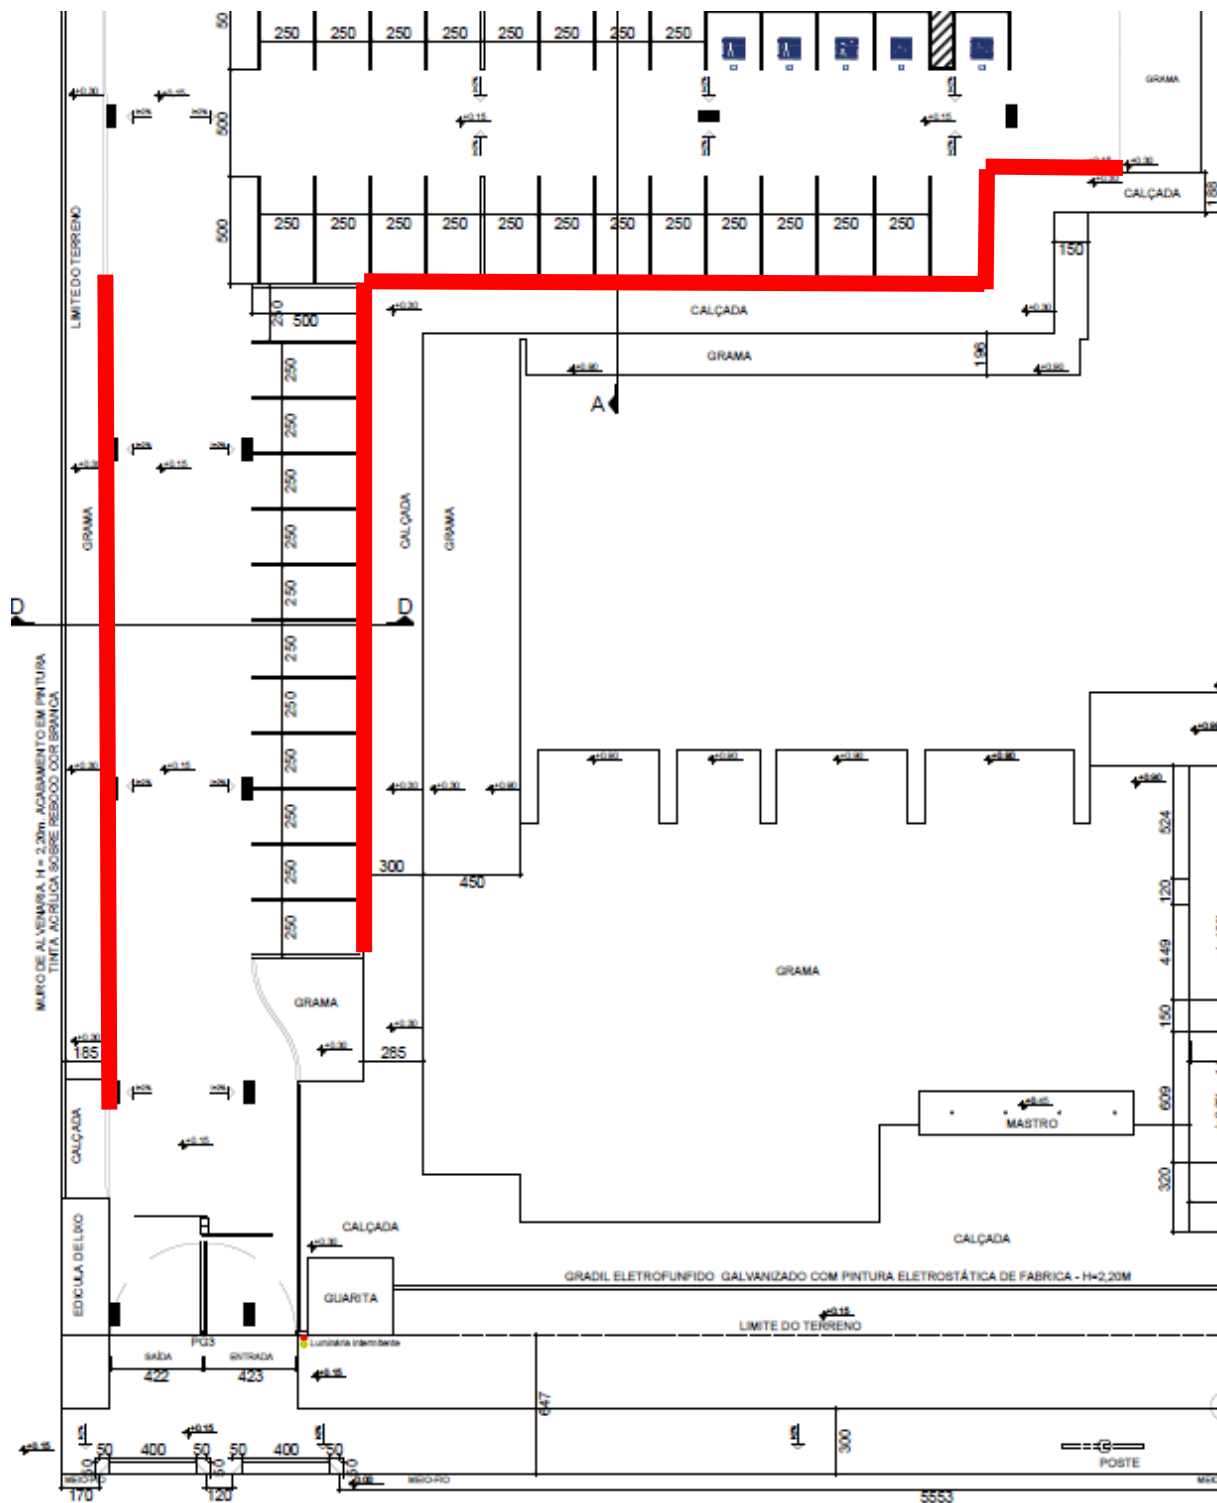


## PLANTA IMPLANTAÇÃO

ESCALA: 1:200

LEGENDA DE MEIO FIO EXECUTADO



**TERRENO**  
**ESCALA: 1:1500**

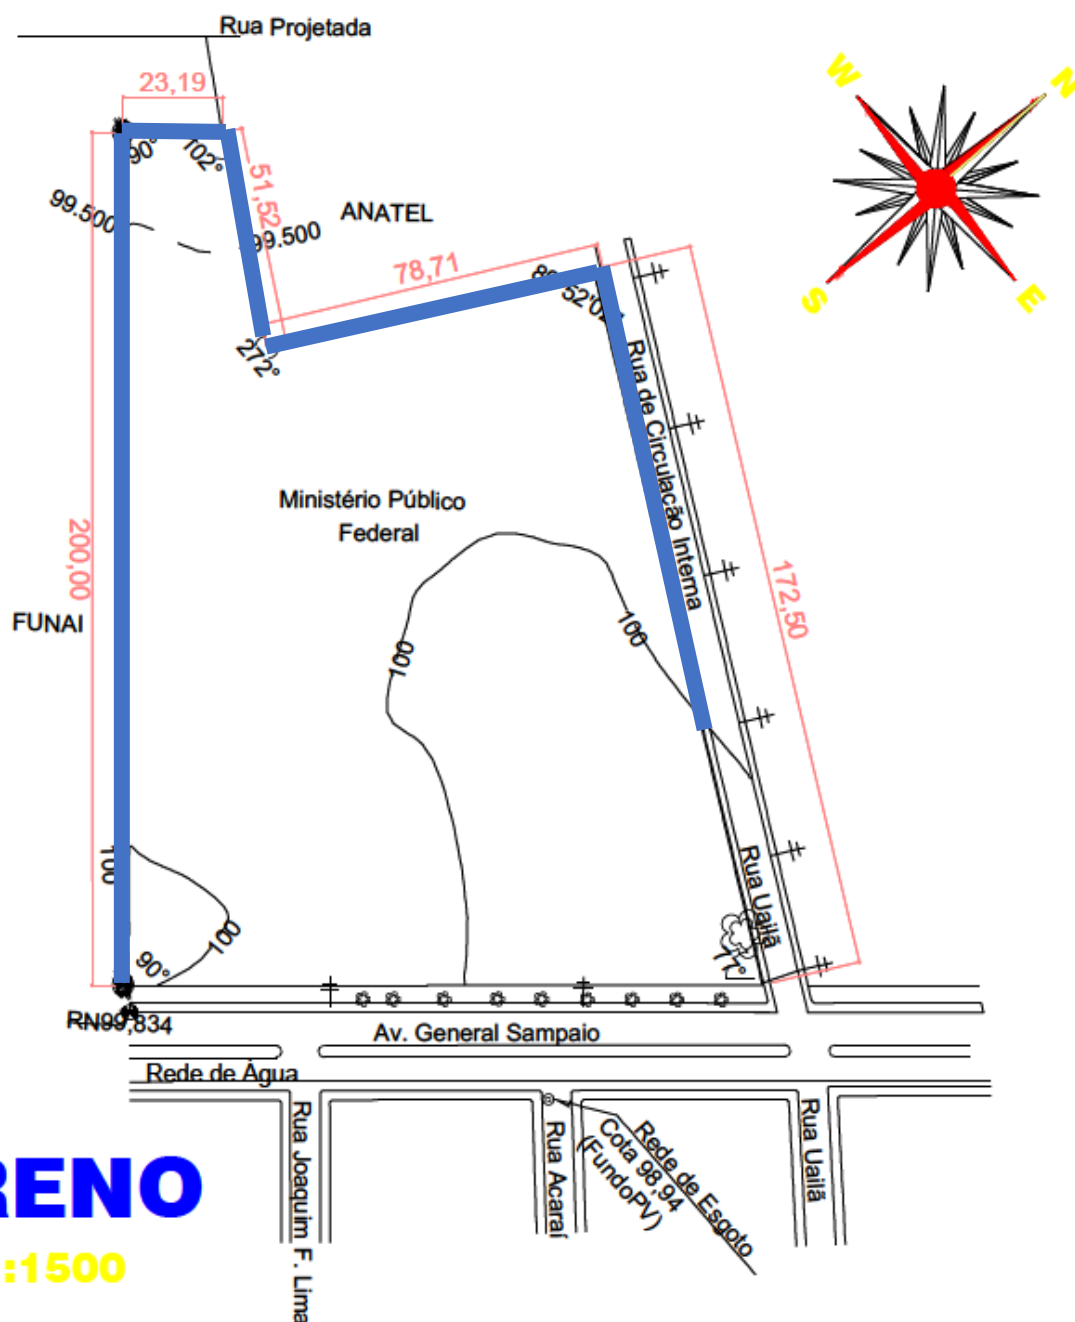

### LEGENDA DA EXECUÇÃO






PISO 90X90

LEGENDA




STRUKTURAS DE MADEIRA - PAVIMENTO TÊNUE

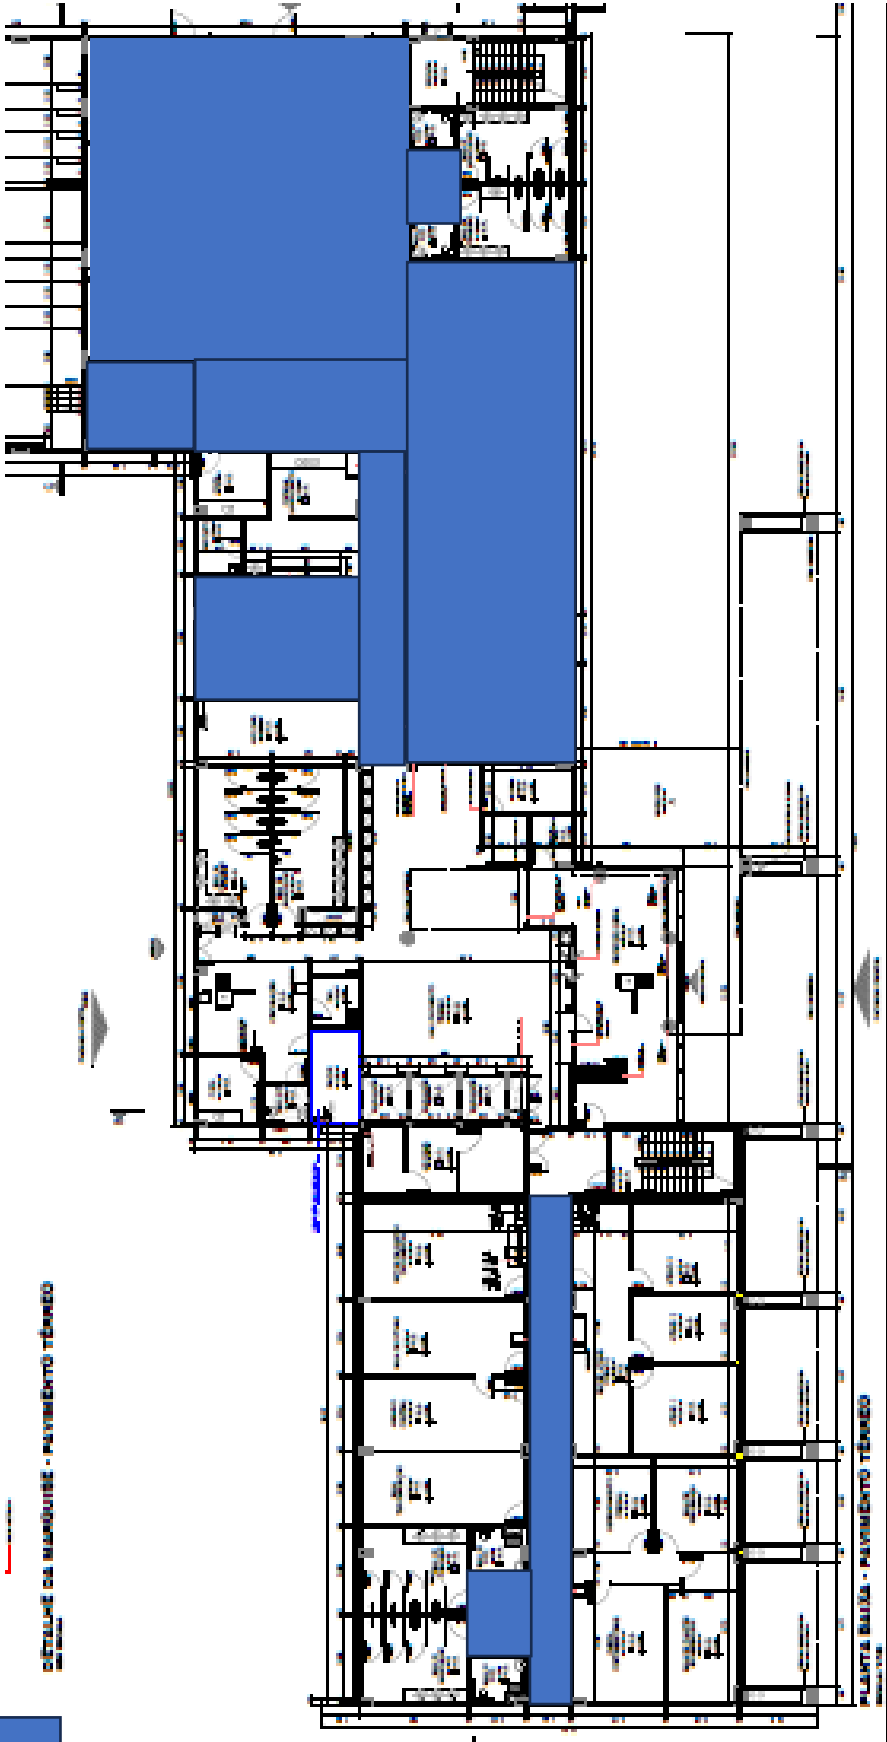

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÊNUE

RODAPÉ 15X80

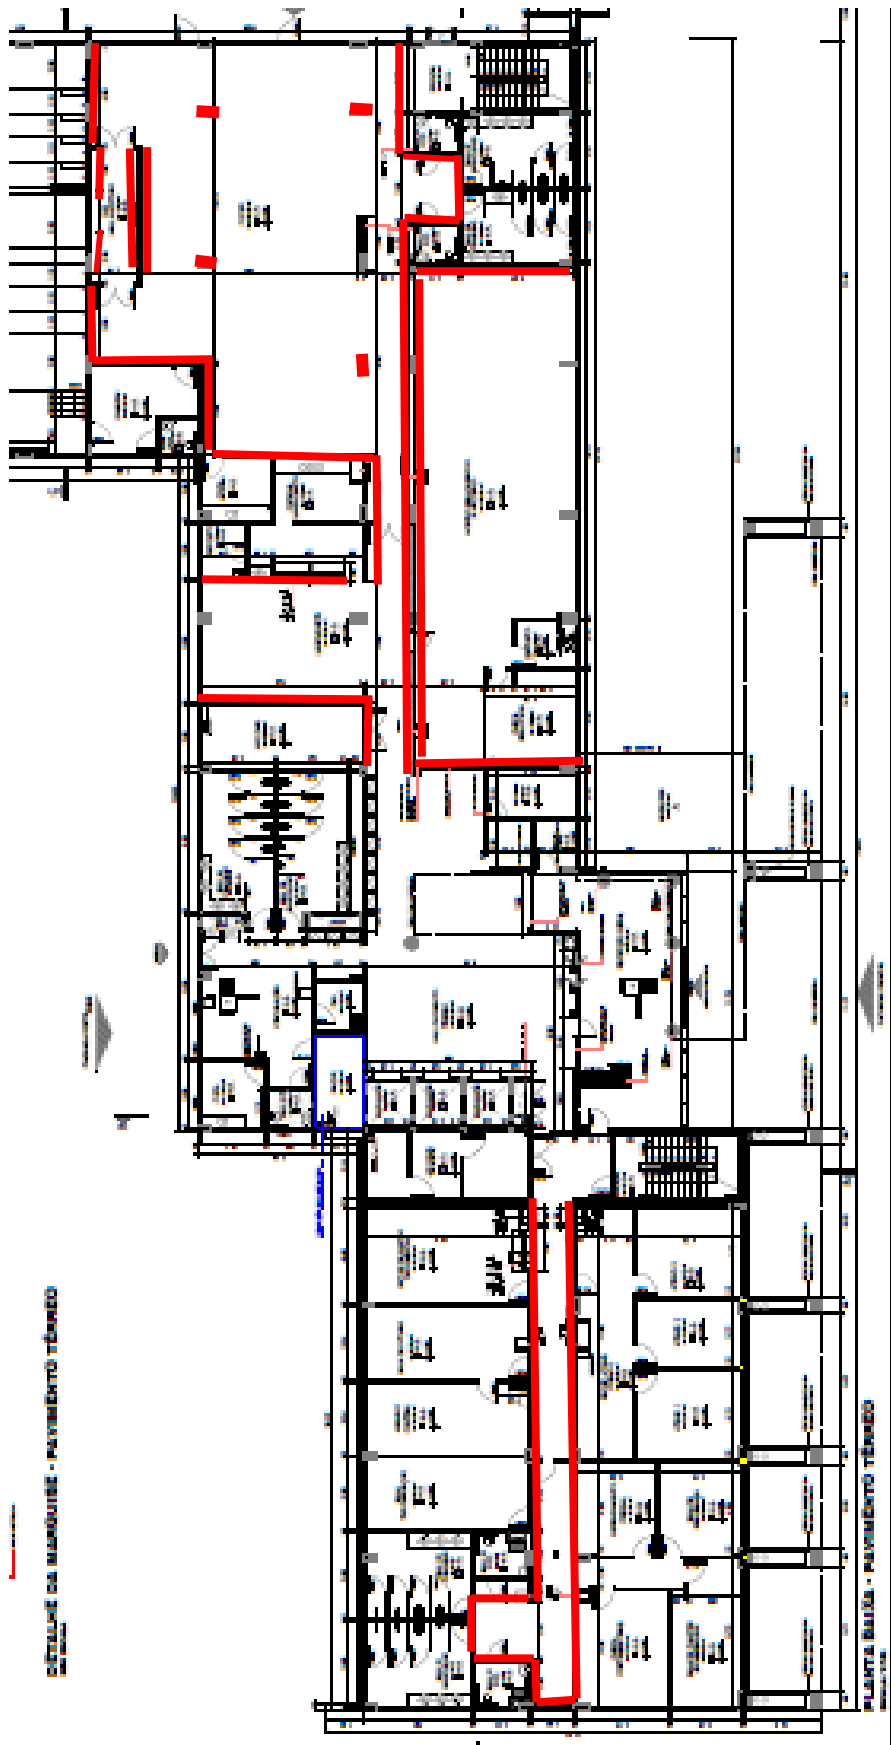

LEGENDA

