

PR-RR-00006947/2023



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 2º MEDIÇÃO



RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 02/2023

INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 16 de janeiro de 2023

PERÍODO DO RELATÓRIO: De 16 de fevereiro até 16 de março de 2023, serviço previsto para a segunda medição: (Foram executados os Serviço de demolição de parede, serviço de demolição de piso em concreto, aplicação de contrapiso e execução de enchimento de piso EPS).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF

Nome: Eng. Marcos Eduardo Silva Madureira

ART: Cargo função nº RR20200078632 / Obra serviço nº RR20200078641.

Telefone: (95) 3198-2005

E-mail: marcoseduardo@mpf.mp.br

1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)

Nome: Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira

Portaria: SE/PR-RR nº02/2023

Telefone: (95) 3198-2025 / 2073

E-mail: prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br

2.0 - ESCOPO E LOCAL

DADOS DO CONTRATO

Nº Contrato: 05/2022

PPA/LOA: AÇÃO 110E

Empresa Contratada: J. NASSER ENGENHARIA LTDA CNPJ 04.618.096/0001-07

Matrícula CEI da Obra: 51.235.89823/71

Valor Atual do Contrato: R\$ 31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Percentual de Reajuste: 6.0%

Saldo de Empenho: 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022

Local/UF: Boa Vista – RR

Responsável Técnico: José Nasser – ART de Execução: RR20230111507

Corresponsável Técnico: Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835

Nota Fiscal Eletrônica de Referência: no valor de R\$ 92.800,08 (Noventa e dois mil e oitocentos reais e oito centavos)

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
TOTAL EXECUTADO				0,50%
TOTAL A EXECUTAR				99,50%

Identificação processo de fiscalização: 1.32.000.000464/2022-71

Tipo de obra: Prédio Público.

Objeto da fiscalização: Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Período abrangido pela fiscalização: 16/02/2023 a 16/03/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)

3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a Serviço de demolição de parede, serviço de demolição de piso em concreto e aplicação de contrapiso, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: A empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA elaborou um novo cronograma para ser analisado e aprovado pela SEA. Mas a empresa vai ter que fazer umas correções no cronograma da obra;

Constatação do Período nº 2: Visto que a empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA entregou os certificados as NRs como: NR 10, NR 12, NR 18 e NR 35, mas visto que faltava o nome do responsável Técnico pelo certificado que é um engenheiro, no certificado só consta o nome do instrutor que é um técnico de segurança do trabalho. Só o técnico não válida os certificados;

Constatação do Período nº 3: Tivemos resposta da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA que o projeto foi aprovado pelos órgãos competentes, Fui repassado para a secretaria de finança para gerar o boleto da taxa do alvará com a data até dia 13 de março. A empresa está solicitando uma correção do boleto devido ao valor do alvará muito alto, porque no último alvará o valor foi mais abaixo. Tivemos a resposta da análise do boleto a Secretaria de Finanças e a avaliação sobre o valor do boleto constatou que o valor e esse mesmo aproximadamente R\$ 47.716,01, pela secretaria de finanças no dia 15/03//2023. Foi pago o boleto do alvará dia 16/03/2023 pela manhã, vai haver aditivo na habite-se no final da obra.

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

A) Foi realizado um levantamento topográfico das cotas de nível nos ambientes de todos os pavimentos visto que não bate com o projeto executivo as cotas níveis, com isso tem que fazer algumas adequações no piso e algumas demolições nas áreas molhadas para nivelar todo o piso. Visto que a cota de nível da escada está divergente com corredor, tornando a escada em incompatível com projeto executivo para aprovação do corpo de bombeiro. Tanto em relação aos níveis, número de degraus e altura dos espelhos com diferenças de alturas. Com isso gerando aditivo nos itens de demolição, depois aplicar enchimento de EPS na área que foi demolida.

B) Foi elaborado projeto de um corte esquemático para decidir a execução, visto que foi acrescentado três degraus no projeto devido as cotas de nível que não bate com projeto executivo. com isso foi repassado para a secretaria de arquitetura da SEA para eles decidir. Foi decidido em reunião com a SEA que os pisos das áreas molhadas elevado ia demolir para nivelar com todo piso ajustado com a escada. Com isso não havia alterar nas instalações hidráulicas, instalações elétricas, pele de vidro e verga das portas tem que mexer em todas. Até mesmo o pleno do Forro de gesso eles diminui dificultando nas instalações elétricas, hidráulicas e climatização. Com isso foi elaborada projeto de arquitetura detalhamento da escada com a SEA, acrescentando degraus para atender as normas vigentes.

C) Viste in loco que áreas elevadas acima da laje em concreto nas áreas molhadas e área técnica elevado se encontra com duas camadas diferença de material como um de tijolo deitado com argamassa e resto de areia e cimento como fosse uma alvenaria horizontal e outra camada de concreto maciço, Em alguns ambientes fui verificado colchão de areia abaixo do concreto maciço. Vai ser utilizado conforme e consultado a engenharia da SEA que o item pode ser utilizado, como o item 1.3.2 demolição de pilares e vigas em concreto armado para o serviço de demolição de piso em concreto maciço, Vão ter que rever as composições desses serviços para cobrar.

D) Devido às fortes chuvas a área dos Fundos acumula muita água, foi combinado com a engenheira da J. NASSER ENGENHARIA LTDA os entulhos gerados na obra quando for fazer a terraplanagem a mesma retirava os entulhos por já estar medidor sem nenhum custo. A retirada dos entulhos na área interna para área externa foi para facilitar o serviço na obra.

6.0 - CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.

7.0 - ANEXOS

a) Relatório fotográfico do período

8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 16 de março de 2023

9.0 - FÉ DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

Declaramos que as metas estabelecidas na 2ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas.

Marcos Eduardo Silva Madureira
Engenheiro Civil/Membro da Comissão

Nazareno Nunes Rodrigues
Membro da Comissão

Sidney Wanderley de Oliveira
Membro da Comissão

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.

10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL

() Não foram identificados vícios.

() Ver Nota Técnica ou Despacho constante da folha
de nº. _____

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

**RELATÓRIO TÉCNICO
MEDIÇÃO 2º**

11.0 A segunda medição foi efetuada pelo fiscal da obra, engenheiro civil da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Marcos Eduardo Silva Madureira, matrícula 31.143, no dia 16/03/2023.

11.1 Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente, mas sem atraso.

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado <i>in loco</i>	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	20,00%	1,54%		X
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	20,00%	1,54%		X
ARQUITETURA / PISOS				
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	00,0%	0,12%		X
EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO DE PISO COM EPS (ISOPOR), ESP. MÉDIA 15,5CM, E CONCRETO, ESP. 6 CM, ARMADO COM TELA Q-92, E JUNTAS SERRADAS	00,0%	0,13%		X
SERVIÇOS GERAIS / LIMPEZA DA OBRA				
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA.	4,17%	4,17%		X

CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	12,5%	12,5%		X
SERVIÇOS GERAIS / TAXAS DE CONSTRUÇÃO				
TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE E DEMAIS TAXAS)	100%	100%		X
CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	40,20%	40,20%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / INSUMOS PÚBLICOS				
INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA.	0,17%	0,29%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.	0,17%	0,29%		X
VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	0,17%	0,29%		X

12.0 Segue abaixo a planilha contendo o resumo dos serviços efetivamente realizados e pactuados para finalização do contrato nº 05/2022.



PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
OBRA: NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA - MPF - 2022
LOCAL: AVENIDA GENERAL SAMPAIO S/Nº, BAIRRO TREZE DE SETEMBRO - BOA VISTA/ RR
PLANILHA SINTÉTICA (COM BDI)



LEIS SOCIAIS NÃO DESONERADAS - REFERÊNCIA HORISTA SINAPI: LS 116,30%
Benefícios e Despesas Indiretas (Serviços): BDI 23,53%
Benefícios e Despesas Indiretas (Equipamentos): BDI 15,27%
REFERÊNCIA: SINAPI - RR - 05/22 (NÃO DESONERADA)

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATADOS				ACUMULADO ANTERIOR		2ª. MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL	
					UND	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	VALOR R\$
1				SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				76.116,52		55.424,34		1.202,46		56.626,80		19.489,72
1.3				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				10.098,24		0,00		1.202,46		1.202,46		8.895,78
1.3.1	SERV.	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	36,38	53,38	1.941,96	0,00	0,00	10,77	574,90	10,77	574,90	25,61	1.367,06
1.3.2	SERV.	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2,10	298,84	627,56	0,00	0,00	2,10	627,56	2,10	627,56	0,00	0,00
5				ARQUITETURA				10.883.731,21		-		27.269,88		27.269,88		10.856.461,33
5.2				PISOS				3.080.170,94		0,00		27.269,88		27.269,88		3.052.901,06
5.2.1	SERV.	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M²	355,00	51,99	18.456,45	0,00	0,00	257,51	13.387,94	257,51	13.387,94	97,49	5.068,51
5.2.3	SERV.	S-ARQ-PISO-PRRR-ADT-ENC-EPS	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO DE PISO COM EPS (ISOPOR), ESP. MÉDIA 15,5CM, E CONCRETO, ESP. 6 CM, ARMADO COM TELA Q-92, E JUNTAS SERRADAS	M²	1.511,00	172,79	261.085,69	0,00	0,00	80,34	13.881,94	80,34	13.881,94	1.430,66	247.203,75
14				SERVIÇOS GERAIS				234.157,38		4.921,07		56.471,07		61.392,14		172.765,24
14.1				TRANSPORTE DE MATERIAL				51.745,20		0,00		110,12		110,12		51.635,08
14.1.1	SERV.	S-SER-TRAN-02	PRÓPRIO	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	780,00	66,34	51.745,20	0,00	0,00	1,66	110,12	1,66	110,12	778,34	51.635,08
14.2				LIMPEZA DA OBRA				96.372,88		4.921,07		6.215,54		11.136,61		85.236,27
14.2.1	SERV.	S-SER-LIMP-PRRR-01	PRÓPRIO	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	402,21	40.221,00	4,17	1.675,87	4,16	1.673,19	8,33	3.349,06	91,67	36.871,94
14.2.2	SERV.	S-DIV-TRAN-ENT-01	PRÓPRIO	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	280,00	92,72	25.961,60	35,00	3.245,20	48,99	4.542,35	83,99	7.787,55	196,01	18.174,05
14.5				TAXAS DE CONSTRUÇÃO				54.660,31		0,00		50.145,41		50.145,41		4.514,90
14.5.1	SERV.	S-SER-TAXA-PRRR-02	PRÓPRIO	TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE E DEMAIS TAXAS)	UN	1,00	47.110,31	47.110,31	0,00	0,00	1,00	47.110,31	1,00	47.110,31	0,00	0,00
14.5.2	SERV.	S-SER-TAXA-COPI-01	PRÓPRIO	CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	500,00	15,10	7.550,00	0,00	0,00	201,00	3.035,10	201,00	3.035,10	299,00	4.514,90
15				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				2.672.342,00		5.611,91		7.856,67		13.468,58		2.658.873,42
15.1				INSUMOS PÚBLICOS				101.200,00		212,52		297,52		510,04		100.689,96
15.1.1	SERV.	S-ADM-INSU-PRRR-001	PRÓPRIO	INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	1.012,00	101.200,00	0,21	212,52	0,29	297,52	0,50	510,04	99,50	100.689,96
15.2				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.571.142,00		5.399,39		7.559,15		12.968,54		2.558.183,46
15.2.1	SERV.	S-ADM-ADMO-PRRR-001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	20.956,62	2.095.662,00	0,21	4.400,89	0,29	6.161,24	0,50	10.562,13	99,50	2.085.099,87
15.2.2	SERV.	S-ADM-ADMO-PRRR-002	PRÓPRIO	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	100,00	4.754,80	475.480,00	0,21	998,50	0,29	1.397,91	0,50	2.396,41	99,50	473.083,59

VALOR TOTAL DO CONTRATO(R\$) C/ BDI	R\$	31.595.942,84														
VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$) C/ BDI									R\$	65.957,32						
VALOR TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI												R\$	92.800,08			
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) C/ BDI														R\$	158.757,40	
SALDO CONTRATUAL (R\$) C/ BDI																R\$ 31.437.185,44

13.0 - ANEXOS FOTOGRÁFICOS

13.1 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA











13.2 – DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO














13.3 – APLICAÇÃO DE CONTRAPISO





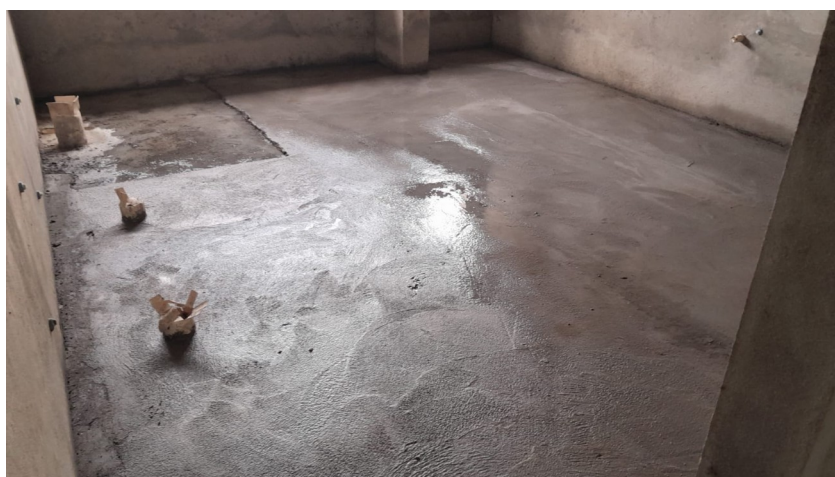







13.4 – EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO DE PISO EPS













13.5 – DESCARTE DE MATERIAL EM CONTAINER DE PAPA-ENTULHO





13.6 – LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA





14-0 Controle de retirada de entulho na obra

DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA DA RETIRADA DO ENTULHOS DA OBRA
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	17/02/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E	24/02/23

DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	27/02/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	06/03/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	09/03/23

15.0 Relação dos colaboradores com a função na empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO
1	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
2	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
3	ANANIAS VIEIRA SILVA	SERVENTE
4	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
5	ARLYSSON DA COSTA SOUZA	TÉCN. EM SEG. DO TRABALHO
6	ARY ALCANTARADOS SANTOS	ALMOXARIFE
7	CAIO DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA	SERVENTE
8	CLAUDIO ANTONIO BARROS DE LIMA	VIGIA
9	DARLISON COSMO PENA	BOMBEIRO HIDRÁULICO
10	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
11	DIEGO SIMÃO BURUM	SERVENTE
12	ELEN MARCIO RIBEIRO MAFRA	SERVENTE
13	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA
14	FRANCISCO EMICIO ALVES BORGES	BOMBEIRO HIDRÁULICO
15	JOSÉ MORENO DA SILVA	MESTRE DE OBRAS
16	JOSÉ RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
17	MÁRCIO RAPOSO	VIGIA
18	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
19	PAULO ROBERTO DA SILVA FREITAS	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
20	RAUDI RAFAEL MARTINEZ BENAVIDES	CARPINTEIRO

21	RONALDO LIBORIO MARTINS	PEDREIRO
22	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
23	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA
24	BENJAMIN LARANHAGA FILHO	ELETRICISTA
25	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVENTE
26	ROZER GREGÓRIO PINTO DE SOUZA	SERVENTE
27	ANTÔNIO DIEGO SOUZA CORDEIRO	SERVENTE
28	EDUARDO FONSECA BRAGA	OPERADOR DE BOMBA
29	LADISLAU JUSTO DO SANTOS FILHO	IMPERMEABILIZADOR

16.0 A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme tabela abaixo:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre a Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2

3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5
4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4
10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6
12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas	Por ocorrência	8

	regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.		
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24
17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção

16.2 – Ocorrência 1: Visto que a empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA entregou os certificados das NRs, mas foi constatado que faltava o nome do responsável Técnico pelo certificado que é um engenheiro, no certificado só consta o nome do instrutor que é um técnico de segurança do trabalho. Só o técnico não válida os certificados.

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.

17.3 A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme MODELO de tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
00	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	00	00
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				00
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: 0,0%				

18.0 - ANEXOS DIÁRIOS DE OBRA E DOCUMENTOS DA PREFEITURA

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	32
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	700			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	16/02/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 16/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do forro da sala da Fiscalização. - Confecção de calçadas frente as salas de Mestre/Encarregados e SESMET. - Confecção de alvenaria do banheiro do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:16/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DE REBOCO NO CANTEIRO DE OBRA; 3.6 - APLICAÇÃO DE FORRO PVC NO CANTEIRO DE OBRAS; 3.7 - REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA ÁREA EXTERNA; 3.8 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4.1 - LIBERADA A LICENÇA PRÉVIA AMBIENTAL ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	33
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	699	DATA	17/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 17/02/2023	
- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):	
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM	
- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):	
01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia	
- SERVIÇOS EXECUTADOS	
- Confecção do forro da sala da Mestre/ encarregados e Sesmet. - Confecção de alvenaria do banheiro do canteiro de obra. - Execução de reboco em alvenaria do banheiro do canteiro de obra. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa.	
- OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência	
Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:17/02/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - SERVIÇO DE CARPINTARIA (MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRA); 3.2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.4 - EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO CANTEIRO DE OBRA; 3.5 - EXECUÇÃO DE REBOCO NO CANTEIRO DE OBRA; 3.6 - APLICAÇÃO DE FORRO PVC NO CANTEIRO DE OBRAS; 3.7 - REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA ÁREA EXTERNA; 3.8 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA.
4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	34
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	698	DATA	18/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	35
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	697	DATA	19/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	36
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	696	DATA	20/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 20/02/2023

- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM

- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):
01 - Engenheira Civil
01 - Técnico em Segurança do Trabalho
01 - Técnico em Edificações
01 - Mestre de obra
01 - Almoxarife
04 - Carpinteiro
01 - Eletricista
02 - Bombeiro hidráulico
03 - Pedreiro
06 - Servente
01 - Pintor
03 - Vigia

- SERVIÇOS EXECUTADOS
- Confeção do forro da sala da Mestre/ encarregados e Sesmet.
- Execução de reboco em alvenaria do banheiro do canteiro de obra.
- Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra.
- Pintura do canteiro de obra.
- Limpeza com roçadeira da área externa.

- OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	37
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	695		DATA	21/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025			

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	38
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	694			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	22/02/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 22/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Confecção do forro da sala da Mestre/ encarregados e Sesmet. - Confecção de portas dos banheiros de funcionários. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa. - OCORRÊNCIA: O expediente na obra iniciou as 12h devido ao feriado de carnaval(quarta-feira de cinzas). Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA TARDE. DATA:22/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.2 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - APLICAÇÃO DE FORRO PVC NO CANTEIRO DE OBRAS; 3.4 - CONFECÇÃO DAS PORTAS DOS BANHEIROS 3.5 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: Expediente começou as 12h por conta do feriado de quarta-feira de cinzas ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	39
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	693	DATA	23/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 23/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 04 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Colocação das portas dos banheiros. - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:23/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.2 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - COLOCAÇÃO DAS PORTAS DOS BANHEIROS 3.4 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: Sem ocorrências ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	40
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	692	DATA	24/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 24/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 02 - Carpinteiro 01 - Eletricista 02 - Bombeiro hidráulico 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 03 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalações elétrica e hidrossanitária provisória do canteiro de obra. - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:24/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIO DO CANTEIRO DE OBRA; 3.2 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.3 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	41
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	691	DATA	25/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	42
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	690	DATA	26/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	43
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	689	DATA	27/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 27/02/2023

- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM

- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):
01 - Engenheira Civil
01 - Técnico em Segurança do Trabalho
01 - Técnico em Edificações
01 - Mestre de obra
01 - Almoxarife
02 - Carpinteiro
01 - Eletricista
03 - Pedreiro
06 - Servente
01 - Pintor
03 - Vigia

- SERVIÇOS EXECUTADOS

- Pintura do canteiro de obra.
- Limpeza com roçadeira da área externa.
- Emestramento de piso do para execução de contrapiso com argamassa do Térreo.

- OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:27/02/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
3 PEDREIRO
1 ALMOXARIFE
1 ELETRICISTA
2 CARPINTEIRO
6 SERVENTE
1 PINTOR
3 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA;
3.2 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA;
3.3 - EMESTRAMENTO DO PISO PARA EXECUÇÃO DE COTRAPISO O ARGAMASSA NO TÉRREO.

4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	44
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	688	DATA	28/02/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 28/02/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 02 - Carpinteiro 01 - Eletricista 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 01 - Bombeiro hidráulico 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa. - Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do Térreo - Local: Lanchonete. - Demolição de contrapiso existente, quais estavam acima da cota de piso acabado - Local: Banheiro Masculino e Feminino. - Reativação e funcionamento do poço tubular existente na obra. - OCORRÊNCIA: Sem Ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:28/02/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 3 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.2 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.3 - MONTAGEM DE QUADRO PROVISÓRIO; 3.4 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO TÉRREO. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	45
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	687	DATA	01/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 01/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 02 - Carpinteiro 01 - Eletricista 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 01 - Bombeiro hidráulico 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa. - Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do Térreo - Local: Lanchonete. - Demolição de contrapiso existente, quais estavam acima da cota de piso acabado - Local: Banheiro Masculino e Feminino PNE - Térreo. - Demolição de contrapiso existente, quais estavam acima da cota de piso acabado - Local: Circulação dos WC's - 1º pavimento. - Esta sendo realizado teste de carga na caixa d'água superior para execução da impermeabilização interna. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrencias Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:01/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.2 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.3 - DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO TÉRREO (BANHEIRO MASCULINO/FEMININO PNE) E 1º PAVIMENTO (CIRCULAÇÃO E OS WC's); 3.4 - ESTA SENDO REALIZANDO TESTE CARGA NA CAIXA D'ÁGUA NO SUPERIOR PARA EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA; 3.5 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO TÉRREO (LANCHONETE). 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	46
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	686	DATA	02/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 02/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 02 - Carpinteiro 01 - Eletricista 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Pintor 01 - Bombeiro hidráulico 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Pintura do canteiro de obra. - Limpeza com roçadeira da área externa. - Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do Térreo - Local: Lanchonete. - Demolição de contrapiso existente, quais estavam acima da cota de piso acabado - Local: Circulação dos WC's - 1º pavimento. - Esta sendo realizado teste de carga na caixa d'água superior para execução da impermeabilização interna. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:02/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 PINTOR 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DO CANTEIRO DE OBRA; 3.2 - DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 1º PAVIMENTO (CIRCULAÇÃO E OS WC's); 3.3 - ESTA SENDO REALIZANDO TESTE CARGA NA CAIXA D'ÁGUA NO SUPERIOR PARA EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA; 3.4 - LIMPEZA COM ROÇADEIRA DA ÁREA EXTERNA; 3.5 - EXECUÇÃO DE CÔTRAPISO EM ARGAMASSA NO TÉRREO (LANCHONETE). 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS	

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	47
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	685	DATA	03/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 03/03/2023

- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM

- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):
01 - Engenheira Civil
01 - Técnico em Segurança do Trabalho
01 - Técnico em Edificações
01 - Mestre de obra
01 - Almoxarife
02 - Carpinteiro
01 - Eletricista
03 - Pedreiro
06 - Servente
02 - Vigia

- SERVIÇOS EXECUTADOS
- Limpeza com roçadeira da área externa.
- Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do Térreo - Local: Lanchonete.
- Demolição de contrapiso existente, quais estavam acima da cota de piso acabado - Local: Circulação dos WC's - 1º pavimento.
- Esta sendo realizado teste de carga na caixa d'água superior para execução da impermeabilização interna.

- OCORRÊNCIA: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:03/03/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
3 PEDREIRO
1 ALMOXARIFE
1 ELETRICISTA
2 CARPINTEIRO
6 SERVENTE
1 PINTOR
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
2 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 1º PAVIMENTO (CIRCULAÇÃO, COPA, RACK, DML E OS WC's DO PCD);
3.2 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO TÉRREO NOS BANHEIROS MASCULINO/FEMININO.

4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	48
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	684	DATA	04/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	49
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	683	DATA	05/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	50
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	682	DATA	06/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 06/03/2023

- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM

- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):
01 - Engenheira Civil
01 - Técnico em Segurança do Trabalho
01 - Técnico em Edificações
01 - Mestre de obra
01 - Almoxarife
02 - Carpinteiro
01 - Eletricista
03 - Pedreiro
05 - Servente
02 - Vigia

- SERVIÇOS EXECUTADOS

- Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do Térreo - Local: Lanchonete.
- Demolição de contrapiso existente, quais estavam acima da cota de piso acabado - Local: Circulação dos WC's - 1º pavimento.
- Esta sendo realizado teste de carga na caixa d'água superior para execução da impermeabilização interna.

- OCORRÊNCIA: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:06/03/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
3 PEDREIRO
1 ALMOXARIFE
1 ELETRICISTA
2 CARPINTEIRO
5 SERVENTE
2 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 1º PAVIMENTO (CIRCULAÇÃO, COPA, RACK E DML);
3.2 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO TÉRREO (BANHEIRO FEMININO E DML);
3.3 - EMESTRAMENTO DO PISO PARA EXECUÇÃO DE COTRAPISO O ARGAMASSA NO TÉRREO (BANHEIROS MASCULINO/FEMININO).

4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	51
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	681	DATA	07/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 07/03/2023

- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM

- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil
01 - Técnico em Segurança do Trabalho
01 - Técnico em Edificações
01 - Mestre de obra
01 - Almoxarife
02 - Carpinteiro
01 - Eletricista
03 - Pedreiro
06 - Servente
02 - Vigia

- SERVIÇOS EXECUTADOS

- Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do Térreo - Local: Controle de acesso PDC, San 07 Masculino, San 06 PCD e San 07 PCD.
- Demolição de contrapiso existente, quais estavam acima da cota de piso acabado - Local: Circulação e WC's - 3º pavimento.
- Esta sendo realizado teste de carga na caixa d'água superior para execução da impermeabilização interna.

- OCORRÊNCIA: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:07/03/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
3 PEDREIRO
1 ALMOXARIFE
1 ELETRICISTA
2 CARPINTEIRO
5 SERVENTE
2 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - DEMOIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 3º PAVIMENTO (CIRCULAÇÃO E BANHEIRO MASCULINO);
3.2 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO TÉRREO (CONTROE DE ACESSO,BANHEIRO MASCUINO, BANHEIRO PCD MASCUINO/ÉMININO E DML);
3.3 - DEMOLIÇÃO DE AVENARIA 2º E 3º PAVIMENTO.

4.0 – OCORRÊNCIAS:

4.1 - ACREDITO QUE HOUE UM ERRO NA SECRETARIA DE FINANÇA EM EMITIR O BOLETO DO ALVARÁ.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	52
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	680	DATA	08/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 08/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 02 - Carpinteiro 01 - Eletricista 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do Térreo - Local: SAN 01 Masculino e SAN 01 Feminino. - Demolição de contrapiso existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Área técnica. - Demolição de paredes em alvenaria do 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:08/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 2 CARPINTEIRO 5 SERVENTE 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - DEMOIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 3º PAVIMENTO (ÁREA TÉCNICA); 3.2 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO TÉRREO (BANHEIRO MASCUINO); 3.3 - DEMOLIÇÃO DE AVENARIA 3º PAVIMENTO (BANHEIROS MASCULINO/FEMININO PCD). 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	53
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	679	DATA	09/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 09/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de obra 01 - Almoxarife 02 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do Térreo - Local: SAN 01 PCD e SAN 02 PCD. - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Rack e DML. - Demolição de paredes em alvenaria do 3º pavimento e Térreo. - Verificação de esquadros dos pisos das salas onde terão piso em chapa metálica - Térreo ao 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:09/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 CARPINTEIRO 5 SERVENTE 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - DEMOIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 3º PAVIMENTO (RACK E DML); 3.2 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO TÉRREO (BANHEIRO FEMININO E PCD's MASCULINO/FEMININO); 3.3 - DEMOLIÇÃO DE AVENARIA 3º PAVIMENTO (BANHEIROS MASCULINO/FEMININO PCD E ÁREA TÉCNICA). 3.4 - CONFERIR O ESQUADRO NOS AMBIENTES DO TÉRREO E DO 1º PAVIMENTO; 3.5 - CONFERIR AS COTA DE NÍVEL DO PISO NO 3º PAVIMENTO (COPA, BANHEIROS FEMININO/MASCULINO). 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4.1 - AO CONFERIR O ESQUADRO FOI VERIFICADO QUE AS SALAS NO LADO DIREITO DA FACHADA FROTAL NO TÉRREO ESTÁ 1 CM FORA DO ESQUADRO, MAS DEVIDO AO REVESTIMENTO 1 CM FICA IMPERCEPTÍVEL POR SER CARPETE E DEPOIS QUANDO APLICAR O RODAPÉ TIRA TODO O DEFEITO. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	54
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	678	DATA	10/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 10/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almojarife 01 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do 3º pavimento - Local: WC 's dos gabinetes. - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Copa e San. - Remoção de entulho da decorrente da demolição de alvenaria e entulho do 2º pavimento. - OCORRÊNCIA: Tivemos a visita dos funcionários do MPF no canteiro de obra no horário das 12:50h. A JNasser solicitou revisão do valor do boleto da renovação do Alvara de construção devido o valor esta muito acima taxa paga pela empresa anterior. Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:10/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 CARPINTEIRO 5 SERVENTE 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 3º PAVIMENTO (RACK E COPA); 3.2 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO 3º PAVIMENTO (BANHEIROS E BANHEIRO PCD); 3.3 - DEMOLIÇÃO DE AVENARIA 3º PAVIMENTO (NAS SALAS TÉCNICA DOS GABINETES). 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4.1 - NADA RESOLVIDO NA SECRETARIA DE FINANÇA EM EMITIR O BOLETO DO ALVARÁ. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	55
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	677	DATA	11/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	56
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	676	DATA	12/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	57
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	675			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	13/03/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 13/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 01 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 06 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Execução de contrapiso em argamassa, aplicado sobre laje de piso do 2º pavimento - Local: Circulação dos WC's. - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Copa e San. - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:13/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 CARPINTEIRO 5 SERVENTE 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 3º PAVIMENTO (ÁREA TÉCNICA); 3.2 - EXECUÇÃO DE COTRAPISO EM ARGAMASSA NO 2º PAVIMENTO (CIRCULÇÃO E BANHEIRO PCD); 3.3 - RETIRADA DE ENTULHO NO 2º E 3º PAVIMENTOS. 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4.1 - A EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA SOLICITOU A REVISÃO DO VALOR DO BOLETO DE RENOVAÇÃO DO ALVARA NA SECRETARIA DE FINANÇA PARA EMITIR O NOVO BOLETO DO ALVARA DA OBRA DO MPF, VISTO ANTERIOMENTE QUE O ALVARA TINHA DADO O VALOR MÃS BAIXO NO ÚLTIMO ALVARA DA OBRA; 4.2 - TEVE UMA VISITA DOS SERVIDOR DO MPF NO CANTEIRO DE OBRA NO HORÁRIO 12:50H NAS DEPENDÊNCIAS DA NOVA SEDE DO MPF, VISTO QUE OS MESMOS NÃO ESTAVA COM CALÇADO APROPRIADO. MAS FOI LEVADA A COMISSÃO PARA UMA ÁREA COM SEGUÑÇA NÃO HAVER NENHUM TIPO DE ACIDENTE. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS	

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	58
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	674	DATA	14/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 14/03/2023					
- CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM					
- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho					
01 - Técnico em Edificações					
01 - Almojarife					
01 - Carpinteiro					
03 - Pedreiro					
06 - Servente					
01 - Bombeiro hidráulico					
01 - Impermeabilizador					
01 - Eletricista					
02 - Vigia					
- SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) - Local: Corredor do 3º pavimento.					
- Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Sanitários.					
- Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º pavimento.					
- Montagem de andaime tubular tipo torre para retirada de entulho.					
- OCORRÊNCIA: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:14/03/2023					
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:					
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)					
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO					
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					
2 PEDREIRO					
1 ALMOXARIFE					
1 CARPINTEIRO					
6 SERVENTE					
1 IMPERMEABILIZADOR					
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO					
2 VIGIA					
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS					
3.1 - DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 3º PAVIMENTO;					
3.2 - COLOCAÇÃO DE EPS E FALTANDO APLIAÇÃO DO CONCRETO NO 3º PAVIMENTO;					
3.3 - MONTAGEM DE UMA TORRE EM ESTRUTURA METÁLICA PARA DESCIDA DE ESTULHO DE DEMOLIÇÃO NOS PAVIMENTOS.					
4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS					
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS					

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	59
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	673	DATA	15/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA


RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:14/03/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 METRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 CARPINTEIRO 6 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 VIGIA
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, ESTAVAM ACIMA DA COTA DO PISO ACABADO NO 3º PAVIMENTO; 3.2 - COLOCAÇÃO DE EPS E FALTANDO APLIAÇÃO DO CONCRETO NO 3º PAVIMENTO;
4.0 – OCORRÊNCIAS: 4.1 - FOI SOLICITADO A ENGENHEIRA DA J. NASSER AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRIICANTE DO EPS PARA APRESENTAR PARA A ENGENHARIA SEA.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização


Contratada

Remedição de 3m
de ventanilha exterior
Contrapiso
Concluído


PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO

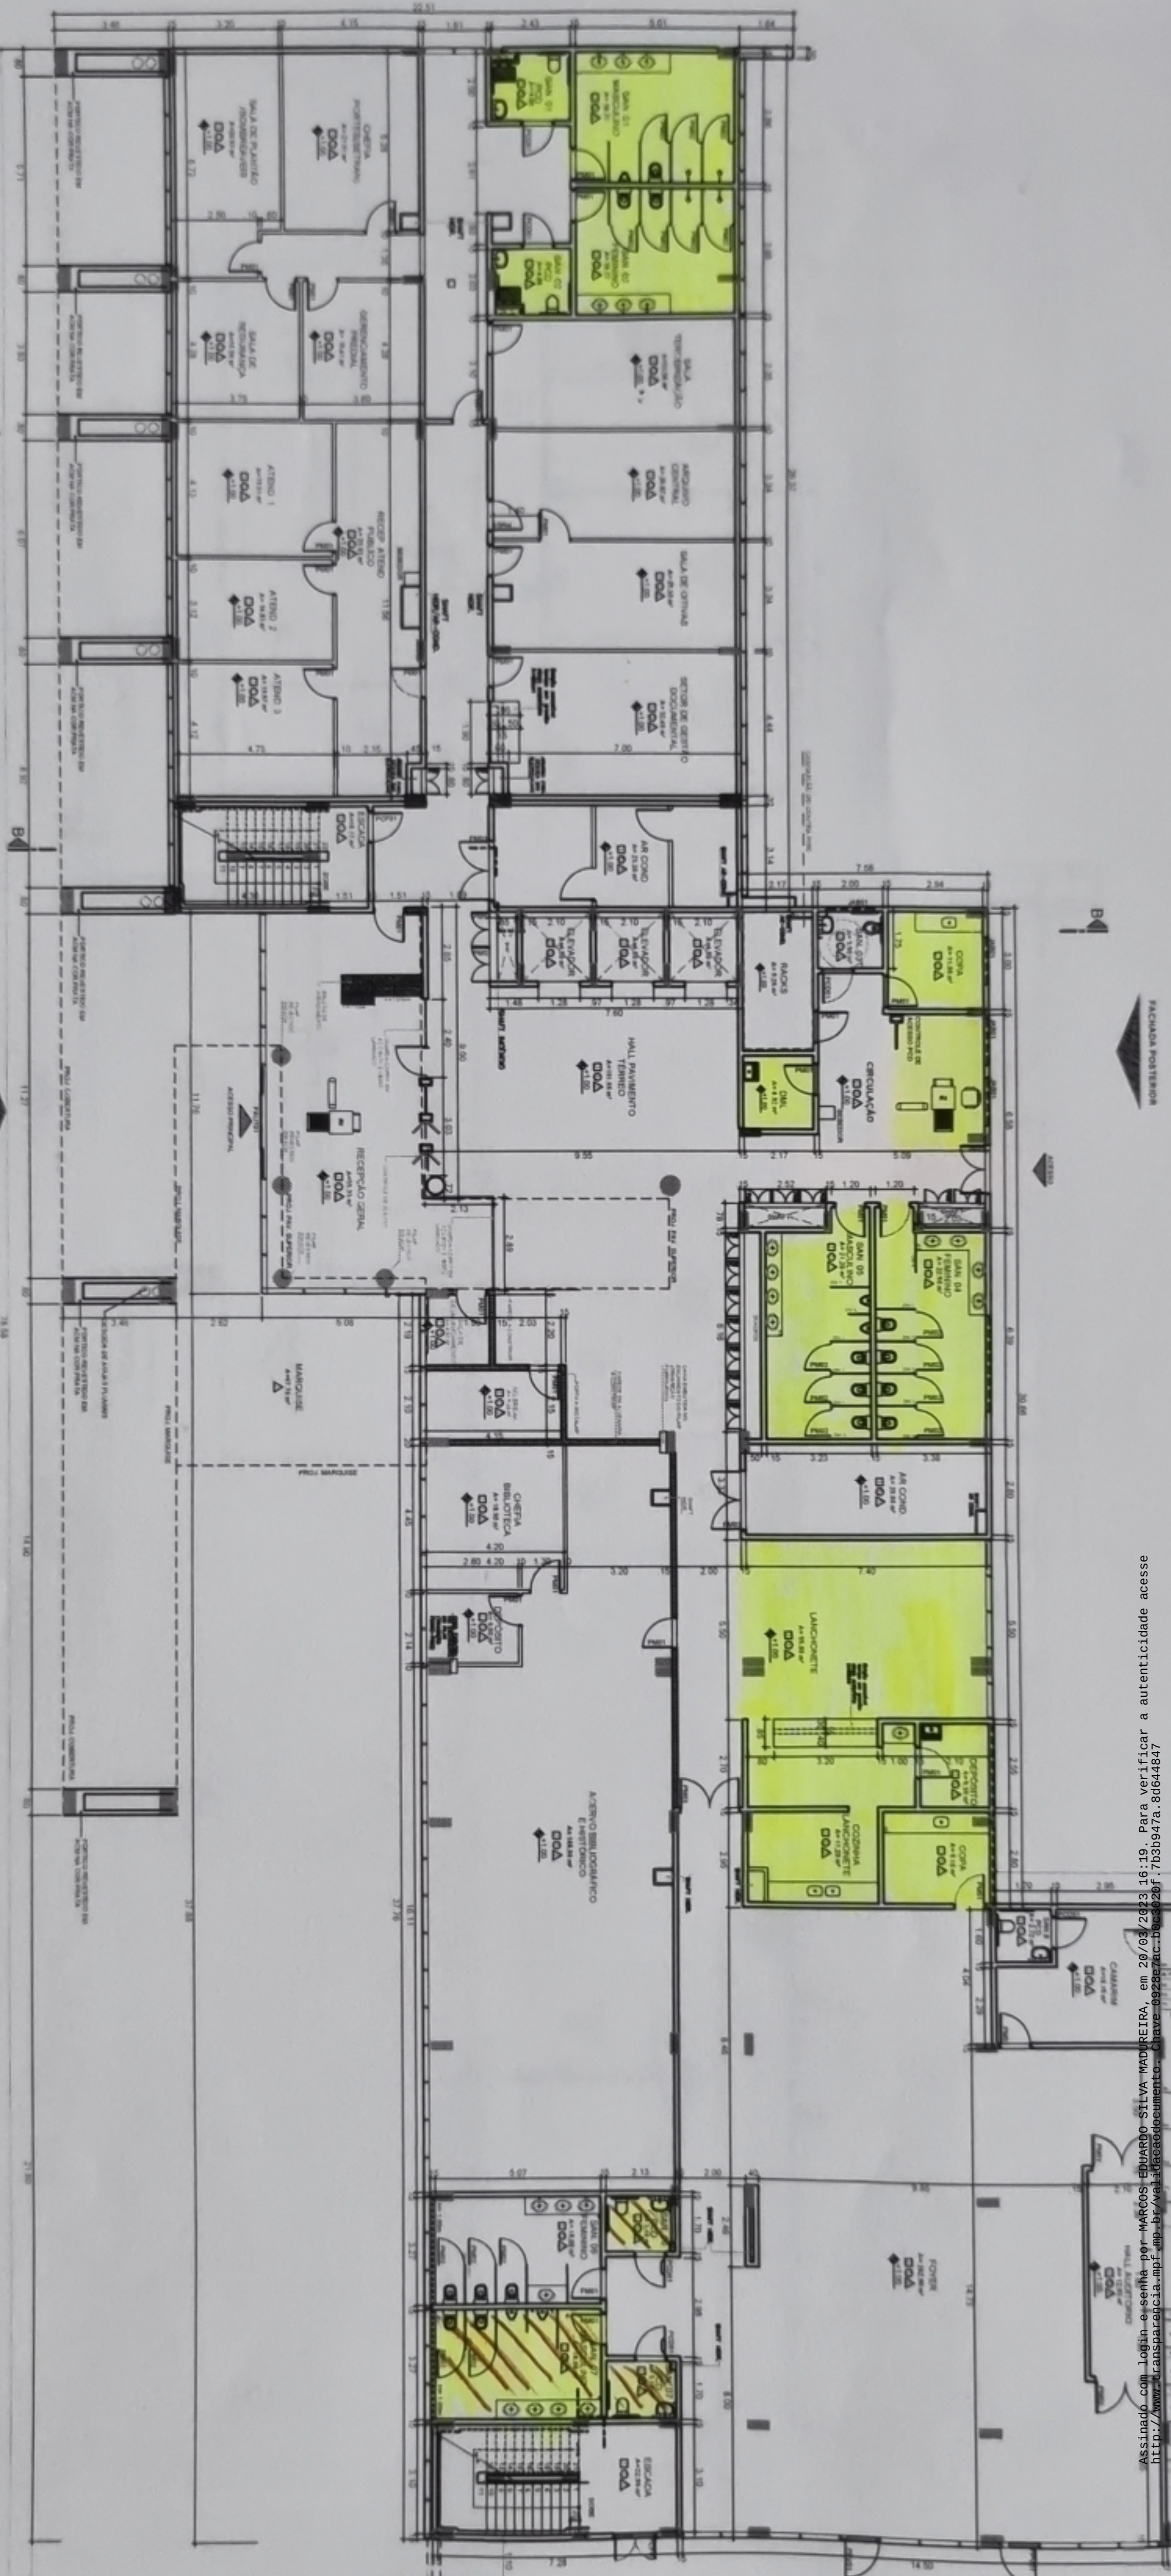

PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO

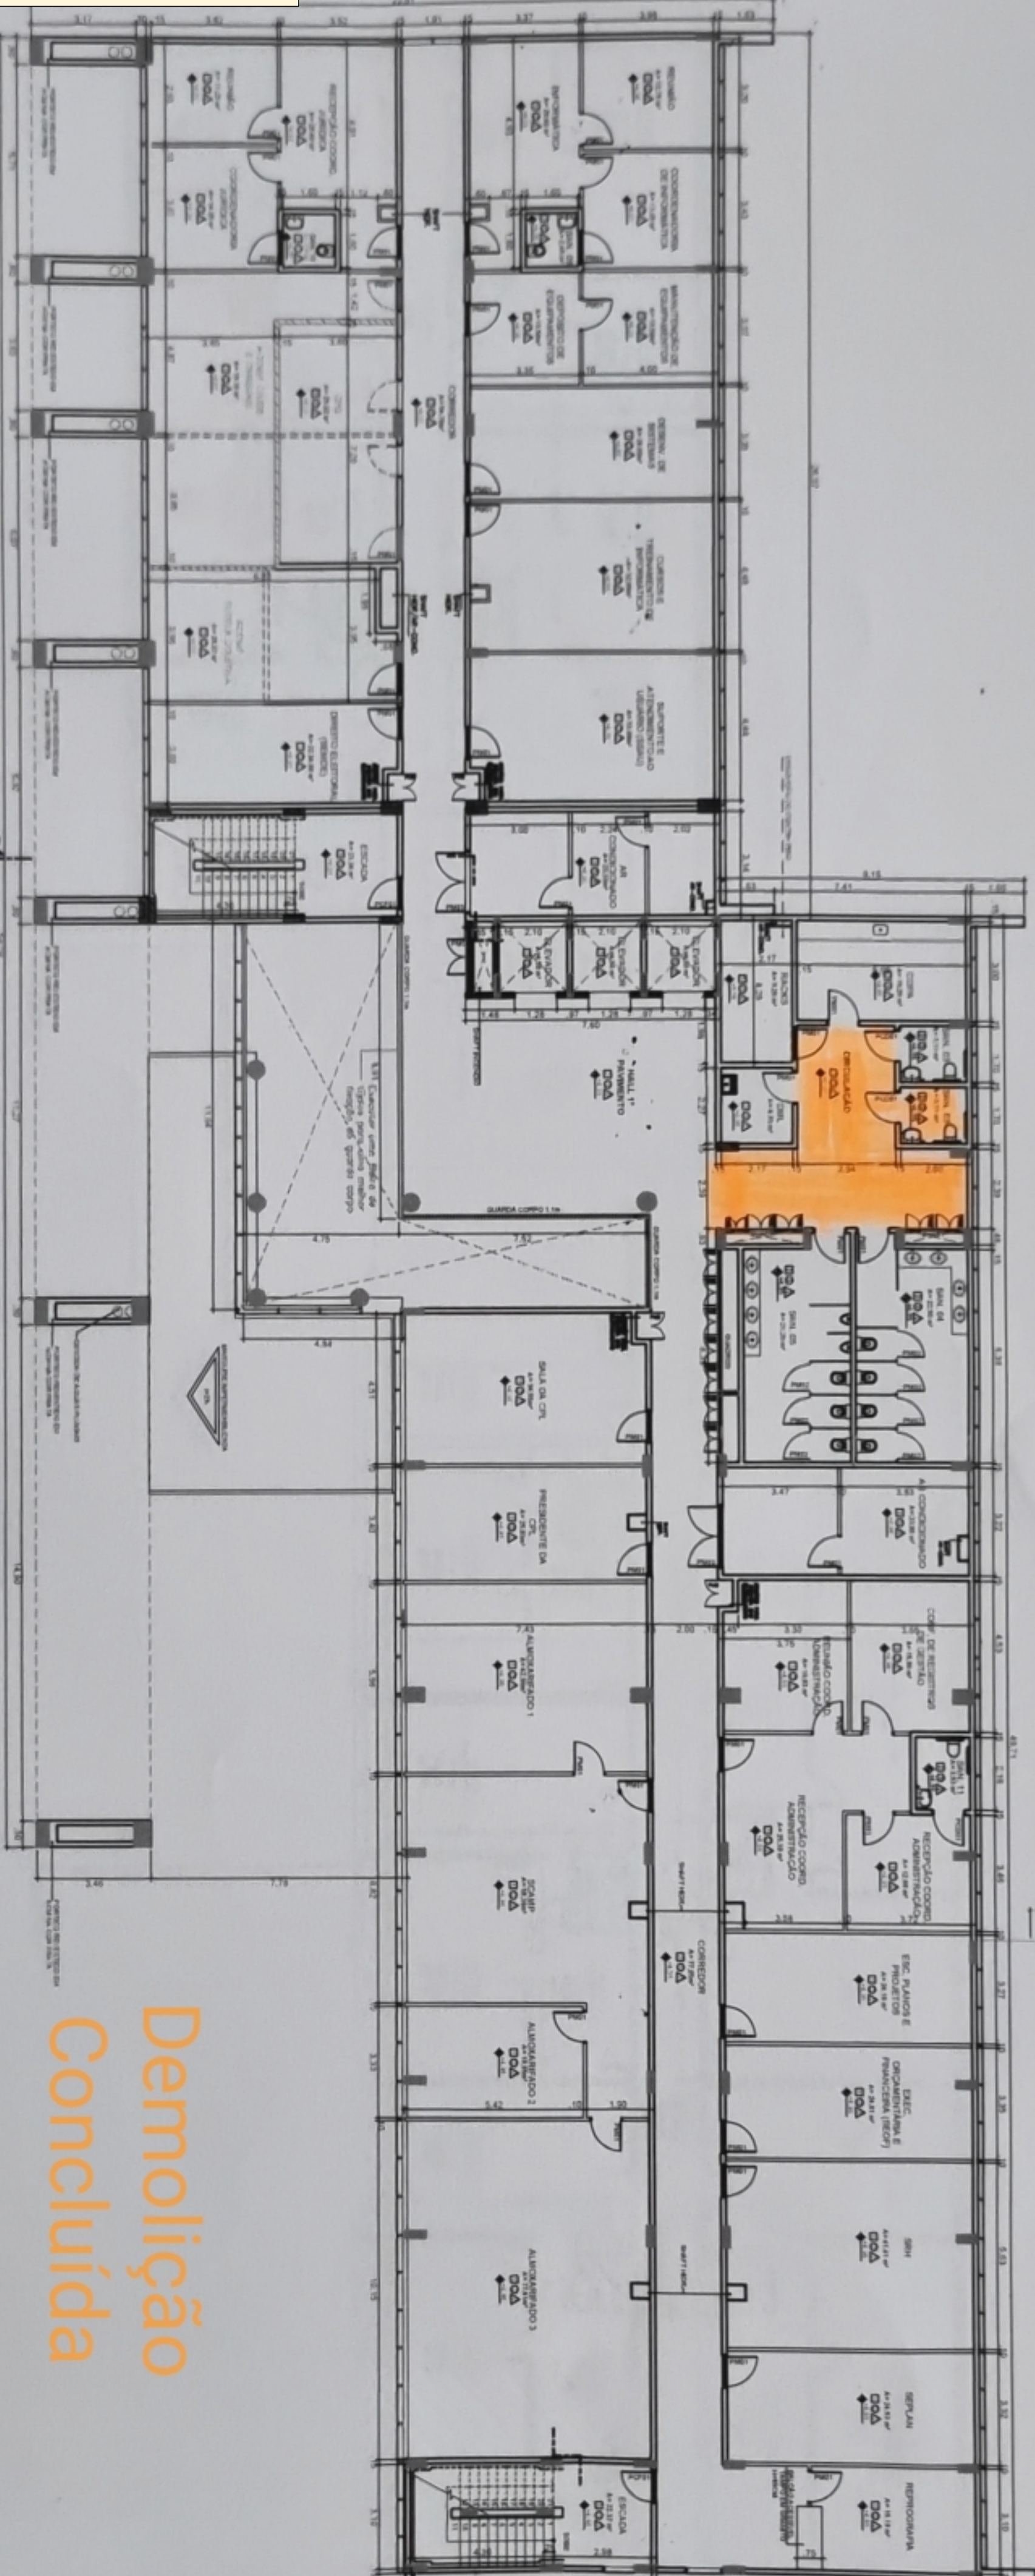


Demolição
Concluída

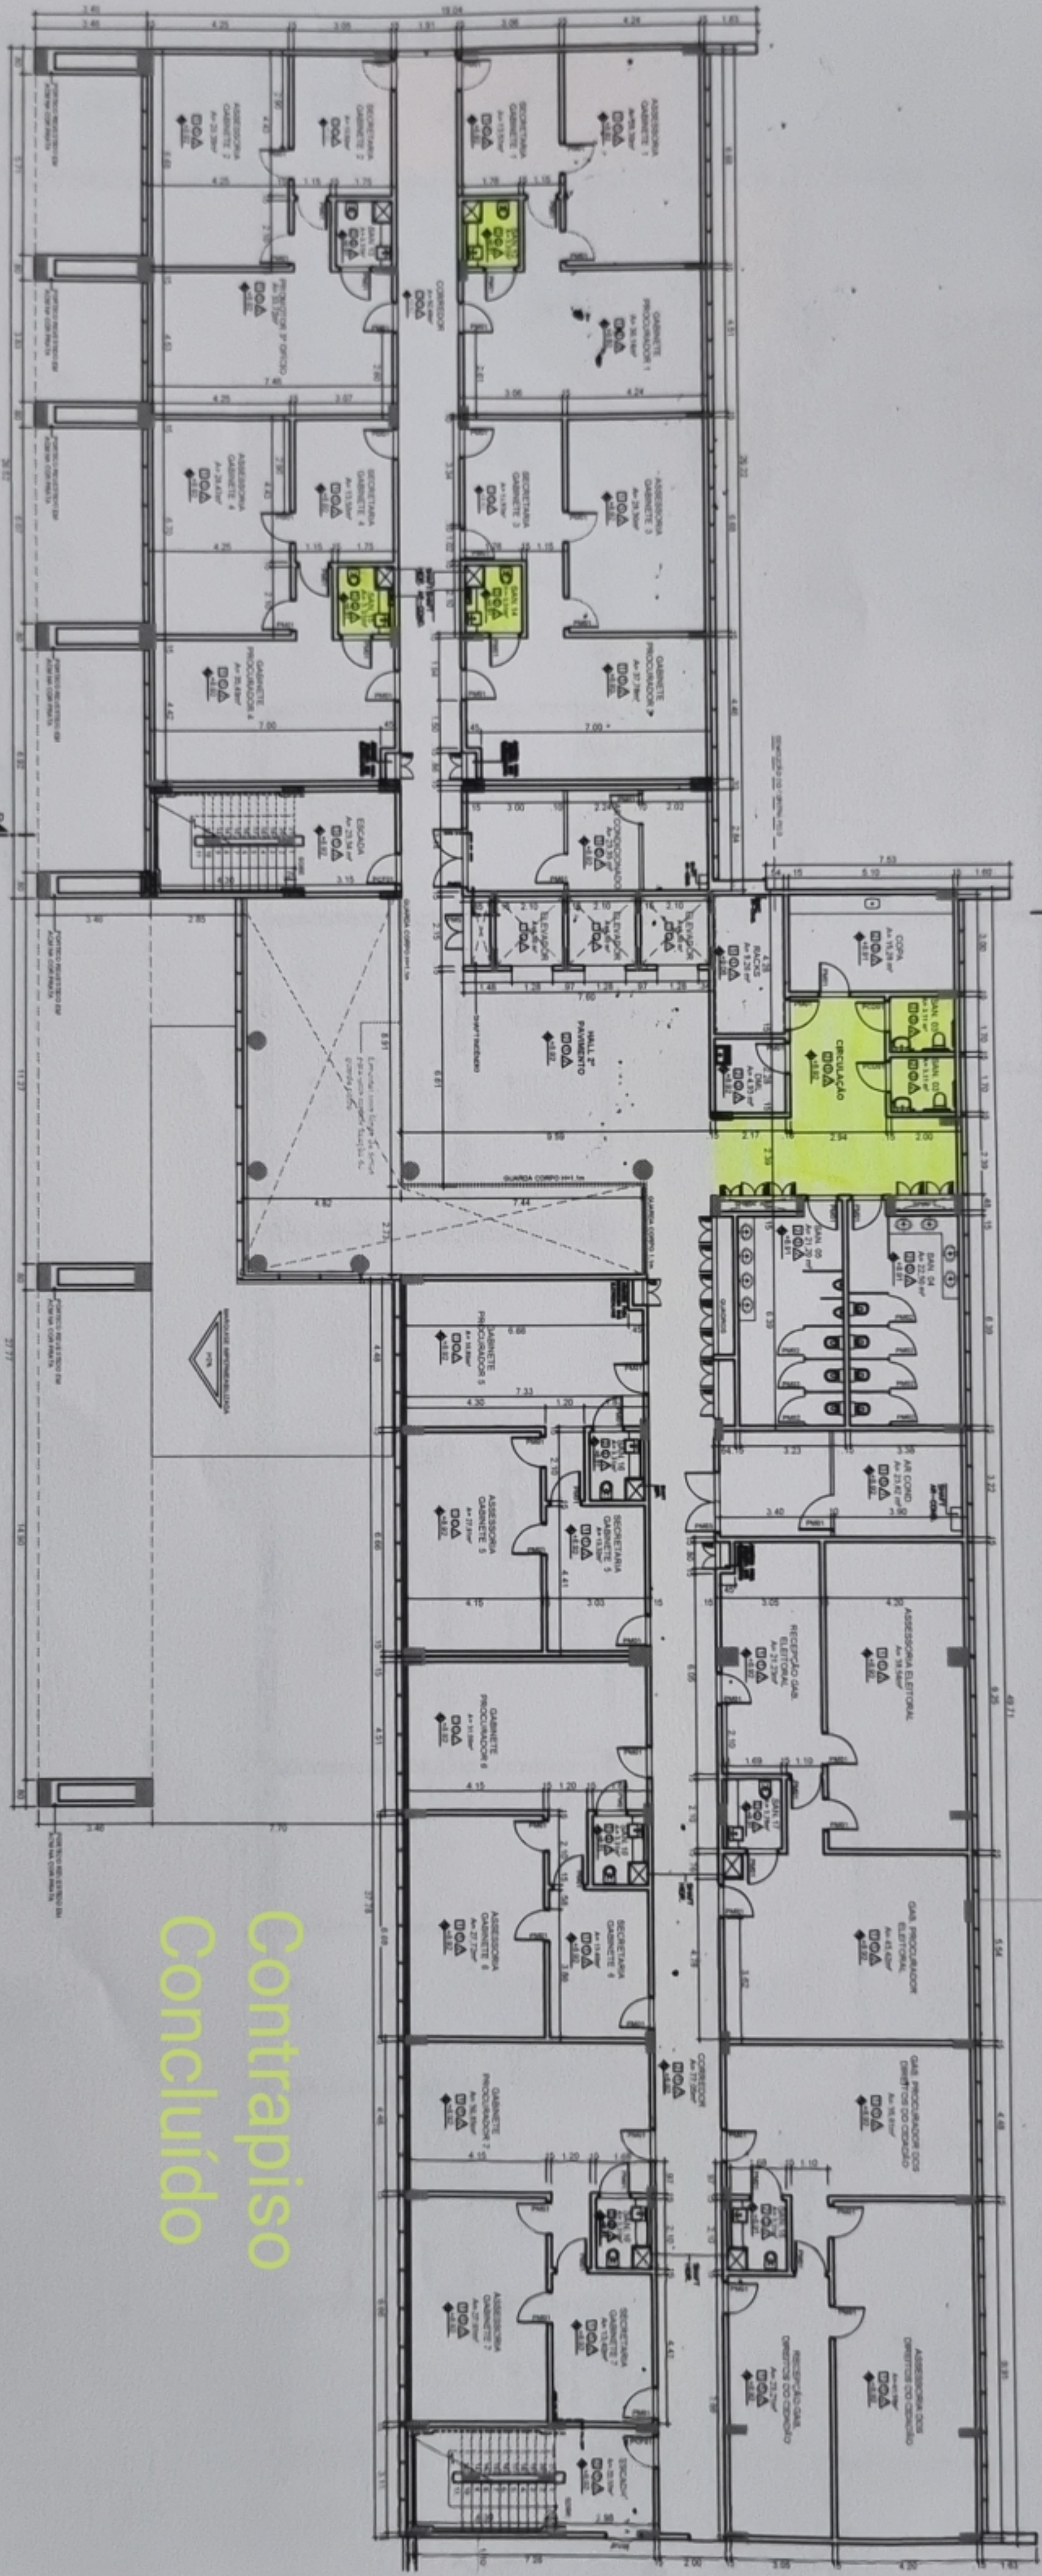

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO

Contrapiso
Concluído

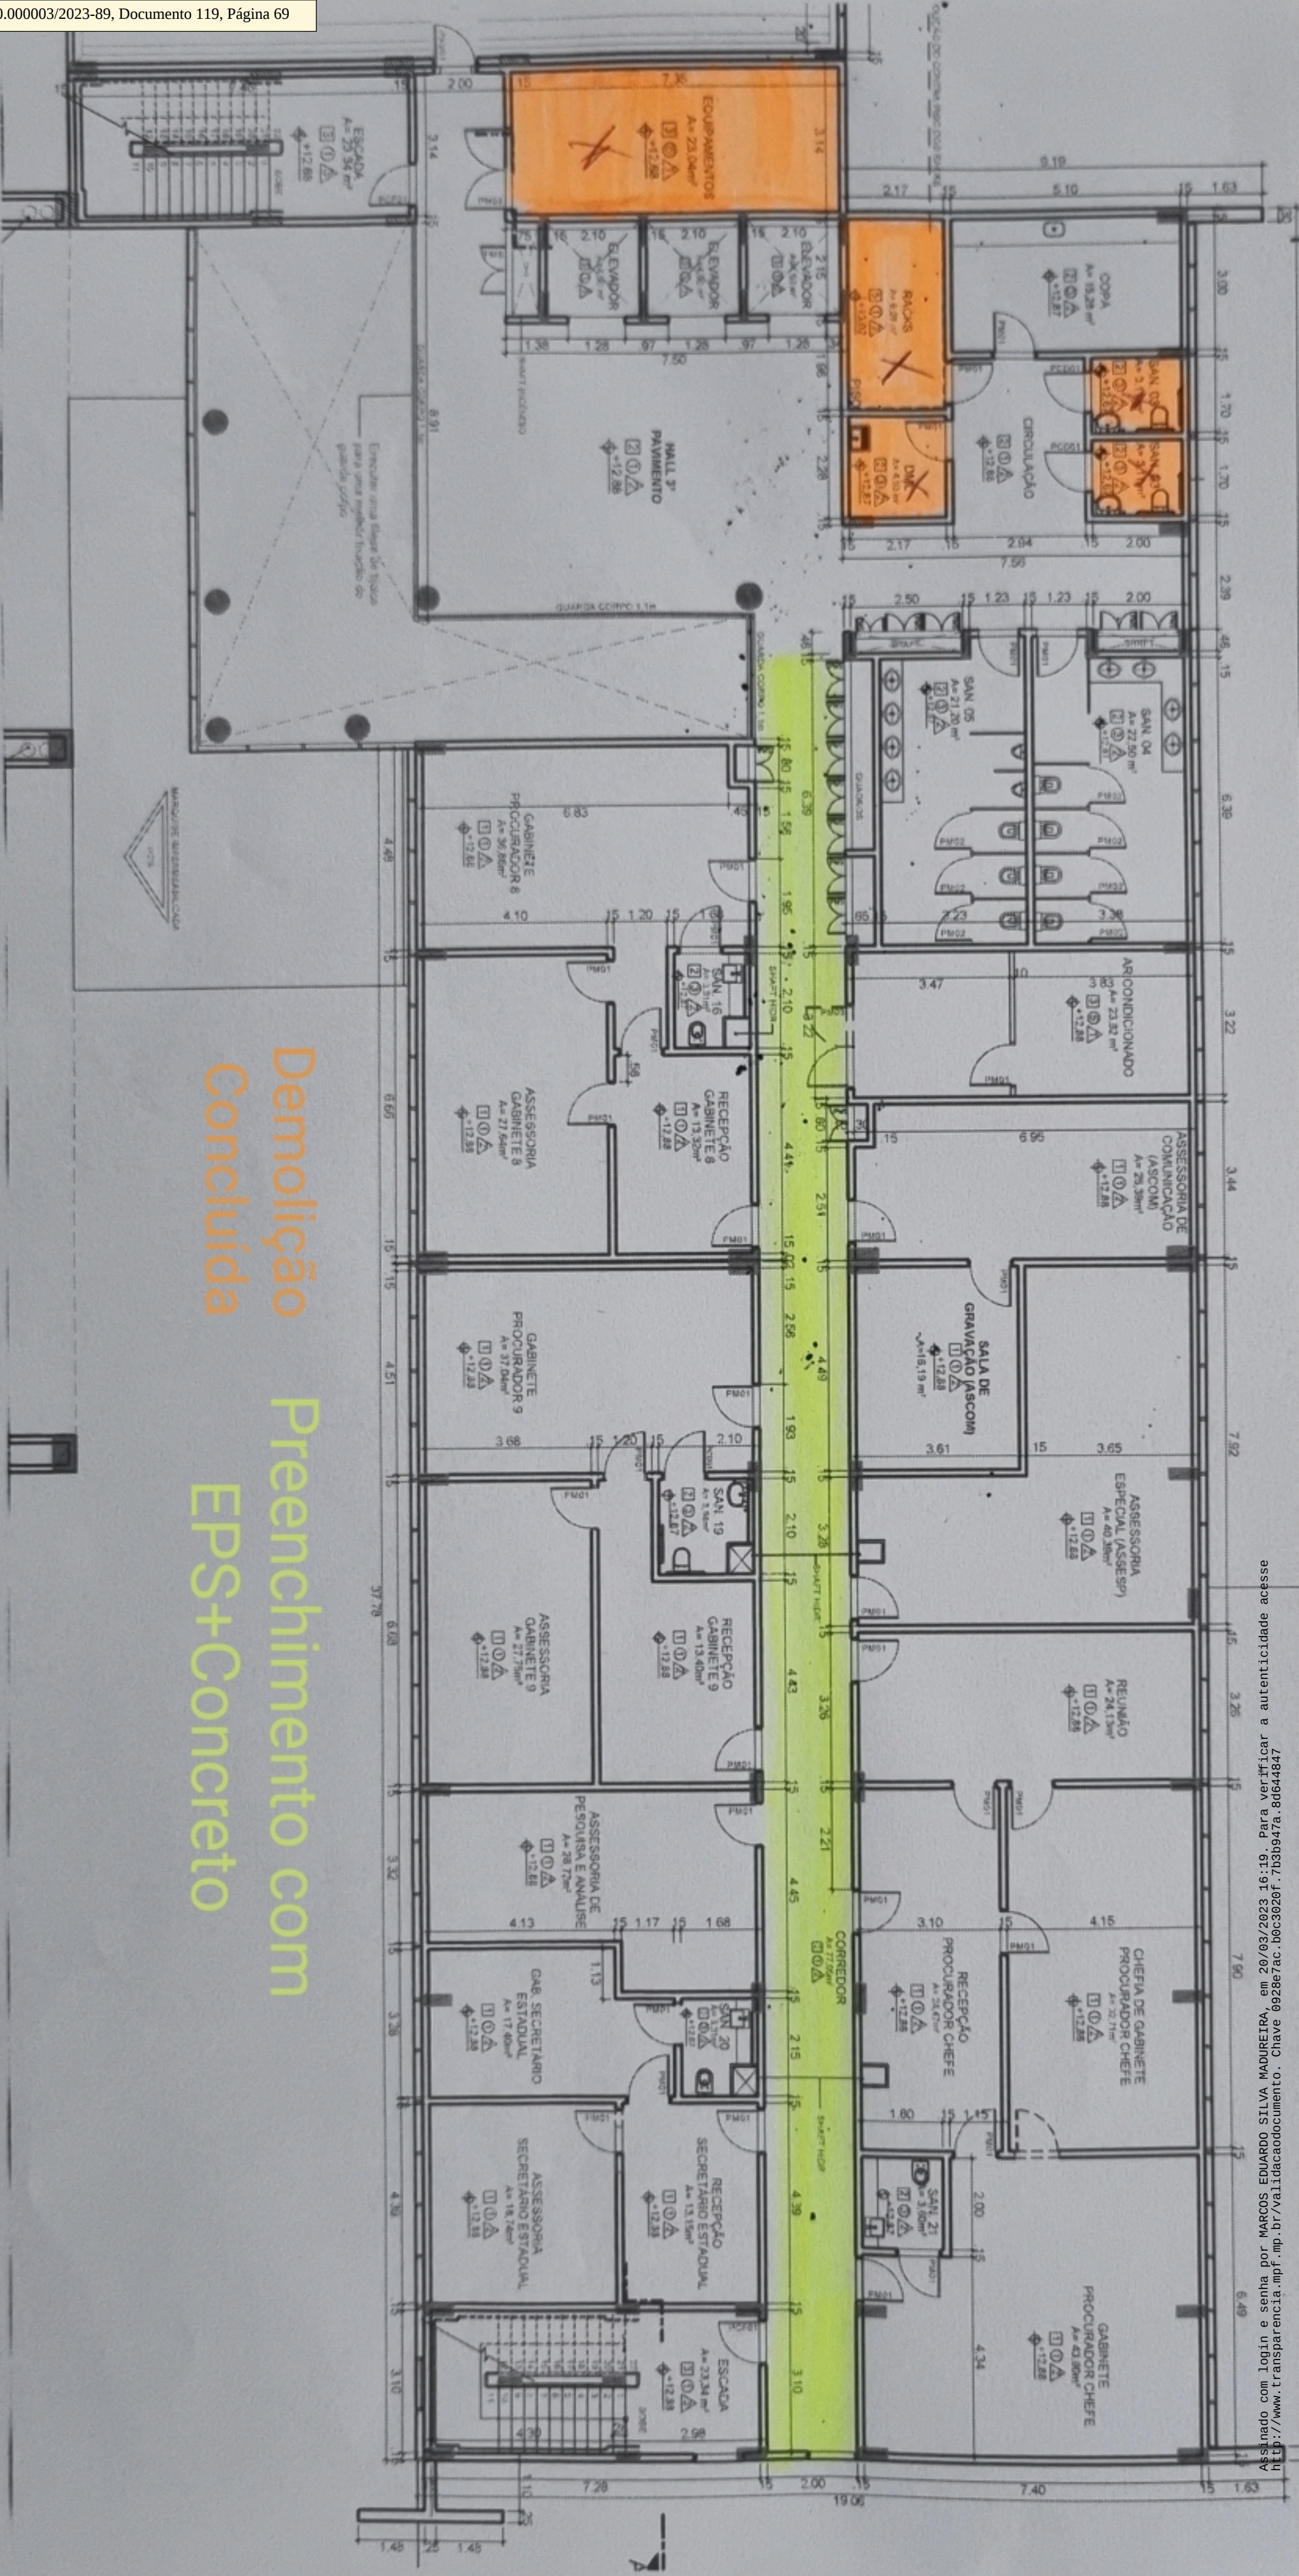



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Departamento de Tributos
Rua Coronel Pinto, 188 - Centro
BOA VISTA - RR - CEP: 69301-150
FONE(S): 95 3621 1653 CNPJ/MF: 05.943.030/0001-55

**TO - TLO -
EXECUÇÃO DE
OBRAS - IND. E**

DAM 408071886

SILVIO

DAM DE RECEITAS DIVERSAS

CONTRIBUINTE J NASSER ENGENHARIA LTDA		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.03.093.2565.003.6	
LOGRADOURO AV GENERAL SAMPAIO		NÚMERO 486	
COMPLEMENTO -MIN. PUBLICO FEDERAL -		BAIRRO 13 DE SETEMBRO	
MUNICÍPIO BOA VISTA		U.F. RR	CPF/CNPJ 04.618.096/0001-07
COMPOSIÇÃO DA RECEITA			
CÓDIGO DA RECEITA 7	DESCRIÇÃO DA RECEITA TO - TLO - EXECUÇÃO DE OBRAS - IND. E COMÉRCIO		COMPETÊNCIA 03/ 2023
REFERÊNCIA QTDE DE M2	Qtde m² 8.528,33	VALOR REFERÊNCIA 5,59	Nº PROCESSO 000875/2023
		VALOR RECEITA 47.716,01	
DADOS PARA PAGAMENTO			
OBSERVAÇÕES TAXA PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 00384/2021		VENCIMENTO 13/03/2023	
		VALOR DEVIDO - R\$	47.716,01
		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - R\$	
		MULTA DE MORA - R\$	
		JUROS DE MORA - R\$	
		HONORÁRIOS - R\$	
		VALOR A PAGAR - R\$	47.716,01

81630000477.6

16010567202.8

30313333033.0

30001801140.7

Bancos convênitados: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco, HSBC, CEF, Lotéricas e Correios.

Via Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Departamento de Tributos

**TO - TLO -
EXECUÇÃO DE
OBRAS - IND. E**

DAM 408071886

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.03.093.2565.003.6		CONTRIBUINTE J NASSER ENGENHARIA LTDA			VENCIMENTO 13/03/2023
VALOR DEVIDO (R\$) 47.716,01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R\$)	MULTA (R\$)	JUROS (R\$)	HONORÁRIOS (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$) 47.716,01


VIA BANCO

81630000477.6

16010567202.8

30313333033.0

30001801140.7



Via Banco/Processamento

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao/documento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **J NASSER ENGENHARIA LTDA**
Agência: **0686** Conta: **51347 - 4**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816100004778 160105672028 303273330330 300018054191**

Valor do documento: **R\$ 47.716,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 16/03/2023 às 09:06:10 via Sispag, CTRL 766707023000015.

Autenticação:

AC6253E04B221E02A759DE9048BCDCB0F6B4E300

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Obras
Departamento de Fiscalização e Edificações-DFE



Ofício:10322 – SMO/DFE/PROTOCOLO/2023

NUP: 9.096223/2023

Boa Vista, 13 de março de 2023.

A J. Nasser Engenharia Ltda

Referência: Processo: 875/2023 – Renovação de Alvará de Construção

Senhor Requerente,

Em resposta ao e-mail constante no processo supracitado, NUP: 9.095029/2023, cumpre-nos esclarecer que, conforme preconiza a Lei 023, de 10 de outubro de 1974 que dispõe sobre o Código de Edificações e instalações do Município de Boa Vista, no que se refere o Capítulo IV- Validade e Cancelamento das Licenças de Obras:

Art. 49 - As obras que não sofrerem solução de continuidade no seu andamento terão suas licenças prorrogadas tantas vezes quantas se tornarem necessárias, até sua conclusão, ressalvada qualquer disposição específica.

Parágrafo Único - As prorrogações deverão ser requeridas até trinta (30) dias após o término do prazo fixado no último alvará, sob pena de multa e embargo das obras.

Art. 50 - Quando uma obra não tiver sido iniciada ou, se iniciada, estiver paralisada por período superior a sessenta (60) dias, a licença concedida e o projeto visado, se houver, estarão cancelados, findo o prazo fixado no alvará para sua construção.

§ 1º - No caso de obra não iniciada, a contagem das taxas para expedição de novo alvará terá processamento como se fora licença nova.

§ 2º - Para as obras iniciadas, mas que estejam paralisadas, além de contagem das taxas para reinício por prazo a critério do contribuinte, será cobrada, para cada seis meses ou fração de paralisação, uma taxa de dez por cento (10%) sobre aquela constante no último alvará.

Considerando que não há qualquer menção no artigo da Lei supracitada que concede descontos para renovação de alvará.

Considerando que a solicitação de Renovação de Alvará referente ao processo em tela não demanda vistoria da equipe do Departamento de Fiscalização e Edificação, uma vez que não se trata de uma construção realizada por etapas, portanto não há emissão de Habite-se Parcial que demanda vistoria.

Secretaria Municipal de Obras - SMO

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4407

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: NOELIA ALVES DA SILVA EM 14/03/2023 10:51:00

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IRACEMA LOPES DE ARAUJO SILVEIRA EM 14/03/2023 10:48:09

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 43335DD8






Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Obras
Departamento de Fiscalização e Edificações-DFE



Considerando que o Habite-se é uma autorização especial dada pela autoridade competente, para utilização de uma edificação. Portanto, se a obra em tela possui 44, 25%, (fundações e infraestrutura) a mesma não está habitável.

Diante do exposto, no que tange ao atendimento das exigências legais e demais responsabilidades desse Departamento de Fiscalização e Edificação, remetemos ao Departamento de Fiscalização- DEFIS para esclarecimento quanto aos valores das taxas emitidas, mantendo as informações citadas no FAT 265/2023.

Para esclarecimentos de eventuais dúvidas, colocamos à disposição o telefone da Secretaria Municipal de Obras – SMO (95) 3621-4422.



Secretaria Municipal de Obras - SMO

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco

Contatos: (95) 3621-4400/3621-4407

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: NOELIA ALVES DA SILVA EM 14/03/2023 10:51:00

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: IRACEMA LOPES DE ARAUJO SILVEIRA EM 14/03/2023 10:48:09

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 114/E DE 02 DE AGOSTO DE 2018 E DECRETO FEDERAL Nº 8539, ART. 7 DE 08 DE OUTUBRO DE 2015

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 43335DD8





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES - DFE

FORMULÁRIO DE ANÁLISE TÉCNICA - FAT - 265/2023											
NUP	875/2023	PROCESSO:	875/2023	PLANO DE GERENCIAMENTO	SIM	X	NÃO		PROE:	SIM	NÃO
REQUERENTE:		J NASSER ENGENHARIA LTDA							ONLINE SIMPLIFICADO		
ENDEREÇO DA OBRA:		AVENIDA GENERAL SAMPAIO							ONLINE DETALHADO		X
Nº	486	LOTE:	2565	QUADRA:	93	ZONA:	3	BAIRRO:	13 DE SETEMBRO		
USO: INSTITUCIONAL											
X	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO			ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO			REGULARIZAÇÃO DE OBRA			HABITE-SE	
	LICENÇA PARA CORTE DE ASFALTO			-	ANÁLISE PRÉVIA					ANISTIA	
PENDÊNCIA:											
OBSERVAÇÕES: <i>No que tange a análise ao atendimento das exigências legais, plano de zoneamento municipal e demais responsabilidades dessa Secretaria Municipal de Obras, informamos que o imóvel está APTO AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ.</i> <i>Encaminhar à Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças para demais providências e verificação quanto aos tributos municipais (DRC), atualização Cadastral (DCI).</i>											
STATUS: APTO											
TIPO DE CONSTRUÇÃO				NÚMERO DE PAVTO				APTO			
☒	ALVENARIA		☐	CONCRETO ARMADO		☐	TÉRREA		☒	SIM	
☐	MADEIRA		☐	MISTA		☒	PAVIMENTOS		☐	NÃO	
☐	EST. METÁLICA		☐	OUTROS - CONTAINER		☐	4		QUANT. PAVTO		
ÁREA DO PROJETO:		8.528,33		m²	ÁREA AMPLIADA A SER COBRADA				m²		
ALVARÁ EXISTENTE:				m²							
HABITE-SE EXISTENTE:				m²							
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE						ASSINATURA					
LÍVIA CRISTINA DE RODRIGUES FERREIRA Arquiteta e Urbanista CAU A47692-7 Mat. 43279											
BOA VISTA - RR, ____ / ____ / ____						RECEBIDO EM, ____ / ____ / ____					

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 20/03/2023 16:19. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 0928e7ac.b0c3020f.7b3b947a.8d644847

