



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 3º MEDIÇÃO



RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 03/2023

INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 16 de janeiro de 2023

PERÍODO DO RELATÓRIO: De 16 de março até 16 de abril de 2023, serviço previsto para a terceira medição: (Foram executados os Serviço de demolição de parede, serviço de demolição de piso em concreto, execução de enchimento de piso EPS, instalação de pontos de água pluvial com descida das prumada pelo shaft, instalação de água fria e esgoto, impermeabilização da caixa superior, serviço de infraestrutura no piso pontos de elétrica, retirada de infra de elétrica/hidráulica e retirada de entulho).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF

Nome:	Eng. Marcos Eduardo Silva Madureira
ART:	Cargo função nº RR20200078632 / Obra serviço nº RR20200078641.
Telefone:	(95) 3198-2005
E-mail:	marcoseduardo@mpf.mp.br

1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)

Nome:	Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira	
Portaria:	SE/PR-RR nº02/2023	
Telefone:	(95) 3198-2025 / 2073	
E-mail:	prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br	prrr-contratos@mpf.mp.br

2.0 - ESCOPO E LOCAL

DADOS DO CONTRATO

Nº Contrato: 05/2022	PPA/LOA: AÇÃO 110E
Empresa Contratada: J. NASSER ENGENHARIA LTDA CNPJ 04.618.096/0001-07	
Matrícula CEI da Obra: 51.235.89823/71	
Valor Atual do Contrato: R\$ 31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).	
Percentual de Reajuste: 6.0%	
Saldo de Empenho: 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022	
Local/UF: Boa Vista – RR	
Responsável Técnico: José Nasser – ART de Execução: RR20230111507	
Corresponsável Técnico: Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835	

Nota Fiscal Eletrônica de Referência: no valor de R\$ 238.045,57 (Duzentos e trinta e oito mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

Ocasionalmente atraso e multa tem que glosa no pagamento IMR no percentual de (-0,50%) com o valor da nota fiscal de R\$ 1.190,23 (Mil e cento e noventa reais e vinte e três centavos)

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
3	1,16%	0,75%	1,40%	1,25%
TOTAL EXECUTADO				1,25%
TOTAL A EXECUTAR				98,75%

Identificação processo de fiscalização: 1.32.000.000464/2022-71

Tipo de obra: Prédio Público.

Objeto da fiscalização: Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Período abrangido pela fiscalização: 16/03/2023 a 16/04/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)

3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a Serviço de demolição de parede, serviço de demolição de piso em concreto, execução de enchimento de piso EPS, impermeabilização da caixa d' água, serviço de instalações hidrossanitário, instalação de pontos de água pluvial com descida das prumadas pelo shaft e instalações de infra de elétrica, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: Operador de bomba com desvio de função, estava aplicando massa ACIII no 3º pavimento, não usava EPI apropriado para o serviço e o mesmo estava, em outras circunstâncias, retirando entulho, também sem EPI. Foi requisitado que o técnico de segurança do trabalho tomasse as devidas providências.

Constatação do Período nº 2: Impermeabilizador subiu no reservatório superior sem o EPI adequado, cinto de segurança com talabarte estava no corredor da área técnica, o técnico de segurança pediu para que o mesmo buscasse o EPI

Constatação do Período nº 3: Instalação de águas pluviais com derivação e barrilete para o shaft tem que fazer a composição não consta esse item na planilha.

Constatação do Período nº 4: Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA (2,00%), INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (2,00%) e CLIMATIZAÇÃO (2,00%). Totalizando 6,00%. Visto que a empresa não entregou o novo cronograma no tempo ágil, com isso vai ter que utilizar o cronograma da obra antigo.

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

A) Os ralos serão realocados para o fundo dos banheiros para um caimento único. Os níveis de piso de banheiros terão rebaixo referente a área seca. A Fiscalização não autorizou a correção dos pontos hidráulicos pela Executora, e solicita que seja usado engates com comprimento maior. Serão realocados

pontos hidrossanitários para lavatórios suspensos. Será realizado prumadas individuais para drenos de ar condicionados, posteriormente lançados na rede de águas pluviais. Cada ambiente das áreas técnicas de ar condicionado terão um ralo individual.

B) Foram definidos os níveis acabados dos degraus (H= 18 cm e P= 28 cm), sendo necessários em caso preenchimento com concreto e em outros realizar demolição/corte parcial de degraus existentes. Nos patamares de acesso aos pavimentos serão necessários fazer a concordaria (caimento) de níveis. Será realizado levantamento dos quantitativos dos serviços com a solução técnica definida, para futura apresentação dos custos e prazos envolvidos para análise e aprovação do MPF.

C) Não será feita a impermeabilização da laje de piso do Térreo, com exceção das áreas do poço do elevador. Será impermeabilizada as paredes externas na altura de 50 cm do piso. Todo o piso do das áreas técnicas de ar condicionado será impermeabilizado.

D) As folhas da porta terão PM 01 terão largura 0,90 m e altura 2,10 m

6.0 - CONCLUSÃO	
Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.	
7.0 - ANEXOS	
a) Relatório fotográfico do período	
8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO	
Boa Vista – Roraima, 16 de abril de 2023	
9.0 - FÉ DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022	
Declaramos que as metas estabelecidas na 3ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas.	
_____ Marcos Eduardo Silva Madureira Engenheiro Civil/Membro da Comissão _____ Nazareno Nunes Rodrigues Membro da Comissão _____ Sidney Wanderley de Oliveira Membro da Comissão	
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	
10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL	
☐ Não foram identificados vícios. ☐ Ver Nota Técnica ou Despacho constante da de nº. _____	_____ Igor José Barbosa Duarte Lopes Secretário Estadual
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

**RELATÓRIO TÉCNICO
MEDIÇÃO 3º**

11.0 A Terceira medição foi efetuada pelo fiscal da obra, engenheiro civil da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Marcos Eduardo Silva Madureira, matrícula 31.143, no dia 16/04/2023.

11.1 Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados, mas com atraso nos itens: INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA (2,00%), INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (2,00%) e CLIMATIZAÇÃO (2,00%). Totalizando 6,00%, não foram executados na 3º medição ocasionando atraso e multa. Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado <i>in loco</i>	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRA, DEMOLIÇÃO E RETIRADA E PROTEÇÃO	5,00%	0,02%	X	
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00%	0,23%		X
ESTRUTURAS DE CONCRETO				
GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS	0,00%	5,84%		X
ARQUITETURA				
VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS, ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	1,00%	1,29%		X

IMPERMEABILIZAÇÃO				
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	9,22%		X
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				
ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO	0,00%	0,12%		X
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				
SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES E CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO	2,00%	0,00%	X	
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV	2,00%	0,00%	X	
CLIMATIZAÇÃO				
EQUIPAMENTOS - ÁGUA GELADA, EQUIPAMENTOS - VRF, EQUIPAMENTOS - SPLIT, EQUIPAMENTOS - VENTILAÇÃO MECÂNICA, TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA, TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA - CONEXÕES, TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA - VÁLVULAS E REGISTROS, TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA - LIGAÇÕES TÍPICAS, DUTOS DE AR, GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS PARA DUTOS, TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA, ISOLAMENTO TÉRMICO - TUBULAÇÕES E DUTOS, SUPORTES - TUBULAÇÕES E DUTOS, DIVERSOS, COMISSIONAMENTO E STARTUP.	2,00%	0,00%	X	
SERVIÇOS GERAIS				
TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO	2,00%	4,52%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA	1,16%	0,75%	X	

12.0 Segue abaixo a planilha contendo o resumo dos serviços efetivamente realizados e pactuados para finalização do contrato nº 05/2022.

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - 3ª MEDIÇÃO
OBRA: NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA - MPF - 2022
LOCAL: AVENIDA GENERAL SAMPAIO S/Nº, BAIRRO TREZE DE SETEMBRO - BOA VISTA/ RR
PLANILHA SINTÉTICA (COM BDI)

LEIS SOCIAIS NÃO DESONERADAS - REFERÊNCIA HORISTA SINAPI: L5
Benefícios e Despesas Indiretas (Serviços): BDI
Benefícios e Despesas Indiretas (Equipamentos): BDI
REFERÊNCIA: SINAPI - RR - 05/22 (NÃO DESONERADA)

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATADOS				ACUMULADO ANTERIOR		3ª. MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO CONTRATUAL	
					UND	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	VALOR R\$
1				SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				75.116,52		86.626,80		14,94		86.641,74		19.474,78
1.3				DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				10.998,24		1.292,46		14,94		1.217,49		8.869,84
1.3.1	SERV.	97622	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M²	36,38	53,38	1.941,96	10,77	574,00	0,28	14,94	11,05	589,84	25,33	1.352,13
2				SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				166.896,96		-		379,50		379,50		166.916,06
2.1				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				166.896,96		0,00		379,50		379,50		166.916,06
2.1.4	SERV.	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M	640,00	19,62	12.556,80	0,00	0,00	7,50	147,15	7,50	147,15	632,50	12.409,65
2.1.5	SERV.	S-PRE-LOCA-TORRE-01	PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE ANDAME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	MMES	640,00	15,49	9.913,00	0,00	0,00	15,00	232,35	15,00	232,35	625,00	9.681,25
4				ESTRUTURAS DE CONCRETO				387.687,79		-		22.667,67		22.667,67		365.220,13
4.5				REPAROS E COMPLEMENTOS				75.669,09		0,00		22.667,67		22.667,67		82.992,02
4.5.2	SERV.	90439	SINAPI	FURTO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	LN	21,00	70,12	1.472,52	0,00	0,00	8,00	560,96	8,00	560,96	13,00	911,86
4.5.4	SERV.	90441	SINAPI	FURTO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015	LN	8,00	143,46	1.147,68	0,00	0,00	8,00	1.147,68	8,00	1.147,68	0,00	0,00
4.5.8	SERV.	S-EST-BASE-SUB-CAV	PRÓPRIO	RETRADA DA INFRAESTRUTURA DE TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO/ELETRICA	M	2.588,00	11,08	28.675,04	0,00	0,00	1.891,61	20.950,03	1.891,61	20.950,03	696,39	7.716,01
5				ARQUITETURA				10.883.731,21		27.269,88		140.398,15		167.678,03		10.716.153,18
5.2				PISOS				3.088.170,94		27.269,88		138.962,90		168.232,79		2.913.938,16
5.2.3	SERV.	S-ARO-PISO-PRRR-ADT-ENC-EPIS	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO DE PISO COM EPS (ISOPOR), ESP. MÉDIA 15,5CM, E CONCRETO, ESP. 6 CM, ARMADO COM TELA Q-92, E JUNTAS SERIADAS	M²	1.511,00	172,79	261.086,69	80,34	13.881,94	804,23	138.962,90	884,57	152.844,84	626,43	108.240,85
5.3				REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS				2.370.814,97		0,00		1.345,25		1.345,25		2.369.469,72
5.3.1	SERV.	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M²	786,47	8,23	6.472,64	0,00	0,00	26,56	218,58	26,56	218,58	759,91	6.254,06
5.3.2	SERV.	S-ARO-VEDA-98655.2	PRÓPRIO	EMBOCO/MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESURA DE 20MM	M²	811,47	42,42	34.422,55	0,00	0,00	26,56	1.126,67	26,56	1.126,67	784,91	33.295,88
6				IMPERMEABILIZAÇÃO				489.919,12		-		42.397,62		42.397,62		417.521,50
6.1				SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO				489.919,12		0,00		42.397,62		42.397,62		417.521,50
6.1.9	SERV.	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIESTER (MMV). AF. 05/2018	M²	2.100,40	58,59	123.062,43	0,00	0,00	274,03	16.055,41	274,03	16.055,41	1.826,37	107.007,02
6.1.10	SERV.	S-ARO-IMPE-98556.3	PRÓPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIESTER E IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESINA TERMOPLÁSTICA	M²	966,37	125,96	71.351,29	0,00	0,00	209,10	26.342,41	209,10	26.342,41	357,27	45.006,88
7				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				944.990,20		-		1.141,90		1.141,90		943.848,30
7.1				ÁGUA FRIA				89.996,96		0,00		394,56		394,56		89.591,39
7.1.1	SERV.	S-HID-AFRI-750301001	PRÓPRIO	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	367,00	26,20	10.067,40	0,00	0,00	10,80	304,56	10,80	304,56	346,20	9.762,84
7.2				ESGOTO SANITÁRIO				177.906,94		0,00		837,34		837,34		177.069,60
7.2.1	SERV.	S-HID-ESGO-741651.1	PRÓPRIO	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00	36,25	5.800,00	0,00	0,00	10,46	410,55	10,46	410,55	149,54	5.869,49
7.2.4	SERV.	S-HID-ESGO-741654.1	PRÓPRIO	TUBO PVC ESGOTO OU ÁGUA PLUVIAL, PREDIAL DN 100MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	367,00	76,46	27.990,02	0,00	0,00	5,00	382,30	5,00	382,30	382,00	29.207,72
7.2.16	SERV.	S-HID-CAIX-89482.02	PRÓPRIO	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM + PROLONGADOR (EXCLUSIVE GRELHA E PORTA GRELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	18,00	44,49	800,82	0,00	0,00	1,00	44,49	1,00	44,49	17,00	756,33
9				INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				5.365.196,69		-		432,88		432,88		5.364.763,81
9.3				INFRAESTRUTURA				1.558.476,98		0,00		432,88		432,88		1.558.039,10
9.3.9	SERV.	S-ELE-INFRA-014455165	PRÓPRIO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", INCLUINDO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	191,00	11,59	2.213,69	0,00	0,00	37,35	432,88	37,35	432,88	153,65	1.780,81
14				SERVIÇOS GERAIS				234.167,38		61.392,14		10.579,98		71.972,13		162.185,26
14.1				TRANSPORTE DE MATERIAL				51.745,20		110,12		3.543,88		3.654,00		48.091,28
14.1.1	SERV.	S-SER-TRAN-02	PRÓPRIO	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	780,00	66,34	51.745,20	1,86	110,12	53,42	3.543,88	55,08	3.654,00	724,92	48.091,28
14.2				LIMPEZA DA OBRA				96.372,88		11.136,61		7.036,11		18.172,72		78.200,16
14.2.1	SERV.	S-SER-LIMP-PRRR-01	PRÓPRIO	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	402,21	40.221,00	8,33	3.349,06	4,16	1.673,19	12,49	5.022,25	87,51	35.198,75
14.2.2	SERV.	S-DIV-TRAN-ENT-01	PRÓPRIO	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	280,00	92,72	25.961,60	83,99	7.787,55	57,84	5.362,92	141,83	13.150,47	138,17	12.811,13
15				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				2.672.342,00		13.468,88		20.122,72		33.591,30		2.638.750,78
15.1				INSUMOS PÚBLICOS				191.200,00		510,04		762,03		1.272,07		99.927,93
15.1.1	SERV.	S-ADM-INSU-PRRR-001	PRÓPRIO	INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	1.012,00	101.200,00	0,50	510,04	0,75	762,03	1,26	1.272,07	98,74	99.927,93
15.2				ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				2.571.142,00		12.958,54		19.360,69		32.319,23		2.538.822,77
15.2.1	SERV.	S-ADM-ADMO-PRRR-001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	20.956,62	2.095.662,00	0,50	10.962,13	0,75	15.780,33	1,26	26.342,46	98,74	2.069.319,54
15.2.2	SERV.	S-ADM-ADMO-PRRR-002	PRÓPRIO	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	100,00	4.754,80	475.480,00	0,50	2.396,41	0,75	3.586,36	1,26	5.976,77	98,74	469.503,23
VALOR TOTAL								R\$ 31.595.942,84								
VALOR ACUMULADO ANTERIOR (R\$) C/ BDI									R\$ 158.757,40							
VALOR TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI											R\$ 238.045,57					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) C/ BDI												R\$ 396.802,97				
SALDO CONTRATUAL (R\$) C/ BDI														R\$ 31.199.139,87		

13.0 - ANEXOS FOTOGRÁFICOS

13.1 – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA



13.2 – DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO













13.3 – IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA









16/03/2023 09:45
N2° 48,056 W-60° 41,278
Av. Gen. Sampaio, 486 - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, 69308, Brasil
Obra da Nova Sede da Procuradoria República - RR











13.4 – EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO DE PISO EPS
















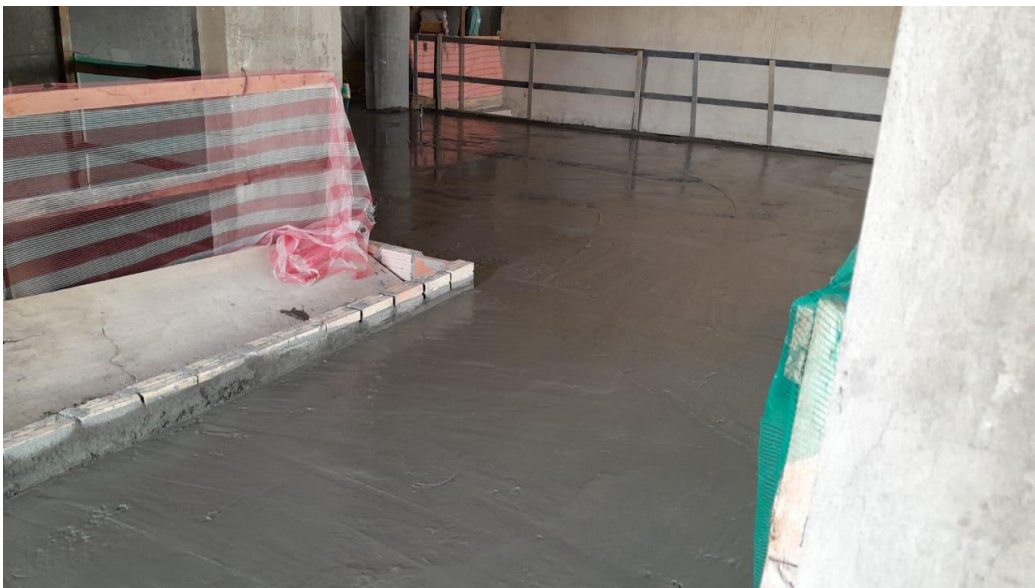


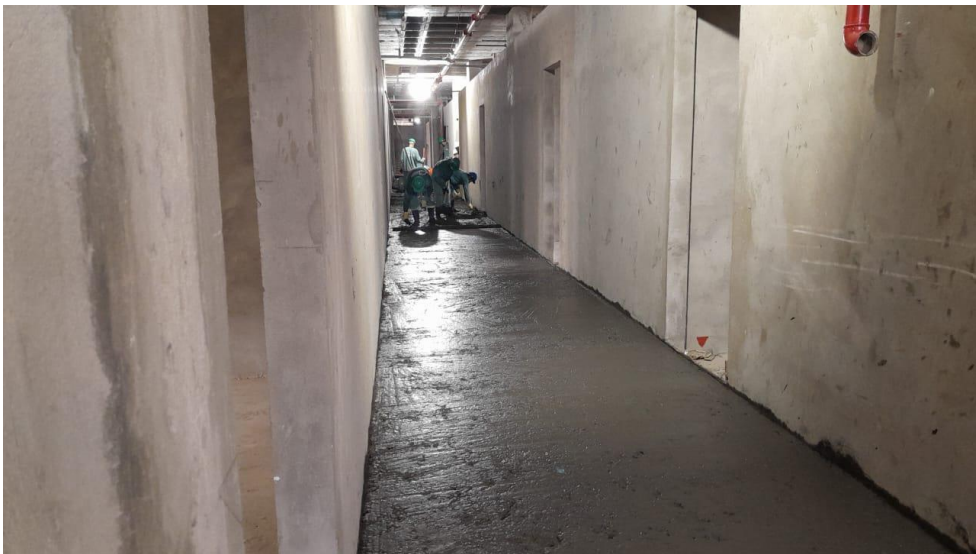





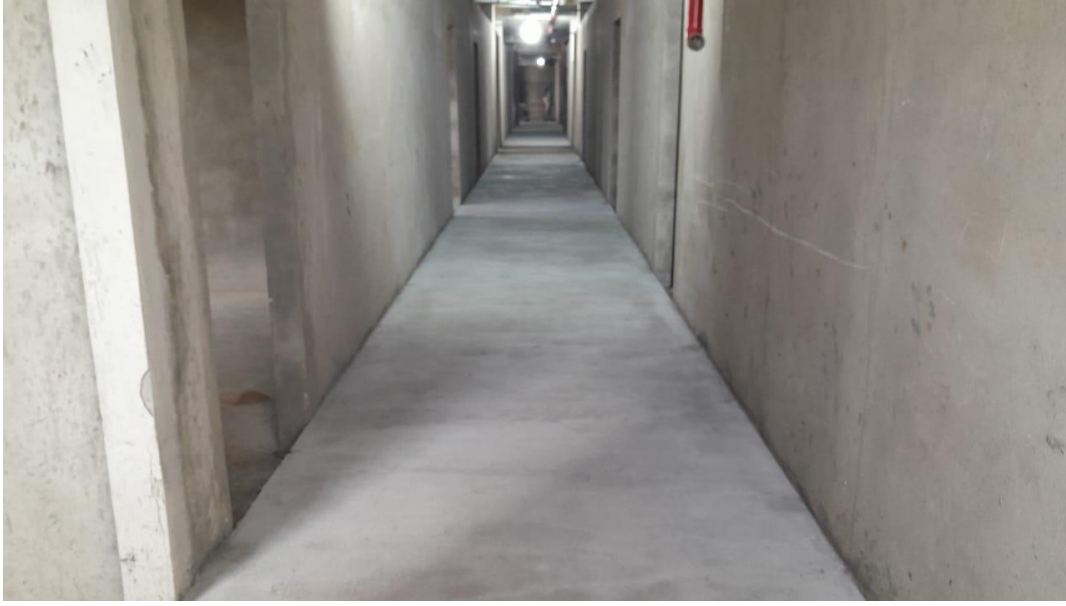

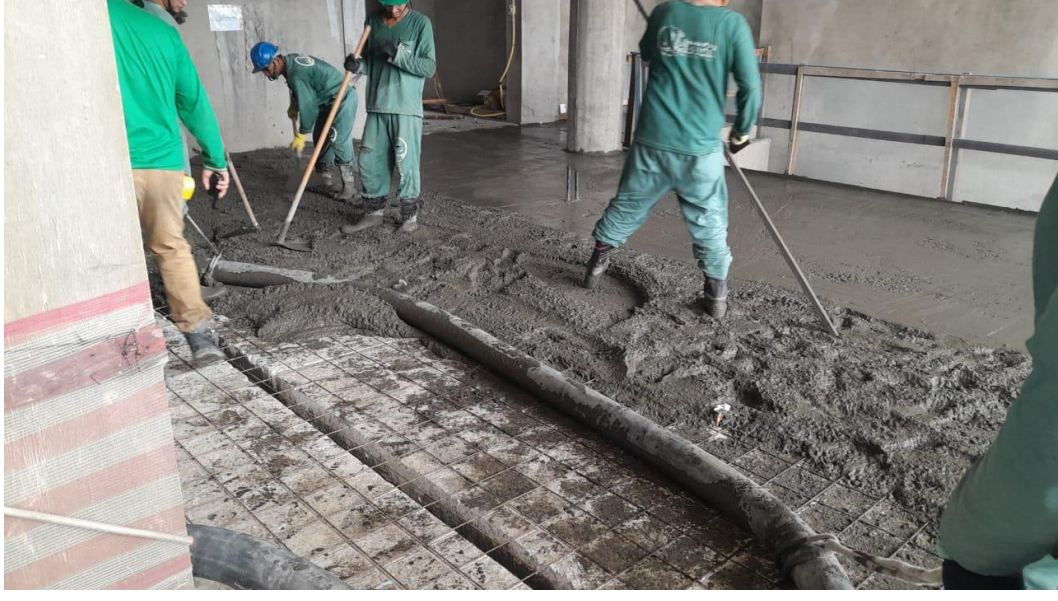


















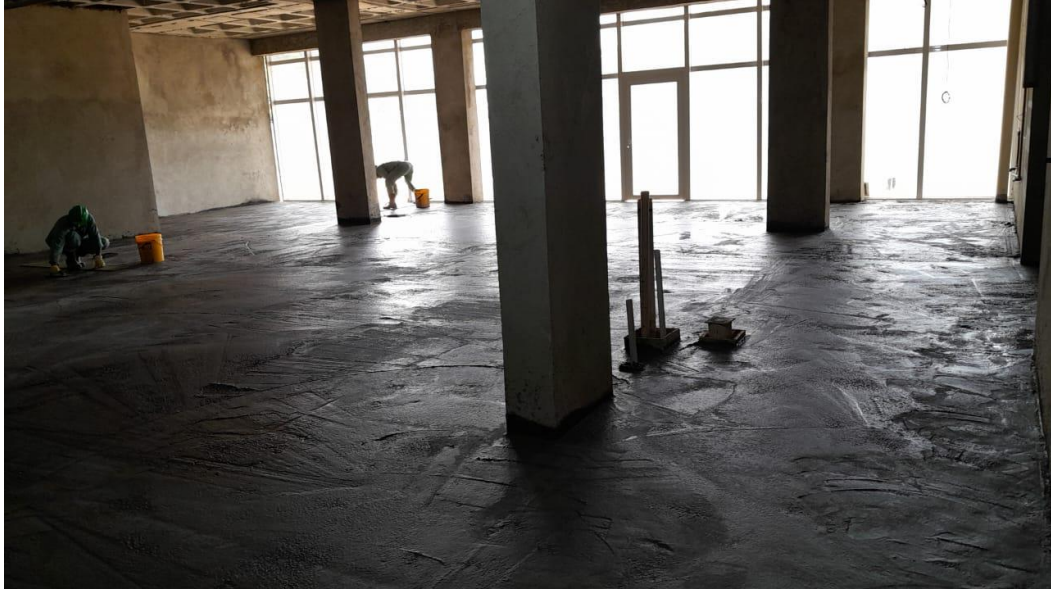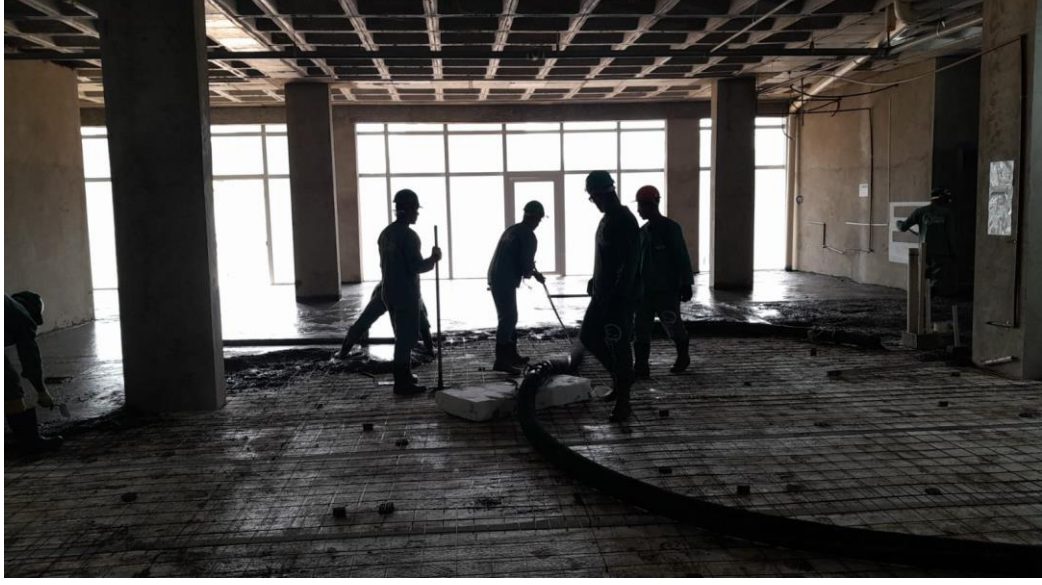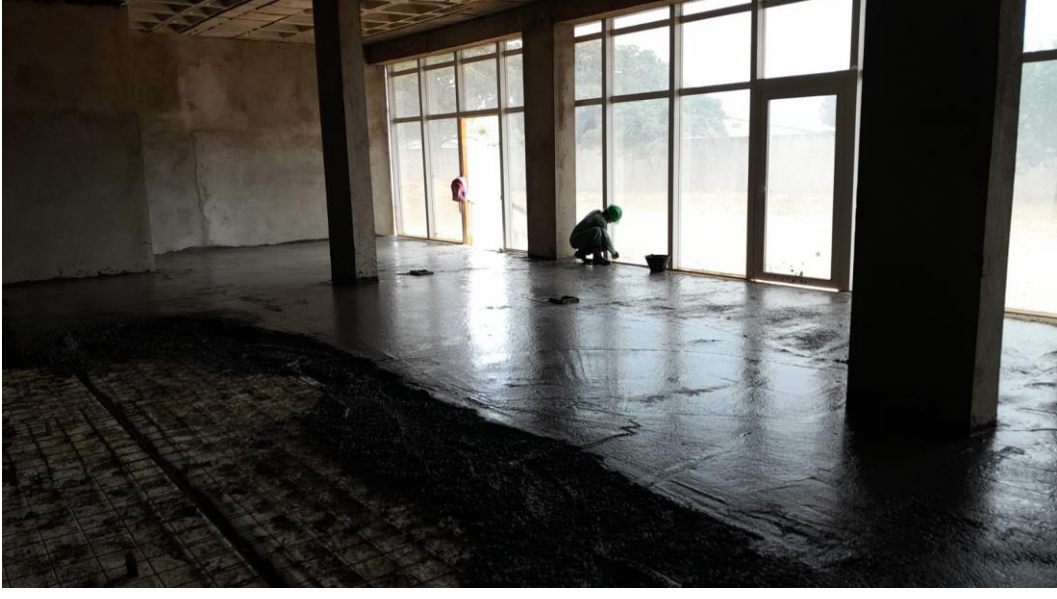

13.5 – DESCARTE DE MATERIAL EM CONTÊINER DE PAPA-ENTULHO
















13.6 –RETIRADA DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA










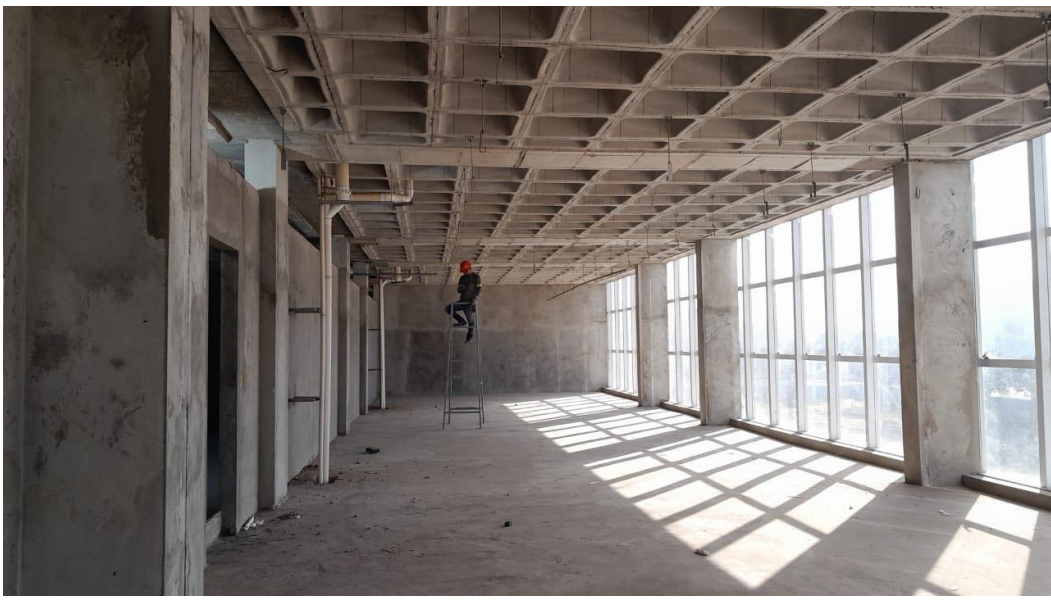





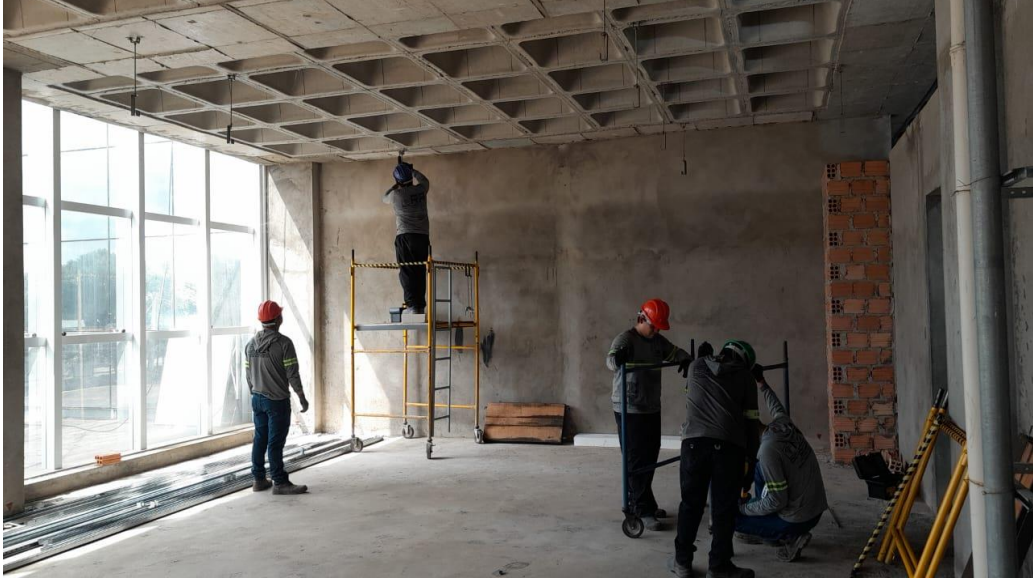

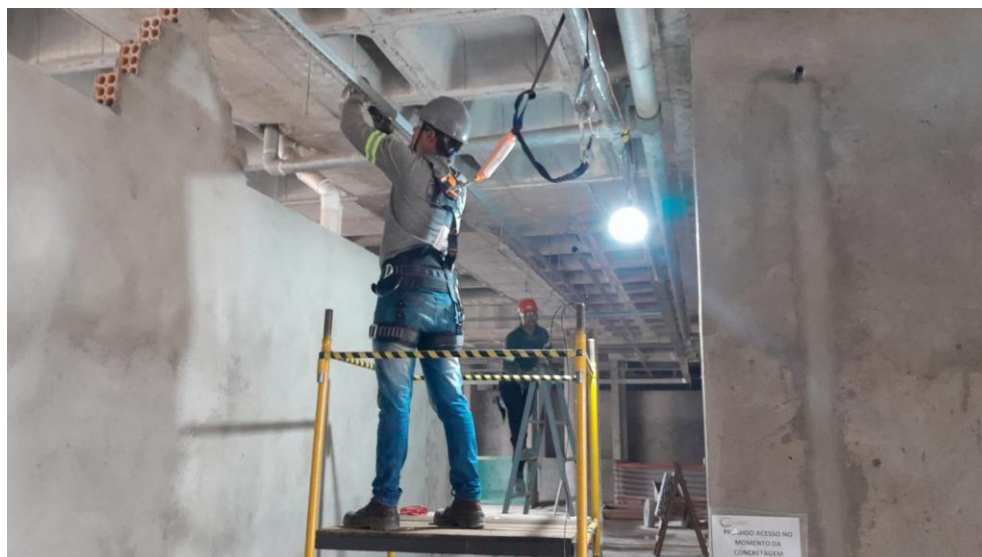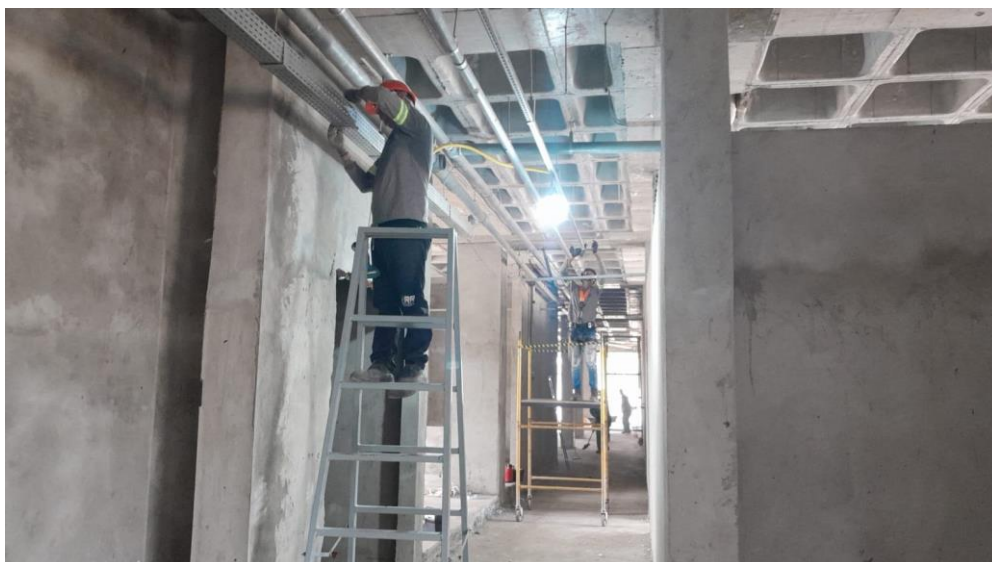

13.7 – LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA









13.8 – INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAL















13.9 – FURO NA LAJE







13.10 – CHAPISCO E REBOCO





13.11- INFRAESTRUTURA DE ELÉTRIA NO PISO





14-0 Controle de retirada de entulho na obra

DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA DA RETIRADA DO ENTULHOS DA OBRA
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	17/03/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	22/03/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	22/02/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	29/03/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	29/03/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	30/03/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	03/04/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	04/04/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	05/04/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	10/04/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	12/04/23
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	14/04/23

15.0 Relação dos colaboradores com a função na empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO
1	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
2	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
3	ANANIAS VIEIRA SILVA	SERVENTE
4	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
5	ARLYSSON DA COSTA SOUZA	TÉCN. EM SEG. DO TRABALHO

6	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA PINTO	ALMOXARIFE
7	CAIO DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA	SERVENTE
8	DARLISON COSMO PENA	BOMBEIRO HIDRÁULICO
9	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
10	DIEGO SIMÃO BURUM	SERVENTE
11	ELEN MARCIO RIBEIRO MAFRA	SERVENTE
12	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA
13	FILIPPE GRALHADO OLIVEIRA	SERVENTE
14	JOSÉ MARCELO ANDRADE	MESTRE DE OBRAS
15	JOSÉ RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
16	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
17	PAULO ROBERTO DA SILVA FREITAS	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
18	RAUDI RAFAEL MARTINEZ BENAVIDES	CARPINTEIRO
19	RONALDO LIBORIO MARTINS	PEDREIRO
20	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
21	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA
22	BENJAMIN LARANHAGA FILHO	ELETRICISTA
23	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVENTE
24	EDUARDO FONSECA BRAGA	OPERADOR DE BOMBA
25	LADISLAU JUSTO DO SANTOS FILHO	IMPERMEABILIZADOR
26	ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	CARPINTEIRO
27	CLEOMAR BATISTA MARQUES	SERVENTE
28	ELIZEU LIMA DA SILVA	SERVENTE
29	ERIVAN LOUREÇO MACHADO	PEDREIRO
30	JOSE VERA BARROS	OPERADOR DE BETONEIRA
31	JOSINALDO DA SILVA ALMEIDA	CARPINTEIRO
32	RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE	PEDREIRO

33	SAMUEL OLIVEIRA FELIX	SERVENTE
34	ANTONIO DIEGO DE SOUZA	SERVENTE

15.1 Relação dos colaboradores com a função na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).

Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO
1	DANIEL ASSIS CARNEIRO	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO	ELETRICISTA
3	GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ	ELETRICISTA
4	JESUS BENIGNO PRADO VELASQUEZ	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
5	SIMON HENRIQUE OLIVEROS LINARES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
6	JORGE LUIZ GOZALEZ LOPES	PEDREIRO

16.0 A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme tabela abaixo:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre da Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5

4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4
10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6

12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24
17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção

16.2 – Ocorrência 1: Operador de bomba com desvio de função, estava aplicando massa ACIII no 3º pavimento, não usava EPI apropriado para o serviço e o mesmo estava, em outras circunstâncias, retirando entulho, também sem EPI. Foi requisitado que o técnico de segurança do trabalho tomasse as devidas providências.



Ocorrência 2: Impermeabilizador subiu no reservatório superior se o EPI adequado, cinto de segurança com talabarte estava no corredor da área técnica, o técnico de segurança pediu para que o mesmo buscasse o EPI

Ocorrência 3: Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (4,98%), INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA (2,00%), INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (2,00%), CLIMATIZAÇÃO (2,00%) E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (0,41%). Totalizando 9,39%, não foram executados na 3ª medição ocasionando atraso e multa. Visto que a empresa não entregou o novo cronograma no tempo ágil, com isso vai ter que utilizar o cronograma da obra antigo.

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.

17.3 A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme MODELO de tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
02	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/ Colaborador	02	04
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	01	12
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				16
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: - 0,50%				

18.0 - ANEXOS DIÁRIOS DE OBRA

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	60
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	672	DATA	16/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 15/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 01 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de Tela Q 92 e emestramento - Local: Corredor do 3º pavimento (lado A). - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Sanitários. - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Montagem de bomba estacionaria com mangotes rígidos e flexíveis para concretagem do piso elevado do 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos Diário de Obra - Data: 16/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 01 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Execução de enchimento de piso - Lançamento de concreto usinado de 20Mpa - Local: Corredor do 3º pavimento (lado A). - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - OCORRÊNCIA: Durante o início da concretagem houve rompimento de um mangote, após correção retomamos a concretagem. Estamos a disposição para esclarecimentos					

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:14/03/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)

1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

1 MESTRE DE OBRA

3 PEDREIRO

1 ALMOXARIFE

1 CARPINTEIRO

9 SERVENTE

1 IMPERMEABILIZADOR

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 OPERADOR DE BOMBA

2 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO 3º PAVIMENTO NO CORREDOR, DA DIREITA PARA ESQUERDA

3.2 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.

4.0 – OCORRÊNCIAS:

SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

FOLHA

61

DATA

17/03/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:17/03/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)

1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

1 MESTRE DE OBRA

3 PEDREIRO

1 ALMOXARIFE

1 CARPINTEIRO

9 SERVENTE

1 IMPERMEABILIZADOR

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 OPERADOR DE BOMBA

2 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO 3º PAVIMENTO NO CORREDOR, DA DIREITA PARA ESQUERDA

3.2 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.

4.0 – OCORRÊNCIAS:

SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:17/03/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)

1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

1 MESTRE DE OBRA

3 PEDREIRO

1 ALMOXARIFE

1 CARPINTEIRO

9 SERVENTE

1 IMPERMEABILIZADOR

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 OPERADOR DE BOMBA

2 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO TERCEIRO PAVIMENTO;

3.2 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.

4.0 – OCORRÊNCIAS:

SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	62
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	670	DATA	18/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	63
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	669	DATA	19/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	64
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	668			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	20/03/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 20/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 01 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Sanitários - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 5000 da caixa d'agua superior. - Instalação de esgoto do 1º pavimento - Local Sanitário PCD. - OCORRÊNCIA: Foi identificado que o projeto de Instalação esgoto apresenta ponto para lavatório de canto, divergente do projeto de arquitetura que mostra ponto em uma parede para lavatório comum suspenso, a informação já foi passada ao fiscal. - Será analisado o projeto da escada enviado, pois houve uma pequena mudança no nível de piso acabado dos pavimentos. - Foi enviado a memória de calculo, relatório fotográfico e planilha da 2ª medição ao Fiscal, após as correções entre a contratante e a fiscalização. Estamos a disposição para esclarecimentos	

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:20/03/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)

1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO

1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

1 MESTRE DE OBRA

3 PEDREIRO

1 ALMOXARIFE

1 CARPINTEIRO

9 SERVENTE

1 IMPERMEABILIZADOR

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 OPERADOR DE BOMBA

2 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO 3º PAVIMENTO;

3.2 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA;

3.4 COLOCAÇÃO DE EPS/TELA E FALTANDO APLIAÇÃO DO CONCRETO NO 3º PAVIMENTO;

4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1 IMPERMEABILIZADOR

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 OPERADOR DE BOMBA

2 VIGIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO 3º PAVIMENTO;

3.2 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;

3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA;

3.4 COLOCAÇÃO DE EPS/TELA E FALTANDO APLIAÇÃO DO CONCRETO NO 3º PAVIMENTO;

4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdado

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	66
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	666	DATA	22/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 22/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 01 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Sanitários - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) e Tela Q92 - Local: Circulação do 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Está sendo realizado novo estudo das alturas de espelhos e piso da escada pela Contratada com objetivo de encontrar uma solução para escada existente executada com níveis e quantidades de degraus diferente do projeto. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:22/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 CARPINTEIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 OPERADOR DE BOMBA 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO 3º PAVIMENTO; 3.2 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO; 3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA; 3.4 COLOCAÇÃO DE ÉPS/TELA E FALTANDO APLIAÇÃO DO CONCRETO NO 3º PAVIMENTO; 3.5 TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO DO LAVATÓRIO DOS SANITÁRIOS 03 DO 3º PAVIMENTO, ANTES A TUBULAÇÃO SAIA DO LADO DA PORTA, AGORA SAIRÁ DA PAREDE ESQUERDA. 3.6 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NO PISO DO HALL DO 3º PAVIMENTO, DENTRO DO EPS. 4.0 – OCORRÊNCIAS: 4.1 OPERADOR DE BOMBA COM DESVIO DE FUNÇÃO, ESTAVA APLICANDO MASSA ACIII NO 3º PAVIMENTO, NÃO USAVA EPI APROPRIADO PARA O SERVIÇO E O MESMO ESTAVÁ, EM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS, RETIRANDO ENTULHO, TAMBÉM SEM EPI APROPRIADO. FOI REQUISITADO QUE O TÉCNICO TOMASSE AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	67
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	665			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	23/03/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 23/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 01 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 2º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Execução de enchimento de piso - Etapa Lançamento de concreto de 20Mpa - Local: Circulação do 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Devido a dificuldade do Estado RR no fornecimento do insumo de areia média durante o período de estiagem, o que torna mais difícil a aquisição de areia média a fina. Portanto houve a necessidade de reajuste do traço do concreto o que deixa com uma aparência de concreto pouco fluido menos argamassado, mas que não altera a Resistencia do concreto. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:23/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 CARPINTEIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 OPERADOR DE BOMBA 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO; 3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA; 3.3 CONCRETAGEM DO PISO EM EPS NO 3º PAVIMENTO; 3.4 TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO DO LAVATÓRIO DOS SANITÁRIOS 03 DO PCD DO 2º PAVIMENTO, ANTES A TUBULAÇÃO SAIA DO LADO DA PORTA, AGORA SAIRÁ DA PAREDE ESQUERDA. 4.0 – OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS: 4.1 O CONCRETO CHEGOU ENTRE 09:30 E 09:50; 4.2 O MANGUETE QUE LEVAVA CONCRETO PARA O 3º PAVIMENTO ENTUPIU 3 VEZES, PARALIZANDO A ATIVIDADE POR CERCA DE UMA HORA; 4.3 A USINA UTILIZOU BRITA 1 AO INVÉS DE BRITA 0 RESULTANDO EM ONDULAÇÕES NA SUPERFÍCIE, O QUE DIFICULTOU A CONCRETAGEM; 4.4 O CONCRETO QUE COBRIU O HALL ESTAVA MUITO AQUOSO, A EQUIPE TEVE QUE ESPERAR ELE SECAR POR CERCA DE UMA HORA PARA PODER FAZER O NIVELAMENTO E ACABAMNETO DELE; 4.5 FALTOU O COBRIR A LIGAÇÃO ENTRE O HALL, O CORREDOR E A CIRCULAÇÃO ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	68
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	664	DATA	24/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 24/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 01 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 1º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Execução de enchimento de piso - Etapa Lançamento de concreto de 20Mpa - Local: Térmico da Circulação do 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:24/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 CARPINTEIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 OPERADOR DE BOMBA 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO; 3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA; 3.3 CONCRETAGEM DO PISO EM EPS NO 3º PAVIMENTO; 3.4 TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO DO LAVATÓRIO DOS SANITÁRIOS 03 DO PCD DO 2º PAVIMENTO, ANTES A TUBULAÇÃO SAIA DO LADO DA PORTA, AGORA SAIRÁ DA PAREDE ESQUERDA. 4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS: 4.1 IMPERMEABILIZADOR SUBIU O RESERVATÓRIO SUPERIOR SEM O EPI ADEQUADO, CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE ESTAVA NO CORREDOR DA ÁREA TÉCNICA, O TÉCNICO DE SEGURANÇA PEDIU PARA QUE O MESMO BUSCASSE 4.2 FORA OBSERVADO QUE A EXECUÇÃO ANTERIOR DE HIDRÁULICA DOS SANITÁRIO 03 PCD DE TODOS OS PAVIMENTOS ESTÁ EM DESACORDO COM O PROJETO, FAZENDO NECESSÁRIA A MUDANÇA DO SISTEMA ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	69
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	663	DATA	25/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	70
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	662	DATA	26/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	71
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	661			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	27/03/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 27/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almojarife 02 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Banheiros das salas - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º e 1º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) e Tela Q92 - Local: Corredor do 2º pavimento (lado A e B). - OCORRÊNCIA: Foi solicitado orientações ao fiscal sobre a impermeabilização do rufo da cobertura do lado B, devido o projeto executivo não apresentar corte nessa área da cobertura, apesar do projeto ter um corte de uma área similar o Fiscal optou por aguardar a visita do membros técnicos que ocorrerá amanhã dia 28/03/2023 para tirar as dúvidas. Foi paralisado o serviço da realocação dos ralos dos banheiros dos pavimentos, já aprovado anteriormente pelo Fiscal. O fiscal optou também por esperar a reunião para tomada de decisão. Foi solicitado ao Fiscal projeto da cobertura metálica da área técnica. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:27/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 CARPINTEIRO 9 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 OPERADOR DE BOMBA 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO; 3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA; 3.3 COLOCAÇÃO DE TELA PARA RECEBIMENTO DE CONCRETO SOBRE O EPS DO 2º PAVIMENTO E COLOCAÇÃO DE EPS NO 2º PAVIMENTO (CORREDOR) 3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO 3º PAVIMENTO 4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cfc3004.a46afe83.2b0cdad0

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	72
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	660	DATA	28/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 28/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 03 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 3º pavimento - Local: Banheiros das salas - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º e 1º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) e Tela Q92 - Local: Corredor do 2º pavimento (lado A e B). - Chapisco e reboco de pilares da platibanda/ cobertura metálica lado B. - OCORRÊNCIA: Visita da equipe técnica da engenharia e arquitetura da SEA e do responsável Técnico Jose Nasser e Marcos Fernandes. Foi apontado e esclarecidos diversos pontos. - Foi solicitado pela Contratada uma análise da execução do porcelanato diretamente sobre o piso de concreto elevado com EPS, no qual foi identificado que a regularização do concreto não está satisfatória, devido a dificuldade local da usina no fornecimento dos insumos como Brita 0 e Areia fina, necessários para que argamassa fique mais homogênea e assim seja possível fazer uma adequada regularização do concreto. Neste caso solicitamos uma avaliação para a execução de contrapiso de regularização para aplicação do porcelanato. Estamos a disposição para esclarecimentos					

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/va11idacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:28/03/2023					
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:					
GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.					
1.0 - EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO				FOLHA	73
1.1 - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					
MESTRE DE OBRA J NASSER ENGENHARIA LTDA					
3.0 - PEDREIRO	05-2022	DIAS FALTANTES	659	DATA	29/03/2023
1.0 - ALMOXARIFE	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		
3.0 - CARPINTeiro					
9.0 - SERVENTE					
1.0 - IMPERMEABILIZADOR					
01 - Eletricista Data: 29/03/2023					
1.0 - BOMBEIRO HIDRÁULICO					
1.0 - OPERADOR DE BOMBA					
2.0 - VIGIA					
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM					
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:					
3.1 - RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
3.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RUFO DA COBERTURA;					
3.3 - COBERTURA DE TELA PARA RECEBIMENTO DE CONCRETO SOBRE O EPS DO 2º PAVIMENTO E COLOCAÇÃO DE EPS NO 2º PAVIMENTO DO CORREDOR					
3.4 - DEMOLIÇÃO DE 400 2º PAVIMENTO DO SANITÁRIO 4;					
3.5 - INSTALAÇÃO DE IUMINAÇÃO PROVISÓRIA NO CANTEIRO DE OBRA NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;					
3.6 - CHAPISCO E RECOCO DE PILARES DO PLATIBANDA/COBERTRA METÁLICA LADO B .					
03 - Pedreiro					
09 - Servente					
01 - Bombeiro Hidráulico					
01 - Impermeabilizador					
01 - Eletricista					
02 - Operador de BOMBA					
02 - Vigia					
01 - MESTRE DE OBRA					
01 - ALMOXARIFE					
03 - CARPINTeiro					
09 - SERVENTE					
01 - IMPERMEABILIZADOR					
01 - ELETRICISTA					
01 - BOMBEIRO HIDRÁULICO					
01 - OPERADOR DE BOMBA					
2 VIGIA					
- SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Retirada de entulho decorrente da demolição da alvenaria e piso de concreto do 3º e 1º pavimento.					
- Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior.					
- Execução de enchimento de piso - Etapa Lançamento de concreto de 20Mpa - Local: Corredor do 2º pavimento (lado A).					
- Chapisco e reboco de pilares da platibanda/ cobertura metálica lado B.					
- OCORRÊNCIA: visita da equipe técnica da engenharia e arquitetura da SEA e do responsável Técnico Jose Nasser e Marcos Fernandes.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:29/03/2023					
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:					
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)					
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO					
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES					
1 MESTRE DE OBRA					
3 PEDREIRO					
1 ALMOXARIFE					
3 CARPINTEIRO					
9 SERVENTE					
1 IMPERMEABILIZADOR					
1 ELETRICISTA					
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO					
1 OPERADOR DE BOMBA					
2 VIGIA					
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:					
3.1 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;					
3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ;					
3.3 CONCRETAGEM SOBRE O PISO EPS DO 2° PAVIMENTO NO CORREDOR LADA A					
3.4 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITARIO 3° PAVIMENTO. (PONTO DO LAVATÓRIO).					
3.5 CHAPISCO E REBOCO DOS PILARES DO PLATIBANDA DA COBERTURA METÁLICA.					
4.0 - OCORRÊNCIAS:					
4.1 VISITA TÉCNICA DO PESSOAL SEA DA ENGENHARIA E ARQUITETURA E OS REPRESENTANTE DA J. NASSER;					
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS					

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	74
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	658	DATA	30/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 30/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Almoxarife 03 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 09 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 01 - Betoneiro 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto do 3º e 1º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) e Tela Q92 - Local: Corredor do 2º pavimento (lado B). - Corte em alvenaria da platibanda para para ancoragem da manta asfáltica da cobertura metálica lado B. - Instalações de águas pluviais do Térreo. - OCORRÊNCIA: Visita da equipe técnica da engenharia e arquitetura da SEA e do responsável Técnico Jose Nasser e Marcos Fernandes. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:30/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 3 CARPINTEIRO 9 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 OPERADOR DE BOMBA 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO; 3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ; 3.3 COLOCAÇÃO DE EPS E TELA NO 2º PAVIMENTO NO HALL; 3.4 INSTALAÇÕES DE PONTO DE ÁGUA PLUVIAL NO TÉRREO. 3.5 PLATIBANDA DA COBERTURA METÁLICA CORTE DA AVENARIA PARA APLICAÇÃO MANTA IMPERMEÁVEL. 4.0 - OCORRÊNCIAS: 4.1 VISITA TÉCNICA DO PESSOAL SEA DA ENGENHARIA E ARQUITETURA E OS REPRESENTANTE DA J. NASSER; ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/va11dacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	75
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	657	DATA	31/03/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 31/03/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de Obra 01 - Almoxarife 03 - Carpinteiro 03 - Pedreiro 12 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 01 - Betoneiro 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Remoção de entulho decorrente da demolição de alvenaria e piso de concreto 2º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Execução de enchimento de piso - Etapa Lançamento de concreto de 20Mpa - Local: Corredor do 2º pavimento (lado B) e Circulação. - Corte em alvenaria da platibanda para para ancoragem da manta asfáltica da cobertura metálica lado B. - Instalações de águas pluviais do Térreo. - OCORRÊNCIA: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:31/03/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 3 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 3 CARPINTEIRO 9 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 OPERADOR DE BOMBA 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO; 3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ; 3.3 CONCRETAGEM DOS CORREDORES E HALL DO 2º PAVIMENTO 3.4 INSTALAÇÕES DE PONTO DE ÁGUA PLUVIAL NO TÉRREO. 3.5 PLATIBANDA DA COBERTURA METÁLICA CORTE DA AVENARIA PARA APLICAÇÃO MANTA IMPERMEÁVEL. 4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	76
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	656	DATA	01/04/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	77
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	655	DATA	02/04/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	78
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	654			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	03/04/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 03/04/2023 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de Obra 01 - Almoxarife 03 - Carpinteiro 05 - Pedreiro 12 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 01 - Betoneiro 02 - Vigia - SERVIÇOS EXECUTADOS - Remoção de entulho decorrente da demolição de piso de concreto 2º pavimento. - Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior. - Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) e Tela Q92 - Local: Corredor do 1º pavimento (lado A). - Corte em alvenaria da platibanda para para ancoragem da manta asfáltica da cobertura metálica lado B. - Instalações de águas pluviais do 3º pavimento. - OCORRÊNCIA: Reunião com os Fiscais do Setor de Contrato e Administrativo. O projeto de impermeabilização das áreas técnicas do ar condicionados apresenta impermeabilização em áreas específicas da sala. O fiscal vai verificar e nos passar qual área a executar. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:03/04/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 5 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 3 CARPINTEIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 OPERADOR DE BOMBA 2 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO; 3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA; 3.3 COLOCAÇÃO DE EPS E TELA NO 1º PAVIMENTO; 3.4 INSTALAÇÕES DE PONTO DE ÁGUA PLUVIAL NO 3º PAVIMENTO. 3.5 PLATIBANDA DA COBERTURA METÁLICA CORTE DA AVENARIA PARA APLICAÇÃO MANTA IMPERMEÁVEL. 3.6 DEMOLIÇÃO SANITÁRIO 05 DO 2º PAVIMENTO 4.0 - OCORRÊNCIAS: 4.1 VISITA TÉCNICA DO PESSOAL PR/RR DO SETOR DE CONTRATO E ADMINISTRATIVO; 4.2 O PROETO DE IMPERMEABOLIAÇÃO DAS ÁREA TÉCNICAS DOS AR CONDICIONADOS REVER COM ENGENHARIA MECÂNICA PARA QUE POSSA EXECUTAR DE ACÓRDO COM AS ESPECIAÇÕES TÉCNICA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	79
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	653	DATA	04/04/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 04/04/2023	
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):	
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM	
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):	
01 - Engenheira Civil	
01 - Técnico em Segurança do Trabalho	
01 - Técnico em Edificações	
01 - Mestre de Obra	
01 - Almoxarife	
03 - Carpinteiro	
05 - Pedreiro	
12 - Servente	
01 - Bombeiro hidráulico	
01 - Impermeabilizador	
01 - Eletricista	
01 - Operador de bomba de concreto	
01 - Betoneiro	
02 - Vigia	
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA	
01 - Engenheiro Eletricista	
02 - Eletricista	
- SERVIÇOS EXECUTADOS	
- Remoção de entulho decorrente da demolição de piso de concreto 2º pavimento.	
- Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior.	
- Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) e Tela Q92 - Local: Corredor do 1º pavimento (lado A) e circulação dos WC's.	
- Chapisco e reboco da platibanda para para ancoragem da manta asfáltica da cobertura metálica lado B.	
- Instalações de águas pluviais.	
- OCORRÊNCIA: De acordo com o projeto 06 de hidráulica que consta que toda rede será remanejada para o fundo (SOB) da laje do 3º. Ficou acordado com o Fiscal que será remanejando apenas a rede que esta na área técnica (aparente), permanecendo a rede existente sob os telhados da coberturas.	
Estamos a disposição para esclarecimentos	

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO				
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:04/04/2023				
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA JUNASSER ENGENHARIA LTDA				
3.0 - HISTÓRIA DA OBRA: ENGENHEIRA CIVIL DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
4.0 - CONDIÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			FOLHA	80
5.0 - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES				
EMPRESA JUNASSER ENGENHARIA LTDA				
6.0 - MESTRE DE OBRA		05-2022	DIAS FALTANTES	652
7.0 - CONTRATO		16/01/2023	PRAZO	15/01/2025
8.0 - INDIQUE OXARIFE		DATA		05/04/2023
3 CARPINTEIRO				
12 SERVENTE				
RELATÓRIO DA CONTRATADA				
1 IMPERMEABILIZADOR				
01 - Eletricista Data: 05/04/2023				
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO				
1 OPERADOR DE BOMBA (TEMPO):				
2 VIGIA				
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM				
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA				
2.2- RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):				
2 ENGENHEIRO ELETRICISTA				
2 ELETRICISTA				
01 - Engenheira Civil				
01 - Técnico em Segurança do Trabalho				
01 - Técnico em Edificações				
01 - Mestre de Obra				
02 - Instalação de entulho devido a demolição;				
02 - Instalações de ponto de água pluvial no 3º pavimento;				
03 - Platibanda da cobertura metálica corte da avenaria para aplicação manta impermeável;				
04 - Demolição piso do 2º pavimento;				
12 - Colocação de tela no 1º pavimento para receber concreto;				
06 - Demolição do piso do térreo para passagem de águas pluviais;				
07 - Colocação de chapisco e reboco no corte da platibanda;				
01 - Eletricista				
01 - Operador de bomba de concreto				
01 - Ocorrência				
02 - Vigia				
2.4 - SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA				
ESTAMOS A SUAS DISPOSIÇÕES PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS				
01 - Engenheiro Eletricista				
02 - Eletricista				
Fiscalização		Contratada		
- SERVIÇOS EXECUTADOS				
- Remoção de entulho decorrente da demolição de piso de concreto 2º pavimento.				
- Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior.				
- Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) - Local: Hall do 1º pavimento.				
- Execução de enchimento de piso - Etapa Lançamento de concreto de 20Mpa - Local: Corredor do 1º pavimento (lado A) e Circulação dos WC's.				
- Chapisco e reboco dos pilares da platibanda da cobertura metálica lado B.				
- Instalações de águas pluviais.				
- OCORRÊNCIA: Sem ocorrência				
Estamos a disposição para esclarecimentos				
RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO				

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	81
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	651			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	06/04/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 06/04/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):
01 - Engenheira Civil
01 - Técnico em Segurança do Trabalho
01 - Técnico em Edificações
01 - Mestre de Obra
01 - Almoxarife
03 - Carpinteiro
05 - Pedreiro
12 - Servente
01 - Bombeiro hidráulico
01 - Impermeabilizador
01 - Eletricista
01 - Operador de bomba de concreto
01 - Betoneiro
02 - Vigia

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA
01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista

- SERVIÇOS EXECUTADOS

- Remoção de entulho decorrente da demolição de piso de concreto 2º pavimento.
- Impermeabilização com aplicação de Viaplus 1000 e 5000 da caixa d'agua superior.
- Execução de enchimento de piso - Contrapiso com argamassa para acabamento - Local: Corredor do 2º pavimento (lado A)
- Instalação elétrica - Infraestrutura de piso do 1º pavimento.
- Chapisco e reboco dos pilares da platibanda da cobertura metálica lado B.
- Instalações de águas pluviais.
- Retirada de infraestrutura de elétrica.

- OCORRÊNCIA: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	82
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	650			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	07/04/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	83
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	649	DATA	08/04/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA		EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE					FOLHA	84
EMPRESA		J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	648			
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	09/04/2023	

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	85
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	647	DATA	10/04/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 10/04/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil 01 - Técnico em Segurança do Trabalho 01 - Técnico em Edificações 01 - Mestre de Obra 01 - Almoxarife 03 - Carpinteiro 05 - Pedreiro 12 - Servente 01 - Bombeiro hidráulico 01 - Impermeabilizador 01 - Eletricista 01 - Operador de bomba de concreto 01 - Betoneiro 02 - Vigia 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais - SERVIÇOS EXECUTADOS - Remoção de entulho decorrente da demolição de piso de concreto 2º pavimento. - Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 2º pavimento . - Execução de enchimento de piso - Contrapiso com argamassa para acabamento - Local: Corredor do 2º pavimento (lado B) - Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) e Tela Q92 - Local: Hall do 1º pavimento e corredor lado B. - Chapisco e reboco dos pilares da platibanda da cobertura metálica lado B. - Retirada de infraestrutura de elétrica. - OCORRÊNCIA: Projeto de elétrica: Detalhe do conector para tubulação Sealtube é com box reto, porém existe no mercado conector especifico para esse tipo tubulação. O fiscal fará uma avaliação de qual conector será dotado, tendo em vista a planilha orçamentaria não especificar nenhum dos dois tipos de conectores. Estamos a disposição para esclarecimentos	

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:13/04/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA.

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	CONSTRUTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)		FOLHA	89	
1.0	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO				
1.0	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	643		
DATA	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	14/04/2023

1 ALMOXARIFE

3 CARPINTEIRO

RELATÓRIO DA CONTRATADA

12 SERVENTE

13 IMPERMEABILIZADOR

14 14/04/2023

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO (TEMPO):

1 OPERADOR DE BOMBA

1 Vigia Tarde: Tempo com Sol - BOM

2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA

01 Técnico em Eletrotécnico

01 Técnico em Segurança do Trabalho

01 Técnico em Edificações

01 Aux. de obra

01 Aut. de SERVIÇO GERAL

01 - Almoxtarife

03 - Atividades REALIZADAS:

05 - Pedreiro

12 - Servente

13 - Retirada DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;

02 - CONCRETO DE PISO E TELA NO TÉRREO;

03 - Impermeabilização

03 - Aplicação DE CHAPISCO E REBOCO NO PLATIBANDA DA COBERTURA;

04 - Retirada DE INSTALAÇÕES EXISTENTES;

05 - Instalação DE FUMOS DE ELÉTRIC

05 - Instalações HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL.

02 - Vigia

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMOTICA

01 - Engenheiro Eletricista

02 - Eletricista

01 - Pedreiro

01 - Aux. de serviços gerais

Fiscalização

Contratada

- SERVIÇOS EXECUTADOS

- Remoção de entulho decorrente da demolição de piso de concreto 1º pavimento.

- Demolição de piso em concreto existente, quais estavam acima da cota de piso acabado do 1º pavimento.

- Execução de enchimento de piso - Etapa Lançamento de concreto de 20Mpa- Foyer - Térreo.

- Chapisco e reboco dos pilares da platibanda da cobertura metálica lado B.

- Retirada de infraestrutura de elétrica.

- Aplicação de primer em platibanda para impermeabilização de rufo.

- Instalações hidrossanitária.

- OCORRÊNCIA: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / PELA TARDE. DATA:14/04/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA.

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.			FOLHA	90
CONSTRUTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)					
CONTRATANTE					
EMPRESA	EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONSTRUTORA DA OBRA	05-2022	DIAS FALTANTES	642		
PROF. PEDREIRO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	15/04/2023

1 ALMOXARIFE

3 CARPINTEIRO

12 SERVENTE

1 IMPERMEABILIZADOR

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 OPERADOR DE BOMBA

2 VIGIA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA

1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO

2 ELETRICISTA

1 PEDREIRO

1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;

3.2 CONCRETAGEM DE EPS NO PAVIMENTO TÉRREO

3.3 APLICAÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO NO PLATIBANDA DA COBERTURA;

3.4 RETIRADA DE INSTALAÇÕES EXISTENTES;

3.5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

about:blank

90/90

Assinado com login e senha por MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, em 17/04/2023 11:16. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaoodocumento>. Chave 5bba5226.2cf63004.a46afe83.2b0cdad0





Enchimento EPS - 3ª medição



Demolição de concreto - 3ª medição

