



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE**

ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA/PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DA NOVA SEDE PR-RR

CONTRATO Nº 05/2022



RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 05/2023

INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 16 de janeiro de 2023

PERÍODO DO RELATÓRIO: De 16 de maio até 19 de junho de 2023, serviço previsto para a quinta medição: (Foram executados os serviços de infraestrutura elétrica, combate á incêndio, impermeabilização e alvenaria).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF

Nome: Eng. Jardel Pereira de Lira

Telefone: (95) 99112-9612

E-mail: jardel@mpf.mp.br

1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)

Nome: Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva
Madureira

Portaria: SE/PR-RR nº 02/2023

Telefone: (95) 3198-2025 / 2073

E-mail: prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br

2.0 - ESCOPO E LOCAL

DADOS DO CONTRATO

Nº Contrato: 05/2022 **PPA/LOA:** AÇÃO 110E

Alvará: nº 00297/2023 | Válido Até 20/09/2024

Empresa Contratada: J. NASSER ENGENHARIA LTDA CNPJ 04.618.096/0001-07

Matrícula CNO da Obra: 90.013.62702/78

Valor Atual do Contrato: R\$ 31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Percentual de Reajuste: 6.0%

Saldo de Empenho: 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022

Local/UF: Boa Vista – RR

Responsável Técnico: José Nasser – ART de Execução: RR20230111507

Corresponsável Técnico: Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835

Valor da Medição da 5ª Parcela: R\$ 408.692,13 (quatrocentos e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos)

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
3	1,16%	0,75%	1,40%	1,25%
4	0,88%	0,66%	1,93%	1,91%
5	1,64%	1,29%	3,57%	3,21%
TOTAL EXECUTADO				3,21%
TOTAL A EXECUTAR				96,79%

Identificação processo de fiscalização: 1.32.000.000464/2022-71

Tipo de obra: Prédio Público.

Objeto da fiscalização: Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Período abrangido pela fiscalização: 16/05/2023 a 19/06/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)

3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a Serviço de demolição de parede, serviço de demolição de piso em concreto, alvenaria/chapisco/emboço/reboco, instalações hidrossanitárias, instalação de dreno de ar condicionado, instalação de água fria, instalação de incêndio, instalações de infra de elétrica como interruptor e tomada baixa ou alta, impermeabilização de áreas molhadas, aplicação de selador e massa latéx em paredes, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados). Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Não há constatações negativas para o período

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

- A) Troca de telhas das cobertura devido a vazamentos, seja pelos tubos de ventilação, furos nas calhas das telhas e diversos amassados;
- B) Os degraus do auditório estavam em desacordo com o projeto, fazendo-se necessárias adaptações para que ele ficasse mais próximo ao projeto;
- C) Foi acordado que os pontos de ancoragem da cobertura serão executados com chumbadores químicos;
- D) Foi acordado que os peitoris, lavatórios, bancadas e divisórias dos banheiros serão de granito cinza andorinha, soleiras serão de granito branco e os detalhes das fachadas vão ser em granito preto “São Gabriel”;
- E) Alguns pilares e vigas estavam com o reboco oco, fazendo-se necessário a demolição do reboco antigo e execução de um novo;
- F) As proteções mecânicas das coberturas estão comprometidas, seja por falta de dobra da manta ou deslocamento do reboco- Hall de entrada, área do foyer/camarim/hall do auditório, marquise lateral, dos fundos, da entrada “L” e da área técnica “ Antenas/Equipamentos”.

6.0 – CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo o aqui exposto, conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.

7.0 – ANEXOS

- a) Relatório fotográfico do período

8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 22 de junho de 2023

9.0 - FÉ DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

Declaramos que as metas estabelecidas na 5ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico-Financeiro foram atendidas.

Assinado Eletronicamente

Jardel Pereira de Lira

Membro da Comissão Portaria SE PR-RR nº 02, de 09 de janeiro de 2023

Eng. Civil / ART RR20160019649 / Matrícula 23815



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

**RELATÓRIO TÉCNICO
MEDIÇÃO 5º**

11.0 A quinta medição foi efetuada pelo fiscal da obra, engenheiro civil da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Jardel Pereira de Lira, matrícula 23,815, no dia 20/06/2023.

11.1 Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado <i>in loco</i>	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,50%	1,71%		X
ESTRUTURAS DE CONCRETO				
GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS	6,87%	10,23%		X
ARQUITETURA				
VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS, ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	2,58%	3,54%		X
IMPERMEABILIZAÇÃO				
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	24,79%	25,56%		X
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				
ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO	8,75%	1,32%	X	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E SPRINKLERS	5,00%	5,96%		X
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				
SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDAE ATERRAMENTO	4,00%	2,80%	X	
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV,	1%	0,01%	X	
CLIMATIZAÇÃO				
ÁGUA GELADA, VRF, SPLIT, VENTILAÇÃO MECÂNICA-, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS, LIGACÕES E DUTOS DE AR	2,50%	0,28%	X	
SERVIÇOS GERAIS				
TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO	30,92%	38,57%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA	3,57%	3,21%	X	

12.0 Segue abaixo a planilha contendo o resumo dos serviços efetivamente realizados e pactuados para finalização do contrato nº 05/2022.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PR-RR-00016742/2023 - RELATÓRIO TÉCNICO

Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 1

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[1.A- Relatório Técnico 5ª Medição Obra Nova Sede.docx](#)

14-0 Controle de retirada de entulho na obra

DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA DA RETIRADA DO ENTULHOS DA OBRA
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	12/05/23 Recibo 0000673
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	19/05/23 Recibo 000724
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	30/05/23 Recibo 000829
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	07/06/23 Recibo 000914

15-0 Relação dos colaboradores com a função na empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO
1	ALCIDES NOGUEIRA SENA NETO	AUX. ADMINISTRATIVO
2	ALEXANDRE SEVERINO DA SILVA AMORIM	PEDREIRO
3	ALESSANDRO SOARES LIMA	TEC. DE EDIFICAÇÕES
4	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
5	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
6	ANANIAS VIEIRA DA SILVA	SERVENTE
7	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
8	ANTONIES DIEGO DE SOUZA CORDEIRO	SERVENTE
9	ANTONIO ALDO SAMPAIO NUNES	PEDREIRO
10	ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	CARPINTEIRO
11	BENJAMIN LARANHAGA FILHO	ELETRICISTA
12	BRUNO SILVA CASTRO	SERVENTE
13	CLEDEILTON LOPES AGUIAR	SERVENTE
14	DARLISON COSMOS PENA	BOMBEIRO HIDRAULICO
15	DAVISON ROZARIO SANTIAGO	IMPERMEABILIZADOR
16	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA

17	DIEGO SIMAO BURUM	SERVENTE
18	ELEN MARCIO RIBEIRO MAFRA	SERVENTE
19	ELIZEU LIMA DA SILVA	SERVENTE
20	ERIVAN LOURENÇO MACHADO	PEDREIRO
21	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA
22	FELIPE GRALHADA OLIVEIRA	SERVENTE
23	FRANCISCO EMICIO	BOMBEIRO HIDRAULICO
24	GILVAN LEITE RIBEIRO	PEDREIRO
25	IGOR ANTONIO PINO PINO	PINTOR
26	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVENTE
27	JOSE MARCELO ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR	MESTRE DE OBRAS
28	JOSE RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
29	JOSÉ VERAS BARROS	OP. BETONEIRA
30	JOSINALDO DA SILVA ALMEIDA	CARPINTEIRO
31	JUVENAL GUILHERME SOBRINHO	CALDEIREIRO
32	LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA	ALMOXARIFE
33	MARLON BORGES PEREIRA	TECNICO DE SEGURANÇA
34	MOISES FERREIRA CHAVES	CARPINTEIRO
35	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
36	PAULO ROBERTO	TEC. DE EDIFICAÇÕES
37	RAIMUNDO GERALDO PEREIRA MOREIRA	PINTOR
38	RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE	PEDREIRO
39	RAUDI RAFAEL MARTINES	CARPINTEIRO

40	RONNY DE SOUZA ANICETO	SERVENTE
41	SERGIO GOMES DA SILVA	SERVENTE
42	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
43	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA

15.1 Relação dos colaboradores, com a função, na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).

Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO
1	DANIEL ASSIS CARNEIRO	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO	ELETRICISTA
3	GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ	ELETRICISTA
4	JORGE LUIZ GOZALEZ LOPES	PEDREIRO
5	RIBAMAR SILVA SANTANA	ELETRICISTA
6	ROMÁRIO DA SILVA BENTO	ELETRICISTA
7	SIMON ENRIQUE OLIVEROS LINARES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
8	FABIO VIEIRA DA SILVA	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

15.2 Relação dos colaboradores, com a função, na empresa FERREIRA & FERREIRA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Nº	COLABORADOR	FUNÇÃO
1	ALLAN GUIMARÃES FARIAS	AUXILIAR DE FUNILARIA
2	SAMUEL LOBATO	FUNILEIRO
3	LUIZ MIGUEL MAURERA	AUXILIAR DE FUNILARIA
4	MIGUEL ALEXANDER JIMENES RIVAS	AUXILIAR DE FUNILARIA

16.0 A faixa de ajuste no pagamento será definida pela soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período de avaliação, conforme tabela abaixo:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre da Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5
4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4
10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4

11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6
12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24
17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.

17.3 A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme a tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
0			0	0
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				0
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: 0,0%				

18.0 - ANEXOS DIÁRIOS DE OBRA

Item	Descrição	Unid.	MEDIÇÃO ACUMULADA			QUANTITATIVOS	EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS		
			%	Quantidade	Valor com BDI	Finais para avaliação	Mês 5		
							Medição Unitária	% executado	Valor com BDI
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS								
1.2	CANTEIRO DE OBRA			0,00					
1.2.1	ADEQUAÇÃO, REFORMA/ADEQUAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE	M2	100,00%	200,00	54.762,00	200,00	4	1,82%	993,93
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			0,00					
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	M3	55,55%	20,21	1.078,81	36,38	5	12,64%	245,55
1.4	PROTEÇÃO			0,00					
1.4.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA PROTEÇÕES - ROLO DE 4X100M - 80 MICRAS	M2	12,98%	415,33	1.245,99	3200,00	415	12,98%	1.245,99
	Subtotais								2.485,47
2.	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS								0,00
2.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00				0,00
2.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	4,84%	31,00	608,22	640,00	7	1,02%	127,53
2.1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	M/MÊS	22,66%	145,00	2.246,05	640,00	65	10,16%	1.006,85
	Subtotais								1.134,38
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO			0,00	0,00				0,00
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO - GRADIL			0,00	0,00				0,00
4.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, PILARES, BALDRAMES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	7,66%	7,97	748,22	104,00	8	7,66%	748,22
4.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	13,14%	1,55	2.074,38	11,80	2	13,14%	2.074,38
4.5.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	71,43%	15,00	1.051,80	21,00	6	28,57%	420,72
4.5.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	UN	100,00%	6,00	673,98	6,00	6	100,00%	673,98
4.5.8	RETIRADA DA INFRAESTRUTURA DE TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO/ELETRICA	M	98,06%	2.537,77	28.118,49	2.588,00	345	13,32%	3.819,50
	Subtotais								7.736,80
5.	ARQUITETURA			0,00	0,00				0,00
5.1	VEDAÇÕES			0,00	0,00				0,00
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO).	M²	38,92%	141,67	13.277,31	364,00	75	20,59%	7.022,44
5.2	PISOS			0,00	0,00				0,00
5.2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M²	75,18%	473,66	29.873,74	630,00	474	75,18%	29.873,74
5.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS			0,00	0,00				0,00
5.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAÓS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	61,61%	484,52	3.987,60	786,47	206	26,15%	1.692,66
5.3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM	M²	56,80%	460,90	19.551,38	811,47	290	35,78%	12.317,92
5.5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M²	100,00%	352,00	38.149,76	352,00	352	100,00%	38.149,76
5.8	PINTURA			0,00	0,00				0,00
5.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M²	1,58%	178,92	2.953,97	11.292,52	179	1,58%	2.953,97

5.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	8,66%	917,22	2.439,81	10.594,50	917	8,66%	2.439,81
5.8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M²	0,44%	26,44	651,75	5.973,00	26	0,44%	651,75
Subtotais									95.102,04
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00	0,00				0,00
6.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	6,51%	57,07	3.202,20	876,82	57	6,51%	3.202,20
6.1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	11,32%	186,35	598,18	1.645,68	186	11,32%	598,18
6.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	28,21%	592,54	34.716,92	2.100,40	319	15,16%	18.661,50
6.1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM RESINA TERMOPLÁSTICA COM FIBRAS REF.: VIAPLUS 7000	M²	76,16%	318,51	22.620,58	418,21	319	76,16%	22.620,58
Subtotais									45.082,46
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS			0,00	0,00				0,00
7.1	ÁGUA FRIA			0,00	0,00				0,00
7.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,23%	75,80	2.137,56	357,00	4	1,12%	112,80
7.1.7	SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	97,22%	70,00	1.911,00	72,00	40	55,56%	1.092,00
7.1.8	SUORTE PARA TUBOS/ DUTOS E/OU ELETROCALHAS VERTICAIS (CHUMBADORES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00%	7,00	351,75	20,00	7	35,00%	351,75
7.1.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00%	0,00	0,00	1,00			0,00
7.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00%	1,00	42,06	1,00	1	100,00%	42,06
7.2	ESGOTO SANITÁRIO			0,00	0,00				0,00
7.2.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,78%	73,25	2.875,06	160,00	56	34,91%	2.192,11
7.2.10	SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,56%	58,00	1.583,40	72,00	58	80,56%	1.583,40
Subtotais									5.374,12
8.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			0,00	0,00				0,00
8.5	HIDRANTES			0,00	0,00				0,00
8.5.3	PINTURA DE TUBOS / ELETRODUTOS COM ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	61,46%	238,30	1.823,00	387,71	238	61,46%	1.823,00
8.6	SPRINKLERS			0,00	0,00				0,00
8.6.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19,44%	145,40	20.025,94	748,00	145	19,44%	20.025,94
8.6.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,71%	4,40	723,58	28,00	4	15,71%	723,58
8.6.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	74,27%	22,28	4.081,92	30,00	22	74,27%	4.081,92
8.6.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,41%	4,15	1.010,15	17,00	4	24,41%	1.010,15

8.6.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	49,61%	54,07	15.835,48	109,00	54	49,61%	15.835,48
8.6.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00%	45,00	15.912,45	45,00	45	100,00%	15.912,45
8.6.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	58,91%	18,85	8.660,63	32,00	19	58,91%	8.660,63
8.6.10	SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00%	104,00	2.839,20	104,00	104	100,00%	2.839,20
8.6.11	SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 4" E 8" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,99%	7,00	239,75	351,00	7	1,99%	239,75
Subtotais									71.152,10
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA			0,00	0,00				0,00
9.3	INFRAESTRUTURA			0,00	0,00				0,00
9.3.1	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 50 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,42%	225,48	21.553,63	1.373,00	206	15,02%	19.706,83
9.3.2	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 100 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,70%	151,45	17.580,32	698,00	98	13,98%	11.327,09
9.3.4	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 150 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,74%	77,28	10.851,66	491,00	77	15,74%	10.851,66
9.3.5	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 250 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,46%	82,73	15.496,98	325,00	83	25,46%	15.496,98
9.3.8	SUPORTE PARA TUBOS/ DUTOS/ ELETROCALHA HORIZONTAIS (CHUMBADORES, TIRANTES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,12%	450,00	30.955,50	1.319,00	450	34,12%	30.955,50
9.3.12	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSAO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,69%	290,00	14.088,20	3.773,00	131	3,47%	6.357,18
9.3.13	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSAO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 25 (1") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,85%	76,05	4.488,47	1.975,00	76	3,85%	4.488,47
9.3.18	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES, CONTRAPISOS, DIVISÓRIAS E OUTROS ELEMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7,22%	100,18	1.075,93	1.388,00	100	7,22%	1.075,93
9.3.22	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,56%	767,53	20.232,09	3.734,00	768	20,56%	20.232,09
9.3.23	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	9,91%	127,00	5.708,65	1.282,00	53	4,13%	2.382,35
9.3.24	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	6,74%	25,00	1.256,50	371,00	25	6,74%	1.256,50
9.3.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,06%	161,00	2.672,60	554,00	85	15,34%	1.411,00
Subtotais									125.541,59
12.	CLIMATIZAÇÃO			0,00	0,00				0,00
12.9	DUTOS DE AR			0,00	0,00				0,00
12.9.2	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #22	M²	2,62%	9,63	2.025,38	367,19	10	2,62%	2.025,38

12.9.3	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #24	M²	1,53%	34,87	6.328,56	2.282,42	35	1,53%	6.328,56
12.9.4	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #26	M²	7,64%	29,34	4.016,65	384,25	29	7,64%	4.016,65
	Subtotais								12.370,58
14.	SERVIÇOS GERAIS			0,00	0,00				0,00
14.1	TRANSPORTE DE MATERIAL			0,00	0,00				0,00
14.1.1	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	20,75%	161,88	10.739,12	780,00	48	6,09%	3.151,81
14.2	LIMPEZA DA OBRA			0,00	0,00				0,00
14.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	20,81%	20,81	8.369,99	100,00	4	4,16%	1.673,19
14.2.2	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	76,59%	214,44	19.882,88	280,00	23	8,37%	2.173,36
14.5	LIMPEZA DA OBRA			0,00	0,00				0,00
14.5.2	CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	55,40%	277,00	4.182,70	500,00	76	15,20%	1.147,60
	Subtotais								8.145,96
	Subtotais								374.125,51
	TOTAL GERAL sem BDI e sem ADMINISTRAÇÃO				927.562,90				374.125,51
15.	ADMINISTRAÇÃO								
15.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
15.1.1	INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	%	3,21%	0,03	3.245,42	100,00	0,0	1,29%	1.309,02
15.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	3,21%	0,03	67.206,65	100,00	0,0	1,29%	27.107,30
15.1.5	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	3,21%	3,21	15.248,36	100,00	1,3	1,29%	6.150,31
	Subtotais								34.566,63
	ADMINISTRAÇÃO				85.700,44				34.566,63

	% do item	Contrato	Realizado
TOTAL GERAL com BDI	100,00%	31.595.943,28	3,21%



	% Realizado	TOTAL R\$
TOTAL R\$	1,29%	408.692,13



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PR-RR-00016742/2023 - RELATÓRIO TÉCNICO

Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 2

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[2.B-Quinta Medição PR-RR - Junho 2023.xlsx](#)


13. Relatório fotográfico

13.1 Alvenaria







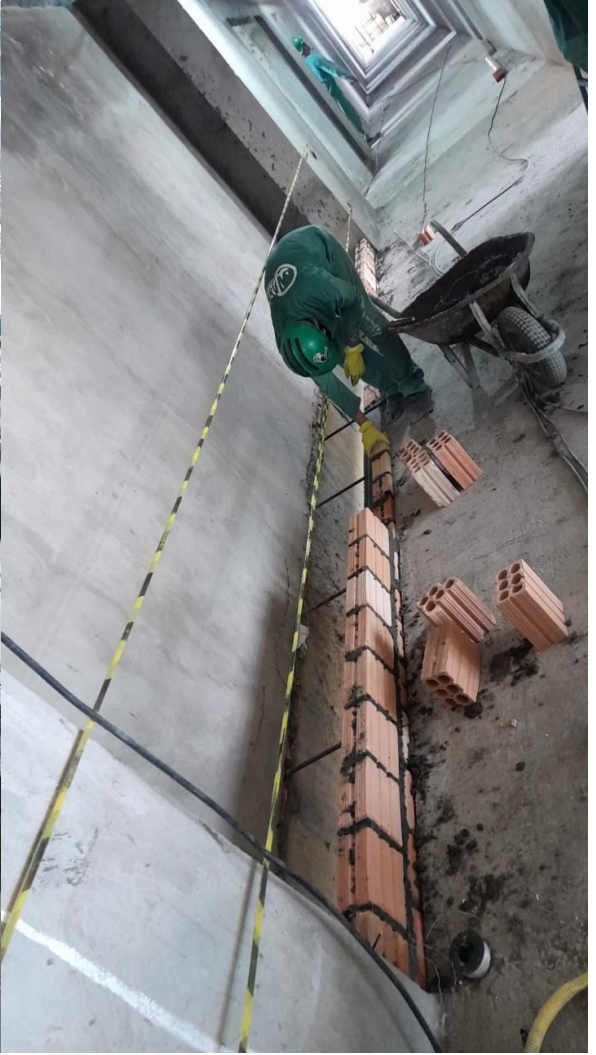













13.2 Demolição de piso



13.3 Chapisco, reboco e esquadro













































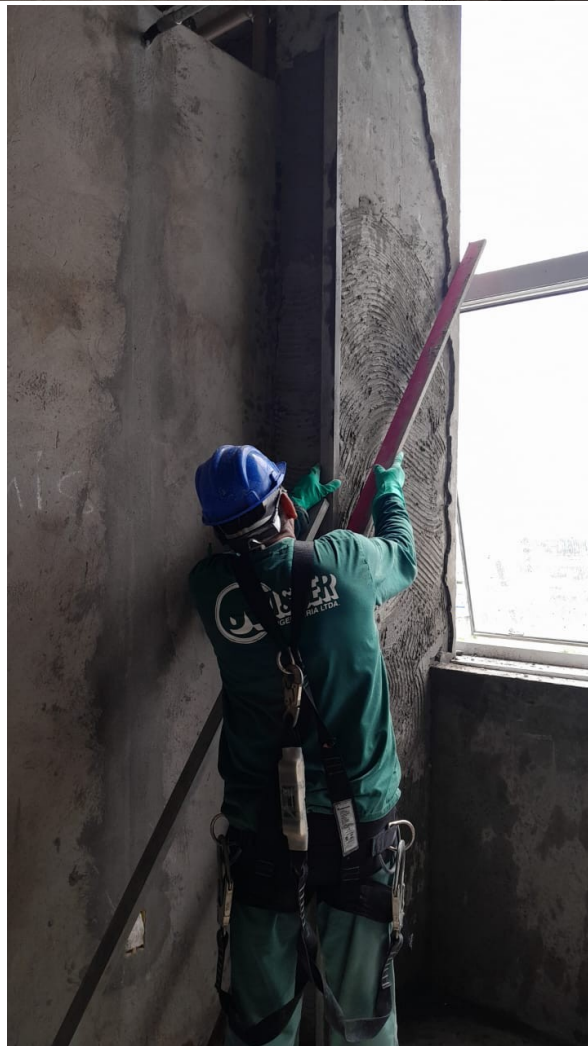

13.4 Eléctrica





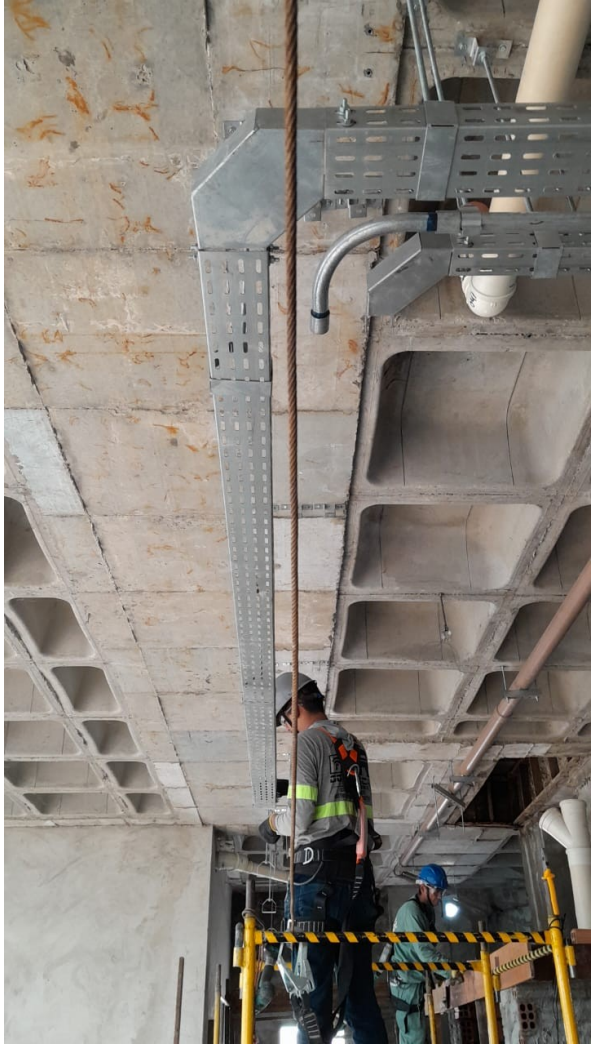










































13.5 Escareamento



13.6 Contrapiso





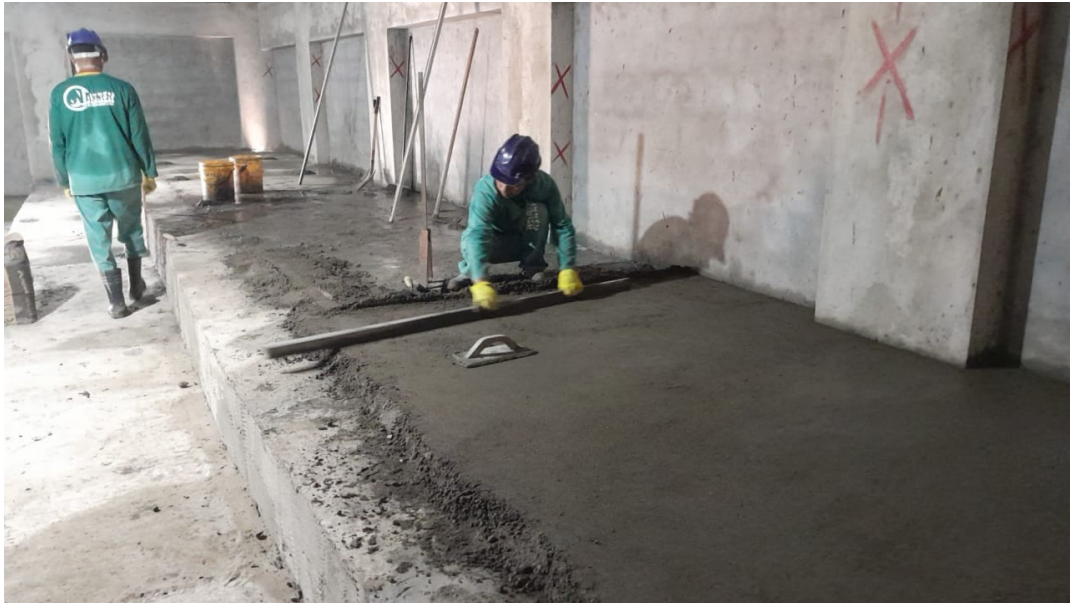







13.7 Limpeza da obra







13.8 Combate à incêndio













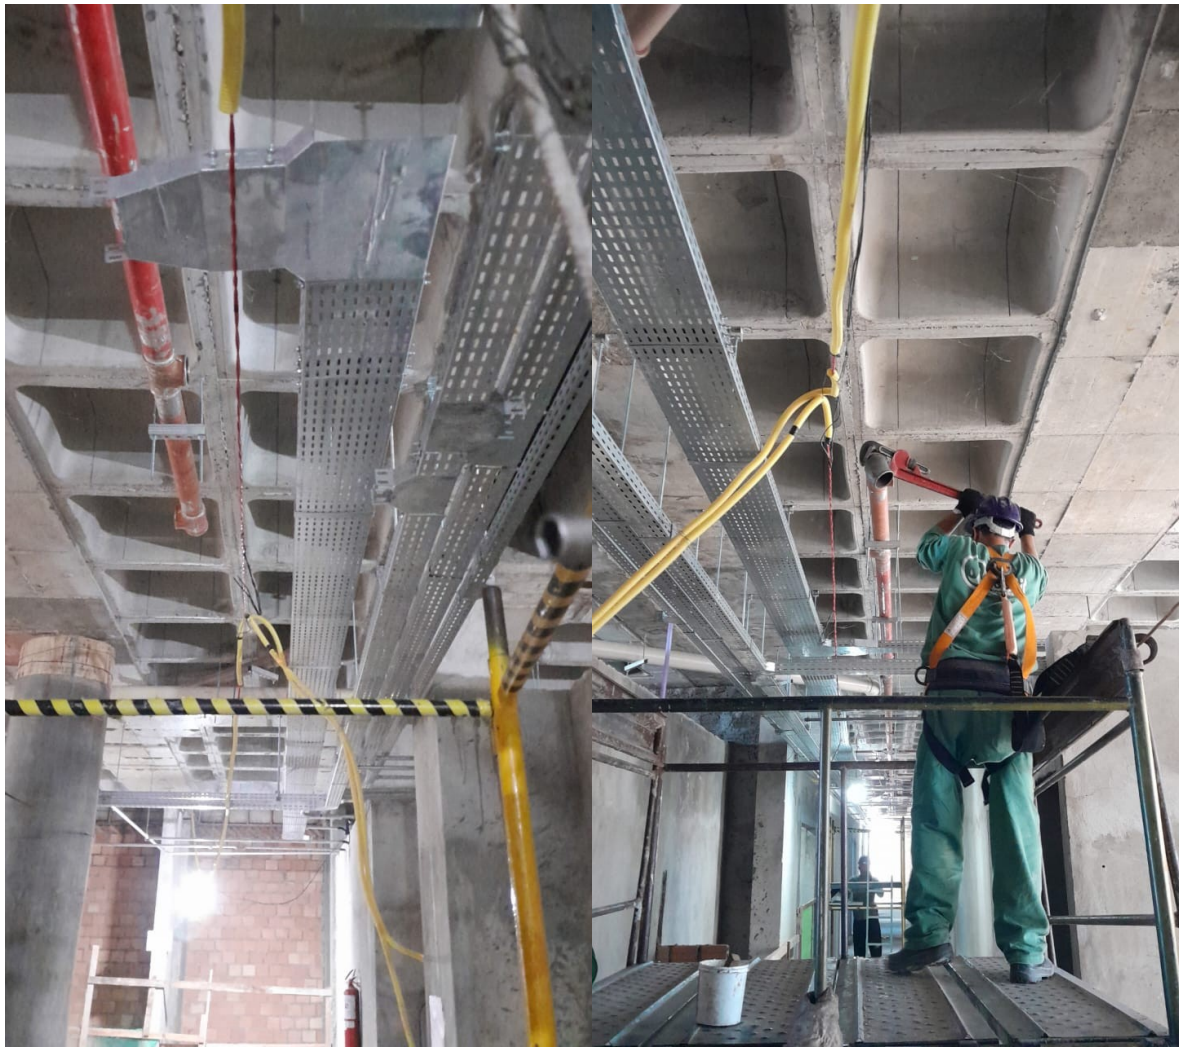






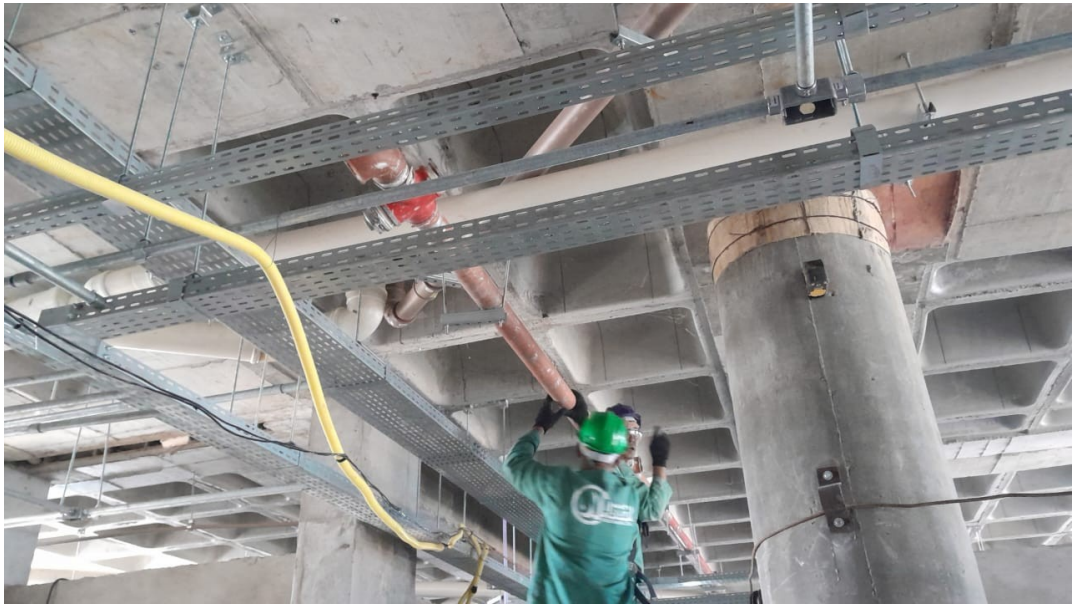




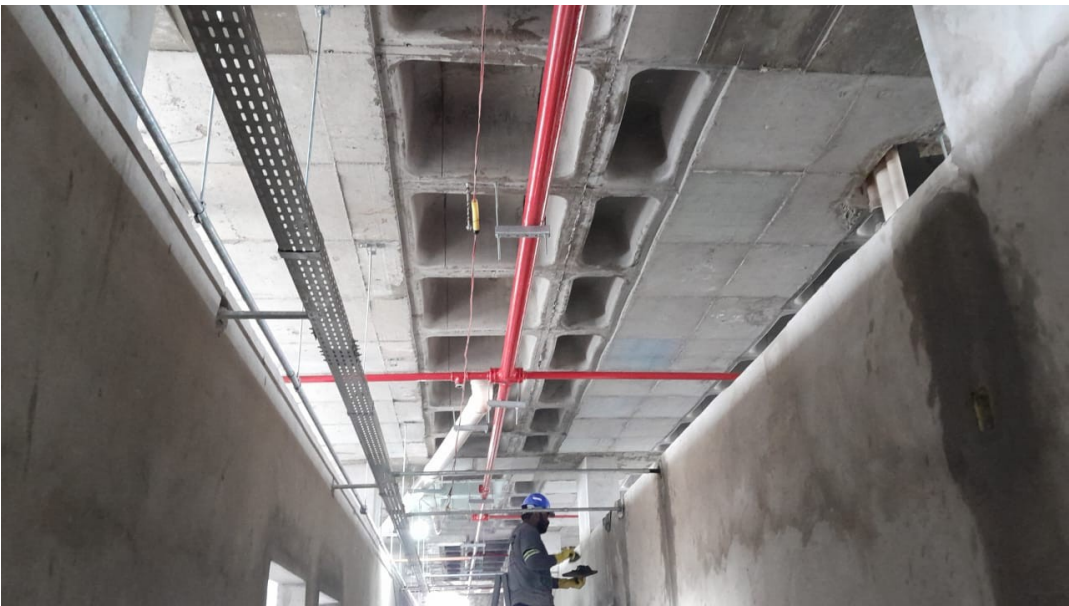







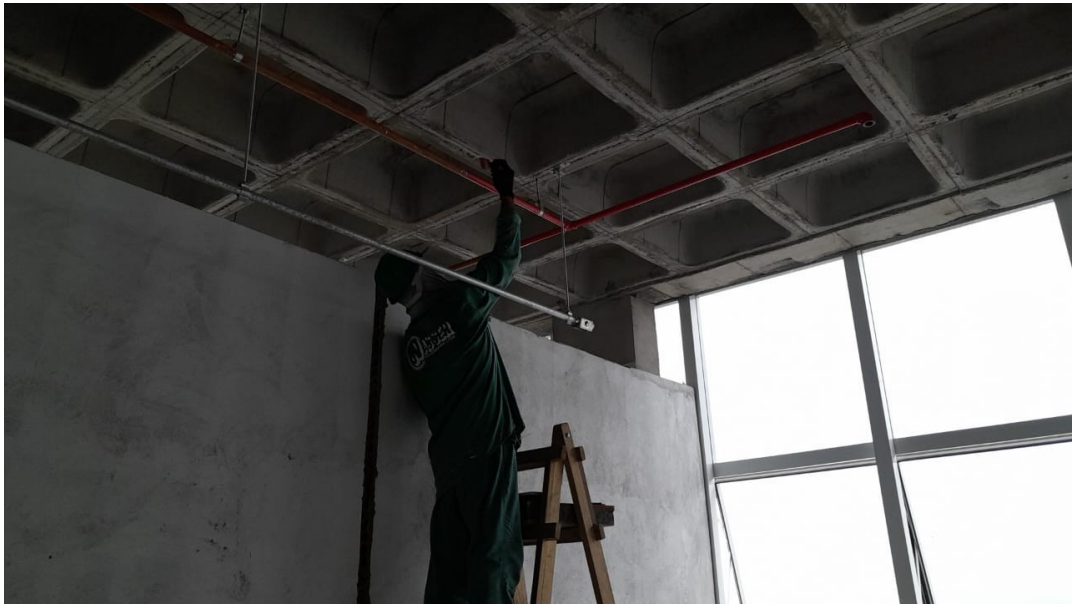







13.9 Papa entulho






13.10 Hidráulica







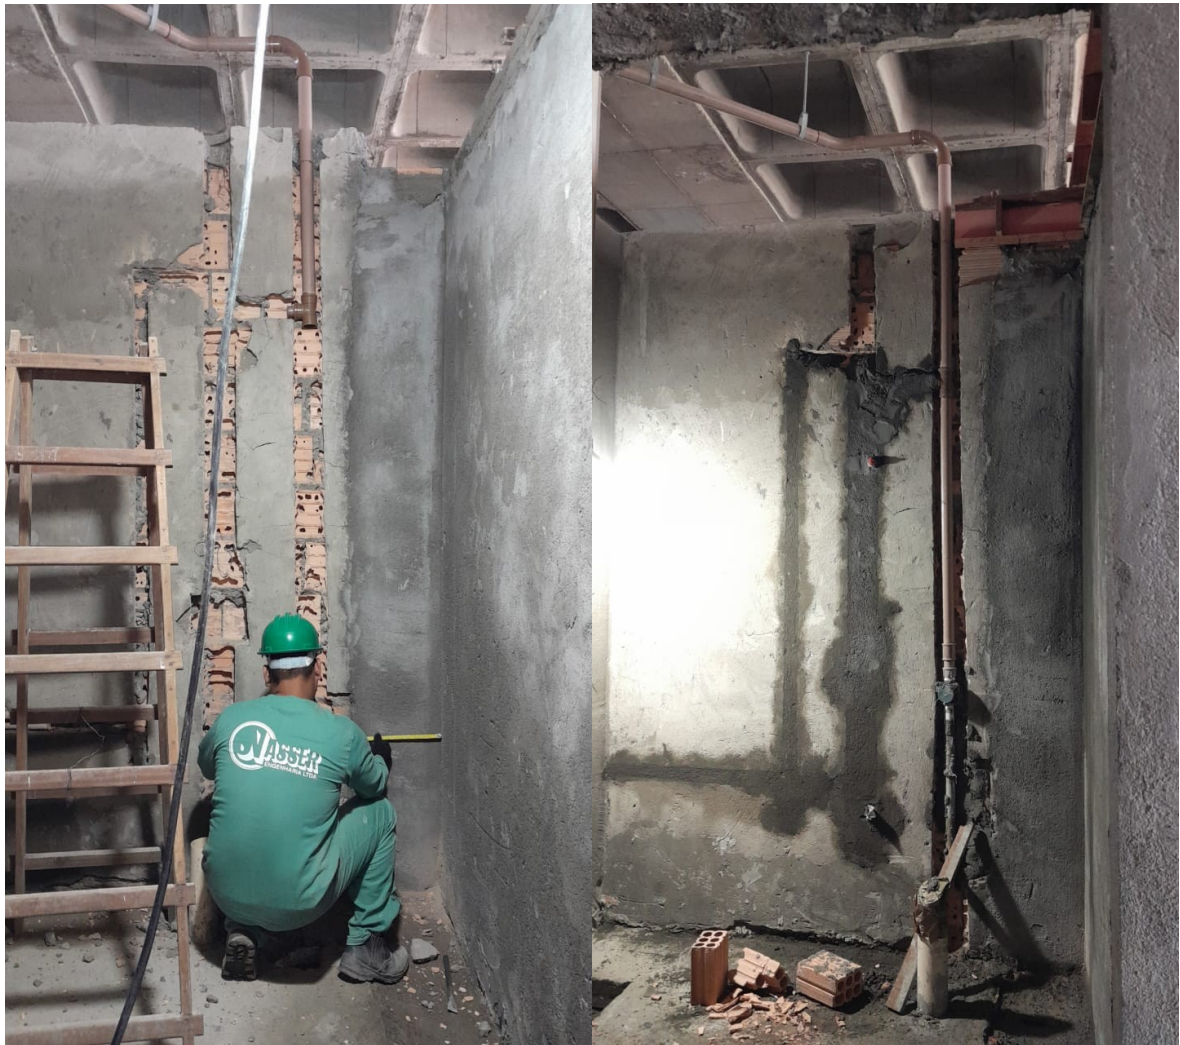





13.11 Impermeabilização





























13.12 Selador e massa














13.13 Adaptações dos degraus do auditório










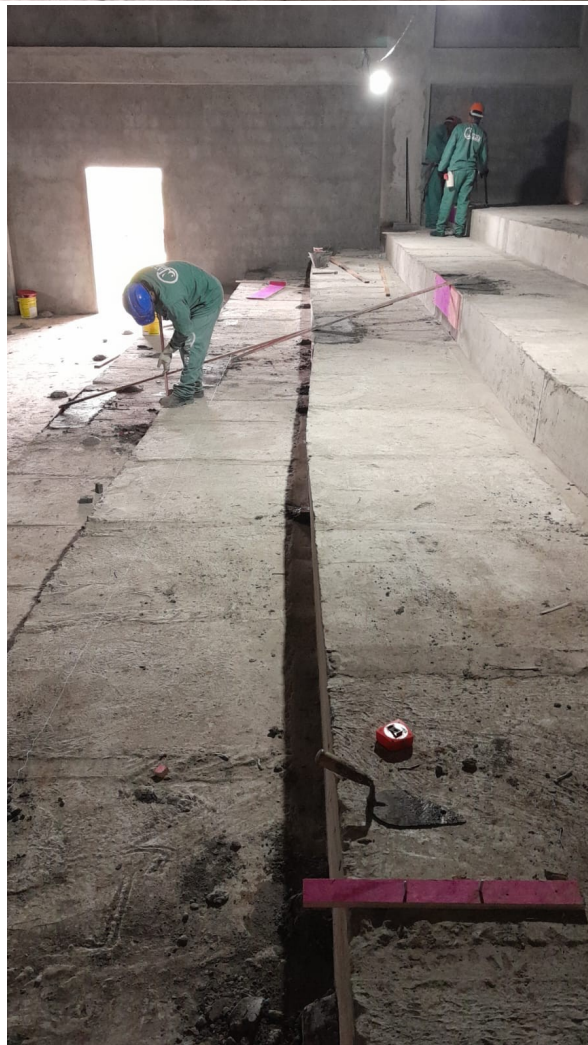




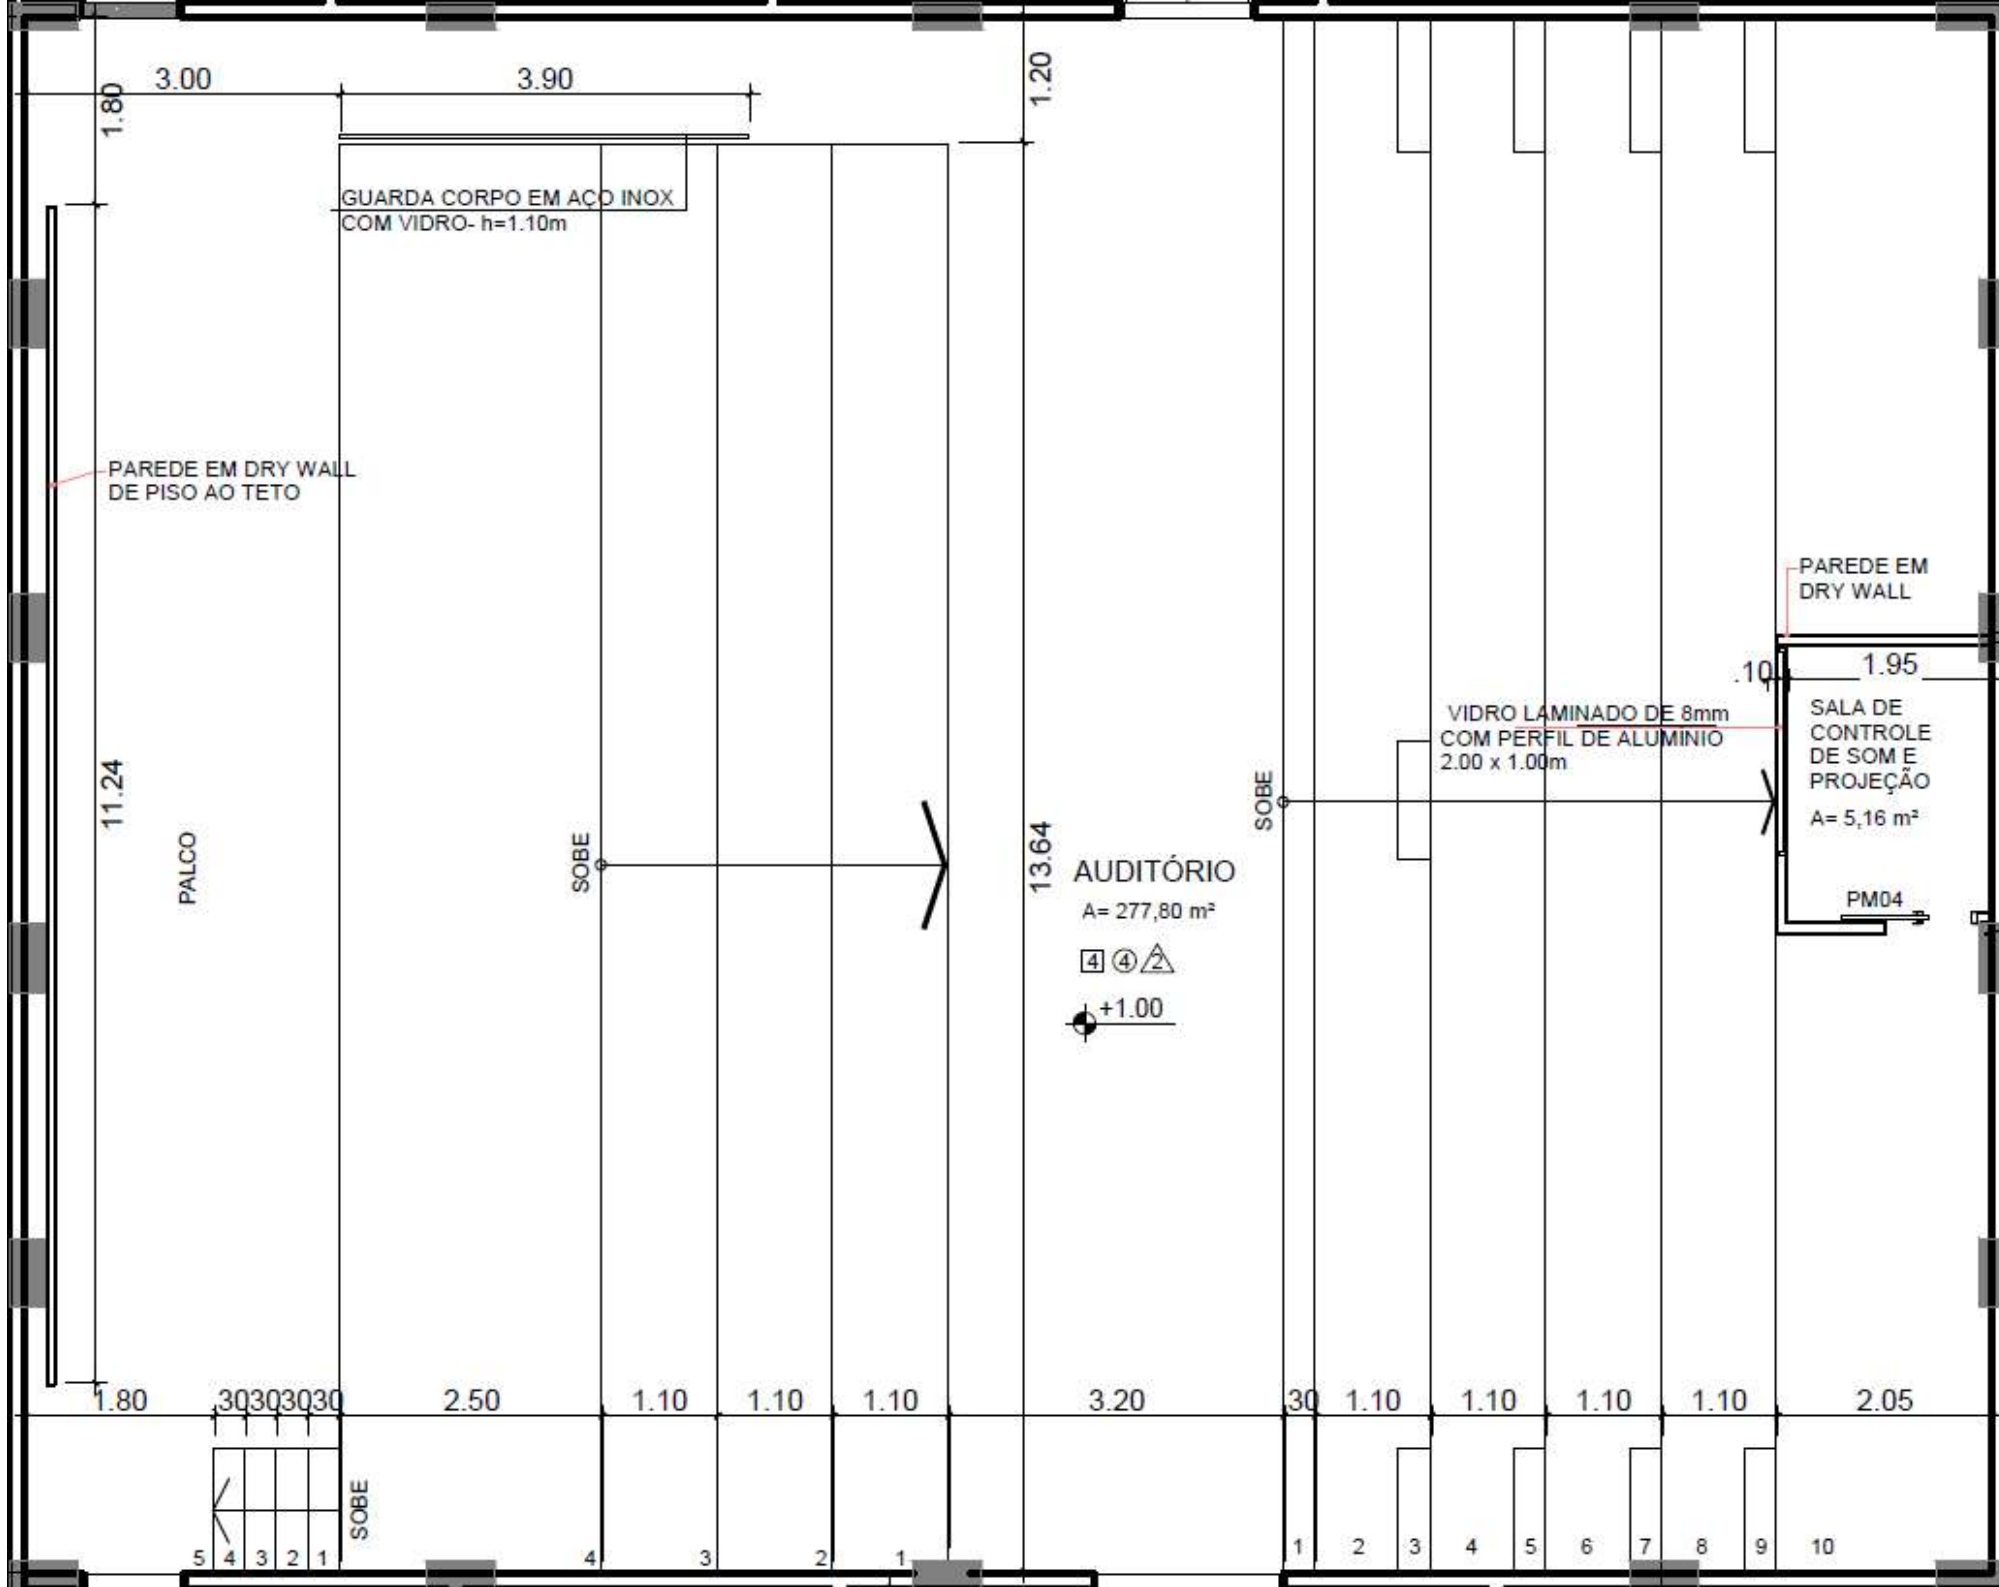


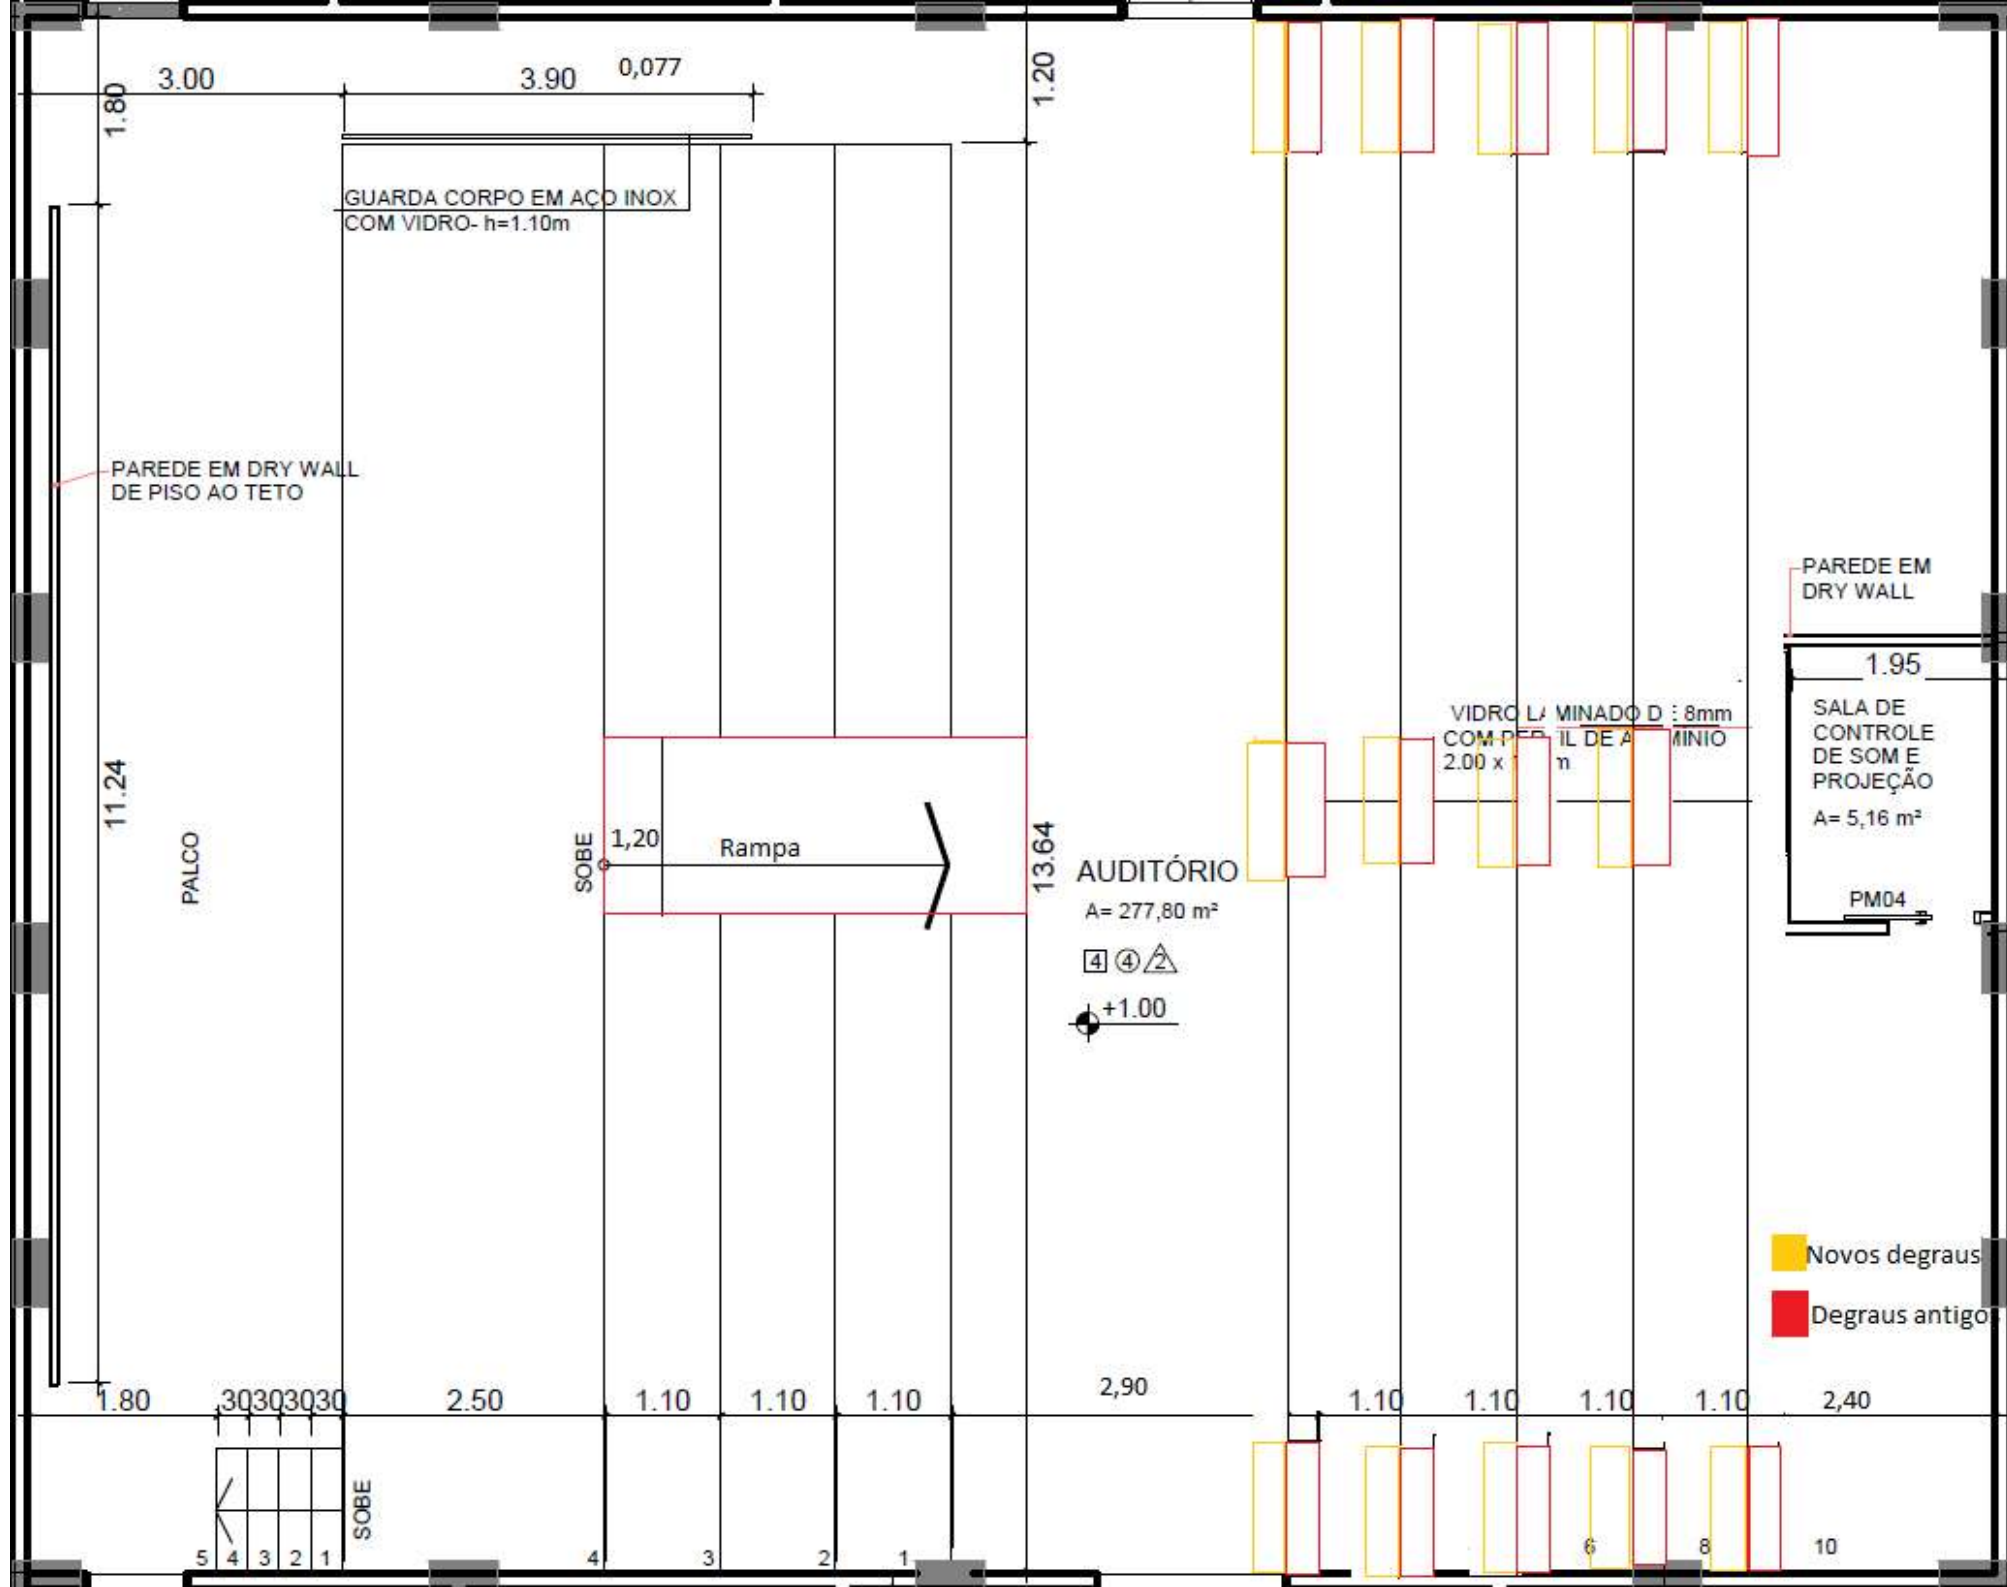

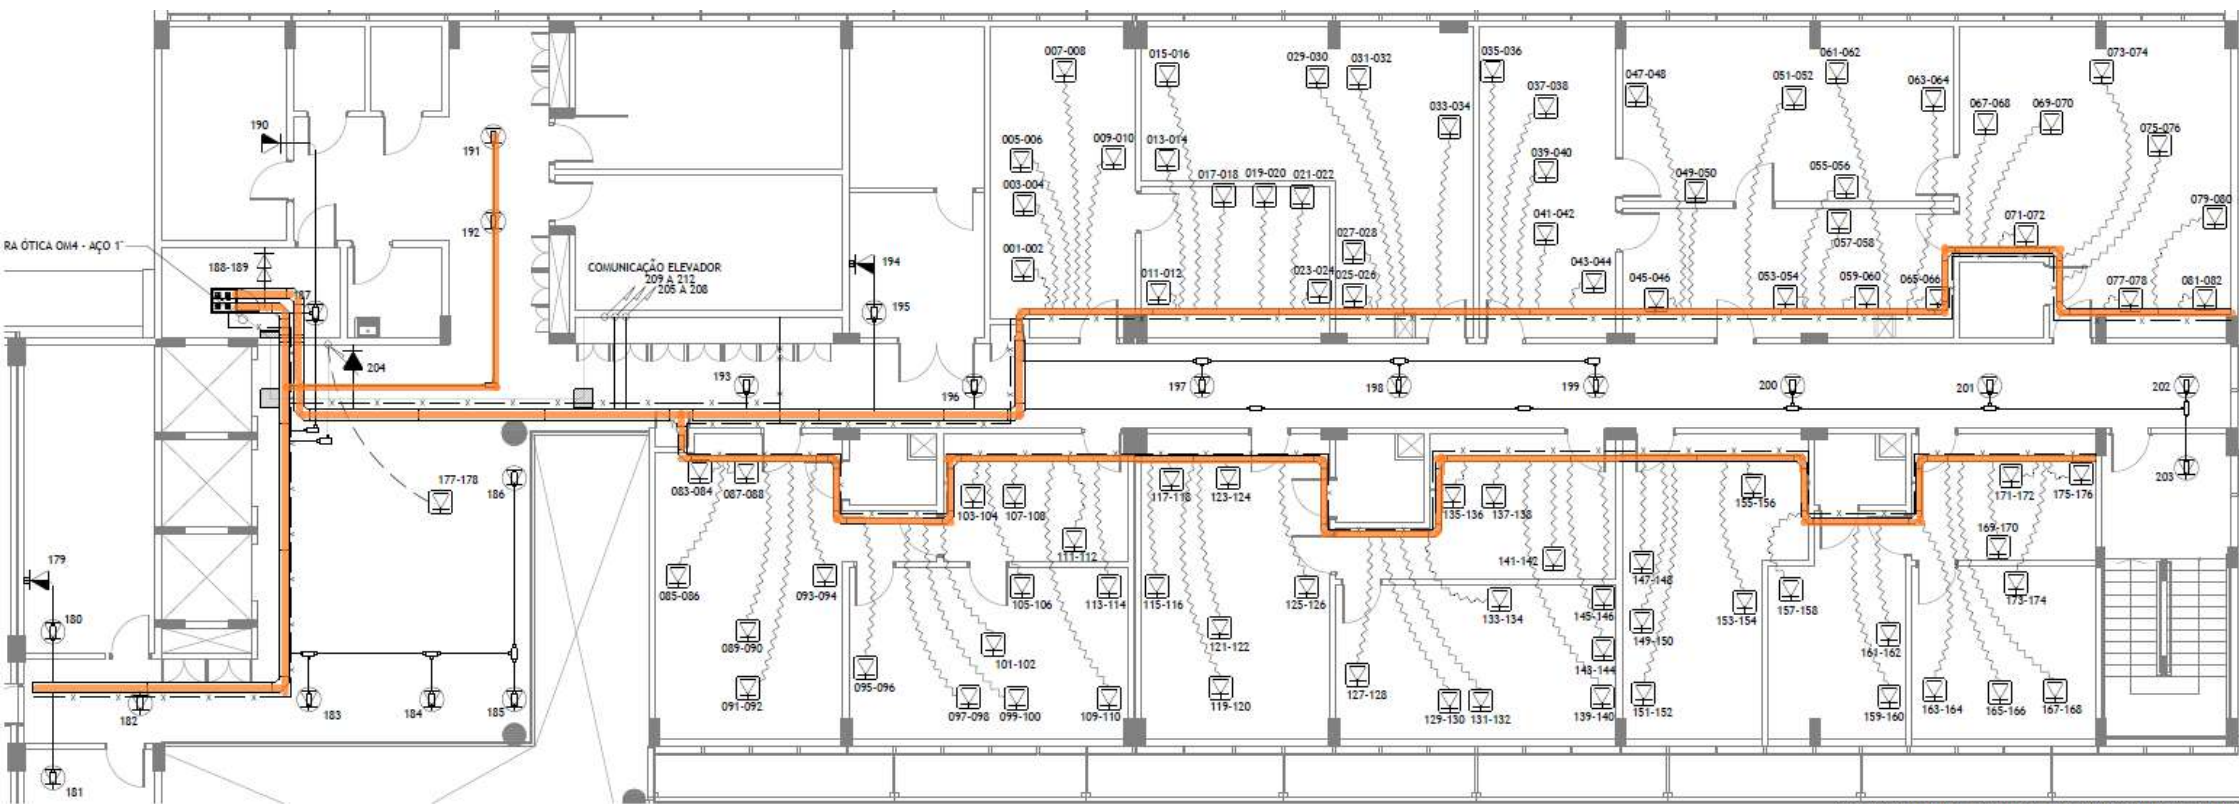


CABEAMENTO ESTRUTURADO 3º PAVIMENTO

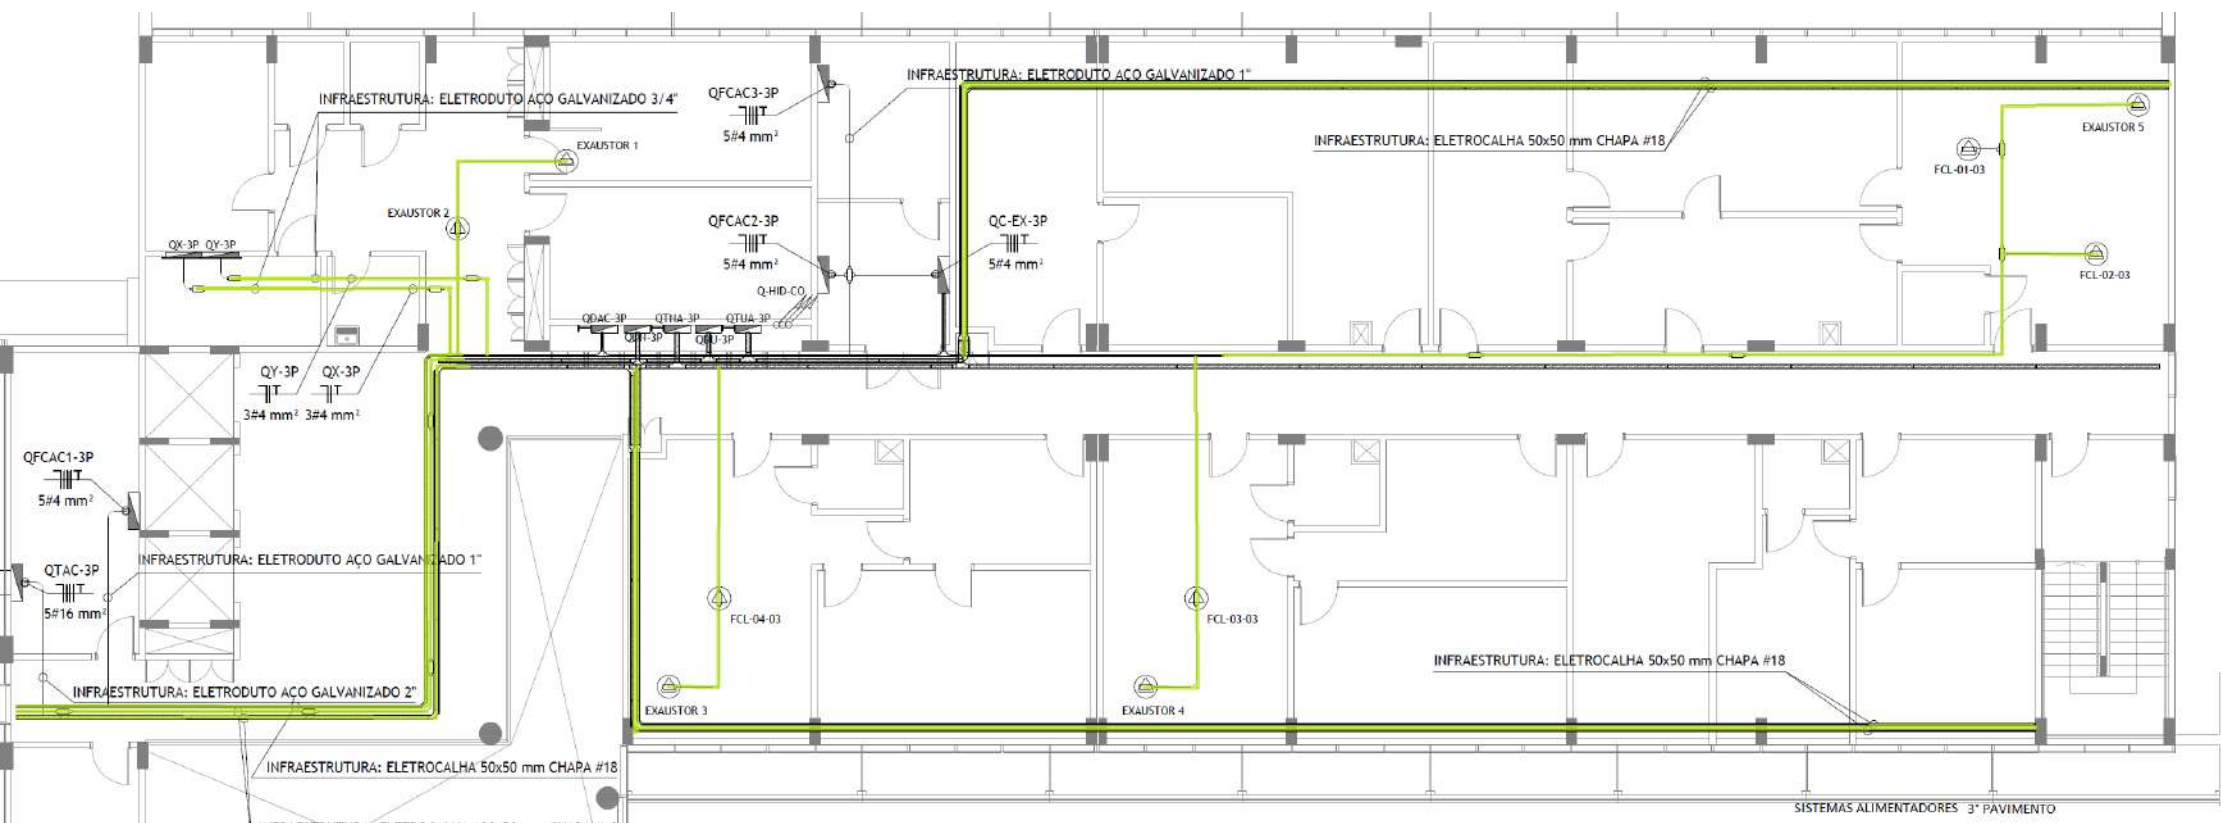


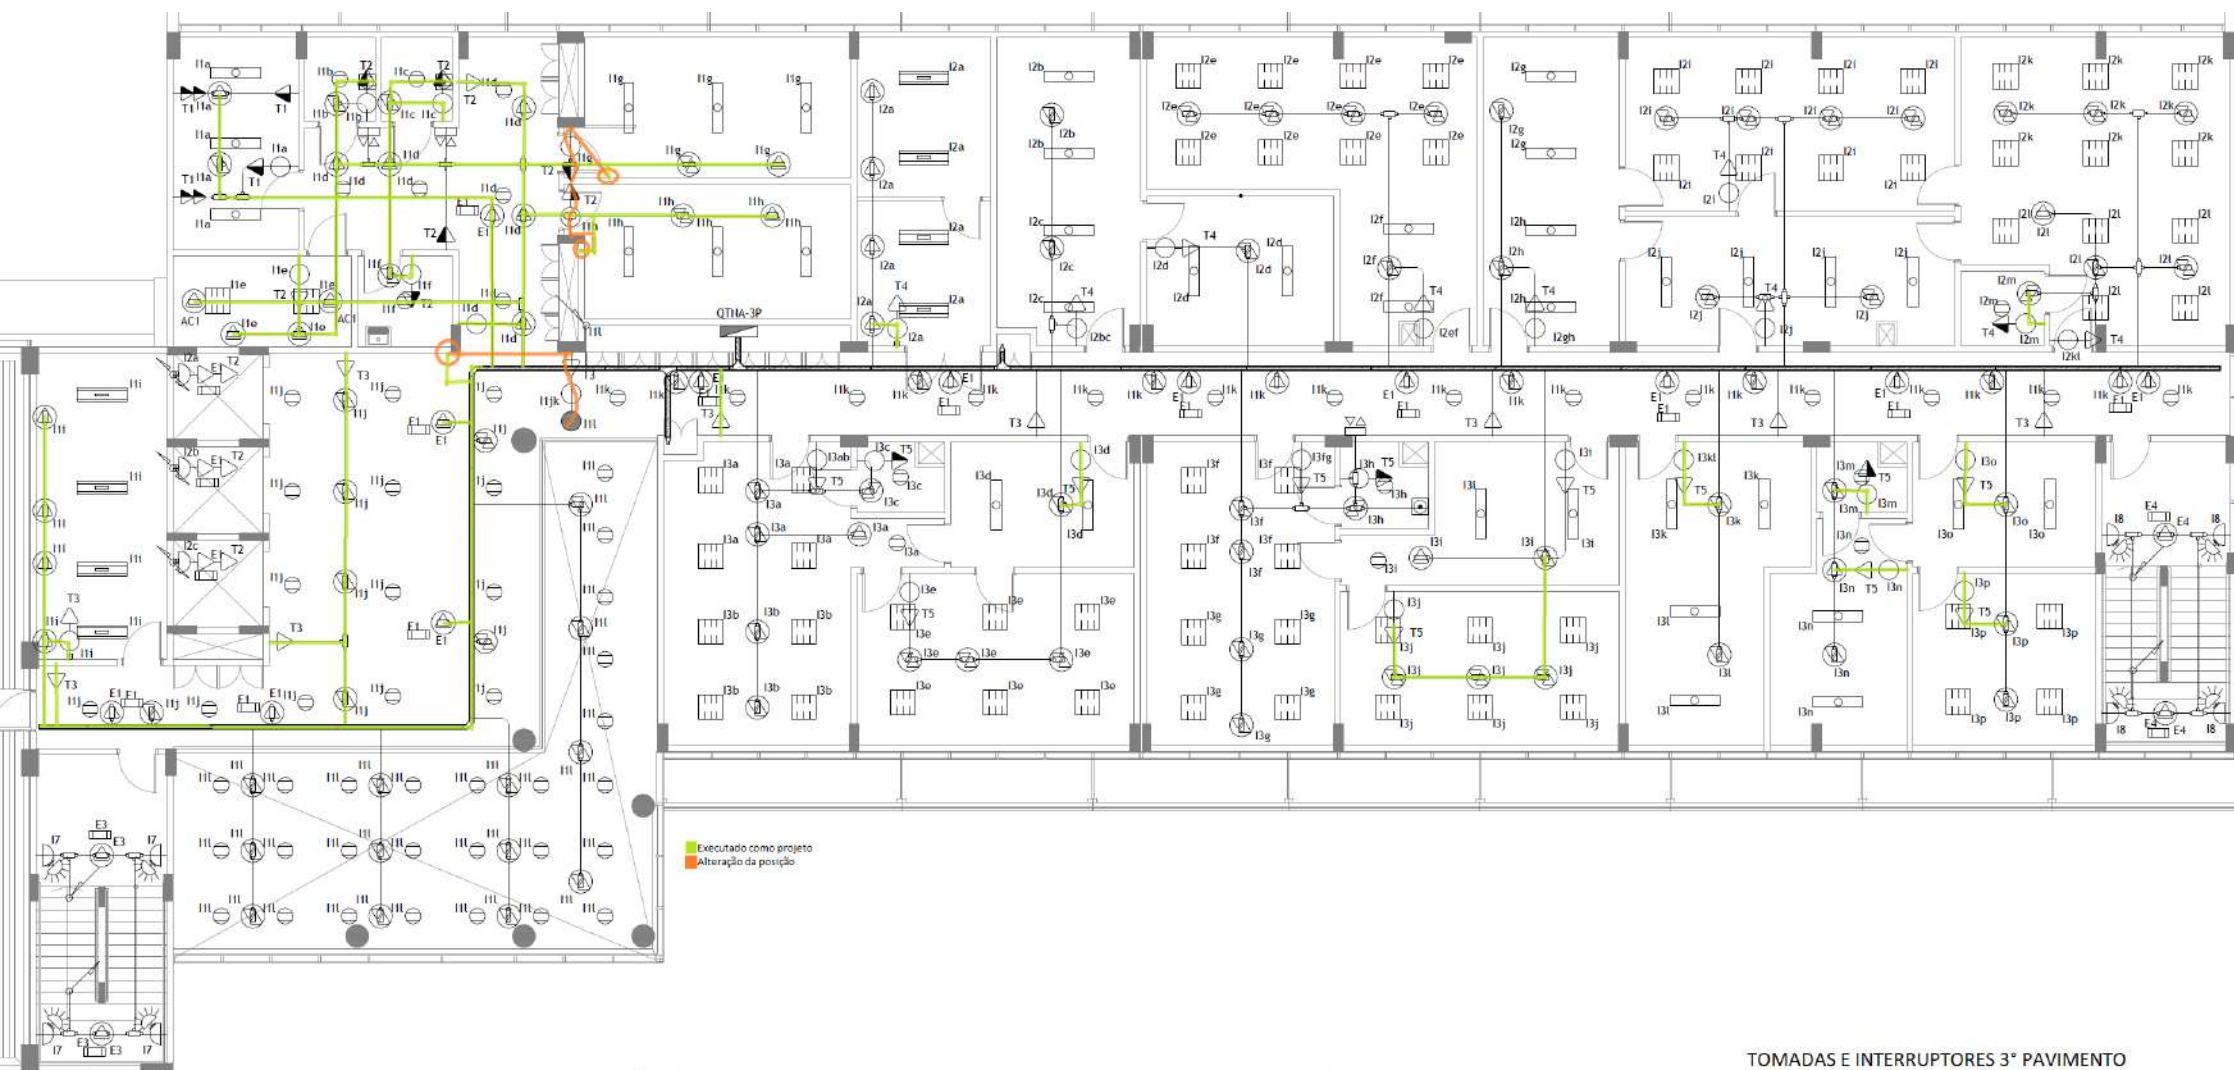

TOMADAS E INTERRUPTORES 3º PAVIMENTO

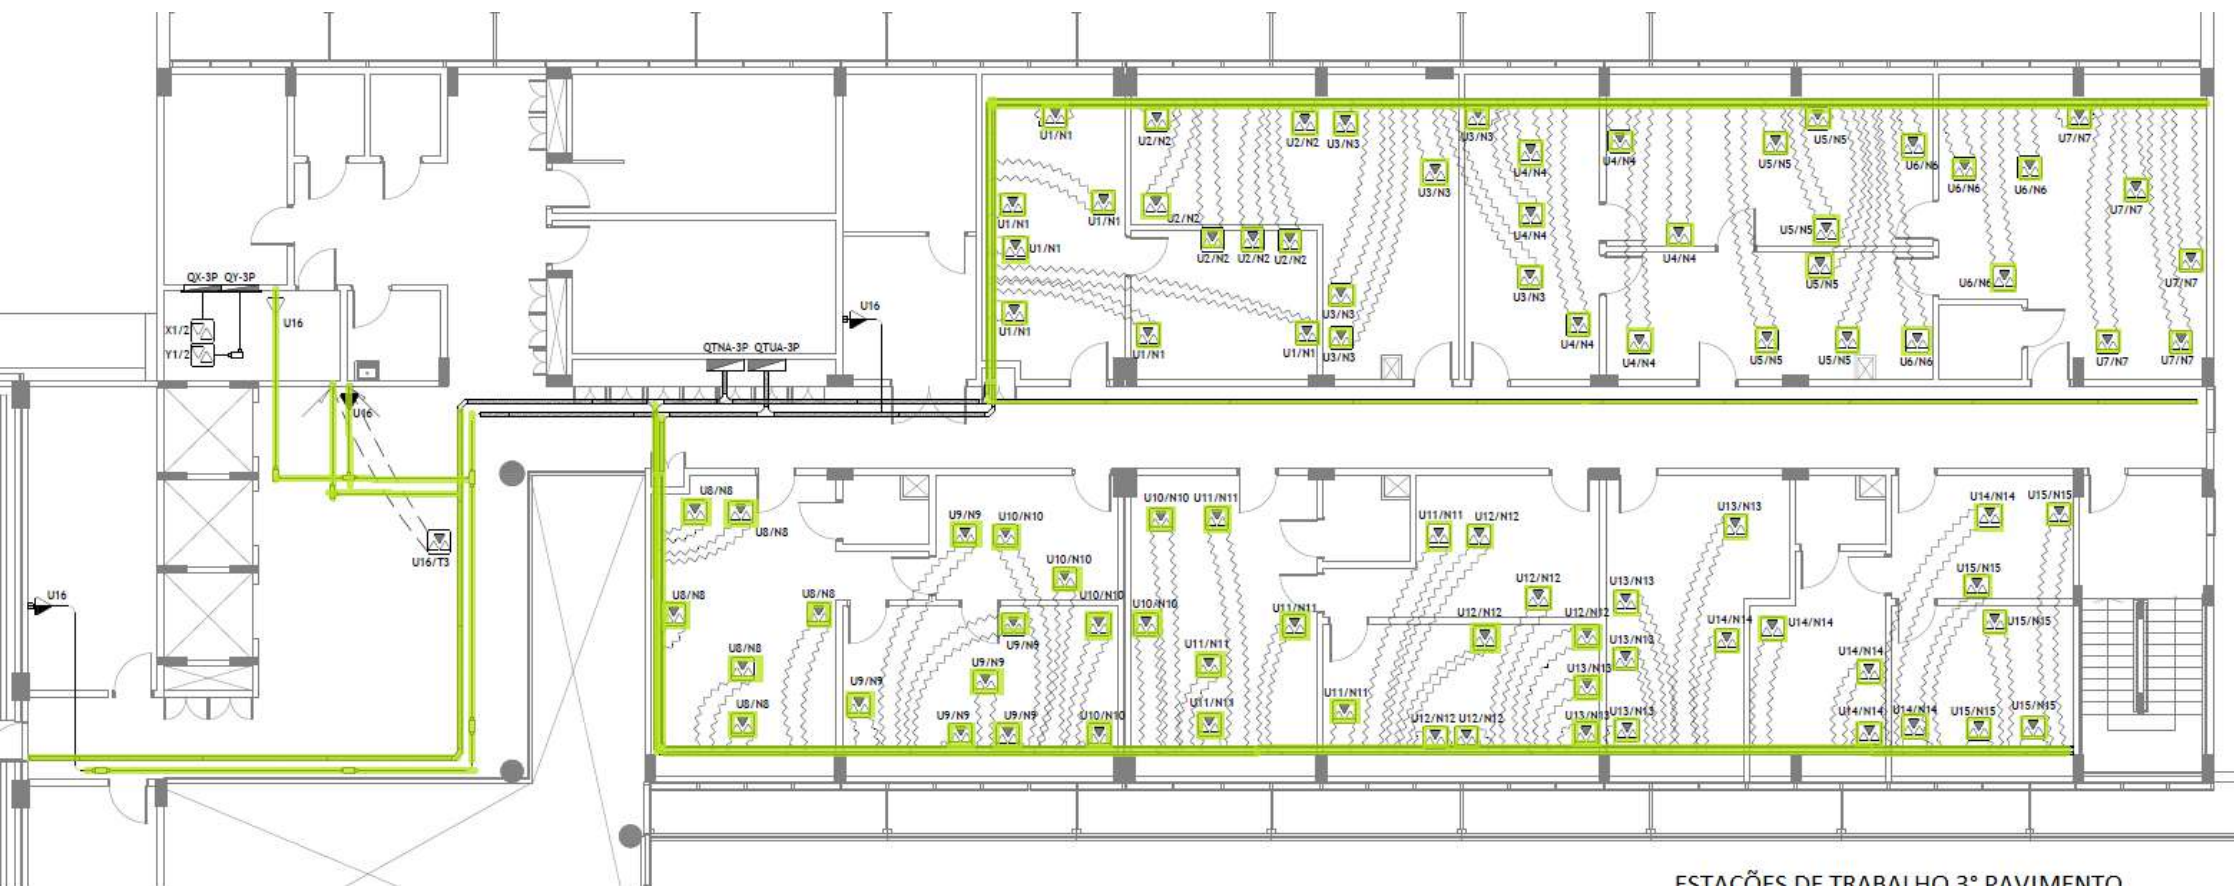

ESTACÕES DE TRABALHO 3º PAVIMENTO

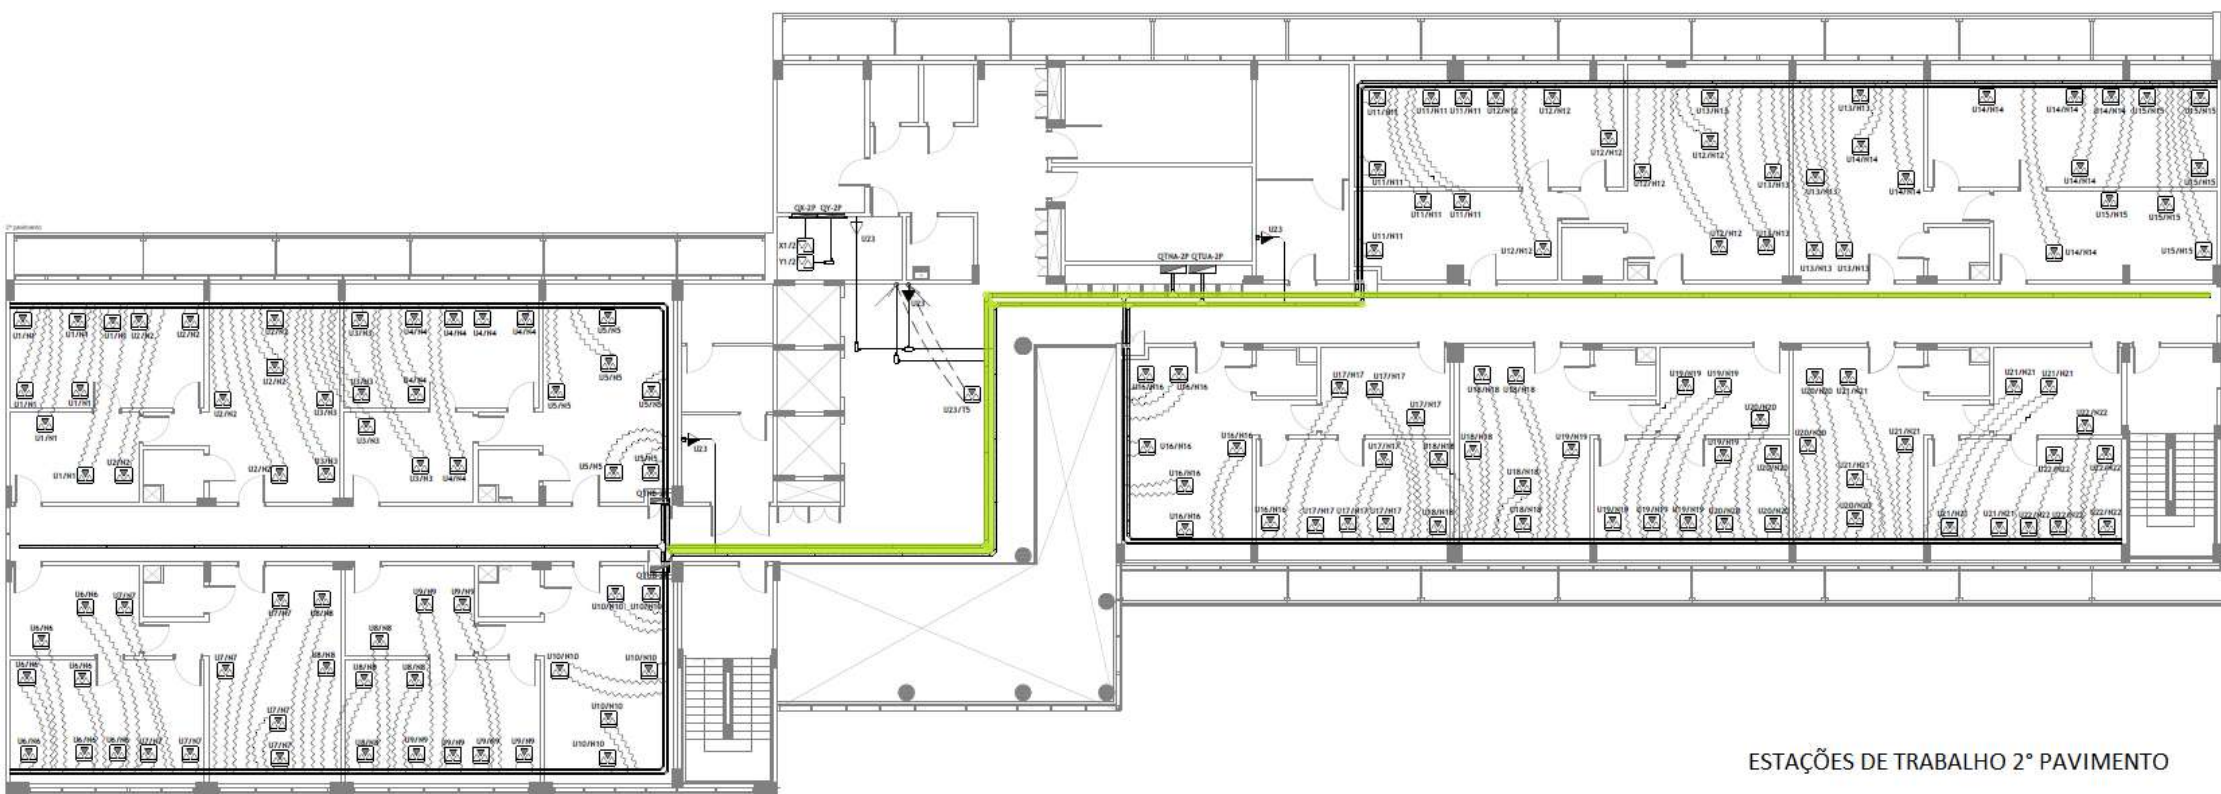

ESTAÇÕES DE TRABALHO 2º PAVIMENTO

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	121
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	611	DATA	16/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 16/05/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho					
01 - Técnico em Edificações					
01 - Mestre de Obra					
01 - Almoxarife					
04 - Carpinteiro					
05 - Pedreiro					
12 - Servente					
01 - Eletricista					
01 - Operador de caldeira					
02 - Bombeiro Hidráulico					
01 - Op. Betoneira					
01 - Op. da Bomba					
01 - Impermeabilizador					
02 - Vigia					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Execução de enchimento de piso - Etapa: Lançamento de concreto de 20 MPa - Local: Hall do Térreo/ Sanitários, Áreas técnicas e Dml do 3º pavimento.					
- Confecção de alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento.					
- Aplicação de chapisco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- impermeabilização dos San 04, San 05 e San 03 do 2º pavimento.					
- Lançamento de concreto em viga invertida da borda laje de cobertura do hall.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:16/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA E CHAPISCO NO 2º e 3º PAVIMENTO;	
3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DO SANITÁRIO 4, 5 E SANITÁRIOS PDCs 3 DO 2º PAVIMENTO;	
3.4 CONCRETAGEM DA VIGA INVERTIDA;	
3.5 CONFECÇÃO DAS PEÇAS DE INCÊNDIO;	
3.6 CONCRETAGEM SANITÁRIO 4, 5 E COPA E ÁREAS TÉCNIAS DO 3º PAVIMENTO;	
3.7 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO 3º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	122
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	610	DATA	17/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 17/05/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã: Chuva forte e Tarde: tempo Nublado					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho					
01 - Técnico em Edificações					
01 - Mestre de Obra					
01 - Almoxarife					
04 - Carpinteiro					
05 - Pedreiro					
12 - Servente					
01 - Eletricista					
01 - Operador de caldeira					
02 - Bombeiro Hidráulico					
01 - Op. Betoneira					
01 - Op. da Bomba					
01 - Impermeabilizador					
02 - Vigia					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Confecção de alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento.					
- Aplicação de chapisco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3ºpavimento.					
- impermeabilização dos San 04, San 05 e San 03, Dml do 2º pavimento.					
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.					
- Retirada de instalação de incêndio - Térreo.					
- Instalação hidrossânitária do 3º pavimento - Ralos					
4 - Ocorrências: Visita da equipe técnica da engenharia e arquitetura da SEA e do responsável Técnico Jose Nasser e Marcos Fernandes.					
.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:16/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA E CHAPISCO NO 2º e 3º PAVIMENTO;	
3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DO SANITÁRIO 4, 5, SANITÁRIOS PDCs 3, COPA, DML, RACK DO 2º PAVIMENTO;	
3.4 CONCRETAGEM DA VIGA INVERTIDA;	
3.5 CONFEÇÃO DAS PEÇAS DE INCÊNDIO;	
3.6 CONCRETAGEM SANITÁRIO 4, 5 E COPA E ÁREAS TÉCNICAS DO 3º PAVIMENTO;	
3.7 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO 3º PAVIMENTO;	
3.8 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;	
3.9 FIXAÇÃO/SUORTE DE TUBOS DE ÁGUA PLUVIAL;	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	123
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	609	DATA	18/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 18/05/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e Tarde: Tempo Nublado					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho					
01 - Técnico em Edificações					
01 - Mestre de Obra					
01 - Almoxarife					
04 - Carpinteiro					
05 - Pedreiro					
12 - Servente					
01 - Eletricista					
01 - Operador de caldeira					
02 - Bombeiro Hidráulico					
01 - Op. Betoneira					
01 - Op. da Bomba					
01 - Impermeabilizador					
02 - Vigia					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Confecção de alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento.					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3ºpavimento.					
- impermeabilização dos San 04, San 05 e San 03, Dml do 2º pavimento.					
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.					
- Retirada de instalação de incêndio - Térreo.					
- Instalação hidrossânitária do 3º pavimento - Colocação de suporte.					
4 - Ocorrências: Visita da equipe técnica da engenharia e arquitetura da SEA e do responsável Técnico Jose Nasser e Marcos Fernandes.					
.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:18/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DO 3° PAVIMENTO;	
3.2 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DO 3° PAVIMENTO	
3.3 EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO 3° PAVIMENTO;	
3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DO SANITÁRIO 4, 5, SANITÁRIOS PDCs 3, DML DO 2° PAVIMENTO;	
3.5 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;	
3.6 FIXAÇÃO/SUPORTE DE TUBOS DE ESGOTO;	
3.7 ESQUADRAMENTO DE PORTAS DO 3° PAVIMENTO;	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	124
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	608	DATA	19/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 19/05/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e Tarde: Tempo Nublado

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho
- 01 - Técnico em Edificações
- 01 - Mestre de Obra
- 01 - Almoxarife
- 04 - Carpinteiro
- 05 - Pedreiro
- 12 - Servente
- 01 - Eletricista
- 01 - Operador de caldeira
- 02 - Bombeiro Hidráulico
- 01 - Op. Betoneira
- 01 - Op. da Bomba
- 01 - Impermeabilizador
- 02 - Vigia

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 01 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Confecção de alvenaria das áreas técnicas - Áreas técnicas.
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3ºpavimento.
- Impermeabilização dos San 04, San 05 e San 03, Dml do 2º pavimento.
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.
- Retirada de instalação de incêndio - Térreo.
- Instalação hidrossanitária do 3º pavimento - Colocação de suporte.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:19/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DO 3º PAVIMENTO	
3.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DO SANITÁRIO 4, 5, SANITÁRIOS PDCs 3, DML DO 2º PAVIMENTO;	
3.4 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA; 2º PAVIMENTO;	
3.5 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO;	
3.6 CONFECÇÃO DOS TUBOS DE INCÊNDIO;	
3.7 REVISÃO DOS PONTOS DE ÁGUA NAS ÁREAS MOLHADAS.	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	125
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	607	DATA	20/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	126
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	606	DATA	21/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	127
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	605	DATA	22/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 22/05/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e Tarde: Tempo Nublado

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 04 - Carpinteiro;
- 05 - Pedreiro;
- 12 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 01 - Operador de caldeira;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Op. da Bomba;
- 01 - Impermeabilizador;
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 01 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Confecção de alvenaria das áreas técnicas - Áreas técnicas.
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3ºpavimento.
- Início da Impermeabilização dos San 04, San 05 e San 03, Dml do 3º pavimento.
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.
- Retirada de instalação de incêndio - Térreo.
- Instalação hidrossanitária do 3º pavimento - Colocação de suporte.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água,
- Escareamento para Assentamento de Alvenaria, Pilar e Viga na Platibanda da Caixa D'Água para Pontos de Ancoragem.
- Início de Alvenaria nos Shaft do Elevadores 3º Pavimento..

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:22/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DO 3º PAVIMENTO	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 EXECUÇÃO DE VERGA NO 3º PAVIMENTO;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DA DML DO 3º PAVIMENTO;	
3.6 ESCAREAMENTO DO COROAMENTO DO PLATIBANDA DA CAIXA D'ÁGUA, PARA EXECUÇÃO DE ALVENARIA.	
3.7 TESTE DE ESTANQUEIDADE D'ÁGUA PARA VER A IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA;	
3.8 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.9 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	128
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	604	DATA	23/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 23/05/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e Tarde: Tempo Nublado					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Op. da Bomba;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Confecção de alvenaria das áreas técnicas - Áreas técnicas.					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Início da Impermeabilização dos San 04, San 05 e San 03, Dml do 3º pavimento.					
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.					
- Retirada de instalação de incêndio - Térreo.					
- Instalação hidrossanitária do 3º pavimento - Colocação de suporte.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água,					
- Escareamento para Assentamento de Alvenaria, Pilar e Viga na Platibanda da Caixa D'Água para Pontos de Ancoragem.					
- Início de Alvenaria nos Shaft do Elevadores 3º Pavimento.					
- Retirada de entelho devido a demolição.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:22/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DO 3º PAVIMENTO	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 EXECUÇÃO DE VERGA NO 3º PAVIMENTO;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 ESCAREAMENTO DO COROAMENTO DO PLATIBANDA DA CAIXA D'ÁGUA, PARA EXECUÇÃO DE ALVENARIA.	
3.7 TESTE DE ESTANQUEIDADE D'ÁGUA PARA VER A IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA;	
3.8 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.9 RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A DEMOLIÇÃO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	129
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	603	DATA	24/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 24/05/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e Tarde: Tempo Nublado

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 04 - Carpinteiro;
- 05 - Pedreiro;
- 12 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 01 - Operador de caldeira;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Op. da Bomba;
- 01 - Impermeabilizador;
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 01 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Confecção de alvenaria das áreas técnicas e Shaft.
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Impermeabilização dos San 04, San 05 e San 03, Dml do 3º pavimento.
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 3º pavimento - Colocação de suporte.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água,

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:24/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DO 3º PAVIMENTO	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 EXECUÇÃO DE CONTRAVERGA NO 3º PAVIMENTO;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	130
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	602	DATA	25/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 25/05/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e Tarde: Tempo Nublado					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Op. da Bomba;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Confecção de alvenaria das áreas técnicas e Shaft.					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3ºpavimento.					
- Impermeabilização dos San 04, San 05 do 3º pavimento.					
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.					
- Instalação hidrossânitária do 3º pavimento - Colocação de suporte e reparos.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Colocação de vergas e vãos de portas.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:25/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DO 3º PAVIMENTO	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º e 2º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 EXECUÇÃO DE CONTRAVERGA E VERGA NO 3º PAVIMENTO;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.7 LIMPEZA PERMANENTE DO 3º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	131
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	601	DATA	26/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 26/05/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã: Chuva forte e Tarde: Tempo Nublado

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo
04 - Carpinteiro;
05 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
02 - Pintor
01 - Operador de caldeira;
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Confecção de alvenaria das áreas técnicas e Shaft.
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..
- Instalação elétrica - Infraestrutura de teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Impermeabilização dos San 04, San 05 do 3º pavimento.
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 3º pavimento - Colocação de suporte e reparos.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.
- Colocação de vergas e vãos de portas.

4 - Ocorrências: Conforme tratativa e orientação da fiscalização referente ao componente do sistema de ancoragem do Prédio no qual o projeto especifica-se chumbador químico tipo ampola, foi determinado pela fiscalização que os pontos de ancoragem da cobertura serão executados com chumbadores químicos adesivo bicomponente a base de epóxi conforme especificado em planilha orçamentária

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO COM PANCADAS DE CHUVA PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:26/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º e 2º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 EXECUÇÃO DE CONTRAVERGA E VERGA NO 3º PAVIMENTO;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.7 LIMPEZA PERMANENTE DO 3º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	132
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	600	DATA	27/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	133
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	599	DATA	28/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	134
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	598	DATA	29/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 29/05/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã: Chuva forte e Tarde					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
01 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Confecção de alvenaria das áreas técnicas e Shaft.					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica - Infraestrutura de parede, teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Impermeabilização dos San 04, San 05 do 3º pavimento.					
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 3º pavimento - Colocação de suporte e reparos.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Colocação de vergas e vãos de portas.					
- Emestramento para contrapiso do auditório.					
4 - Ocorrências: Houve divergência entre o piso executado e o projeto no auditório, após emestramento será possível determinar qual solução para menor impacto em alturas de contrapiso.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO COM PANCADAS DE CHUVA PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:29/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º e 2º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3º PAVIMENTO;	
3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.5 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.6 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA;	
3.7 REPARO INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS.	
3.8 LEVANTAMENTO DA COTAS NÍVEIS DO AUDITORIO COM AS MESTRAS.	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 NAS COBERTURAS "A" E "B" TERÃO QUE TROCAR DE 48 TELHAS, 31 NO LADO "A" E 17 NO LADO "B", DEVIDO AOS VAZAMENTOS, PRINCIPALMENTE, PELOS TUBOS DE VENTILAÇÃO, FUROS NAS CALHAS DAS TELHAS METÁLICAS, E DIVERSOS AMASSADOS;	
4.2 FOI DETECTADO ERRO NA EXECUÇÃO, PELA ANTIGA EMPRESA, DOS DEGRAUS DO AUDITÓRIO, SENDO INVIÁVEL SEGUIR COMO ESTÁ NO PROJETO, FAZENDO-SE NECESSÁRIAS ADAPTAÇÕES, OS DEGRAUS ANTIGOS VÃO SER MOVIDOS PARA FRENTE. PARA ISSO OS ANTIGOS SERÃO PREENCHIDOS PARA TER O MESMO NÍVEL DA CIRCULAÇÃO DE CADA PATAMAR E OS NOVOS VÃO AVANÇAR NO PATAMAR ANTERIOR;	
4.3 OS PONTOS DE ANCORAGEM DA COBERTURA SERÃO EXECUTADOS COM CHUMBADORES QUÍMICOS ADESIVO BICOMPONENTE A BASE DE EPÓXI CONFORME ESPECIFICADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	135
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	597	DATA	30/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 30/05/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo nublado com chuva forte					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Confecção de alvenaria das áreas técnicas e Shaft.					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica - Infraestrutura de parede, teto com eletrodutos e eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Impermeabilização do DML do 3º pavimento.					
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 3º pavimento - Colocação de suporte e reparos.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Colocação de contra vergas e vãos de janelas.					
- Contrapiso do auditório.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrência;					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO COM PANCADAS DE CHUVA PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:30/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º e 2º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.5 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA;	
3.6 LEVANTAMENTO DA COTAS NÍVEIS DO AUDITÓRIO COM AS MESTRAS;	
3.7 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NO AUDITÓRIO;	
3.8 EXECUÇÃO NDE CONTRAPISO DO AUDITÓRIO;	
3.9 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 PEITORIL, LAVATÓRIO, BANCADA E DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS VÃO SER GRANITO CINZA ANDORINHA;	
4.2 SOLEIRAS DAS PORTAS SERÃO DE GRANITO BRANCO;	
4.3 OS DETALHES DAS FACHADAS DO ELEVADOR VÃO SER EM GRANITO PRETO "SÃO GABRIEL".	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	136
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	596	DATA	31/05/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 31/05/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Confecção de alvenaria das áreas técnicas e Shaft.					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.					
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.					
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.					
- Instalação hidrossânitária do 2º pavimento.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Requadro de portas do 3º pavimento.					
- Contrapiso do auditório.					
- Aplicação de selador em parede do 3º pavimento.					
- Demolição de proteção mecânica da laje de cobertura do Hall.					
4 - Ocorrências: Foi realizado a identificação em pilares que estão apresentando descolamento da argamassa.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:31/05/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º e 2º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.5 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA;	
3.6 LEVANTAMENTO DA COTAS NÍVEIS DO AUDITÓRIO COM AS MESTRAS;	
3.7 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NO AUDITÓRIO;	
3.8 EXECUÇÃO NDE CONTRAPISO DO AUDITÓRIO;	
3.9 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.10 EXECUÇÃO DE ELETROCALHA DE PISO DO 3º PAVIMENTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	137
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	595	DATA	01/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 01/06/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo
04 - Carpinteiro;
05 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
02 - Pintor
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.
- Requadro de portas do 3º pavimento.
- Contrapiso do auditório.
- Aplicação de selador em parede do 3º pavimento.
- Demolição de proteção mecânica da laje de cobertura do Hall.

4 - Ocorrências: Efetivo comprometido com a ausência de 06 funcionários com sintomas gripais(virose) devido o clima com fortes chuvas que vem ocorrendo no estado nos últimos dias.
- A infraestrutura de SOM/TV será executada conforme projeto, porem em planilha orçamentária as tubulações contempladas estão diferente do projeto.
- A empresa está encontrando dificuldade em encontrar curvas 90º de 1" e 2" em FG parede pesada no mercado.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:1/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BOMBA	
4 VIGIA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º e 2º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.5 LEVANTAMENTO DA COTAS NÍVEIS DO AUDITÓRIO COM AS MESTRAS;	
3.6 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NO AUDITÓRIO;	
3.7 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DO AUDITÓRIO;	
3.8 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.9 EXECUÇÃO DE ELETROCALHA DE PISO DO 3º PAVIMENTO;	
3.10 DESPLACAMENTO E CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS.	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 FOI PRECISO REALIZAR DESPLACAMENTO DO REBOCO DOS PILARES PRA MELHORAR O ACABAMANETO. ANTES ESTAVA EXECUTADO SEM CHAPISCO, O QUE REDUZIU A ADERÊNCIA DO REBOCO.	
4.2 FOI OBSERVADO QUE NA PLANTA DE SOM/TV CONSTA TUBULAÇÃO DE 1" E 2", MAS NA PLANILHA SÓ TEM DE 1 1/2" E 3/4", ALÉM DE NÃO CONSTAR TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOMENTE O DE AÇO GALVANIZADO.	
4.3 A EMPRESA E A ENGENHEIRA CONSTATARAM QUE NÃO HÁ CURVA LONGA GALVANIZADA, 1" E 2" PARA O SERVIÇO DE ELÉTRICA, DISPONÍVEL NO MERCADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA OBRA.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	138
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	594	DATA	02/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 02/06/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e Tarde: Tempo com Sol - BOM					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria das áreas técnicas - Gabinete do 3º pavimento..					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.					
- Tratamento com argamassa para recebimento de impermeabilização - 3º Pavimento.					
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Requadro de portas do 3º pavimento.					
- Contrapiso do auditório.					
- Aplicação de selador em parede do 3º pavimento.					
- Demolição de proteção mecânica da laje de cobertura do Hall.					
- Retirada de infra estruturada de Incêndio do 1º pavimento.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrência.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:02/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º e 2º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.5 RETIRADÁ DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DO 1º PAVIMENTO;	
3.6 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA NO AUDITÓRIO;	
3.7 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DO AUDITÓRIO;	
3.8 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.9 EXECUÇÃO DE ELETROCALHA DE PISO DO 3º PAVIMENTO;	
3.10 DESPLACAMENTO E CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.11 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO.	
3.12 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA DA LAJE DE COBERTURA DO HALL	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	139
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	593	DATA	03/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	140
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	592	DATA	04/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	141
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	591	DATA	05/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 05/06/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e Tarde: Tempo nublado com chuva forte durante o dia.

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 01 - Aux. administrativo
- 04 - Carpinteiro;
- 05 - Pedreiro;
- 12 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 02 - Pintor
- 01 - Operador de caldeira;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 01 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria dos San 03 - 3º pavimento.
- Colocação de verga do San 03.
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.
- Requadro de portas do 3º pavimento.
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm
- Aplicação de selador em parede do 3º pavimento.
- Pintura da rede de Sprinkler.
- Retirada de manta da laje de cobertura do Hall.
- Retirada de infra estruturada de Incêndio do Térreo..

4 - Ocorrências: Sem ocorrência.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:05/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º e 2º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.5 RETIRADÁ DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DO TÉRREO;	
3.6 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DO AUDITÓRIO;	
3.7 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.8 EXECUÇÃO DE ELETROCALHA DE PISO DO 3º PAVIMENTO;	
3.9 DESPLACAMENTO E CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO.	
3.11 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA DA LAJE DE COBERTURA DO HALL	
3.12 PINTURÁ DOS TUBOS DE INCÊNDIO COM TINTA VERMELHA ÓLEO;.	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 AS PROTEÇÕES MECÂNICAS DAS COBERTURAS DO HALL DE ENTRADA, ÁREA DO FOYER/CAMARIM/HALL DO AUDITÓRIO, MARQUISE LATERAL, DOS FUNDOS, DA ENTRADA "EM L" E DA ÁREA TÉCNICA ANTENAS/EQUIPAMENTOS ESTÃO COMPROMETIDAS, SEJA POR FALTA DE DOBRA DA MANTA ASFÁLTICA OU DESPLACAMENTO DO REBOCO.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	142
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	590	DATA	06/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 06/06/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã: chuva forte durante toda a manhã e Tarde: Tempo nublado com chuva

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo
04 - Carpinteiro;
05 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
02 - Pintor
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria dos San 03 - 3º pavimento.
- Colocação de verga do San 03.
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.
- Requadro de portas do 3º pavimento.
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm
- Aplicação de selador em parede do 3º pavimento.
- Pintura da rede de Sprinkler.
- Retirada de manta da laje de cobertura do Hall.
- Confeção de alvenaria de sala do CPD - 1º Pavimento.

4 - Ocorrências: Devido a forte chuva que ocorreu pela manhã foi observado muitos vazamentos pelo rufos da pele de vidros.
Visita da equipe técnica do contrato da obra do MPF de Boa Vista à obra.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ, NUBLADO PELA TARDE.	DATA:06/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.5 RETIRADÁ DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DO TÉRREO;	
3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.7 EXECUÇÃO DE ELETROCALHA DE PISO DO 3º PAVIMENTO;	
3.8 DESPLACAMENTO E CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO.	
3.10 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA DA LAJE DE COBERTURA DO HALL	
3.11 PINTURA DOS TUBOS DE INCÊNDIO COM TINTA VERMELHA ÓLEO;	
3.12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2º PAVIMENTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 VAZAMENTO PELO RUFO DA PELE DE VIDRO.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	143
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	589	DATA	07/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 07/06/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã: chuva forte durante toda a manhã e Tarde: Tempo nublado com chuva

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 01 - Aux. administrativo
- 04 - Carpinteiro;
- 05 - Pedreiro;
- 12 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 02 - Pintor
- 01 - Operador de caldeira;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 01 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria dos San 03 - 3º pavimento.
- Colocação de verga do San 03.
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm
- Aplicação de selador em parede do 3º pavimento.
- Pintura da rede de Sprinkler.
- Emestramento de piso para regularização da laje do Hall.
- Confecção de alvenaria de sala do CPD - 1º Pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:07/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.5 RETIRADÁ DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO DO TÉRREO;	
3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.7 EXECUÇÃO DE ELETROCALHA DE PISO DO 3º PAVIMENTO;	
3.8 CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS(EXISTENTES);	
3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO.	
3.10 PINTURA DOS TUBOS DE INCÊNDIO COM TINTA VERMELHA ÓLEO;	
3.11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2º PAVIMENTO;	
3.12 EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO 1º PAVIMENTO;	
3.13 APLICAÇÃO DE TELA PARA RECEBIMENTO DE REBOCO NOS DEGRAUS DO AUDITÓRIO;	
3.14 EXECUÇÃO DE MESTRA DA LAJE DA COBERTURA DO HALL.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	144
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	588	DATA	08/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	145
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	587	DATA	09/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 09/06/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã: chuva forte durante toda a manhã e Tarde: Tempo nublado

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 01 - Aux. administrativo
- 04 - Carpinteiro;
- 05 - Pedreiro;
- 12 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 02 - Pintor
- 01 - Operador de caldeira;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 01 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria da área técnica- 3º pavimento.
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm
- Aplicação de selador em parede do 3º pavimento.
- Pintura da rede de Sprinkler.
- Contra piso para regularização da laje do Hall para recebimento de impermeabilização.
- Confecção de alvenaria de sala do CPD - 1º Pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrência

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ, NUBLADO PELA TARDE.	DATA:09/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO NO 3º PAVIMENTO;	
3.3 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 3ºPAVIMENTO;	
3.4 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 3º PAVIMENTO;	
3.5 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.6 EXECUÇÃO DE ELETROCALHA DE PISO DO 3º PAVIMENTO;	
3.7 DESPLACAMENTO E CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO.	
3.9 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA DA LAJE DE COBERTURA DO HALL	
3.10 PINTURA DOS TUBOS DE INCÊNDIO COM TINTA VERMELHA ÓLEO;	
3.11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2º PAVIMENTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 VAZAMENTO PELO RUFO DA PELE DE VIDRO.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	146
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	586	DATA	10/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	147
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	585	DATA	11/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	148
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	584	DATA	12/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 12/06/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: chuva forte durante toda a manhã					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria da área técnica- 3º pavimento.					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Instalação elétrica - Infraestruturas com colocação de caixas 4x2 do 2º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 2º pavimento.					
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.					
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm					
- Aplicação de selador em parede do 3º pavimento.					
- Contra piso para regularização da laje do Hall para recebimento de impermeabilização.					
- Confecção de alvenaria de sala do CPD - 1º Pavimento.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrência					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ, NUBLADO PELA TARDE.	DATA:12/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 2ºPAVIMENTO;	
3.3 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.4 DESPLACAMENTO E CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 CONTRA PISO LAJE DO HALL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO;	
3.7 EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO 1º PAVIMENTO, PARA FECHAR VÃO EM DESACORDO COM O PROJETO;	
3.8 COLOCAÇÃO DE TELA PARA REBOCO NOS DEGRAUS DO AUDITÓRIO;	
3.9 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 2º PAVIMENTO;	
3.10 COLOCAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 4x2 DO 2º PAVIMENTO;	
3.11 RASGO EM PAREDE PARA COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO/CAIXAS DE PASSAGEM DO 2º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	149
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	583	DATA	13/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 13/06/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: tempo nublado com pancadas de chuva durante todo dia.					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria da área técnica- 3º pavimento.					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Instalação elétrica - Infraestruturas com colocação de caixas 4x2 do 2º pavimento e eletroduto flexível 3/4".					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 2º pavimento.					
- Impermeabilização da Área técnica e San 03 do 3º pavimento.					
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm.					
- Chapisco e reboco reforçado tela galvanizada hexagonal dos degraus do auditório.					
- Aplicação de selador e massa PVA em parede do 3º pavimento.					
- Contra piso para regularização da laje do Hall para recebimento de impermeabilização.					
- Confecção de alvenaria e chapisco de sala do CPD - 1º Pavimento.					
- Confecção de alvenaria da área técnica - 1º Pavimento.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrência					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:13/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 2º PAVIMENTO;	
3.3 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.4 DEMOLIÇÃO DO ACABAMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 CONTRA PISO LAJE DO HALL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO;	
3.7 EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO 1º PAVIMENTO, PARA FECHAR VÃO EM DESACORDO COM O PROJETO;	
3.8 CONTRA PISO E REBOCO DOS DEGRAUS DO AUDITÓRIO;	
3.9 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 2º PAVIMENTO;	
3.10 COLOCAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 4x2 DO 2º PAVIMENTO;	
3.11 RASGO EM PAREDE PARA COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO/CAIXAS DE PASSAGEM DO 2º PAVIMENTO;	
3.12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2º PAVIMENTO;	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	150
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	582	DATA	14/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 14/06/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo bom ensolarado.					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria da área técnica- 3º pavimento.					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Instalação elétrica - Infraestruturas com colocação de caixas 4x2 do 2º pavimento e eletroduto flexível 3/4".					
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do 2º pavimento.					
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.					
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm.					
- Chapisco e reboco reforçado tela galvanizada hexagonal dos degraus do auditório.					
- Aplicação de selador e massa PVA em parede do 3º pavimento.					
- Contra piso para regularização da laje do Hall para recebimento de impermeabilização.					
- Confeção de alvenaria e chapisco de sala do CPD - 1º Pavimento.					
- Confeção de alvenaria da área técnica - 1º Pavimento.					
- Instalação de Som e Antena - Infraestruturas com eletrodutos.					
4 - Ocorrências: Visita da SEA na obra					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:14/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 2º PAVIMENTO;	
3.3 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.4 DEMOLIÇÃO DO ACABAMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 CONTRA PISO LAJE DO HALL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO;	
3.7 EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO 1º PAVIMENTO, PARA FECHAR VÃO EM DESACORDO COM O PROJETO;	
3.8 CONTRA PISO E REBOCO DOS DEGRAUS DO AUDITÓRIO;	
3.9 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 2º PAVIMENTO;	
3.10 COLOCAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 4x2 DO 2º PAVIMENTO;	
3.11 RASGO EM PAREDE PARA COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO/CAIXAS DE PASSAGEM DO 2º PAVIMENTO;	
3.12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2º PAVIMENTO;	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	151
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	581	DATA	15/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 15/06/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo bom ensolarado.					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria da área técnica- 2º pavimento.					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 3º pavimento.					
- Instalação elétrica - Infraestruturas com colocação de caixas 4x2 do 2º pavimento e eletroduto flexível 3/4".					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 2º pavimento.					
- Impermeabilização da Área técnica do 3º pavimento.					
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm.					
- Chapisco e reboco reforçado tela galvanizada hexagonal dos degraus do auditório.					
- Aplicação de selador e massa PVA em parede do 3º pavimento.					
- Contra piso para regularização da laje do Hall para recebimento de impermeabilização.					
- Confecção de alvenaria da área técnica - 1º Pavimento.					
- Instalação de Som e Antena - Infraestruturas com eletrodutos.					
- Retirada, e substituição de telhas trapezoidal novas das cobertura lado B.					
4 - Ocorrências: Visita da SEA na obra.					
Após reunião com a equipe SEA ficou definido que as cores de cabos FASE COR PRETO para rede normal e cabos FASE COR VERMELHO parede ininterrupta.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:15/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 2º PAVIMENTO;	
3.3 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.4 DEMOLIÇÃO DO ACABAMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 CONTRA PISO LAJE DO HALL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO;	
3.7 EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO 1º PAVIMENTO, PARA FECHAR VÃOS EM DESACORDO COM O PROJETO;	
3.8 CONTRA PISO E REBOCO DOS DEGRAUS DO AUDITÓRIO;	
3.9 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 2º PAVIMENTO;	
3.10 COLOCAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 4x2 DO 2º PAVIMENTO;	
3.11 RASGO EM PAREDE PARA COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO/CAIXAS DE PASSAGEM DO 2º PAVIMENTO;	
3.12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2º PAVIMENTO;	
3.13 RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS TRAPEZOIDAIS DA COBERTURA "B";	
3.14 INSTALAÇÃO DE SOM E ANTENA - INFRAESTRUTURAS COM ELETRODUTOS.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	152
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	580	DATA	16/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 16/06/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo nublado com chuva					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
05 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
02 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em Eletrotécnica					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria da área técnica- 2º pavimento.					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 2º pavimento.					
- Instalação elétrica - Infraestruturas com colocação de caixas 4x2 do 2º pavimento e eletroduto flexível 3/4".					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 2º pavimento.					
- Impermeabilização da Área técnica do 2º pavimento.					
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.					
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.					
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm.					
- Chapisco e reboco reforçado tela galvanizada hexagonal dos degraus do auditório.					
- Aplicação de selador e massa PVA em parede do 3º pavimento.					
- Contra piso para regularização da laje do Hall para recebimento de impermeabilização.					
- Confecção de alvenaria da área técnica - 1º Pavimento.					
- Instalação de Som e Antena - Infraestruturas com eletrodutos.					
- Retirada, e substituição de telhas trapezoidal novas das cobertura lado A.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:16/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 3º PAVIMENTO;	
3.2 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 2º PAVIMENTO;	
3.3 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.4 DEMOLIÇÃO DO ACABAMENTO E EXECUÇÃO DE CHAPISCO DOS PILARES E VIGAS;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 CONTRA PISO LAJE DO HALL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO;	
3.7 EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO 1º PAVIMENTO, PARA FECHAR VÃOS EM DESACORDO COM O PROJETO;	
3.8 CONTRA PISO E REBOCO DOS DEGRAUS DO AUDITÓRIO;	
3.9 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 2º PAVIMENTO;	
3.10 COLOCAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM 4x2 DO 2º PAVIMENTO;	
3.11 RASGO EM PAREDE PARA COLOCAÇÃO DE ELETRODUTO/CAIXAS DE PASSAGEM DO 2º PAVIMENTO;	
3.12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2º PAVIMENTO;	
3.13 RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS TRAPEZOIDAIS DA COBERTURA "B";	
3.14 INSTALAÇÃO DE SOM E ANTENA - INFRAESTRUTURAS COM ELETRODUTOS.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	153
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	579	DATA	17/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 17/06/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo nublado com chuva 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em Eletrotécnica 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 2º pavimento. - Instalação elétrica - Infraestruturas com colocação de caixas 4x2 do 2º pavimento e eletroduto flexível 3/4". 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	154
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	578	DATA	18/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	155
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	577	DATA	19/06/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 19/06/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo nublado pouco ensolarado

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheira Civil;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 02 - Técnico em Edificações;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 01 - Aux. administrativo
- 04 - Carpinteiro;
- 05 - Pedreiro;
- 12 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 02 - Pintor
- 01 - Operador de caldeira;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em Eletrotécnica

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de chapisco e reboco em alvenaria da área técnica- 2º pavimento.
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 2º pavimento.
- Instalação elétrica - Infraestruturas com colocação de caixas 4x2 do 2º pavimento e eletroduto flexível 3/4".
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 2º pavimento.
- Impermeabilização da Área técnica do 2º pavimento.
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 3º pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 2º pavimento.
- Teste de Estanqueidade D'Água para ver a Impermeabilização da Caixa D'Água.
- Contrapiso do auditório com alturas variáveis de entre 3cm a 9 cm.
- Chapisco e reboco reforçado tela galvanizada hexagonal dos degraus do auditório.
- Aplicação de selador e massa PVA em parede do 3º pavimento.
- Contra piso para regularização da laje do Hall para recebimento de impermeabilização.
- Confecção de alvenaria da área técnica - 1º Pavimento.
- Retirada e substituição de telhas trapezoidal novas das cobertura lado A.
- Instalação de dutos de Climatização - 3º pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ E ENSOLARADO TARDE.	DATA:19/06/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO: RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO	
2 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 2º PAVIMENTO;	
3.2 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 2º PAVIMENTO;	
3.3 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 3º PAVIMENTO;	
3.4 DEMOLIÇÃO DO REBOCO DOS PILARES E VIGAS OCOS;	
3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREAS MOLHADAS 3º PAVIMENTO;	
3.6 CONTRA PISO LAJE DO HALL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO;	
3.7 EXECUÇÃO DE ALVENARIA NO 1º PAVIMENTO, PARA FECHAR VÃOS EM DESACORDO COM O PROJETO;	
3.8 CONTRA PISO E REBOCO DOS DEGRAUS DO AUDITÓRIO;	
3.9 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 2º PAVIMENTO;	
3.10 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 2º PAVIMENTO;	
3.11 RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS TRAPEZOIDAIS DA COBERTURA "B";	
3.12 INSTALAÇÃO DE DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO;	
3.13 COLOCAÇÃO DE CAIXAS 4x2 E ELETRODUTO FELXÍVEL DO 2º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 A CONTRATADA REALIZOU JORNADA DE TRABALHO NO SÁBADO, 17/06/2023, PARA EXECUÇÃO DA INFRESTRUTURA ELÉTRICA DO 2º PAVIMENTO	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada
