

PR-RR-00022122/2023



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 7ª MEDIÇÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 07/2023			
INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA:		16 de janeiro de 2023	
PERÍODO DO RELATÓRIO		De 20 de julho até 16 de agosto de 2023	
SERVIÇOS PREVISTOS PARA SÉTIMA MEDIÇÃO		Instalação de infraestrutura elétrica, combate à incêndio, impermeabilização, sistema de climatização, execução de alvenaria e emassamento	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF			
Nome:	Engenheiro Marcos Eduardo Silva Madureira		
Telefone:	(95) 3198-2005		
E-mail:	marcoseduardo@mpf.mp.br		
1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)			
Nome:	Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira		
Portaria:	SE/PR-RR nº02/2023		
Telefone:	(95) 3198-2025 / 2073		
E-mail:	prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br		
2.0 - ESCOPO E LOCAL			
DADOS DO CONTRATO:	Nº Contrato: 05/2022	PPA/LOA: AÇÃO 110E	
Empresa Contratada	J. NASSER ENGNHARIA LTDA	CNPJ 04.618.096/0001-07	
Matrícula CEI da Obra	51.235.89823/71		
Valor Atual do Contrato	R\$31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco		

	mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)
Percentual de reajuste	6,0%
Saldo de Empenho	5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022
Local/UF	Boa Vista – RR
Responsável Técnico	José Nasser – ART de Execução: RR20230111507
Corresponsável Técnico	Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835
Nota Fiscal Eletrônica de Referência	R\$ 406.964,62 (quatrocentos e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste	R\$ 21.685,56 (Vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% Previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
3	1,16%	0,75%	1,40%	1,25%
4	0,88%	0,66%	1,93%	1,91%
5	1,64%	1,29%	3,57%	3,21%
6	1,94%	1,25%	5,51%	4,46%
7	0,95%	1,29%	4,93%	5,75%
TOTAL EXECUTADO				5,75%
TOTAL A EXECUTAR				94,25%

Identificação do processo de fiscalização	1.32.000.000464/2022-71
Tipo de obra	Prédio Público
Objeto da fiscalização	Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima
Período abrangido pela fiscalização	20/07/2023 a 16/08/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)

3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a serviço de alvenaria/chapisco/emboço, colocação de granito (peitoril), viga do guarda corpo (hall), instalações hidrossanitários, instalação de incêndio, sistema de climatização (envelopamento), instalações de infra de elétrica como interruptor e tomada baixa ou alta, fiação de iluminação e tomada/interruptor, pontos de ancoragem, impermeabilização da área técnica/cobertura, aplicação de selador e massa latéx em paredes, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza,

consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: IMPERMEABILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO;

Constatação do Período nº 2: Fui surpreendido por funcionário da empresa cobrando que não tinha recebido o salário estava insatisfeito com a empresa, respondi a eles que não tinha informação sobre o assunto.

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

A) Em resposta a carta 9/2023 J NASSER ENGENHARIA LTDA -PR-RR-00018007/2023, segue em anexo as pranchas do projeto executivo solicitado como: PROJETO ESTRUTURAL DA VIGA E PILARES DA PLATIBANDA PRANCHA STR - 01/01 E PROJETO EXECUTIVOS DA COBERTURA METÁLICA PRANCHA STR - 01/01;

B) Em resposta a carta 11/2023 J NASSER ENGENHARIA LTDA -PR-RR-00018279/2023, para informar que foi elaborado o projeto de detalhamento executivo da junta de dilatação, e repassado para empresa;

C) Em resposta a carta 16/2023 J NASSER ENGENHARIA LTDA - PR-RR-00019873/2023, esclarecer que de acordo com o CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Visto com isso permite na circulação (escada e corredores) um pé direito com alturas mínimas de 2,40m. Conforme os projetos executivos existentes com altura do pé direito dos corredores/Hall com altura 2,60m, vamos ter que alterar altura do pé direito dos corredores/Hall para 2,50m por motivo de compatibilização de projeto dando interferência nas instalações. Vamos permanecer todos os ambientes com o forro de 2,60m de altura como pede o projeto executivo.

D) Em resposta a carta 17/2023 J NASSER ENGENHARIA LTDA - PR-RR-00019916/2023, O Vitpoli Eco, especificado no projeto de impermeabilização na marquise (PRANCHA 03/04). Após a retirada de toda a impermeabilização aplica o PU na junta entre o vidro e a laje. Para a camada de regularização utilizar argamassa 1:3 aditivada com Vifix diluído em volume na proporção 1:2 (Vifix/água). Visto também que é a mesma não constava na planilha orçamentária da obra com isso serviço vai ser aditivo;

E) Em resposta à CARTA 11/2023 J NASSER ENGENHARIA LTDA - PR-RR-00018279/2023; para informar que foi elaborado o projeto de paginação de piso e fornecido para empresa;

F) Em resposta a carta 12/2023 J NASSER ENGENHARIA LTDA -PR-RR-00018784, da especificação do material em Bloco de concreto e a cota de nível do peitoril da janela alta dos sanitários vão Fica na altura de 2 m. Já área técnica vai fechar todo vão do ambiente. Os ambientes como: os sanitários 04 femininos nos 1º; 2º e 3º pavimentos, bem como na área técnica do 3

pavimento.

G) informar sobre o projeto que já tinha repassado para empresa com aprovação na Secretaria de trânsito da prefeitura de Boa Vista-RR. A mesma estava cobrando in loco o projeto.

H) Foi entregue as especificações de acordo com o projeto de arquitetura e a planilha, entrar em contato com fabricante sobre material, acessórios, dimensão da porta e apresentar a proposta a seguir e tirar algumas dúvidas com a mesma.

I) Foram colocados e pagos os pontos de ancoragem faltando só fazer o teste do arranque dos pontos ancoragem.

6.0 – CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.

7.0 – ANEXOS

A) Relatório fotográfico do período

8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 16 de agosto de 2023

9.0 - FÉ DO MEMBRO DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

Declaramos que as metas estabelecidas na 7ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas.

Marcos Eduardo Silva Madureira
 Engenheiro Civil/Membro da Comissão

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.

10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL

() Não foram identificados vícios.

() Ver Nota Técnica ou Despacho constante da
 folha _____ de
 nº. _____

Igor José Barbosa Duarte Lopes
 Secretário Estadual

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 7ª MEDIÇÃO

11.0 - A SÉTIMA MEDIÇÃO FOI EFETUADA PELO FISCAL DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, MATRÍCULA 31143, NO DIA 16/08/2023

11.1 - Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado <i>in loco</i>	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E PROTEÇÃO	79,90%	80,37%		X
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,00%	3,12%		X
ESTRUTURAS DE CONCRETO				
GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS	11,35%	12,39%		X
ARQUITETURA				

VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS, ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	4,43%	4,43%		X
IMPERMEABILIZAÇÃO				
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	39,21%	36,99	X	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				
ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO	1,49%	2,20%		X
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E SPRINKLERS	13,00%	14,81%		X
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				
SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO	6,06%	7,90%		X
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV,	1,08%	0,02	X	
CLIMATIZAÇÃO				
ÁGUA GELADA, VRF, SPLIT, VENTILAÇÃO MECÂNICA-, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS, LIGACÕES E DUTOS DE AR	1,43%	3,88%		X
SERVIÇOS GERAIS				
TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO	41,20%	43,23%		X

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA	4,93%	5,75%		X

12.0 Segue abaixo a planilha contendo o resumo dos serviços efetivamente realizados e pactuados para finalização do contrato nº 05/2022.

TABELA PARA O REAJUSTE													
DESCRIÇÃO	SUBTOTAL COM BDI	PREVISTO	REALIZADO	ESTA EM ATRASO		VALOR EM ATRASO NO MOMENTO DO SEGUNDO REAJUSTE	VALOR ADIANTADO NO MOMENTO DO SEGUNDO REAJUSTE	VALOR EXECUTADO NA 5ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 5ª MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NA 6ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 6ª MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NA 7ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 7ª MEDIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.116,52	R\$ 56.626,80	R\$ 56.885,15	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 258,35	R\$ 2.485,46	R\$ 134,21	R\$ 1.256,41	R\$ 202,06	R\$ 548,74	R\$ 231,69
		74,39%	74,73%		☹								
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 166.895,56	R\$ 830,11	R\$ 1.719,89	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 889,78	R\$ 1.134,38	R\$ 61,26	R\$ 1.006,85	R\$ 115,63	R\$ 1.341,22	R\$ 188,05
		0,50%	1,03%		☹								
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 372.192,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		☹								
ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 387.887,79	R\$ 18.870,99	R\$ 31.938,44	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 13.067,45	R\$ 7.736,79	R\$ 417,79	R\$ 201,43	R\$ 428,66	R\$ 8.169,14	R\$ 869,80
		4,87%	8,23%		☹								
ARQUITETURA	R\$ 10.883.731,21	R\$ 172.062,82	R\$ 290.256,85	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 118.194,03	R\$ 95.101,99	R\$ 5.135,51	R\$ 45.241,00	R\$ 7.578,52	R\$ 51.679,73	R\$ 10.369,23
		1,58%	2,67%		☹								
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 459.919,12	R\$ 68.028,57	R\$ 58.671,64	SIM	NÃO	R\$ 9.356,93	R\$ 0,00	R\$ 45.082,45	R\$ 1.929,18	R\$ 33.072,04	R\$ 3.728,05	R\$ 0,00	R\$ 5.513,95
		14,79%	12,76%	☹									
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 944.990,20	R\$ 35.437,13	R\$ 7.053,63	SIM	NÃO	R\$ 28.383,50	R\$ 0,00	R\$ 5.374,12	R\$ 0,00	R\$ 2.878,80	R\$ 0,00	R\$ 5.380,21	R\$ 0,00
		3,75%	0,75%	☹									
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.193.101,20	R\$ 29.827,53	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 29.827,53	R\$ 0,00	R\$ 71.152,08	R\$ 2.231,53	R\$ 70.663,73	R\$ 6.047,37	R\$ 34.913,88	R\$ 7.932,72
		2,50%	0,00%	☹									
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 5.365.186,69	R\$ 107.303,73	R\$ 24.793,36	SIM	NÃO	R\$ 82.510,37	R\$ 0,00	R\$ 125.541,55	R\$ 2.323,68	R\$ 143.724,83	R\$ 10.084,82	R\$ 129.545,16	R\$ 17.080,26
		2,00%	0,46%	☹									
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1.087.133,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,58	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 12,61
		0,00%	0,00%		☹								
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	2.540.238,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		☹								
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.455.597,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.370,57	R\$ 668,01	R\$ 58.122,27	R\$ 3.806,61	R\$ 102.481,78	R\$ 9.340,63
		0,00%	0,00%		☹								
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 756.454,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		☹								
SERVIÇOS GERAIS	234.157,38	R\$ 70.046,34	R\$ 82.137,65	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.091,31	R\$ 8.145,95	R\$ 439,88	R\$ 5.518,76	R\$ 737,89	R\$ 5.412,22	R\$ 1.030,15
		29,91%	35,08%		☹								
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.672.342,00	R\$ 51.695,79	R\$ 51.175,29	SIM	NÃO	R\$ 520,50	R\$ 0,00	R\$ 34.566,60	R\$ 1.838,49	R\$ 33.461,10	R\$ 3.645,39	R\$ 34.420,50	R\$ 5.504,10
		1,93%	1,91%	☹									
TOTAIS EM ATRASO OU ADIANTADO SEGUNDO O CRONOGRAMA APÓS A QUARTA MEDIÇÃO.						150.598,84	R\$ 144.500,92		R\$ 15.179,53		R\$ 21.208,09		R\$ 21.685,56

ÍNDICE INCC-DI, ACUMUALADO ATÉ MAIO DE 2023 FGV	5,40%	PREÇO TOTAL DO CONTRATO	R\$ 31.595.942,84	A PAGAR APARTIR DA 5ª PARCELA	R\$ 30.991.310,94	A PAGAR COM O PRIMEIRO REJUSTE	R\$ 30.840.712,10
---	-------	-------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 5ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$281.102,49
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 6ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$392.742,49
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 7ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$401.584,41

TOTAL			
VALORES A PAGAR PELO MPF 5ª MEDIÇÃO	=	R\$15.179,53	R\$423.871,47
VALORES A PAGAR PELO MPF 6ª MEDIÇÃO	=	R\$21.208,09	R\$416.829,38
VALORES A PAGAR PELO MPF 7ª MEDIÇÃO	=	R\$21.685,56	R\$428.650,18

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATADOS					7ª. MEDIÇÃO		ACUMULADO NA 7ª		SALDO CONTRATUAL		
		UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						76.116,52	0,72%	548,74	80,37%	61.175,76		14.940,76
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						10.098,24		548,74	23,42%	2.364,51		7.733,73
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	36,38	43,22	53,38		1.941,96	10,28	548,74	32,54	1.736,95	3,84	205,01
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS						166.895,56	0,80%	1.341,22	3,12%	5.202,34		161.693,22
2.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						166.895,56		1.341,22	3,12%	5.202,34		161.693,22
2.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	640,00	15,89	19,62		12.556,80	68,36	1.341,22	99,36	1.949,44	540,64	10.607,36
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO						387.887,79	2,11%	8.169,14	12,39%	48.045,80		339.841,99
4.5	REPAROS E COMPLEMENTOS						75.659,69		8.169,14		39.362,50		36.297,19
4.5.1	PONTO DE ANCORAGEM NA ESTRUTURA - ELEMENTO DE FIXAÇÃO E OLHAL EM AÇO INOX Ø12MM (FIXAÇÃO QUÍMICA + TESTE COM DINAMÔMETRO) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 2300KG	UN	90,00	129,10	159,47		14.352,30	49,00	7.814,03	49,00	7.814,03	41,00	6.538,27
4.5.8	RETIRADA DA INFRAESTRUTURA DE TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO/ELETRICA	M	2.588,00	8,97	11,08		28.675,04	32,05	355,11	2.588,00	28.675,01	0,00	0,03
5	ARQUITETURA						10.883.731,21	0,47%	51.679,73	4,43%	482.279,57		10.401.451,64
5.1	VEDAÇÕES						401.563,21		2.424,53	4,76%	19.096,36		382.466,85
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO).	M²	364,00	75,87	93,72		34.114,08	25,87	2.424,53	203,76	19.096,36	160,24	15.017,72
5.2	PISOS						3.080.170,94		4.937,18	10,32%	317.746,12		2.762.424,82
5.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M²	355,00	42,09	51,99		18.456,45	19,29	1.002,88	325,57	16.926,37	29,43	1.530,08
5.2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M²	630,00	51,06	63,07		39.734,10	62,38	3.934,30	630,00	39.734,08	0,00	0,02
5.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS						2.370.814,97		13.783,91	2,18%	51.760,29		2.319.054,68
5.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE AÇOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	786,47	6,67	8,23		6.472,64	79,92	657,74	691,56	5.691,51	94,91	781,13
5.3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM	M²	811,47	34,34	42,42		34.422,55	122,05	5.177,36	803,01	34.063,66	8,46	358,89
5.3.8	PEITORIL EM GRANITO (CINZA ANDORINHA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	60,40	631,48	780,06		47.115,62	10,19	7.948,81	15,39	12.005,12	45,01	35.110,50
5.8	PINTURA						1.096.660,80		30.534,11	5,06%	55.527,04		1.041.133,76
5.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	11.292,52	13,37	16,51		186.439,50	1.559,65	25.749,82	2.640,13	43.588,53	8.652,39	142.850,97
5.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	10.594,50	2,16	2,66		28.181,37	1.573,24	4.184,81	3.769,71	10.027,41	6.824,79	18.153,96
5.8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M²	5.973,00	19,96	24,65		147.234,45	24,32	599,48	77,53	1.911,10	5.895,47	145.323,35
6	IMPERMEABILIZAÇÃO						459.919,12	7,19%	33.072,04	36,99%	170.138,66		289.780,46
6.1	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO						459.919,12		33.072,04	36,99%	170.138,66		289.780,46
6.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAL) E EDIFICAÇÃO	M²	876,82	45,43	56,11		49.198,37	143,78	8.067,49	200,85	11.269,68	675,97	37.928,69
6.1.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	M²	655,00	83,67	103,35		67.694,25	119,51	12.351,35	119,51	12.351,35	535,49	55.342,90
6.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	M²	246,58	130,57	161,29		39.770,88	78,45	12.653,20	156,75	25.282,20	89,83	14.488,68
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS						941.059,00	0,57%	5.380,21	2,20%	20.686,76		920.372,24
7.1	ÁGUA FRIA						79.030,35		4.552,48	12,60%	9.957,70		69.072,65
7.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	357,00	22,83	28,20		10.067,40	18,20	513,24	109,15	3.078,03	247,85	6.989,37
7.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	889,00	32,30	39,90		35.471,10	40,00	1.596,00	43,24	1.725,27	845,76	33.745,83
7.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00	46,27	57,15		9.144,00	41,00	2.343,15	41,00	2.343,15	119,00	6.800,85
7.1.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	81,03	100,09		100,09	1,00	100,09	1,00	100,09	0,00	0,00
7.2	ESGOTO SANITÁRIO						175.940,44		827,73	4,34%	7.628,92		168.311,52
7.2.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00	31,78	39,25		6.280,00	7,95	312,03	90,87	3.566,62	69,13	2.713,38
7.2.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	235,00	41,75	51,57		12.118,95	10,00	515,70	14,50	747,76	220,50	11.371,19
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						1.193.101,20	2,93%	34.913,88	14,81%	176.729,69		1.016.371,51
8.6	SPRINKLERS						521.299,50		34.913,88	33,55%	174.906,70		346.392,80
8.6.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	748,00	111,50	137,73		103.022,04	194,76	26.824,29	748,00	103.022,03	0,00	0,01
8.6.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00	133,13	164,45		4.604,60	8,31	1.366,57	28,00	4.604,59	0,00	0,01
8.6.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,00	197,05	243,41		4.137,97	4,31	1.049,09	16,82	4.094,14	0,18	43,83
8.6.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	109,00	237,09	292,87		31.922,83	12,17	3.564,22	78,69	23.045,93	30,31	8.876,90
8.6.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00	371,94	459,45		14.702,40	3,25	1.493,21	32,00	14.702,39	0,00	0,01
8.6.11	SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 4" E 8" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	351,00	27,73	34,25		12.021,75	18,00	616,50	35,00	1.198,75	316,00	10.823,00


9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA					5.365.186,69	2,41%	129.545,16	7,90%	423.604,90		4.941.581,79
9.3	INFRAESTRUTURA					1.555.470,98		119.860,68	26,61%	413.920,42		1.141.550,56
9.3.1	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 50 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.373,00	77,39	95,59	131.245,07	33,37	3.189,83	591,35	56.527,12	781,65	74.717,95
9.3.2	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 100 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	698,00	93,97	116,08	81.023,84	123,86	14.377,66	340,61	39.537,98	357,39	41.485,86
9.3.4	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 150 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	491,00	113,68	140,42	68.946,22	119,43	16.770,36	338,68	47.557,43	152,32	21.388,79
9.3.5	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 250 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,00	151,64	187,32	60.879,00	39,85	7.464,70	163,44	30.615,57	161,56	30.263,43
9.3.8	SUORTE PARA TUBOS/ DUTOS/ ELETROCALHA HORIZONTAIS (CHUMBADORES, TIRANTES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.319,00	55,69	68,79	90.734,01	102,00	7.016,58	686,00	47.189,94	633,00	43.544,07
9.3.12	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.773,00	39,33	48,58	183.292,34	397,89	19.329,49	1.057,10	51.353,90	2.715,90	131.938,44
9.3.13	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 25 (1") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.975,00	47,78	59,02	116.564,50	111,25	6.565,97	187,30	11.054,44	1.787,70	105.510,06
9.3.16	SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.302,00	22,10	27,30	90.144,60	211,00	5.760,30	423,00	11.547,90	2.879,00	78.596,70
9.3.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CONDUZADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES, CONTRAPISOS, DIVISÓRIAS E OUTROS ELEMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.388,00	8,70	10,74	14.907,12	91,20	979,48	191,38	2.055,41	1.196,62	12.851,71
9.3.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.734,00	21,34	26,36	98.428,24	1.050,00	27.678,00	3.137,53	82.705,29	596,47	15.722,95
9.3.23	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	1.282,00	36,39	44,95	57.625,90	177,00	7.956,15	505,00	22.699,75	777,00	34.926,15
9.3.24	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	371,00	40,69	50,26	18.646,46	36,00	1.809,36	61,00	3.065,86	310,00	15.580,60
9.3.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	554,00	13,44	16,60	9.196,40	58,00	962,80	219,00	3.635,40	335,00	5.561,00
9.4	CONDUTORES E CABOS					1.103.775,66		9.684,48	0,88%	9.684,48		1.094.091,18
9.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67.456,00	3,87	4,78	322.439,68	1.848,00	8.833,44	1.848,00	8.833,44	65.608,00	313.606,24
9.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.635,00	6,38	7,88	75.923,80	108,00	851,04	108,00	851,04	9.527,00	75.072,76
12	CLIMATIZAÇÃO					4.455.597,11	2,30%	102.481,78	3,88%	172.974,62		4.282.622,49
12.12	ISOLAMENTO TÉRMICO - TUBULAÇÕES E DUTOS					783.397,45		102.481,78	13,08%	102.481,78		680.915,67
12.12.15	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ALUMINIZADA - MANTA DE 15 MM - ARMADUCT OU EQUIVALENTE	M2	2.217,00	254,98	314,97	698.288,49	325,37	102.481,78	325,37	102.481,78	1.891,63	595.806,71
14	SERVIÇOS GERAIS					234.157,38	2,31%	5.412,22	43,23%	101.214,58		132.942,80
14.1	TRANSPORTE DE MATERIAL					51.745,20		1.360,63	24,54%	12.700,10		39.045,10
14.1.1	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	780,00	53,71	66,34	51.745,20	20,51	1.360,63	191,44	12.700,10	588,56	39.045,10
14.2	LIMPEZA DA OBRA					96.372,88		3.991,19	38,56%	37.161,07		59.211,81
14.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	325,60	402,21	40.221,00	4,16	1.673,19	29,13	11.715,01	70,87	28.505,99
14.2.2	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	280,00	75,06	92,72	25.961,60	25,00	2.318,00	274,44	25.446,06	5,56	515,54
14.5	TAXAS DE CONSTRUÇÃO					54.660,31		60,40	93,95%	51.353,41		3.306,90
14.5.2	CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	500,00	12,23	15,10	7.550,00	4,00	60,40	281,00	4.243,10	219,00	3.306,90
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					2.672.342,00	1,29%	34.420,50	5,75%	153.623,49		2.518.718,51
15.1	INSUMOS PÚBLICOS					101.200,00		1.303,48	5,75%	5.817,60		95.382,40
15.1.1	INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	819,24	1.012,00	101.200,00	1,29	1.303,48	5,75	5.817,60	94,25	95.382,40
15.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.571.142,00		33.117,02	5,75%	147.805,89		2.423.336,11
15.2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	16.964,81	20.956,62	2.095.662,00	1,29	26.992,71	5,75	120.472,24	94,25	1.975.189,76
15.2.2	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	100,00	3.849,11	4.754,80	475.480,00	1,29	6.124,31	5,75	27.333,65	94,25	448.146,35

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI	R\$	406.964,62	R\$	1.815.909,75	R\$	29.776.101,89
-------------------------------------	-----	------------	-----	--------------	-----	---------------

13.0 Relatório Fotográfico


13.1 Selador/Massa látex



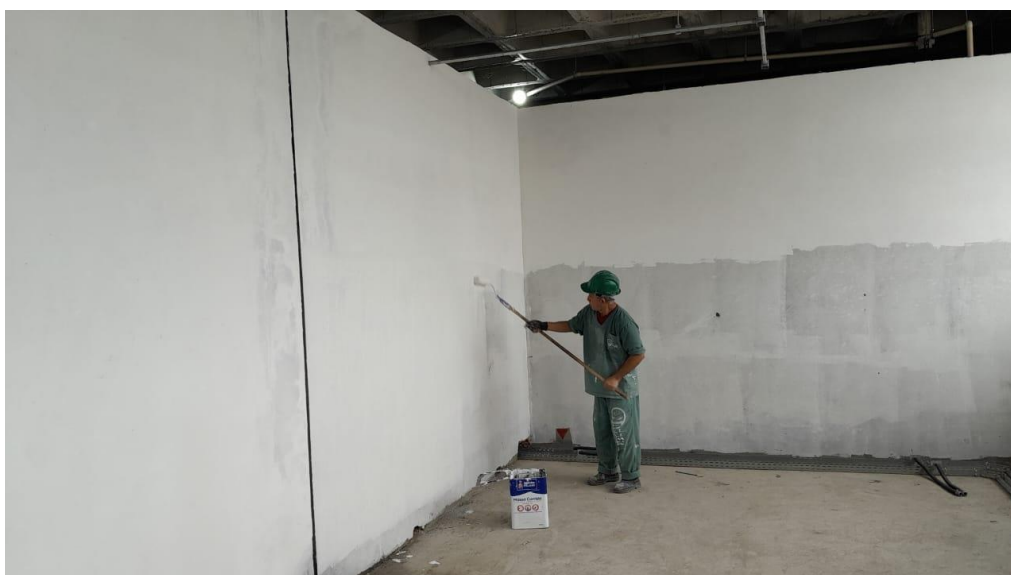






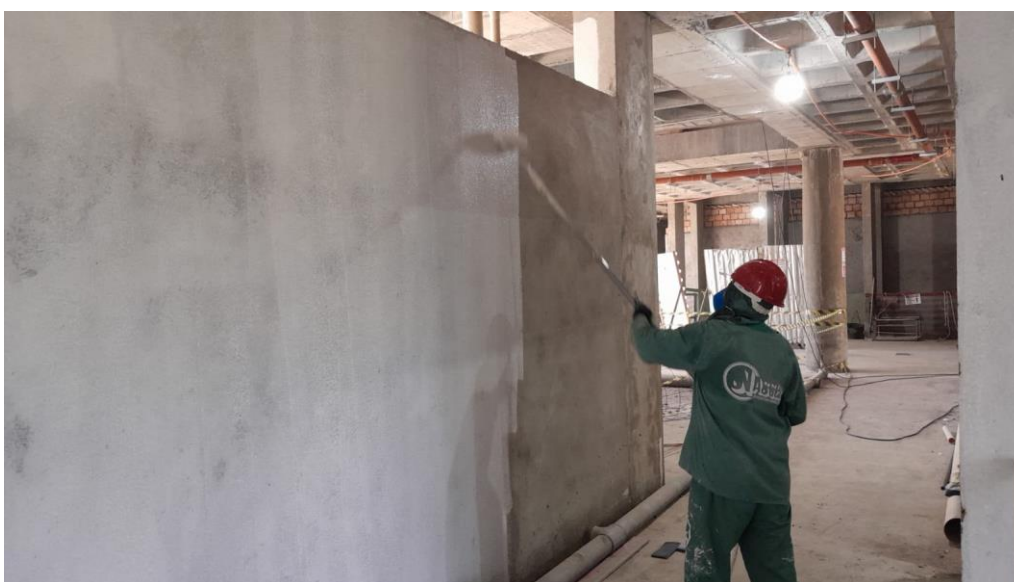










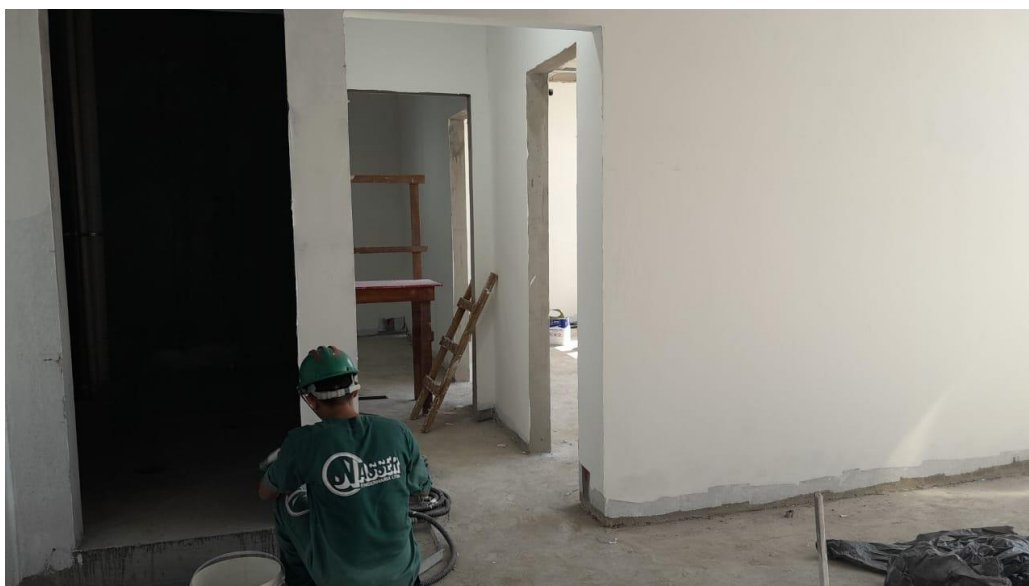

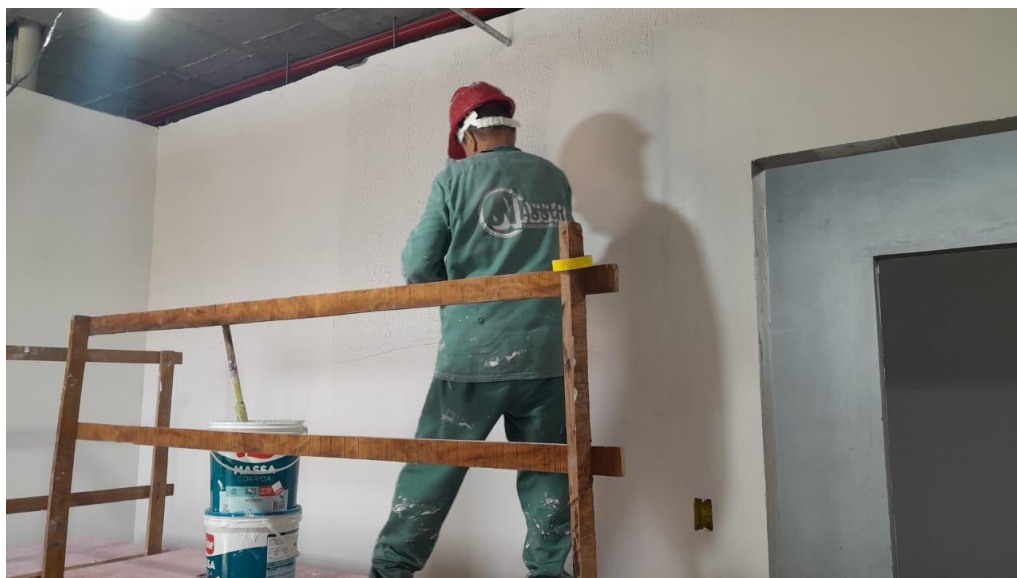



13.2 Impermeabilização e Manta Asfáltica

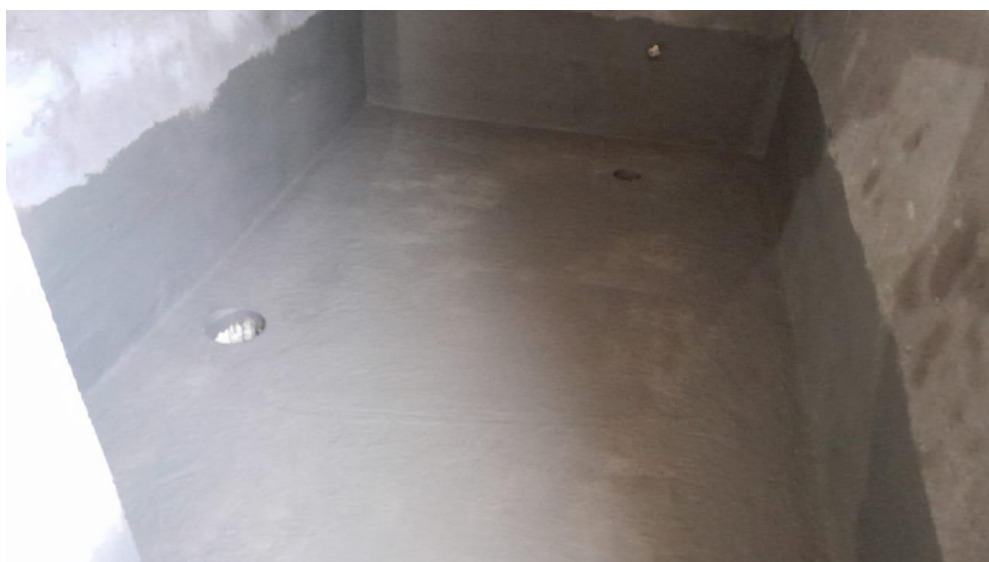

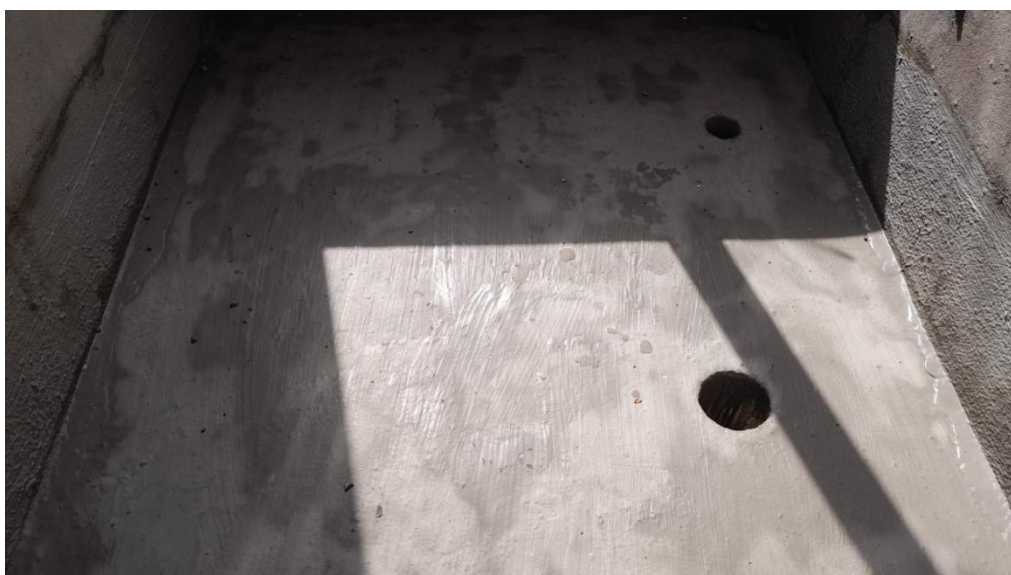



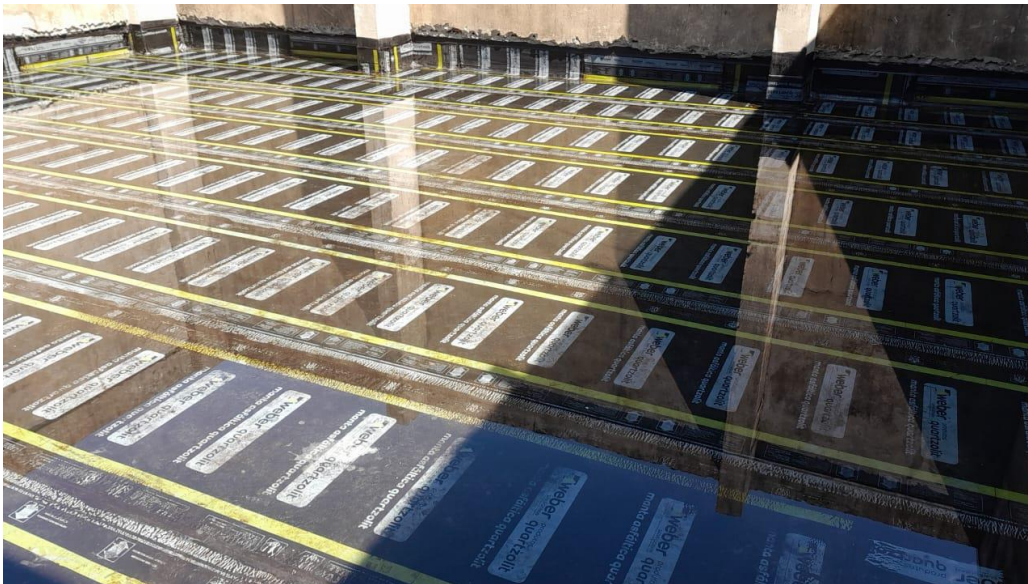

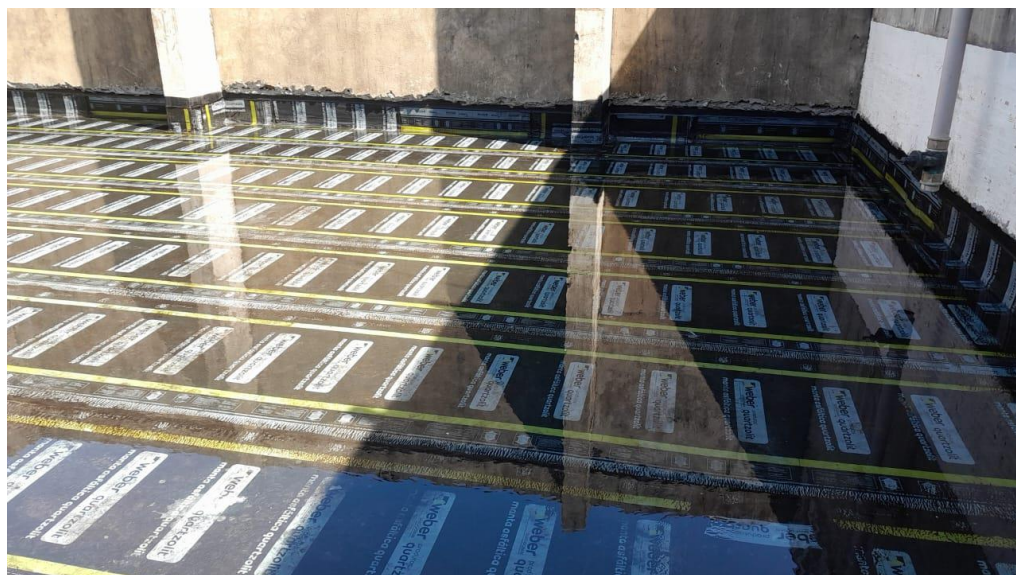

13.3 Climatização/Envelopamento
















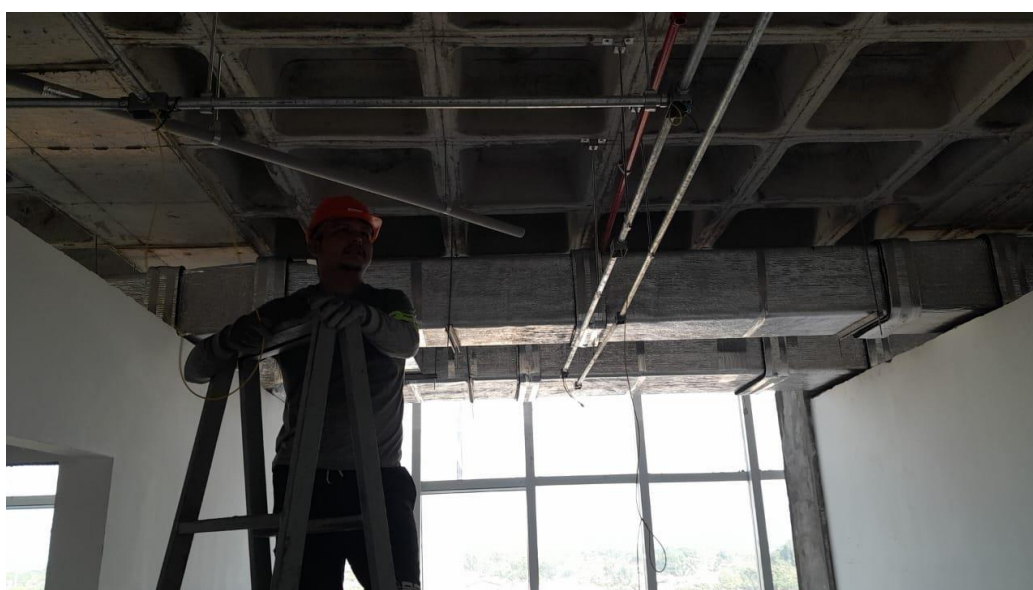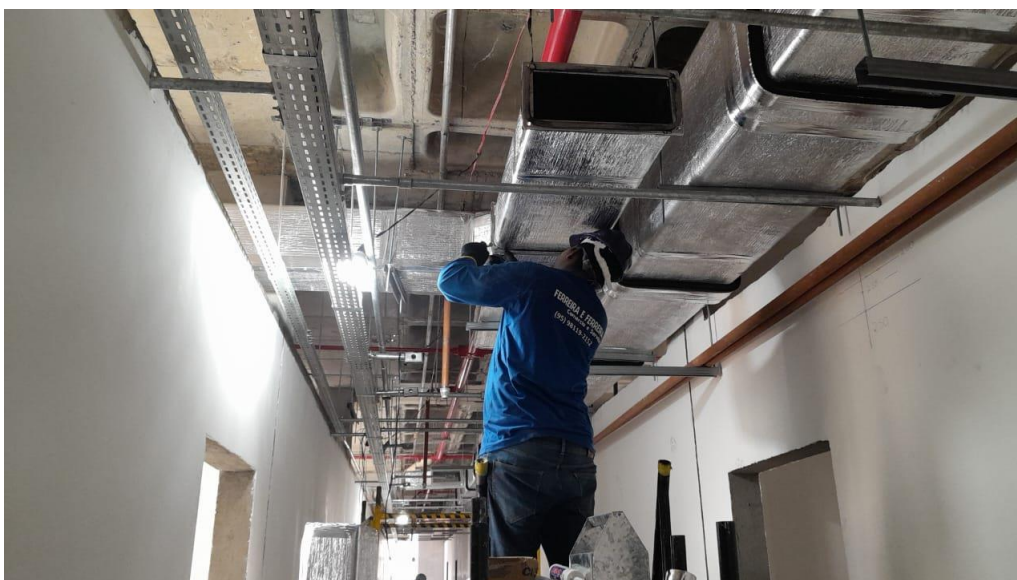


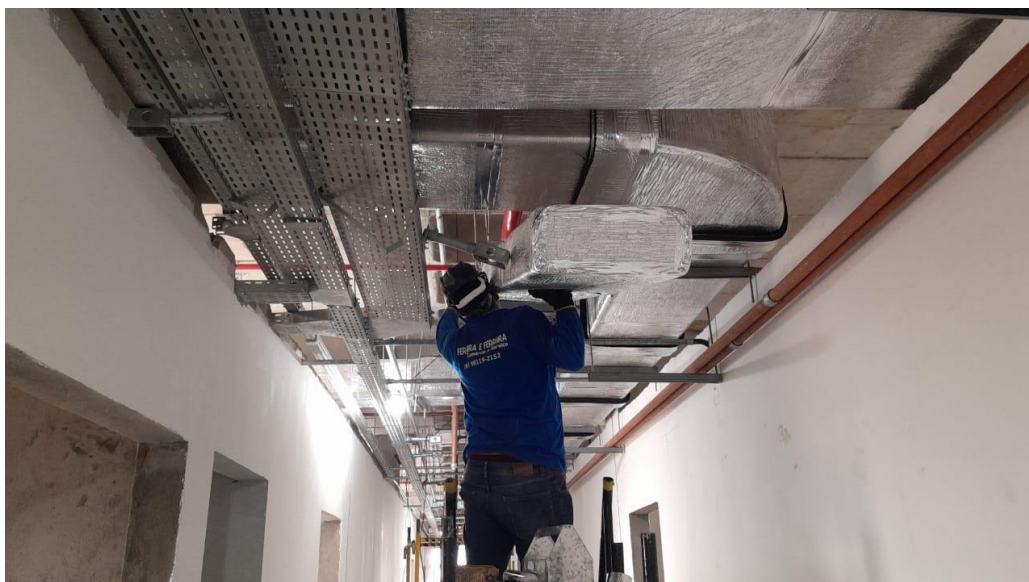

13.4 Incêndio





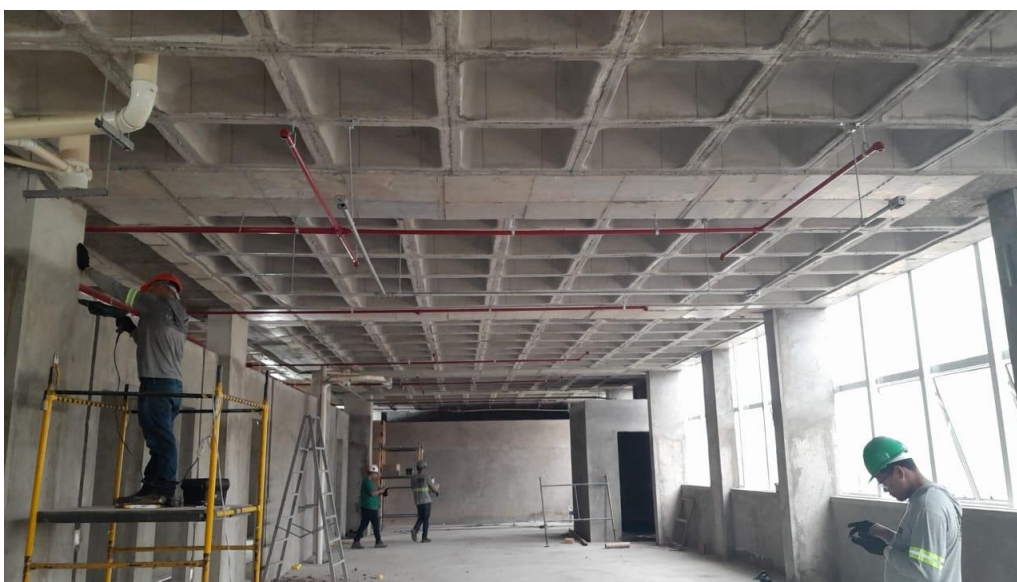













13.5 Infraestructura eléctrica



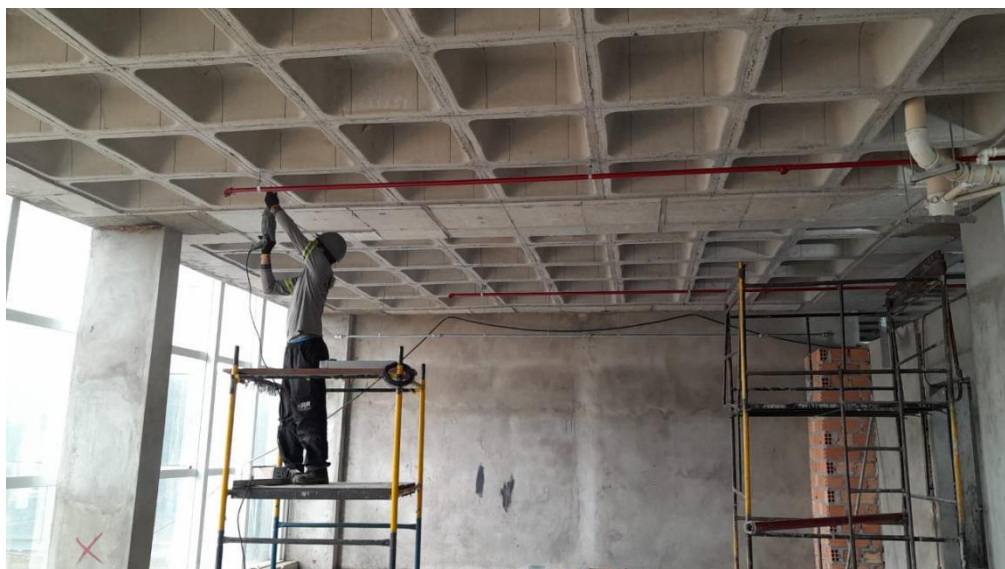




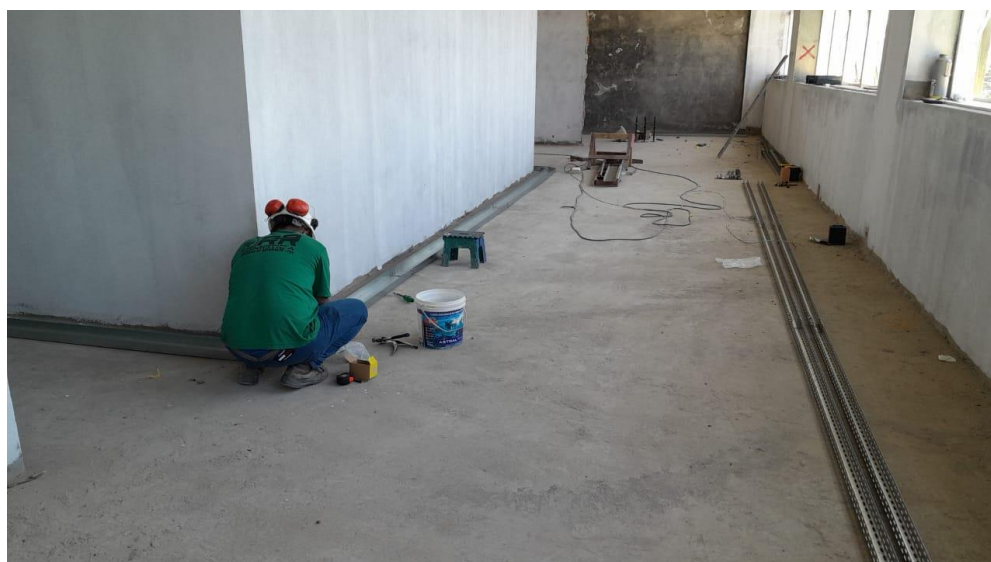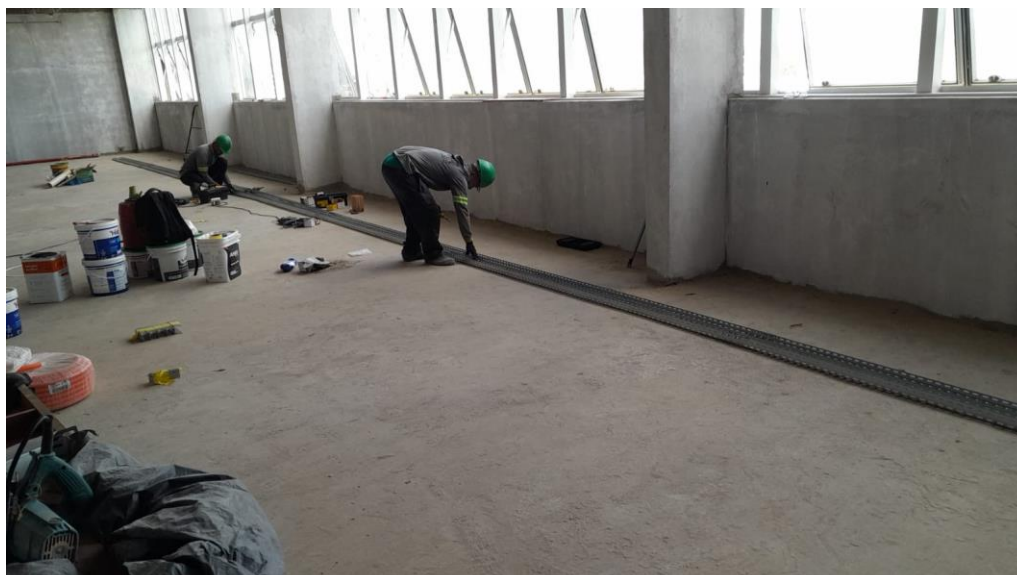


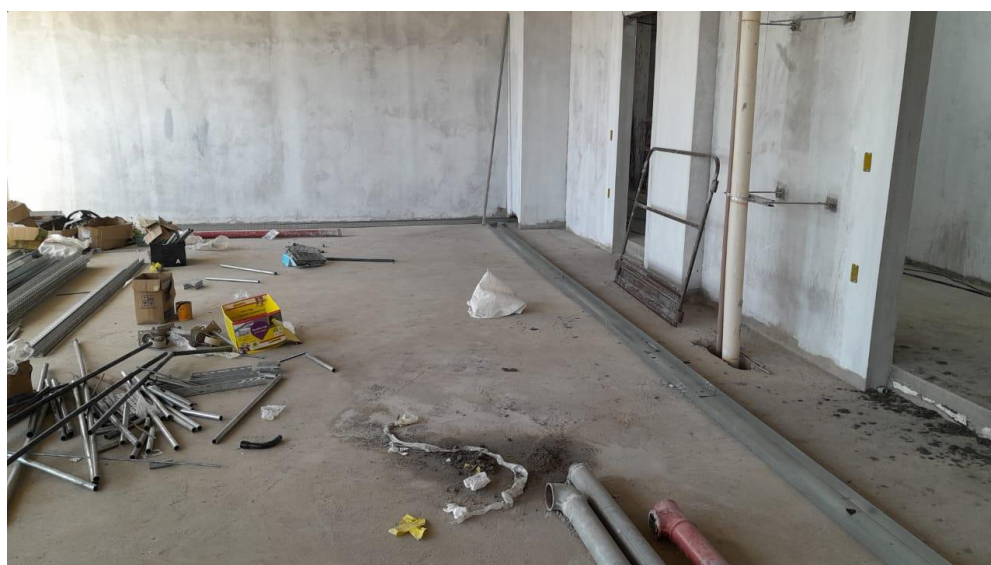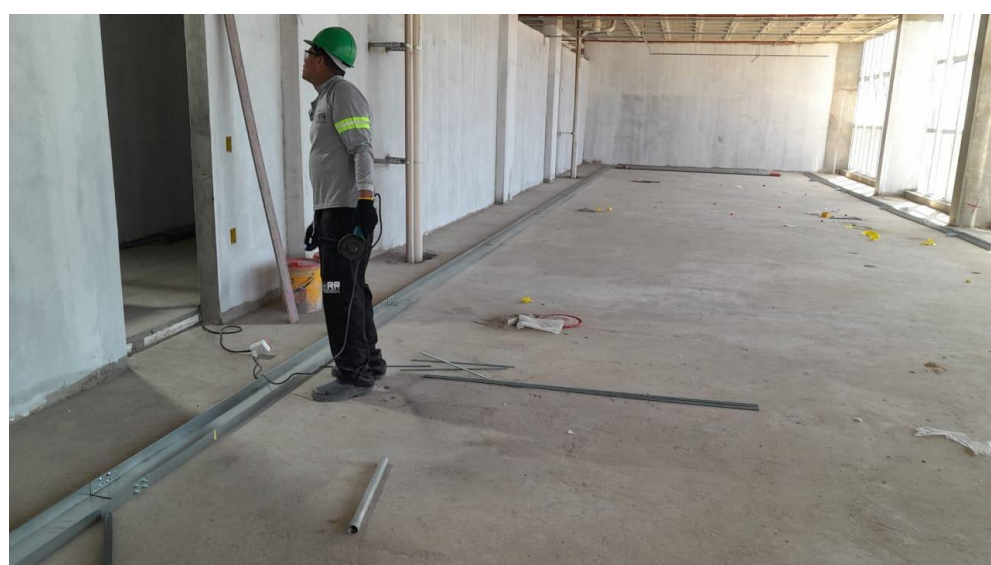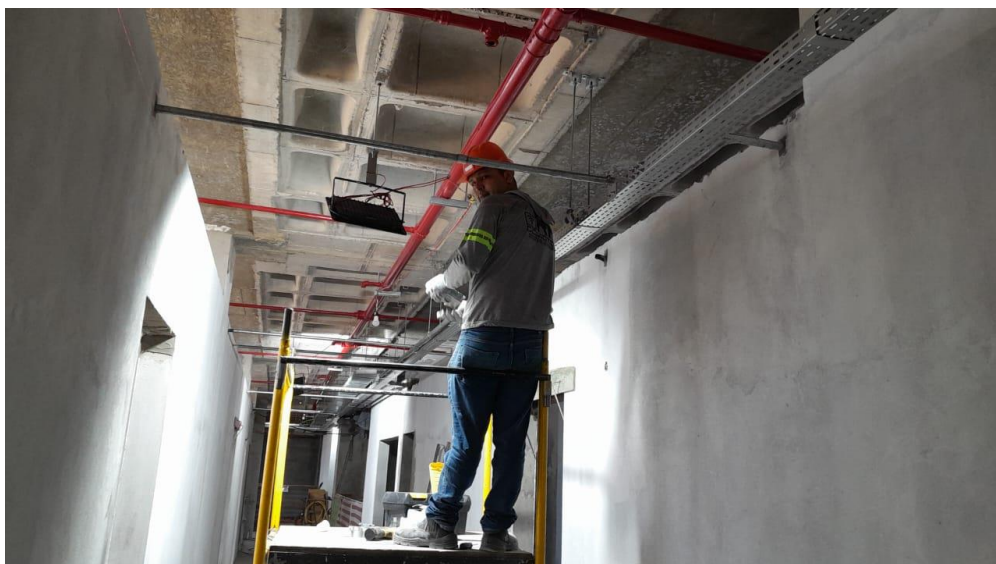






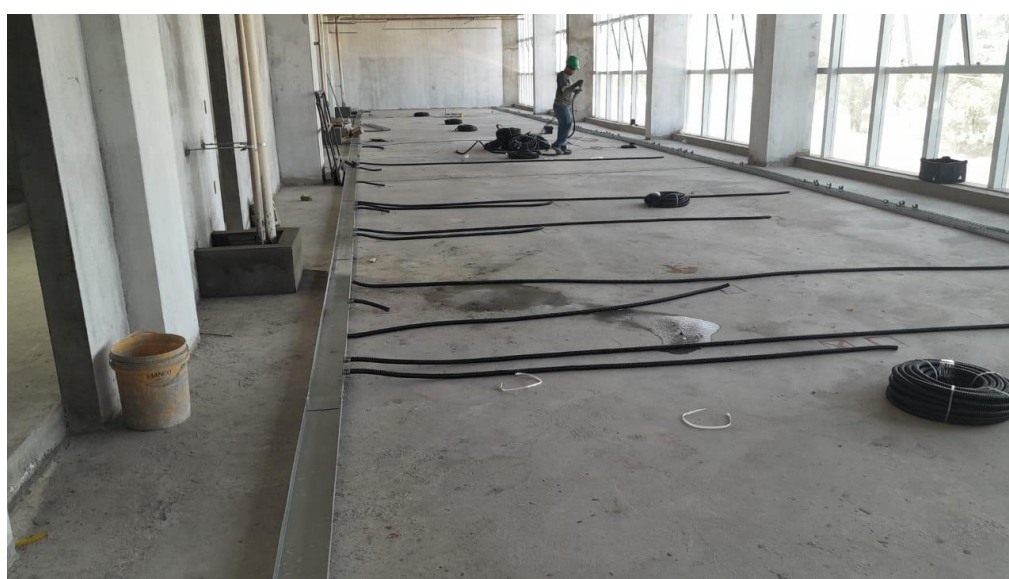

13.6 Viga do Guarda Corpo

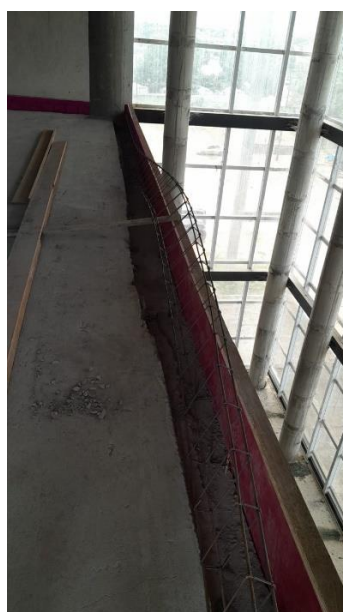

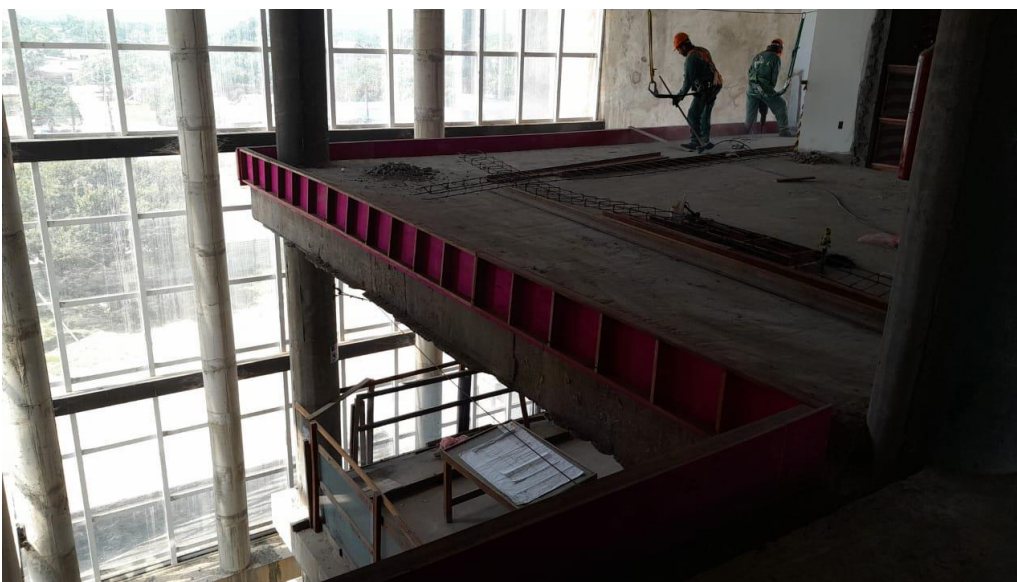

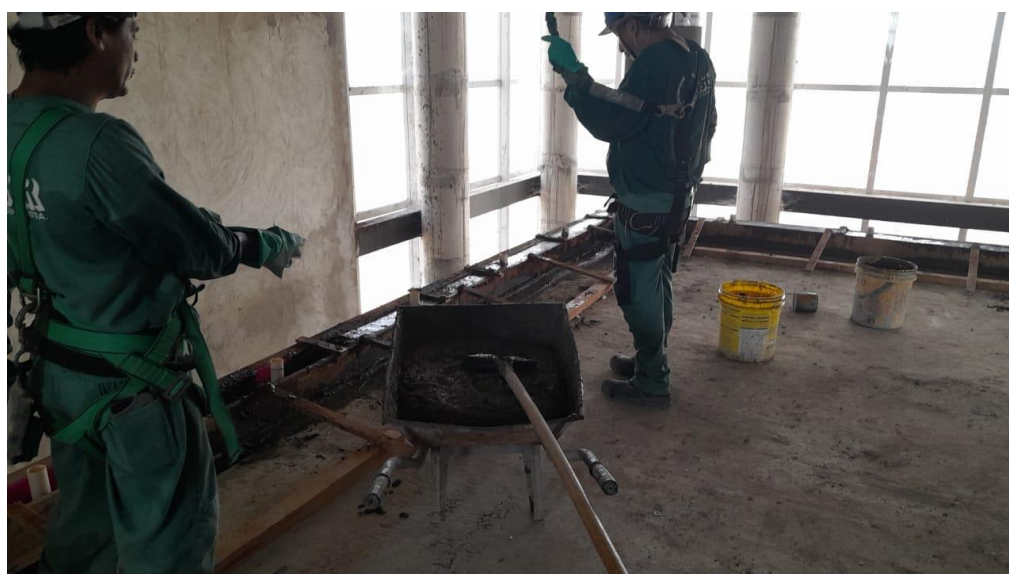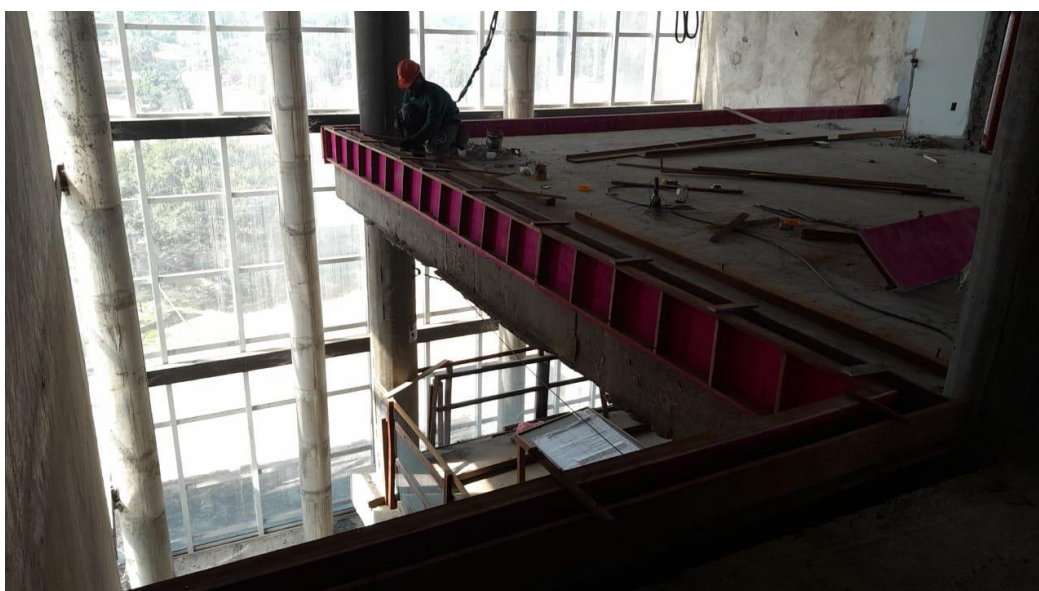



13.7 Peitoril em Granito







13.8 Entulho







Disk Entulho		RECIBO
Rua Plácido Salazar, 1000 - Centro Fone: (31) 3333-1111 - Fax: (31) 3333-1112 CNPJ: 06.908.000/0001-01		
Data: 19/02/23		
Cliente: J. Naves - Leandro		
CPF: N. 486		
End: Av. General Sampaio, 486		
Fone: (31) 991144-1574 Bairro: 13 de Set		
Qnt	Discriminação	P. Unit. P. Total
01	Conteiner	230,00
	cel 28	
	Ret 15	
Obra: Instituto Público		
(mensal) ent		
LEANDRO SILVA		Total R\$ 230,00
Assinatura		

Disk Entulho		RECIBO
Rua Plácido Salazar, 1000 - Centro Fone: (31) 3333-1111 - Fax: (31) 3333-1112 CNPJ: 06.908.000/0001-01		
Data: 06/02/23		
Cliente: J. Naves - Leandro		
CPF: N. 486		
End: Av. General Sampaio		
Fone: (31) 991144-1574 Bairro: 13 de Set		
Qnt	Discriminação	P. Unit. P. Total
01	Conteiner	230,00
	cel 28	
	Ret 28	
Obra: Instituto Público		
(mensal) ent		
LEANDRO SILVA		Total R\$ 230,00
Assinatura		

Disk Entulho		RECIBO
Rua Plácido Salazar, 1000 - Centro Fone: (31) 3333-1111 - Fax: (31) 3333-1112 CNPJ: 06.908.000/0001-01		
Data: 23/02/23		
Cliente: J. Naves - Leandro		
CPF: N. 486		
End: Av. General Sampaio		
Fone: (31) 991144-1574 Bairro: 13 de Set		
Qnt	Discriminação	P. Unit. P. Total
01	Conteiner	230,00
	cel 28	
	Ret 62	
Obra: Instituto Público		
(mensal) ent		
LEANDRO SILVA		Total R\$ 230,00
Assinatura		

Disk Entulho		RECIBO
Rua Plácido Salazar, 1000 - Centro Fone: (31) 3333-1111 - Fax: (31) 3333-1112 CNPJ: 06.908.000/0001-01		
Data: 14/02/23		
Cliente: J. Naves - Leandro		
CPF: N. 486		
End: Av. General Sampaio, 486		
Fone: (31) 991144-1574 Bairro: 13 de Set		
Qnt	Discriminação	P. Unit. P. Total
01	Conteiner	230,00
	cel 44	
Obra: Instituto Público		
(mensal) ent		
LEANDRO SILVA		Total R\$ 230,00
Assinatura		

Disk Entulho		RECIBO
Rua Plácido Salazar, 1000 - Centro Fone: (31) 3333-1111 - Fax: (31) 3333-1112 CNPJ: 06.908.000/0001-01		
Data: 09/02/23		
Cliente: J. Naves - Leandro		
CPF: N. 486		
End: Av. General Sampaio		
Fone: (31) 991144-1574 Bairro: 13 de Set		
Qnt	Discriminação	P. Unit. P. Total
01	Conteiner	230,00
	cel 28	
	Ret 97	
Obra: Instituto Público		
(mensal) ent		
LEANDRO SILVA		Total R\$ 230,00
Assinatura		

13.9 Colocação de Pontos de Ancoragem





















13.10 Fiação de Iluminação e Tomada/Interruptor

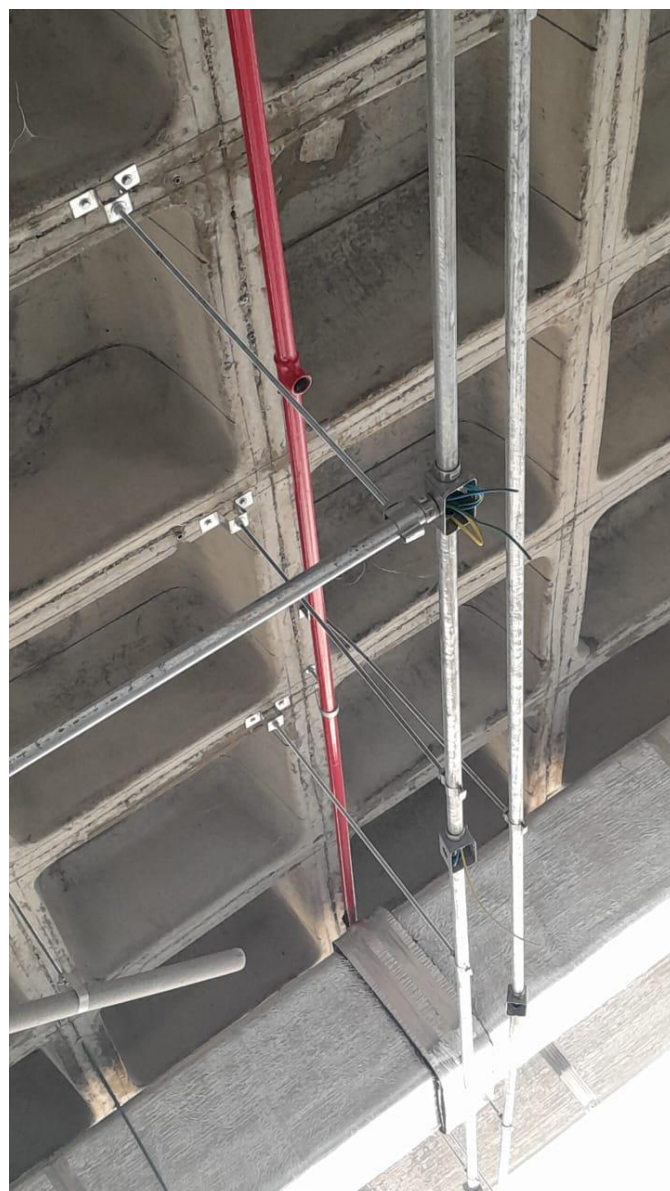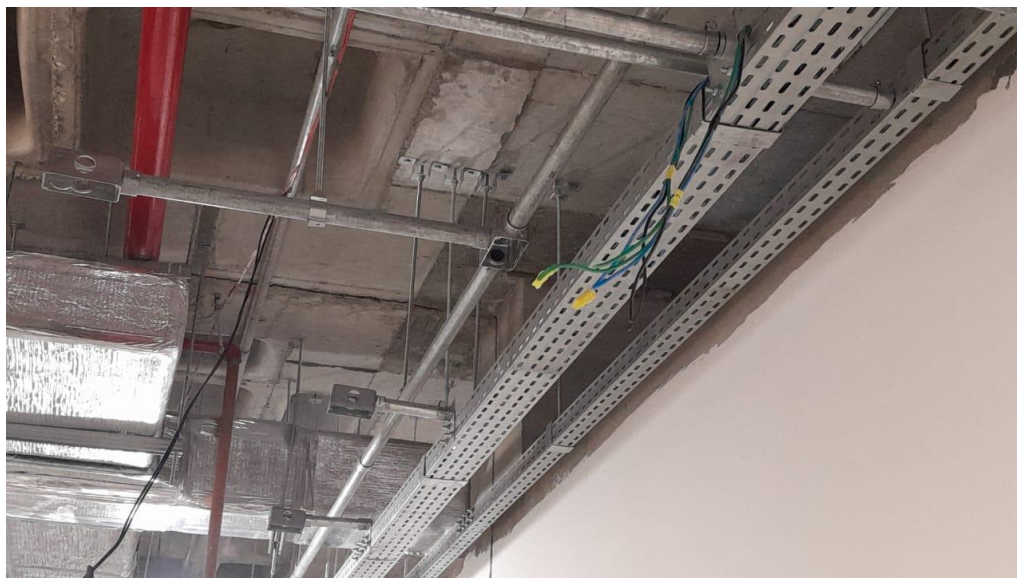


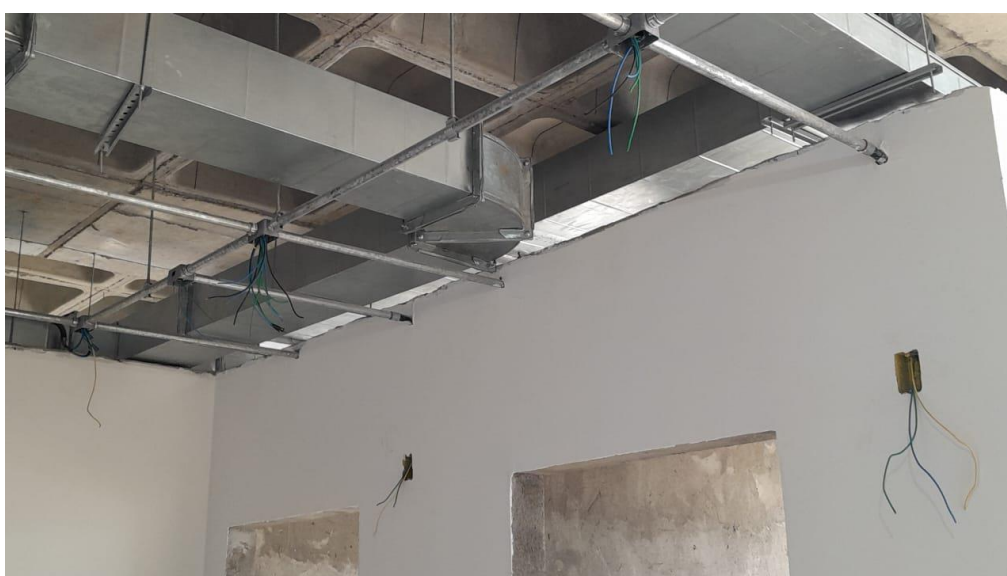


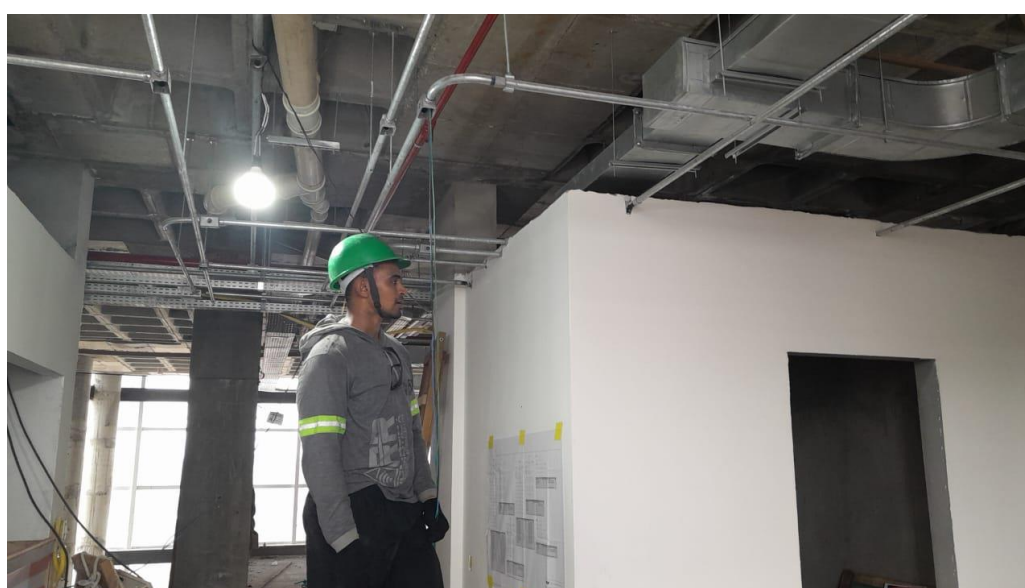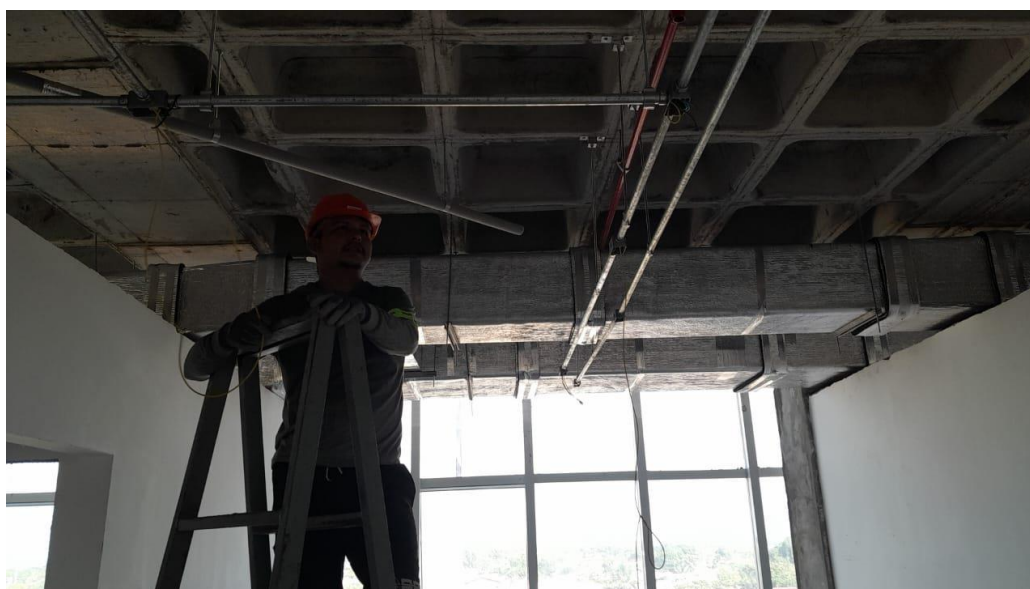




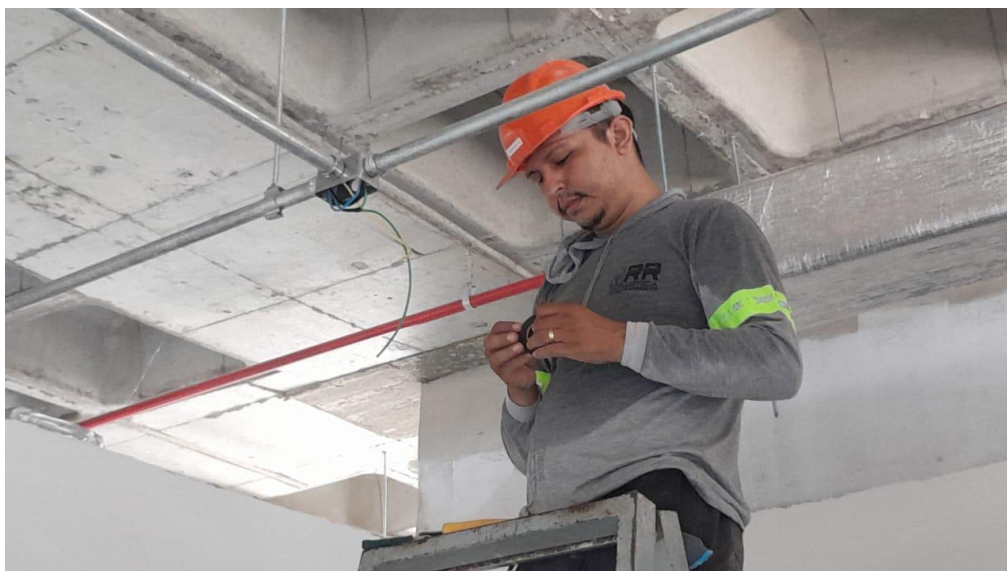

13.11 Regularização e Proteção Mecânica

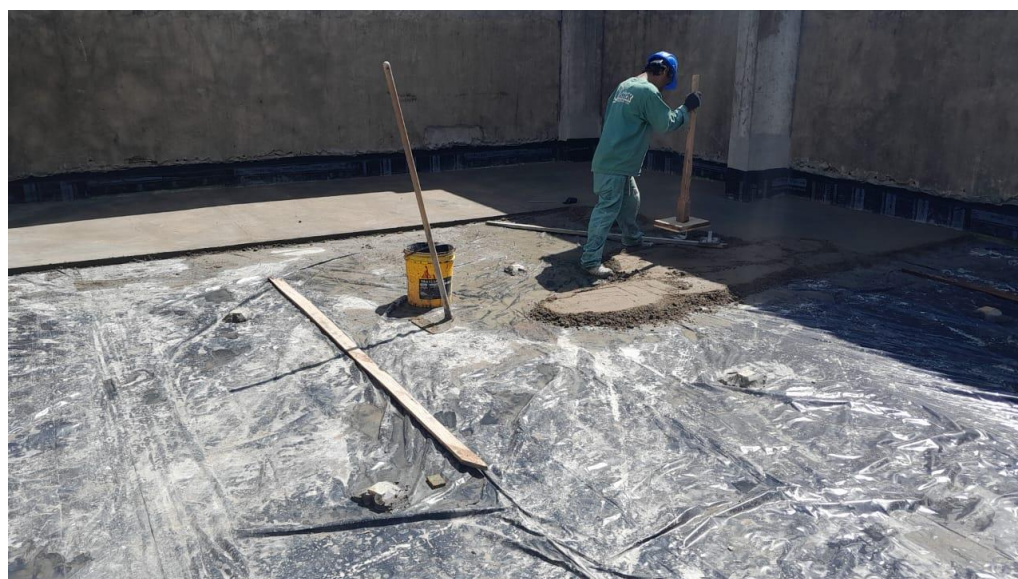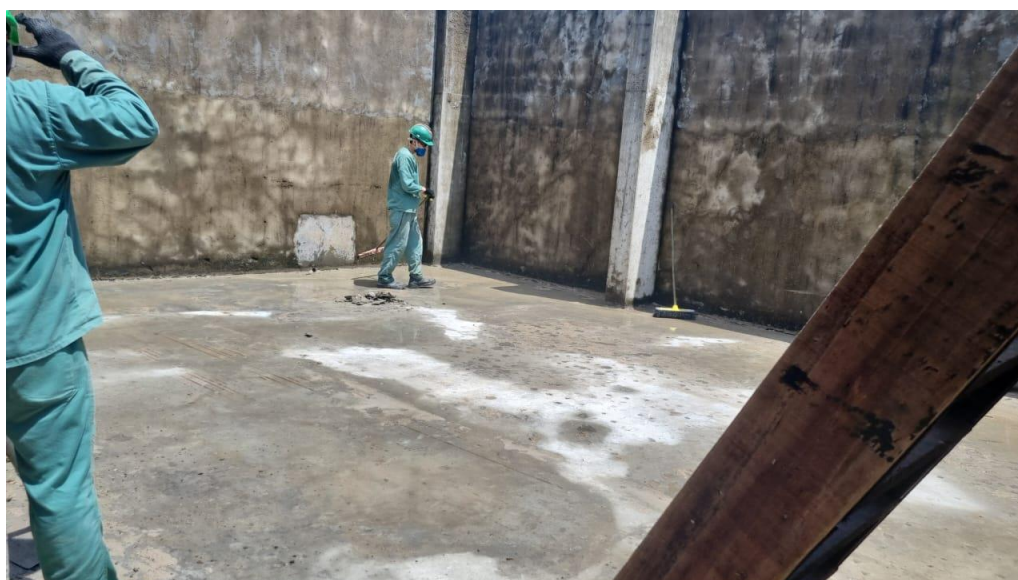



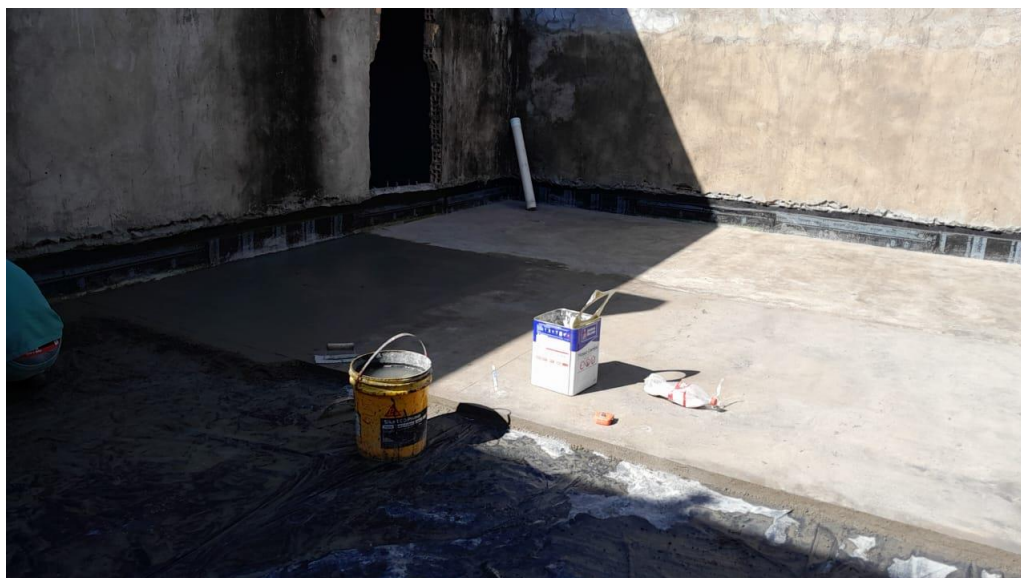


13.12 Alvenaria, Chapisco, Emboço e Requadramento de Porta











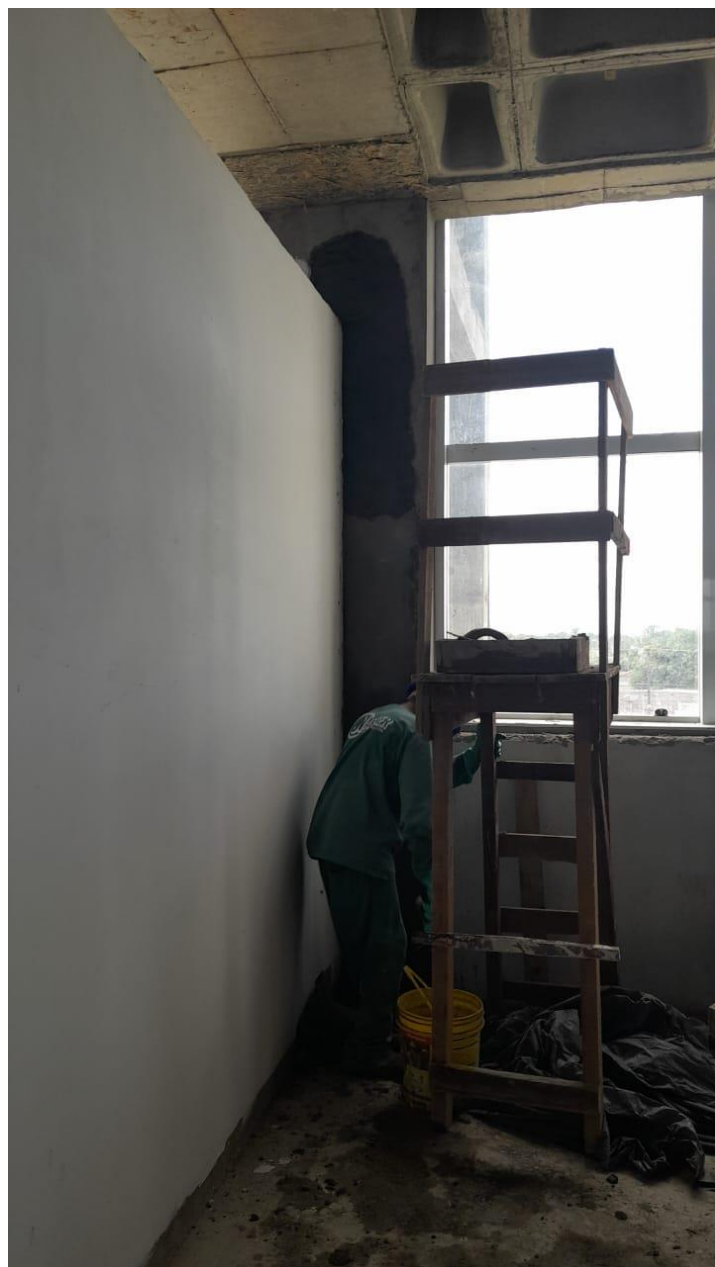



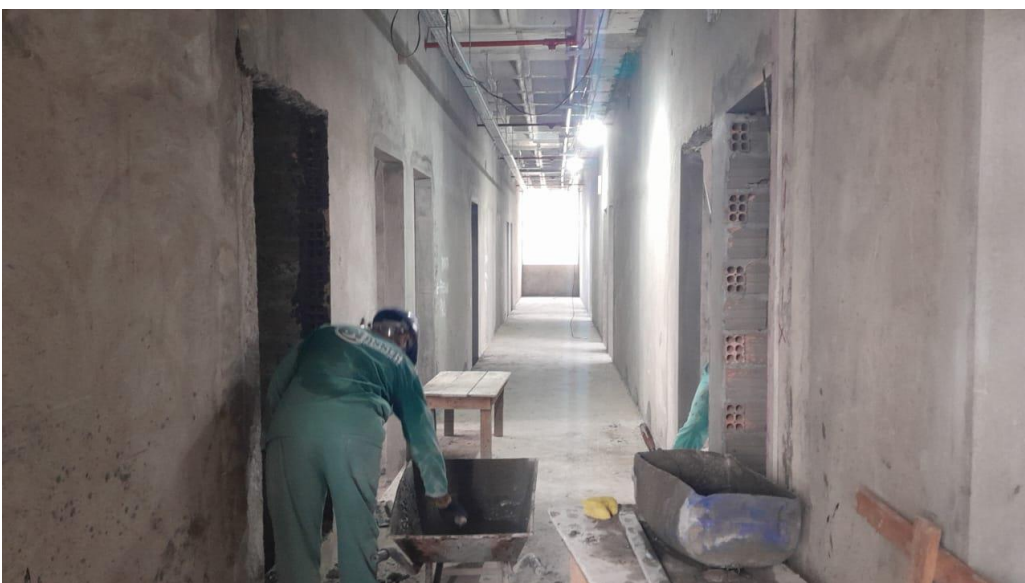

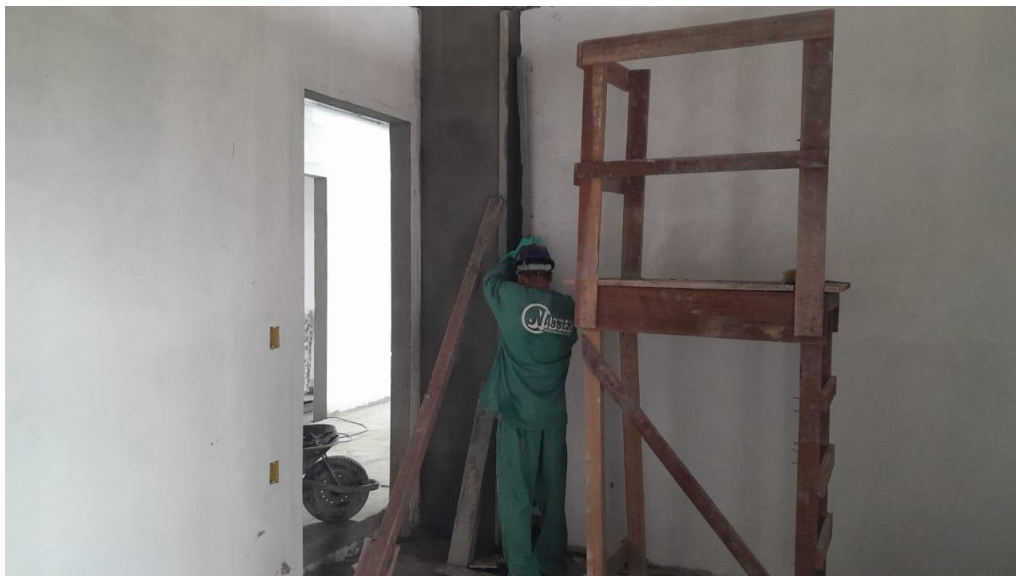

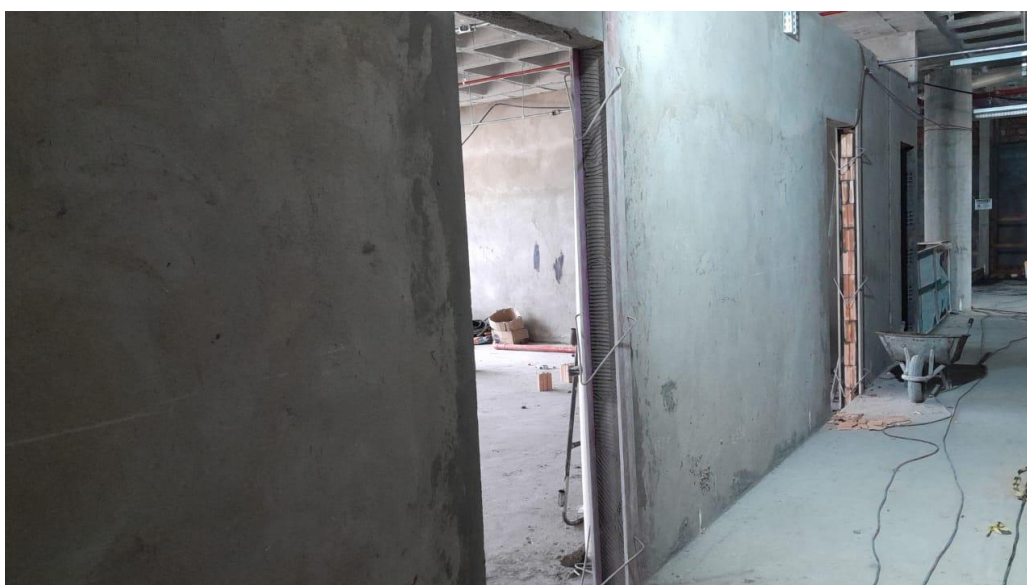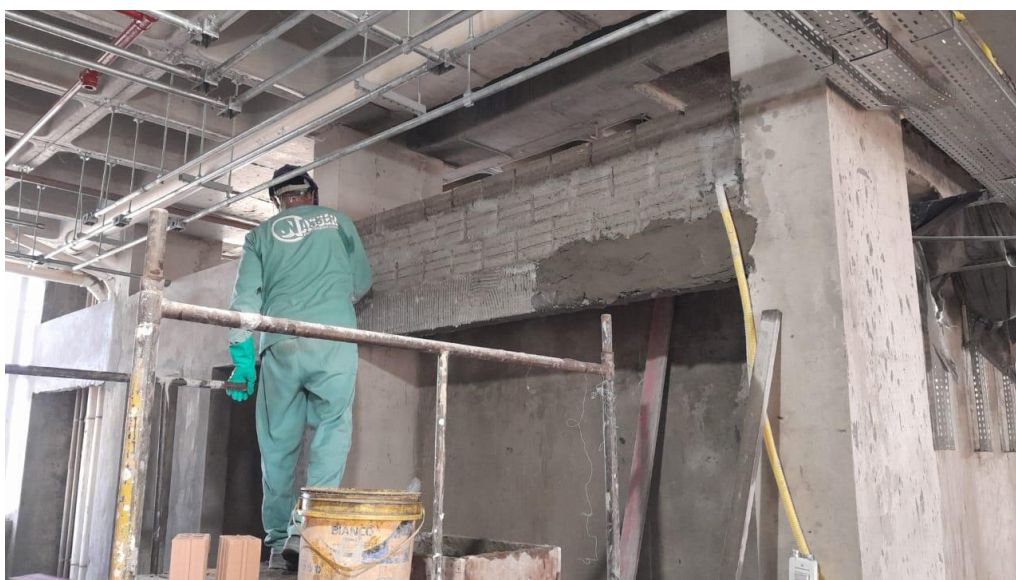





13.13 Demolição





14.0 - CONTROLE DE RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA

Descrição do item	Data da retirada do entulhos da obra
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	19/07/23 Recibo 001285
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	27/07/23 Recibo 001381
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	02/08/23 Recibo 001525
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	02/08/23 Recibo 001525
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	14/08/23 Recibo 001599

15.0 - RELAÇÃO DOS COLABORADORES COM A FUNÇÃO NA EMPRESA J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	Colaborador	Função
1	ALCIDES NOGUEIRA SENA NETO	AUX. ADMINISTRATIVO
2	ALESSANDRO SOARES LIMA	TEC. DE EDIFICAÇÕES
3	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
4	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
5	ANANIAS VIEIRA DA SILVA	SERVENTE
6	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
7	ANTONIES DIEGO DE SOUZA CORDEIRO	SERVENTE
8	ANTONIO ALDO SAMPAIO NUNES	PEDREIRO
9	ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	CARPINTEIRO
10	ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	ELETRICISTA
11	BRUNO SILVA CASTRO	SERVENTE
12	CLEDEILTON LOPES AGUIAR	SERVENTE
13	DARLISON COSMOS PENA	BOMBEIRO HIDRAULICO
14	DAVISON ROZARIO SANTIAGO	IMPERMEABILIZADOR
15	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
16	DIEGO SIMAO BURUM	SERVENTE

17	ELIZEU LIMA DA SILVA	SERVENTE
18	ERIVAN LOURENÇO MACHADO	PEDREIRO
19	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA
20	FELIPE GRALHADA OLIVEIRA	SERVENTE
21	FRANCISCO EMICIO	BOMBEIRO HIDRAULICO
22	GILVAN LEITE RIBEIRO	PEDREIRO
23	GLEIDIMAR SILVA CUNHA	BOMBEIRO HIDRAULICO
24	IGOR ANTONIO PINO	PINTOR
25	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVENTE
26	JOSE MARCELO ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR	MESTRE DE OBRAS
27	JOSE RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
28	JOSÉ VERAS BARROS	OP. BETONEIRA
29	JOSINALDO DA SILVA ALMEIDA	CARPINTEIRO
30	JUVENAL GUILHERME SOBRINHO	CALDEIREIRO
31	JOSE MARIA FROTA CONRADO	PINTOR
32	LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA	ALMOXARIFE
33	MARLON BORGES PEREIRA	TECNICO DE SEGURANÇA
34	MOISES FERREIRA CHAVES	CARPINTEIRO
35	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
36	PAULO ROBERTO	TEC. DE EDIFICAÇÕES
37	RAIMUNDO GERALDO PEREIRA MOREIRA	PINTOR
38	RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE	PEDREIRO
39	RAUDI RAFAEL MARTINES	CARPINTEIRO
40	RONNY DE SOUZA ANICETO	SERVENTE
41	SEBASTIÃO ASSIS DE FREITAS	PINTOR
42	SERGIO GOMES DA SILVA	SERVENTE
43	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA

44	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA
----	-------------------------------	-------

15.1 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).

Nº	Colaborador	Função
1	DANIEL ASSIS CARNEIRO	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO	ELETRICISTA
3	GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ	ELETRICISTA
4	JORGE LUIZ GOZALEZ LOPES	PEDREIRO
5	RIBAMAR SILVA SANTANA	ELETRICISTA
6	ROMÁRIO DA SILVA BENTO	ELETRICISTA
7	SIMON ENRIQUE OLIVEROS LINARES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
8	FABIO VIEIRA DA SILVA	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

15.2 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa FERREIRA & FERREIRA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Nº	Colaborador	Função
1	ALLAN GUIMARÃES FARIAS	AUXILIAR DE FUNILARIA
2	SAMUEL LOBATO	FUNILEIRO
3	LUIZ MIGUEL MAURERA	AUXILIAR DE FUNILARIA
4	MIGUEL ALEXANDER JIMENES RIVAS	AUXILIAR DE FUNILARIA

16.0 - A FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO SERÁ DEFINIDA PELA SOMA DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS OCORRÊNCIAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, CONFORME TABELA ABAIXO:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre da Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 - Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos

cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5
4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4

10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6
12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24

17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção
----	--	--------------------------	---

17.0 - DO PAGAMENTO
17.1 - Pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.
17.2 - Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.
17.3 - A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme a tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				00
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: 00%				

18.0 - ANEXO: DIÁRIOS DE OBRA

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	183
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	549	DATA	17/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 17/07/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo BOM ensolarado 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 03 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 04 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais 01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Execução de enchimento de piso - Etapa colocação de EPS (isopor) - Local: Térreo - Sala de apoio. - Reboco da alvenaria do Sanitário 03 T - Térreo. - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 1º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 1º pavimento. - Teste de Estanqueidade da laje do Hall da cobertura. - Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 2º pavimento. - Requadro de portas do 2 pavimento. - Instalação hidrossanitária do 2º pavimento. - Aplicação de selador em parede do 2º pavimento. - Aplicação massa PVA em parede do 3º pavimento. - Colocação de Peitoril em granito cinza corumbazinho nas janelas do 3º pavimento. - Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento. - Acabamento com argamassa do piso do auditório. 4 - Ocorrências: Foi informado ao Fiscal da obra qual altura da verga da porta de acesso auditório. Fiscal solicitou que executasse o mesmo padrão para altura de portas PM 01. Foi informado ao Fiscal sobre a redução de 80mm para 65mm da Prumada principal ao chegar ao Térreo, qual vai alimentar as prumadas secundarias ao subir novamente dentro dos Shaft, as tubulação sobem para os pavimentos superior qual muda novamente a bitola do tubo de 65mm para 80mm. Fiscal solicitou executar conforme projeto. Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	184
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	548	DATA	18/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 18/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo BOM ensolarado					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenharia Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 03 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 04 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais 01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Execução de enchimento de piso - Etapa Lançamento de concreto - Local: Térreo - Sala de apoio. - Demolição de alvenaria para confecção de contra verga do Rack e Dml do Térreo. - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 1º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 1º pavimento. - Teste de Estanqueidade da laje do Hall da cobertura. - Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 2º pavimento. - Requadro de portas do 2 pavimento. - Instalação hidrossanitária do Térreo. - Aplicação de selador em parede do 2º pavimento. - Aplicação massa PVA em parede do 3º pavimento. - Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:18/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS 2ºPAVIMENTO;
 3.3 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 3º PAVIMENTO;
 3.4 ENCHIMENTO COM EPS+TELA DA SALA DE APOIO DO AUDITÓRIO;
 3.5 COLOCAÇÃO DA REDE DE SPRINKLER 1º PAVIMENTO;
 3.6 EXECUÇÃO DE REBOCO DAS ALVENARIAS DO 1º PAVIMENTO;
 3.7 INSTALAÇÃO DE INFRA HIDROSSANITÁRIA DO 2º PAVIMENTO;
 3.8 DEMOLIÇÃO DE REBOCO OCO DE PILARES E VIGAS;
 3.9 CHAPISCO E REBOCO DO 1º PAVIMENTO;
 3.10 ALVENARIA DA ÁREA TÉCNICA DO TÉRREO.
 3.11 INSTALAÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.13 TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS ÁRES MOLHADAS DO 2º PAVIMENTO;
 3.14 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 2º PAVIMENTO;
 3.15 PINTURA DO SISTEMA DE INCÊNDIO COM TINTA ÓLEO VERMELHA.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	185
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	547	DATA	19/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 19/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã: Tempo BOM ensolarado e tarde: nublado com chuva					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 03 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 04 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais 01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 1º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 1º pavimento. - Teste de Estanqueidade da laje do Hall da cobertura. - Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 2º pavimento. - Requadro de portas do 2 pavimento. - Instalação hidrossanitária do Térreo. - Aplicação de selador em parede do 2º pavimento. - Aplicação massa PVA em parede do 3º pavimento. - Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento. - Confecção de infraestrutura da tubulação de agua gelada. - Contrapsio dos San 06 e 07 PNE.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	186
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	546	DATA	20/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 20/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo BOM ensolarado					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
03 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
13 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 1º pavimento.					
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do 1º pavimento.					
- Teste de Estanqueidade da laje do Hall da cobertura.					
- Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 2º pavimento.					
- Requadro de portas do 2 pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do Térreo.					
- Aplicação de selador em parede do 2º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 3º pavimento.					
- Confeção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
- Confeção de infraestrutura da tubulação de agua gelada.					
- Demolição de argamassa da laje de Equipamento/ Pavimento tecnico.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:19/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO 2º PAVIMENTO;
 3.3 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA LAJE DO HALL DE COBERTURA;
 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO 2º PAVIMENTO;
 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
 3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR DO 2º PAVIMENTO;
 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 3º PAVIMENTO;
 3.8 CONFECÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.9 CONFECÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA;
 4.0 CONTRAPISO DOS SAN. 06 E 07.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:20/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO 2º PAVIMENTO;

3.3 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA LAJE DO HALL DE COBERTURA;
3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO 2º PAVIMENTO;
3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR DO 2º PAVIMENTO;
3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 3º PAVIMENTO;
3.8 CONFECÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
3.9 CONFECÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA;
4.0 CONTRAPISO DOS SAN. 06 E 07.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	187
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	545		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	21/07/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 21/07/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo BOM ensolarado 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 03 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 04 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais 01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 1º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 1º pavimento. - Teste de Estanqueidade da laje do Hall da cobertura. - Demolição de argamassa de reboco ocas/soltas da interface dos pilares do 2º pavimento. - Requadro de portas do 2 pavimento. - Instalação hidrossanitária do Térreo. - Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento. - Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento. - Confecção de infraestrutura da tubulação de agua gelada. - Demolição de argamassa da laje de Equipamento/ Pavimento tecnico. 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	188
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	544	DATA	22/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	189
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	543	DATA	23/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	190
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	542	DATA	24/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 24/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo BOM ensolarado					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
03 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
13 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 1º pavimento.					
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do 1º pavimento.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Confeção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
- Demolição de argamassa da laje de Equipamento/ Pavimento técnico.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:24/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO 1º PAVIMENTO;
 3.3 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA LAJE DO HALL DE COBERTURA;
 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO 2º PAVIMENTO;
 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
 3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR DO 2º PAVIMENTO;
 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 3º PAVIMENTO;
 3.8 CONFECÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.9 CONFECÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA;
 3.10 DEMOLIÇÃO DE REBOCO OCO DE PILARES.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	191
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	541	DATA	25/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 25/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Nublado com chuva forte					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
03 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
13 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do 1º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do 1º pavimento.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Demolição de argamassa da laje de Equipamento/ Pavimento técnico.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	192
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	540	DATA	26/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 26/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Nublado com chuva					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
03 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
13 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.					
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do 1º pavimento.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Confeção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Demolição de argamassa da laje de Equipamento/ Pavimento técnico.					
4 - Ocorrências: A camada separadora qual será utilizada é lona plástica em polietileno com 100 micra.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:25/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO 1º PAVIMENTO;
 3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO;
 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;
 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
 3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR DO 2º PAVIMENTO;
 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 3º PAVIMENTO;
 3.8 CONFECÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
 3.10 DEMOLICÇÃO DE REBOCO OCO DE PILARES.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:26/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO 1º PAVIMENTO;

3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO;
3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;
3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR DO 2º PAVIMENTO;
3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 3º PAVIMENTO;
3.8 CONFECÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.10 DEMOLICÇÃO DE REBOCO OCO DE PILARES.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	193
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	539	DATA	27/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 27/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Nublado com chuva					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
03 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
13 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento.					
- Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Emestramento de laje para contrapiso de regularização para recebimento de impermeabilização.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:27/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECCÃO DA REDE DE SPRINKLER DO 1º PAVIMENTO;
 3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO;
 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;
 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
 3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR DO 2º PAVIMENTO;
 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 3º PAVIMENTO;
 3.8 CONFECCÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
 3.10 DEMOLICÇÃO DE REBOCO OCO DE PILARES.

4.0 - Ocorrências: (SEM Ocorrências)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	194
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	538	DATA	28/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 27/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Nublado com chuva					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
03 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
13 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento.					
- Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
-Contrapiso de regularização para recebimento de impermeabilização da laje Antena/pavimento técnico.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:28/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
 3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO;
 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;
 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
 3.6 CHAPISCO E REBOCO DO DOS SHAFTS DO 1º PAVIMENTO;
 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
 3.8 CONFECÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
 3.10 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO PRA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE SUPERIOR/ANTENA

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	195
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	537	DATA	29/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 29/07/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã: Nublado com chuva e tarde: Nublado sem chuva 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 02 - Pedreiro; 04 - Servente; 01 - Op. Betoneira; 02 - Vigia. 2.1 FERREIRA E FERREIRA 03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento. -Contrapiso de regularização para recebimento de impermeabilização da laje Antena/pavimento técnico. 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	196
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	536	DATA	30/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	197
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	535	DATA	31/07/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 31/07/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Nublado com chuva fraca					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo;					
04 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
13 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.					
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento.					
- Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Confeção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
-Contrapiso de regularização para recebimento de impermeabilização da laje Antena/pavimento técnico.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	198
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	534		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	01/08/2023
RELATÓRIO DA CONTRATADA					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:31/07/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFEÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
 3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBZINHO DO 2º PAVIMENTO;
 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;
 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
 3.6 CHAPISCO E REBOCO DO DOS SHAFTS DO 1º PAVIMENTO;
 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
 3.8 CONFEÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
 3.10 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO PRA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE SUPERIOR/ANTENA

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:01/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
- 3.2 CONFEÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
- 3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO;
- 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;
- 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO TÉRREO;
- 3.6 CHAPISCO E REBOCO DO DOS SHAFTS DO 1º PAVIMENTO;
- 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
- 3.8 CONFEÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
- 3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
- 3.10 EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO PRA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE SUPERIOR/ANTENA

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	199
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	533	DATA	02/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 02/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Nublado com chuva fraca					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo; 04 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 04 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais 01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento. - Confeção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo. - Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento. - Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento. - Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento. - Instalação hidrossanitária do 1º pavimento. - Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento. - Confeção de dutos de arcondionados do 2º pavimento. - Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento. -Contrapiso de regularização para recebimento de impermeabilização da laje Antena/pavimento técnico. - Proteção Mecânica da Área Téc. do Hall da Cobertura. - Aplicação de Praise Área Téc. Antenas/ Tv a cabo.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:02/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECCÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
 3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO;
 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;
 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO 1º PAVIMENTO;
 3.6 CHAPISCO E REBOCO DO DOS SHAFTS DO 1º PAVIMENTO;
 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
 3.8 CONFECCÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
 3.10 APLICAÇÃO DE PRIMER NA ÁREA TÉCNICA ANTENA/TV A CABO
 3.11 PROTEÇÃO MECÂNICA DA ÁREA TÉCNICA DO HALL DA COBERTURA

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	200
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	532	DATA	03/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 03/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol.					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo; 04 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 04 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais 01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo. - Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento. - Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento. - Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento. - Instalação hidrossanitária do 1º pavimento. - Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento. - Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento. - Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento. - Proteção Mecânica da Área Téc. do Hall da Cobertura. - Aplicação manta asfáltica 4mm na laje do pavimento técnico/ Antena.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:03/08/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
3 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;	
3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;	
3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO;	
3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;	
3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO 1º PAVIMENTO;	
3.6 CHAPISCO E REBOCO DO DOS SHAFTS DO 1º PAVIMENTO;	
3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;	
3.8 CONFECÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;	
3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;	
3.10 APLICAÇÃO DE PRIMER NA ÁREA TÉCNICA ANTENA/TV A CABO	
3.11 PROTEÇÃO MECÂNICA DA ÁREA TÉCNICA DO HALL DA COBERTURA	
4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	201
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	531	DATA	04/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 04/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol.					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo; 04 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 04 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais 01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo. - Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento. - Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento. - Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento. - Instalação hidrossanitária do 1º pavimento. - Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento. - Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento. - Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento. - Proteção Mecânica da Área Téc. do Hall da Cobertura. - Aplicação manta asfáltica 4mm na laje do pavimento técnico/ Antena.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:04/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 2 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
 3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO;
 3.4 ESQUADRAMENTO DAS PORTAS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;
 3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO 1º PAVIMENTO;
 3.6 CHAPISCO E REBOCO DO DOS SHAFTS DO 1º PAVIMENTO;
 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
 3.8 CONFECÇÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO;
 3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
 3.10 PROTEÇÃO MECÂNICA DA ÁREA TÉCNICA DO HALL DA COBERTURA;
 3.11 APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 4MM NA LAJE DO PAVIMENTO TÉCNICO/ANTENA

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	202
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	530	DATA	05/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	203
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	529	DATA	06/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	204
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	528	DATA	07/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:07/08/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 1 AUX. ADMINISTRATIVO 5 PEDREIRO 4 CARPINTEIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 CALDEIREIRO 1 OPERADOR DE BETONEIRA 2 VIGIA 2 PINTOR 2.1- SUBCONTRATAÇÃO: 2.1.1-RR DOMÓTICA 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 4 ELETRICISTA 1 PEDREIRO 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL 2.1.2- FERREIRA E FERREIRA 3 AUXILIAR DE FUNILARIA 1 FUNILEIRO 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO; 3.2 CONFECCÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO; 3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CONZA CORUMBAZINHO DO 2º PAVIMENTO; 3.4 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO 1º PAVIMENTO; 3.5 CHAPISCO E REBOCO DO DOS SHAFTS DO 1º PAVIMENTO; 3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR NO 1º PAVIMENTO; 3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO; 3.8 CONFECCÃO DA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO 2º PAVIMENTO; 3.9 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO; 3.10 PROTEÇÃO MECÂNICA DA ÁREA TÉCNICA DO HALL DA COBERTURA; 3.11 APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 4MM NA LAJE DO PAVIMENTO TÉCNICO/ANTENA; 3.12 EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO NA ÁREA TÉCNICA DO TÉRREO; 3.13 ESCARÉAMENTO PARA A EXECUÇÃO DA VIGA DO GUARDA-CORPO NO 3º PAVIMENTO. 4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS) ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	205
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	527	DATA	08/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 07/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde.: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo; 04 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 04 - Eletricista 01 - Pedreiro 01 - Aux. de serviços gerais 01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria 01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo. - Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento. - Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento. - Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento. - Instalação hidrossanitária do 1º pavimento. - Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento. - Aplicação selador no 1º pavimento e térreo. - Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento. - Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento. - Montagem da armação da viga invertida do guarda corpo do Hall. - Teste de estanqueidade da laje do pavimento técnico/ Antena.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					
Diário de Obra - Data: 08/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã: Tempo Bom com sol e tarde: chuva forte					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 02 - Técnico em Edificações; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo; 04 - Carpinteiro; 07 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor 01 - Operador de caldeira;					

02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
04 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria
01 - Funileiro

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.
- Requadro de portas do Térreo e 1º pavimento.
- Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento.
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Aplicação selador no 1º pavimento e térreo.
- Confeção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.
- Confeção de fôrma da viga invertida do guarda corpo do Hall.
- Teste de estanqueidade da laje do pavimento técnico/ Antena.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:08/08/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
2 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
3 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;	
3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;	
3.3 COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA DO 2º PAVIMENTO;	
3.4 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO 1º PAVIMENTO;	
3.5 CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS. E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;	
3.6 APLICAÇÃO DE SELADOR NO TÉRREO E 1º PAVIMENTO;	
3.7 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;	
3.8 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;	
3.9 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA MANTA ASFÁTICA DA ÁREA TÉCNICA;	
3.10 COLOCAÇÃO DE FORMA PARA A EXECUÇÃO DA VIGA DO GUARDA-CORPO NO 3º PAVIMENTO.	
4.0 - Ocorrências: (SEM Ocorrências)	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	206
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	526	DATA	09/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 09/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã: Tempo Bom com sol e tarde: chuva Intensa por curto periodo					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo;					
04 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
13 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Aplicação selador no 1º pavimento e térreo.					
- Confecção de dutos de arcondionados do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Lançamento de concreto da viga invertida do guarda corpo do Hall.					
- Emestramento para proteção mecânica da Laje da Antena.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:09/08/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 1 AUX. ADMINISTRATIVO 5 PEDREIRO 4 CARPINTEIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 CALDEIREIRO 1 OPERADOR DE BETONEIRA 2 VIGIA 3 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 4 ELETRICISTA 1 PEDREIRO 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
3 AUXILIAR DE FUNILARIA 1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO; 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO; 3.3 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DO 1º PAVIMENTO; 3.4 CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE; 3.5 APLICAÇÃO DE SELADOR NO TÉRREO E 1º PAVIMENTO; 3.6 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO; 3.7 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO; 3.8 TESTE DE ESTANQUEIDADE DA MANTA ASFÁTICA DA ÁREA TÉCNICA; 3.9 CONCRETAGEM DA VIGA DO GUARDA-CORPO NO 3º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	207
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	525	DATA	10/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 10/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo;					
04 - Carpinteiro;					
06 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
04 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Supervisor de Manutenção Eletrônica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento - Drenos de ar condicionados.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Proteção mecânica da Laje da Antena.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:10/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 2 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
 3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
 3.3 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DRENO AR COND DO 1º PAVIMENTO;
 3.4 CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
 3.5 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
 3.6 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
 3.7 COLOCAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO;
 3.8 PROTEÇÃO MECÂNICA DA ÁREA TÉCNICA (ANTENA).

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	208
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	524	DATA	11/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 11/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo;					
04 - Carpinteiro;					
06 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Chapisco e Reboco de Shafts do 1º pavimento.					
- Instalação hidrossanitária do 1º pavimento - Drenos de ar condicionados.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Proteção mecânica da Laje da Antena.					
- Marcação dos pontos de ancoragem na cobertura do lado A.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:11/08/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
3 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;	
3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;	
3.3 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DRENO AR COND;	
3.4 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;	
3.5 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;	
3.6 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;	
3.7 COLOCAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO;	
3.8 LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DO PRÉDIO;	
3.8 PROTEÇÃO MECÂNICA DA ÁREA TÉCNICA (ANTENA).	
.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	209
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	523	DATA	12/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 12/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
02 - Servente;
03 - Pintor;
03 - Bombeiro Hidráulico;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

02 - Eletricista
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

03 - Aux de funilaria
01 - Funileiro

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas e eletrodutos do 1º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	210
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	522	DATA	13/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	211
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	521	DATA	14/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 14/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo;					
04 - Carpinteiro;					
06 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Colocação de peitoril em granito cinza corumbazinho do 2º pavimento.					
- Alvenaria do Térreo - Lado B.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Proteção mecânica da Laje da Antena.					
- Colocação dos pontos de ancoragem na cobertura do lado A - (Furos + Haste roscada+ Chumbador químico).					
- Demolição de proteção mecânica da laje da tampa da caixa d'agua.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:14/08/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
3 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;	
3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;	
3.3 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DRENO AR COND;	
3.4 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;	
3.5 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;	
3.6 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;	
3.7 COLOCAÇÃO DE PEITORIL DE GRANITO;	
3.8 COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM;	
3.9 PINTURA DE TINTA ÓLEO NA REDE SPRINKLER;	
3.10 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MÉCANICA DA COBERTURA	
3.11 CHAPISCO COM AC3 NA ÁREA TÉCNICA (ANTENA).	
4.0 - Ocorrências: (SEM Ocorrências)	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	212
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	520	DATA	15/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 15/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo;					
04 - Carpinteiro;					
06 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.					
- Cabeamento de tomadas e iluminação, exaustão do 3º Pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Alvenaria, chapisco e reboco do Shafts do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Colocação dos pontos de ancoragem na cobertura do lado B - (Furos + Haste roscada+ Chumbador químico).					
- Demolição de proteção mecânica da laje da tampa da caixa d'agua.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:15/08/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
3 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;	
3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;	
3.3 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;	
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;	
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;	
3.6 COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM;	
3.7 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MÉCANICA DA COBERTURA;	
3.8 FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA/INTERRUPTOR DO 3 PAVIMENTO;	
3.9 PROTEÇÃO MÉCANICA NA ÁREA TÉCNICA (ANTENA).	
4.0 - Ocorrências: (SEM Ocorrências)	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	213
EMPRESA					
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	519	DATA	16/08/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 15/08/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheira Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
02 - Técnico em Edificações;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo;					
04 - Carpinteiro;					
06 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
01 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.					
- Cabeamento de tomadas e iluminação, exaustão do 3º Pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.					
- Alvenaria, chapisco e reboco do Shafts do 1º pavimento.					
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.					
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.					
- Colocação dos pontos de ancoragem na cobertura do lado B - (Furos + Haste roscada+ Chumbador químico).					
- Demolição de proteção mecânica da laje da tampa da caixa d'agua.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					


RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:16/08/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
3 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;	
3.2 CONFECÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;	
3.3 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;	
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;	
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;	
3.6 COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM;	
3.7 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MÉCANICA DA COBERTURA;	
3.8 FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA/INTERRUPTOR DO 3 PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada





Contrapiso - 7ª medição

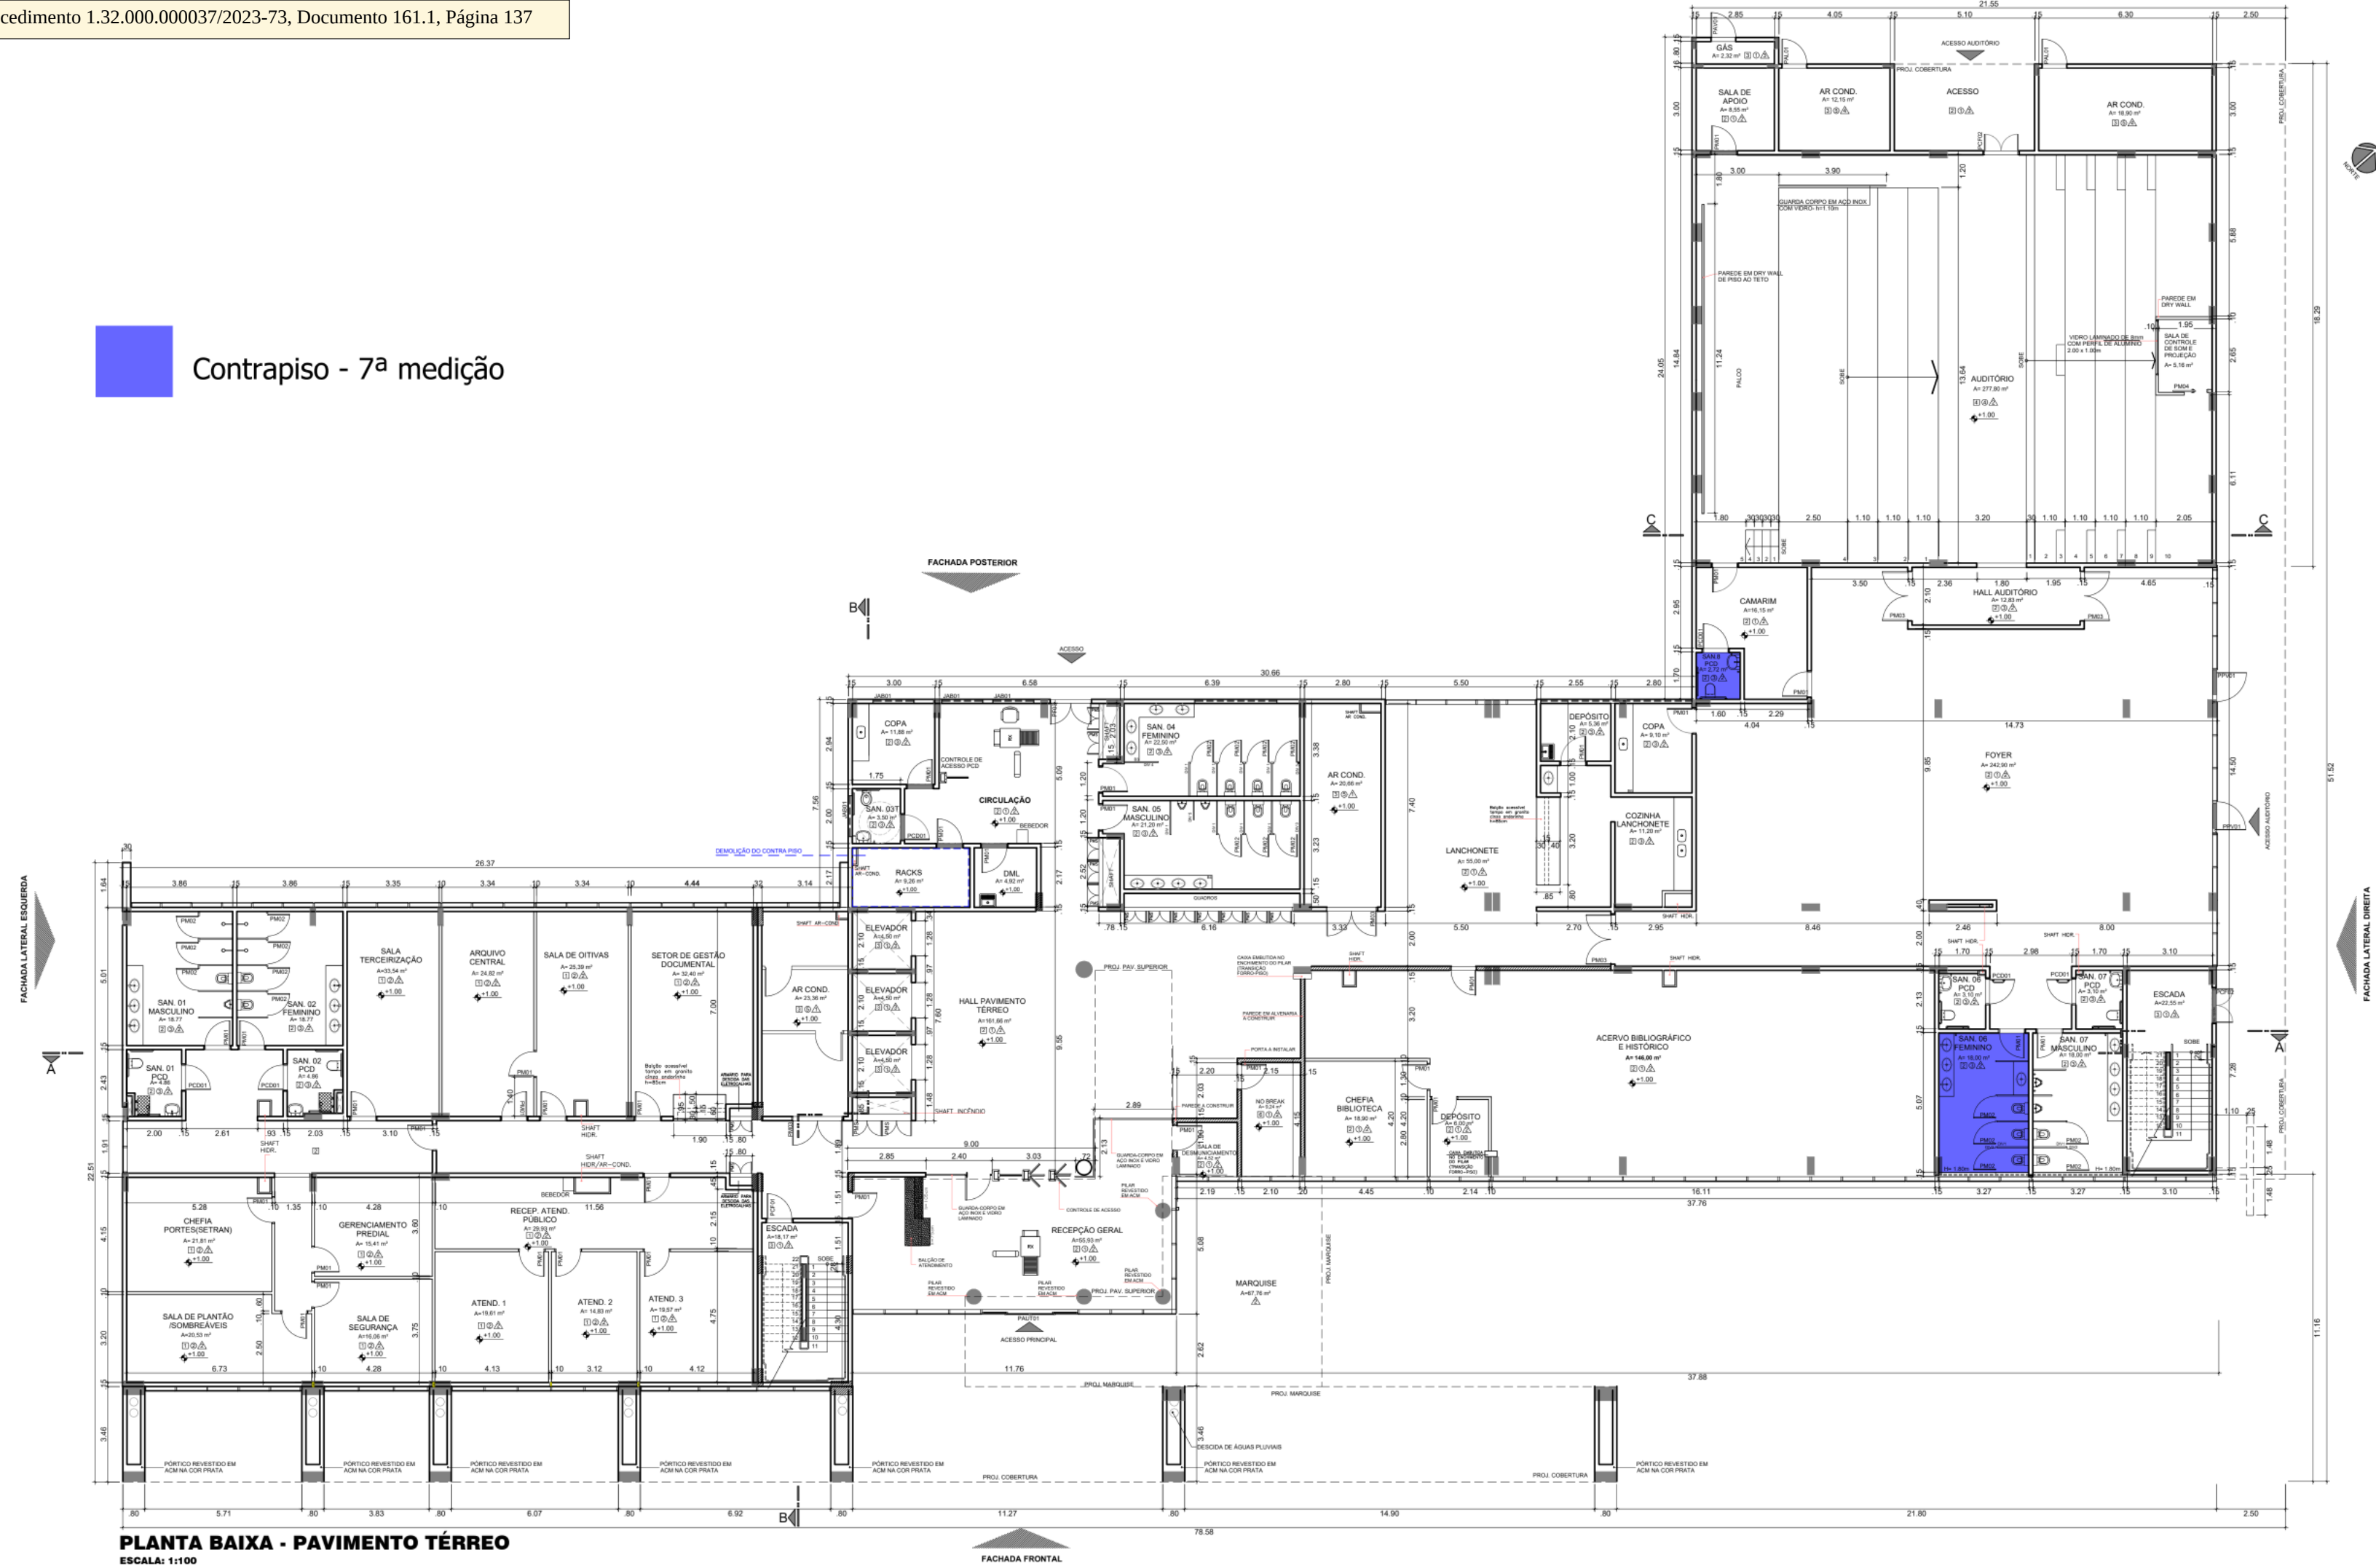


 Executado

■ Não executado

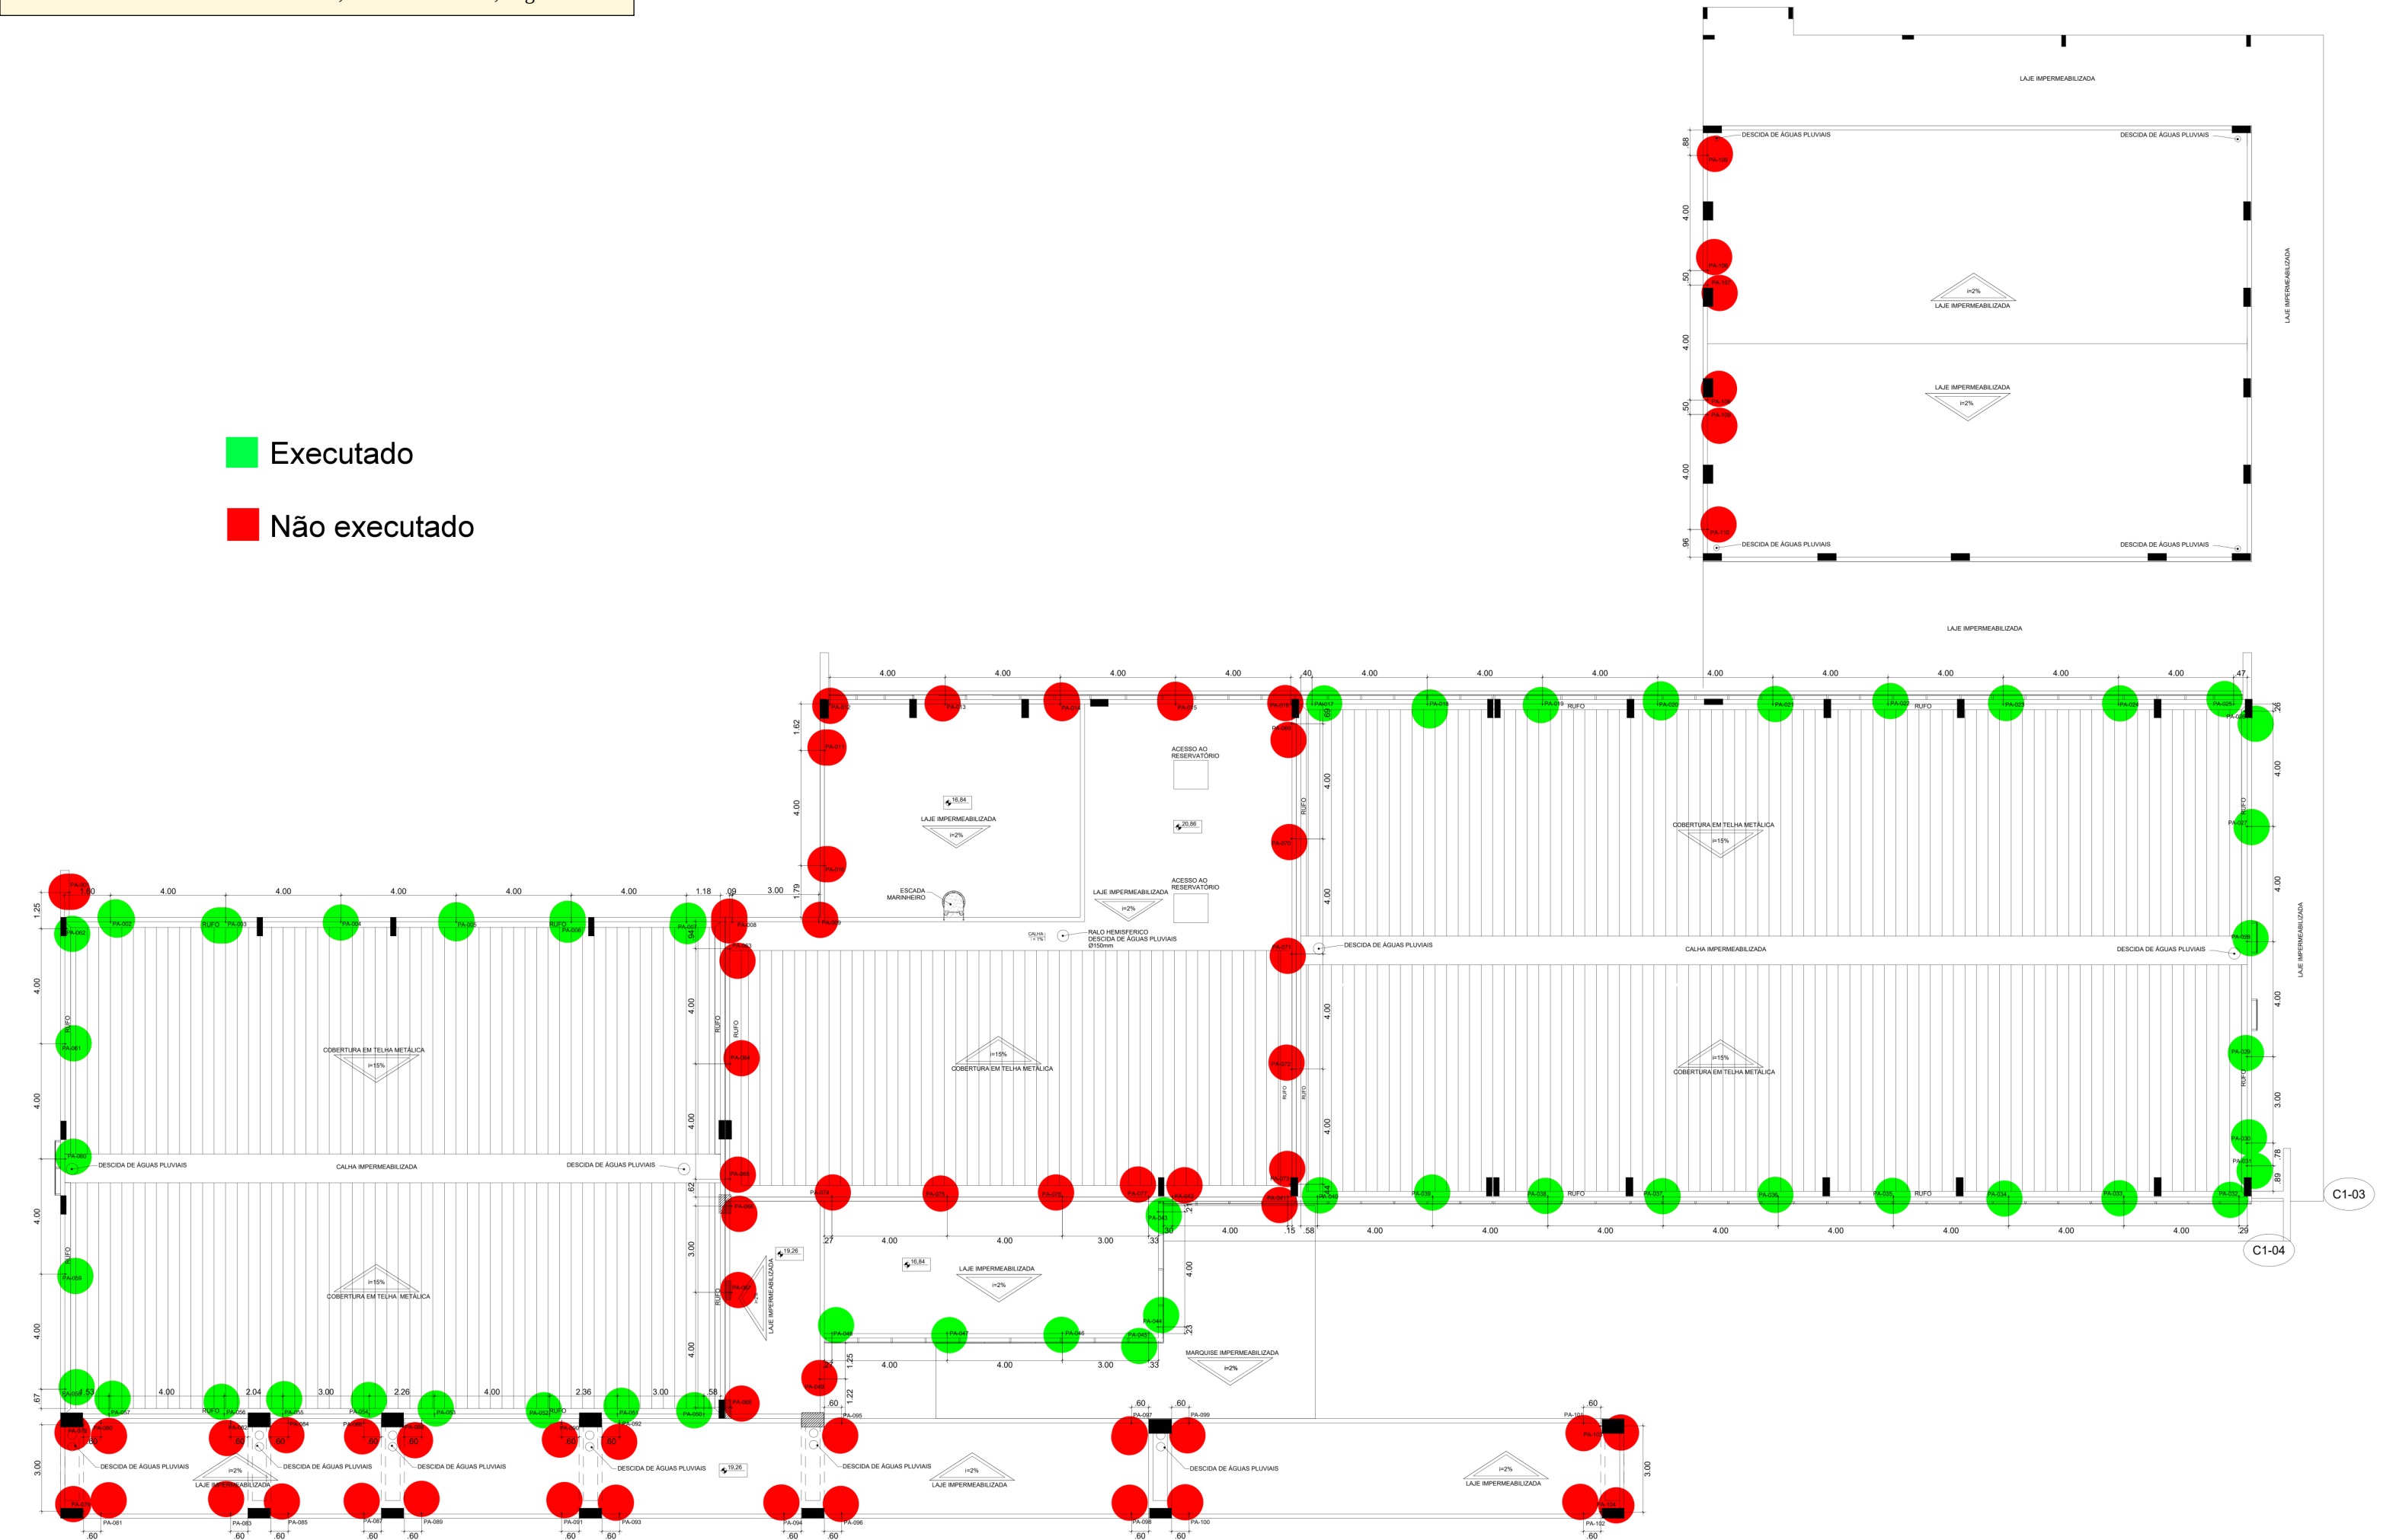

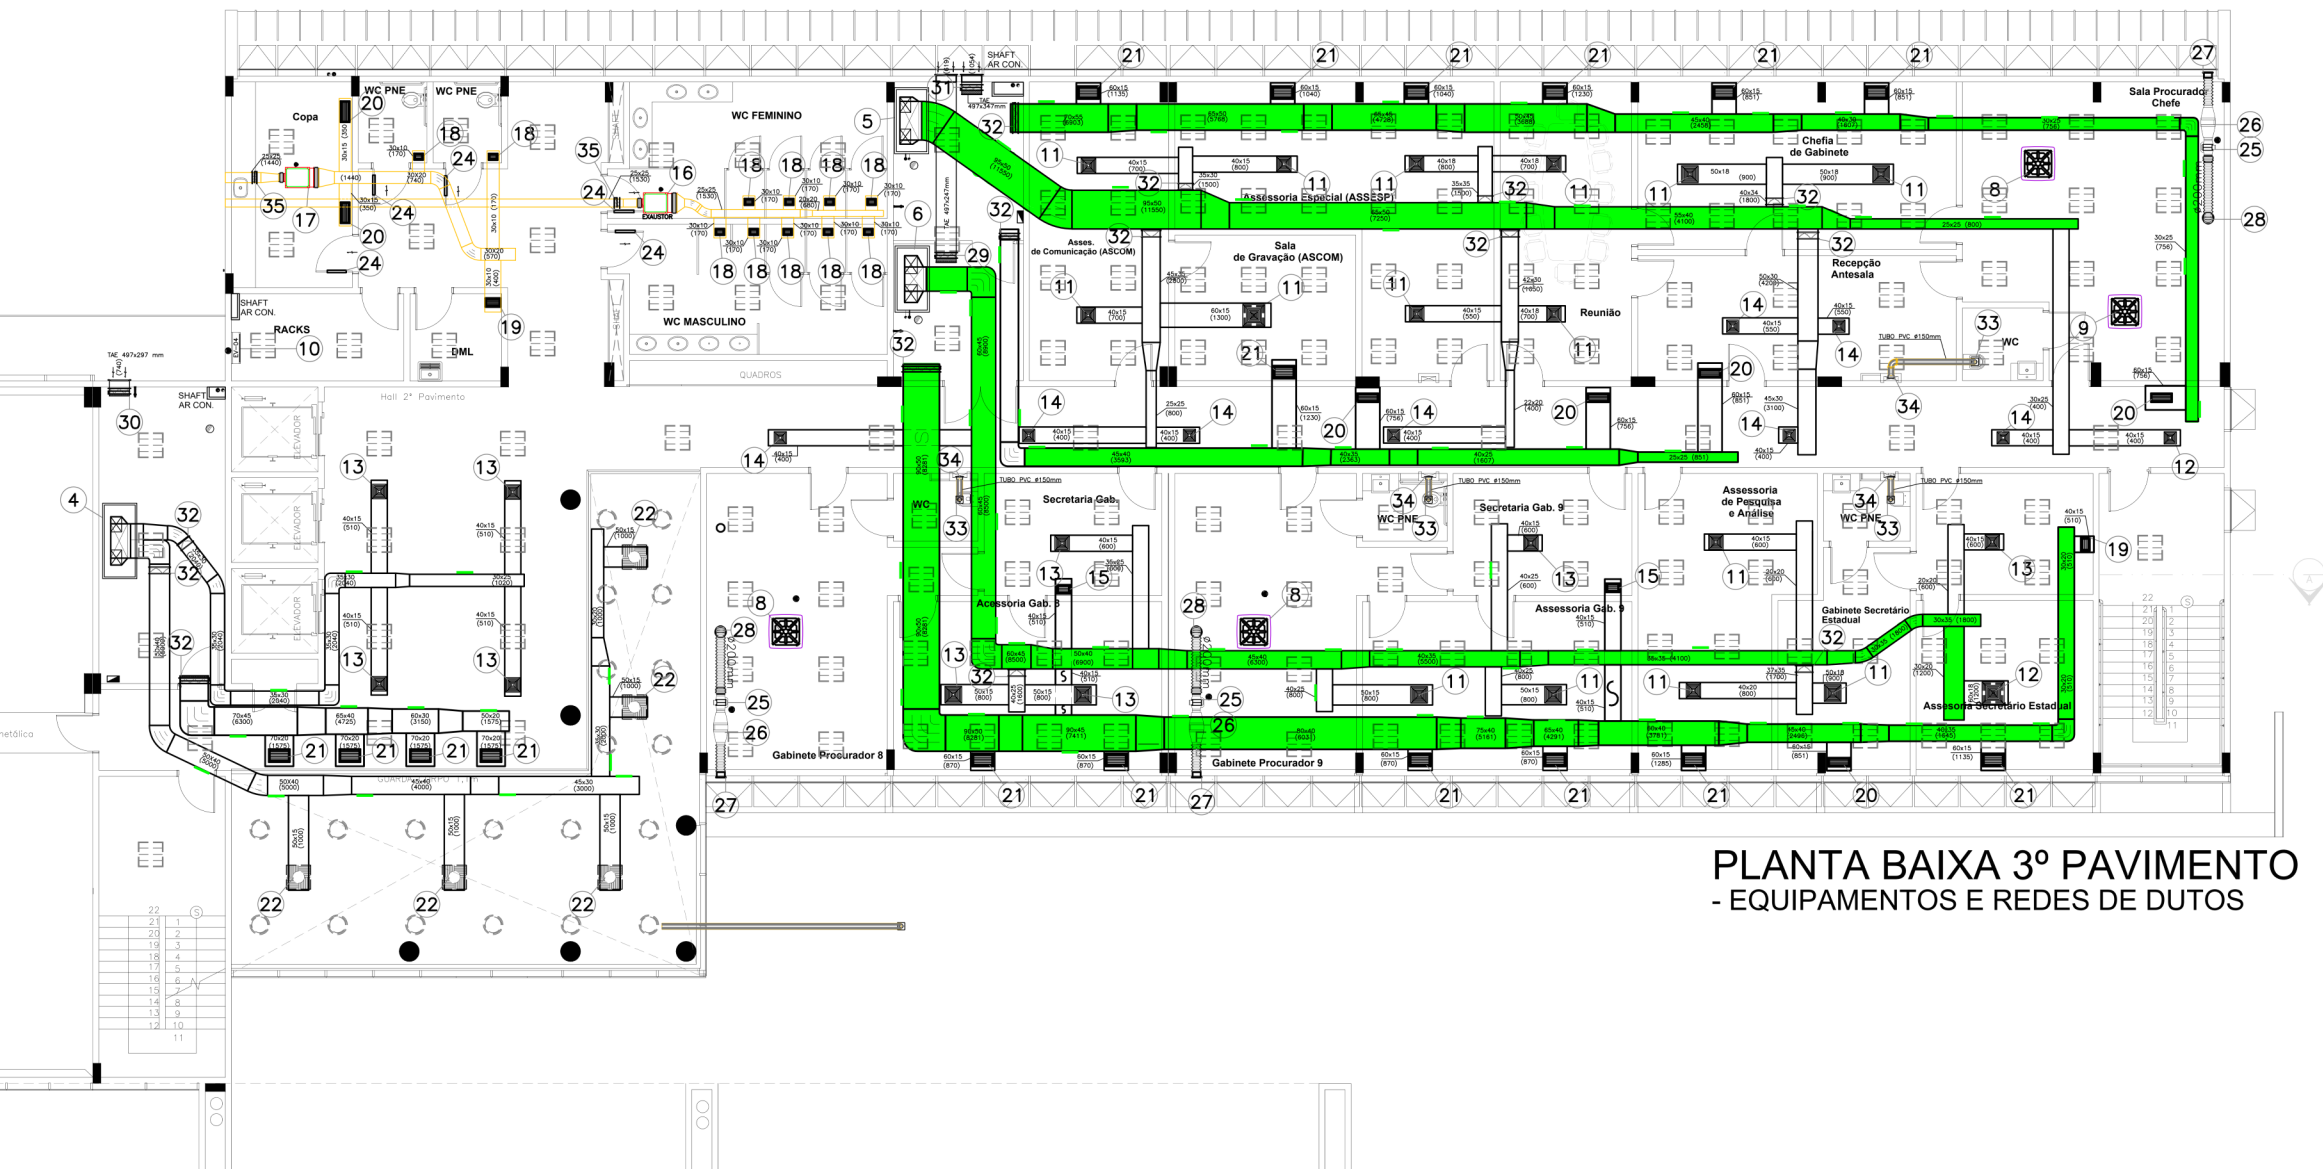

PLANTA BAIXA 3º PAVIMENTO

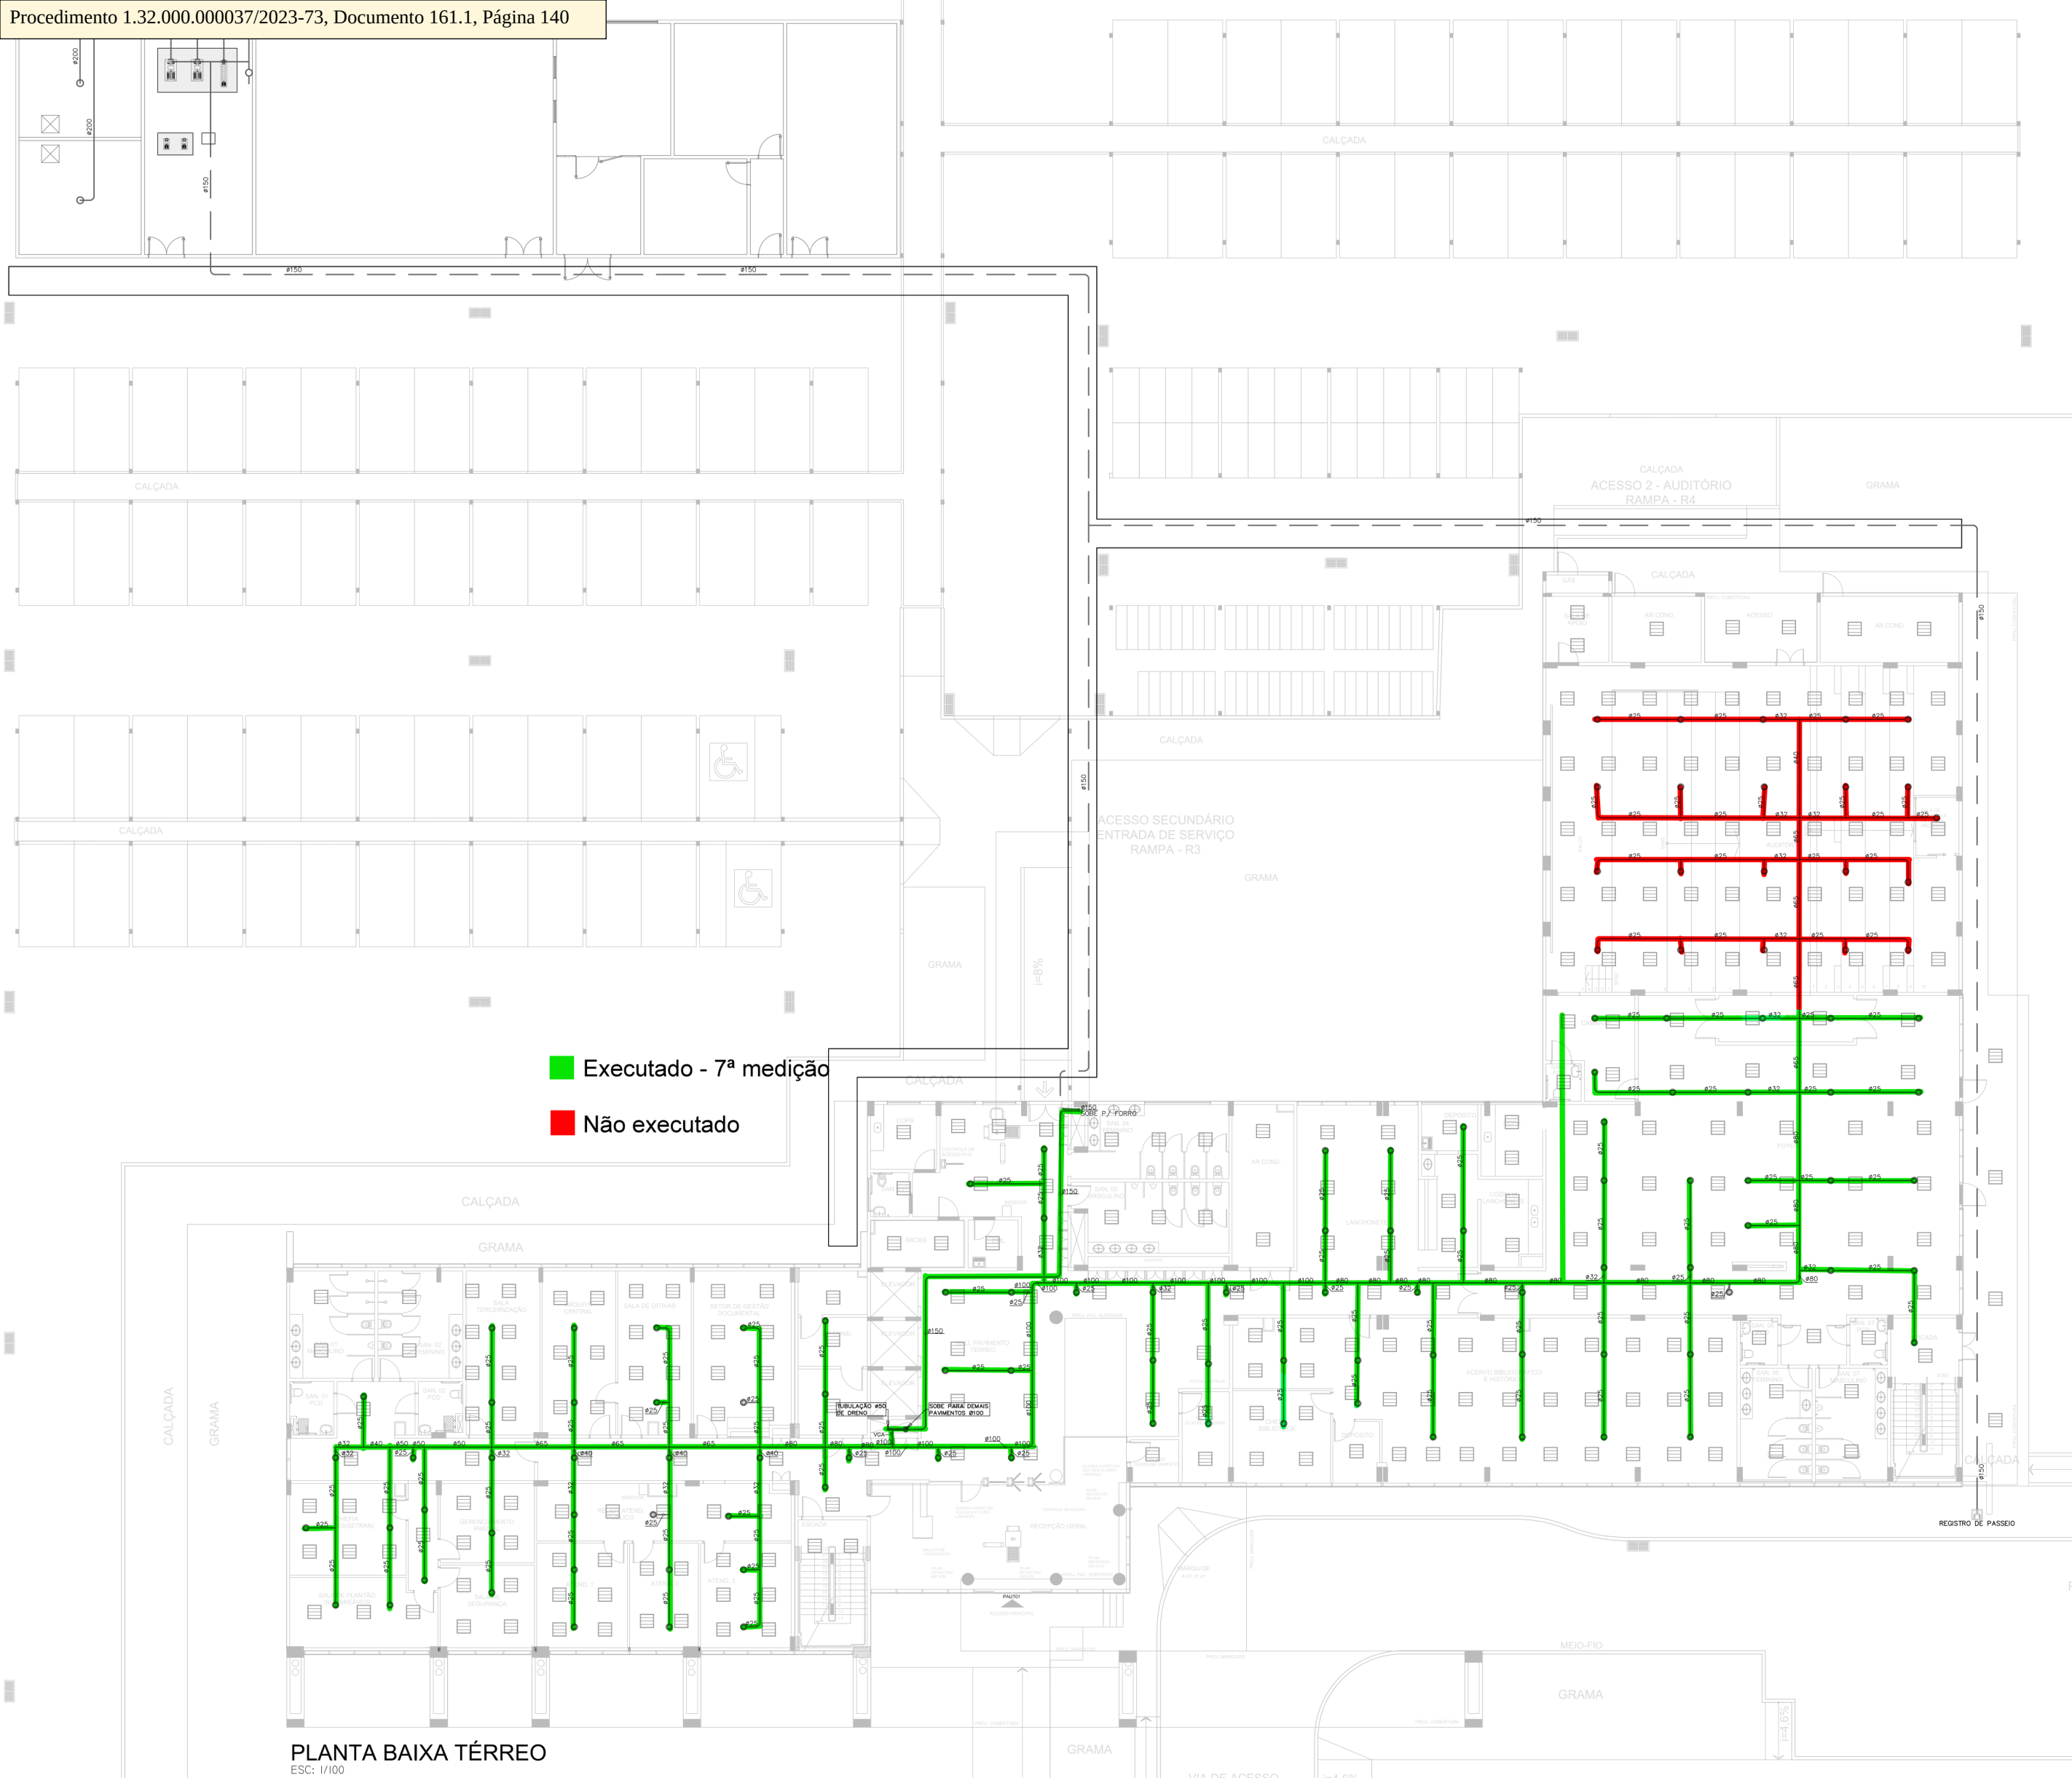

Executado - medição passada



PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

ESC: 1/100
