



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR/RR

Despacho nº 946/2023

Referência: 1.32.000.000003/2023-89

Assunto: Relatório técnico da 8ª medição da obra da Nova Sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima

Segue em anexo o relatório técnico da 8ª medição

Nota Fiscal Eletrônica de Referência R\$ 665.242,28 (seiscentos e sessetna e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)

Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste R\$ 35.923,08 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e oito centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente

Boa Vista, 20 de setembro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA

Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 8ª MEDIÇÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 08/2023			
INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA:		16 de janeiro de 2023	
PERÍODO DO RELATÓRIO		De 16 de agosto a 20 de setembro de 2023	
SERVIÇOS PREVISTOS PARA OITAVA MEDIÇÃO		Instalação de infraestrutura elétrica, combate à incêndio, sistema de climatização, execução de alvenaria e emassamento, cabeamento, platibandas, estrutura metálica da cobertura, viga do gradil, revestimento cerâmico e divisórias dos sanitários.	
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF			
Nome:	Engenheiro Marcos Eduardo Silva Madureira		
Telefone:	(95) 3198-2005		
E-mail:	marcoseduardo@mpf.mp.br		
1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)			
Nome:	Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira		
Portaria:	SE/PR-RR nº02/2023		
Telefone:	(95) 3198-2025 / 2073		
E-mail:	prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br		
2.0 - ESCOPO E LOCAL			
DADOS DO CONTRATO:	Nº Contrato: 05/2022	PPA/LOA: AÇÃO 110E	
Empresa Contratada	J. NASSER LTDA	ENGNHARIA	CNPJ 04.618.096/0001-07

Matrícula CEI da Obra	51.235.89823/71			
Valor Atual do Contrato	R\$31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)			
Percentual de reajuste	6,0%			
Saldo de Empenho	5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022			
Local/UF	Boa Vista – RR			
Responsável Técnico	José Nasser – ART de Execução: RR20230111507			
Corresponsável Técnico	Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835			
Nota Fiscal Eletrônica de Referência	R\$ 665.242,28 (seiscentos e sessetna e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos)			
Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste	R\$ 35.923,08 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e oito centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.			
DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA				
Medição nº	% Previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
3	1,16%	0,75%	1,40%	1,25%
4	0,88%	0,66%	1,93%	1,91%
5	1,64%	1,29%	3,57%	3,21%
6	1,94%	1,25%	5,51%	4,46%
7	0,95%	1,29%	4,93%	5,75%
8	1,17%	2,11%	6,10%	7,85%
TOTAL EXECUTADO				7,85%
TOTAL A EXECUTAR				92,15%
Identificação do processo de fiscalização		1.32.000.000464/2022-71		
Tipo de obra		Prédio Público		
Objeto da fiscalização		Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima		
Período abrangido pela fiscalização		16/08/2023 a 20/09/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)		
3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO				
Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a serviço de alvenaria/chapisco/emboço, colocação de granito (peitoril), viga do guarda corpo (hall), instalações hidrossanitários, instalação de incêndio, sistema de climatização (envelopamento),				

instalações de infra de elétrica como interruptor e tomada baixa ou alta, fiação de iluminação e tomada/interruptor, pontos de ancoragem, aplicação de selador e massa latéx em paredes, platibanda e estrutura metálica da cobertura, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: IMPERMEABILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO;

Constatação do Período nº 2: Visto pela análise da engenharia o contrato 05/2022 da disciplina de arquitetura e os itens das notas fiscais, que a empresa J. Nasser engenharia Ltda solicitou o adiantamento do pagamento desses itens, mas não contempla os requisitos do contrato, pois no contrato apenas são contemplados os itens 5.2.4 (piso elevado com 2 placas de aço com enchimento de concreto celular) e 5.3.5 (painel de fachada em alumínio (acm)), tendo em vista que os valores na tabela batem com os valores desses itens quando não é aplicado o desconto linear de 6%, além disso no item 2.5.11 do contrato especifica que "a solicitação deverá ser realizada com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência em relação a qualquer parcela que se pretenda antecipar", com isso não foi autorizado o pagamento;

Constatação do Período nº 3: Em resposta ao Despacho 848/2023 e a Carta 14/2023 AM - JNASSER ENGENHARIA LTDA, foi encaminhado o Despacho 879/2023 com os dados do 1º aditivo da obra, que corresponde ao período da 1ª a 5ª medição.

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

- A) Venho notificar no Despacho 823/2023 que serviços já pagos de telhas metálicas foram amassados da mesma forma em que foram cobradas para serem reparadas . Com isso familiarizamos que a J. NASSER ENGENHARIA LTDA não prestou atenção em isolar a área, por isso quero trocar as telhas amassadas por novas; visto que foi verificado também descolamento da Manta Asfáltica Aluminizada na cobertura do rufo; verificado in loco fissura na Proteção Mecânica na cobertura do Hall da entrada principal, fissura no piso e na dobra da parede;
- B) Vai ser aberto um rasgo na área técnica para passagem de dutos de climatização, que alimentam o auitório;
- C) Uma empresa especializada fez vistoria na pele de vidro tentando achar uma solução para os diversos problemas que fosse mais adequada;
- D) Foram analisadas três opções de solução para os shafts de climatização e água gelada, tem incompatibilidades entres os tubos;
- E) Há interferência nos instalações de incêndio e de elétrocalha, levando a alterações do projeto para obter compatibilidade entre os sistemas;
- F) A pedra divisória do smictório teve sua dimensão reduzida, de 70x110 foi para 40x110,

diminuindo sua profundidade, aprovado pela SEA; G) A viga do gradil, no projeto estava com altura de 40cm, devido ao relevo ela teve que ficar com 60cm para atingir o nível da rua e servir como contenção pra as águas pluviais infiltradas no solo.	
6.0 – CONCLUSÃO	
Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.	
7.0 – ANEXOS	
A) 13.0 Relatório fotográfico do período	
8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO	
Boa Vista – Roraima, 20 de setembro de 2023	
9.0 - FÉ DO MEMBRO DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022	
Declaramos que as metas estabelecidas na 8ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas.  Marcos Eduardo Silva Madureira Engenheiro Civil/Membro da Comissão	
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas.	
10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL	
() Não foram identificados vícios. () Ver Nota Técnica ou Despacho constante da folha de nº. _____	 Igor José Barbosa Duarte Lopes Secretário Estadual
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas.	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 8ª MEDIÇÃO

11.0 - A OITAVA MEDIÇÃO FOI EFETUADA PELO FISCAL DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, MATRÍCULA 31143, NO DIA 20/09/2023

11.1 - Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma (%)	Percentual executado <i>in loco</i> (%)	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E PROTEÇÃO	80,90%	82,22%		X
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,68%	3,75%		X
ESTRUTURAS DE CONCRETO				
GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS	12,35%	17,05%		X
ARQUITETURA				
VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS,	5,07%	5,83%		X

ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS				
IMPERMEABILIZAÇÃO				
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	44,28%	42,42%	X	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				
ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO	1,55%	2,36%		X
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E SPRINKLERS	17,39%	22,28%		X
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				
SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO	7,68%	10,46%		X
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV,	3,16%	0,02%	X	
CLIMATIZAÇÃO				
ÁGUA GELADA, VRF, SPLIT, VENTILAÇÃO MECÂNICA-, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS, LIGACÕES E DUTOS DE AR	2,83%	7,88%		X
SERVIÇOS GERAIS				
TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO	42,20%	45,11%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA	6,10%	7,85%		X

12.0 SEGUE ABAIXO A PLANILHA CONTENDO O RESUMO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E PACTUADOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATADOS						8ª. MEDIÇÃO		ACUMULADO NA 8ª		SALDO CONTRATUAL	
		UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	VALOR R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					76.116,52		1,85%	1.404,97	82,22%	62.580,73		13.535,79
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					10.098,24			204,97	25,44%	2.569,48		7.528,76
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	36,38	43,22	53,38	1.941,96		3,84	204,97	36,38	1.941,92	0,00	0,04
1.4	PROTEÇÃO					9.600,00			1.200,00	37,43%	3.592,98		6.007,02
1.4.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA PROTEÇÕES - ROLO DE 4X100M - 80 MICRAS	M²	3.200,00	2,43	3,00	9.600,00		400,00	1.200,00	1.197,66	3.592,98	2.002,34	6.007,02
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS					166.895,56		0,63%	1.058,89	3,75%	6.261,23		160.634,33
2.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					166.895,56			1.058,89	3,75%	6.261,23		160.634,33
2.1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	M/MÊS	640,00	12,54	15,49	9.913,60		68,36	1.058,89	278,36	4.311,79	361,64	5.601,81
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO					387.887,79		4,67%	18.103,86	17,05%	66.149,66		321.738,13
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO - GRADIL					39.650,41			11.565,59	36,29%	14.388,19		25.262,22
4.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	44,00	66,56	82,22	3.617,68		21,00	1.726,62	21,00	1.726,62	23,00	1.891,06
4.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. DE 3,4 ATÉ 6,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	138,90	17,07	21,08	2.928,01		43,09	908,33	43,09	908,33	95,81	2.019,68
4.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,30 ATÉ 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	261,40	15,70	19,39	5.068,54		118,75	2.302,56	118,75	2.302,56	142,65	2.765,98
4.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, PILARES, BALDRAMES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	104,00	76,00	93,88	9.763,52		24,00	2.253,12	31,97	3.001,34	72,03	6.762,18
4.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	11,80	1.083,39	1.338,31	15.792,05		2,40	3.211,94	3,95	5.286,32	7,85	10.505,73
4.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M³	23,40	64,40	79,55	1.861,47		14,62	1.163,02	14,62	1.163,02	8,78	698,45
4.5	REPAROS E COMPLEMENTOS					75.659,69			6.538,27		45.900,77		29.758,92
4.5.1	PONTO DE ANCORAGEM NA ESTRUTURA - ELEMENTO DE FIXAÇÃO E OLHAL EM AÇO INOX Ø12MM (FIXAÇÃO QUÍMICA + TESTE COM DINAMÔMETRO) CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 2300KG	UN	90,00	129,10	159,47	14.352,30		41,00	6.538,27	90,00	14.352,30	0,00	0,00
5	ARQUITETURA					10.883.731,21		1,40%	152.591,17	5,83%	634.870,74		10.248.860,47
5.1	VEDAÇÕES					401.563,21			31.125,53	12,51%	50.221,89		351.341,32
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO).	M²	364,00	75,87	93,72	34.114,08		106,54	9.984,92	310,30	29.081,28	53,70	5.032,80
5.1.4	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	182,00	743,11	917,96	167.068,72		23,03	21.140,61	23,03	21.140,61	158,97	145.928,11
5.2	PISOS					3.080.170,94			27.512,85	11,21%	345.258,97		2.734.911,97
5.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M²	355,00	42,09	51,99	18.456,45		1,95	101,38	327,52	17.027,75	27,48	1.428,70
5.2.8	PISO EM PORCELANATO 90X90CM, SUPERFÍCIE NATURAL RETIFICADO - REF.: MINERAL OFF WHITE, NATURAL RETIFICADO DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	M²	1.960,98	315,97	390,31	765.390,10		70,23	27.411,47	70,23	27.411,47	1.890,75	737.978,63
5.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS					2.370.814,97			46.084,10	4,13%	97.844,39		2.272.970,58
5.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA EMBOÇO/MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM	M²	786,47	6,67	8,23	6.472,64		94,91	781,10	786,47	6.472,61	0,00	0,03
5.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60 CM - COM REJUNTE ACRÍLICO - REF.: PORTOBELLO BIANCO ACETINADO RETIFICADO OU EQUIVALENTE	M²	811,47	34,34	42,42	34.422,55		8,46	358,87	811,47	34.422,53	0,00	0,02
5.3.4	PEITORIL EM GRANITO (CINZA ANDORINHA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	1.508,70	164,25	202,89	306.100,14		170,50	34.592,74	170,50	34.592,74	1.338,20	271.507,40
5.3.8	PERFILADO EM GRANITO (CINZA ANDORINHA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	60,40	631,48	780,06	47.115,62		13,27	10.351,39	28,66	22.356,51	31,74	24.759,11
5.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES					193.093,34			26.087,11	33,27%	64.236,87		128.856,47
5.5.1	ESTRUTURA PARA COBERTURA COM TELHA METÁLICA - COM PINTURA E FUNDO DE ZARCÃO	M²	352,00	119,79	147,97	52.085,44		176,30	26.087,11	176,30	26.087,11	175,70	25.998,33
5.8	PINTURA					1.096.660,80			21.781,58	7,05%	77.308,62		1.019.352,18
5.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	11.292,52	13,37	16,51	186.439,50		952,60	15.727,42	3.592,73	59.315,95	7.699,79	127.123,55
5.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	10.594,50	2,16	2,66	28.181,37		1.733,15	4.610,17	5.502,86	14.637,58	5.091,64	13.543,79
5.8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M²	5.973,00	19,96	24,65	147.234,45		58,58	1.443,99	136,11	3.355,09	5.836,89	143.879,36
6	IMPERMEABILIZAÇÃO					459.919,12		5,43%	24.958,58	42,42%	195.097,24		264.821,88
6.1	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO					459.919,12			24.958,58	42,42%	195.097,24		264.821,88
6.1.4	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE PAREDES E FACHADAS	M²	876,82	45,43	56,11	49.198,37		163,83	9.192,50	364,68	20.462,18	512,14	28.736,19
6.1.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	M²	655,00	83,67	103,35	67.694,25		12,36	1.277,40	131,87	13.628,75	523,13	54.065,50
6.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018	M²	246,58	130,57	161,29	39.770,88		89,83	14.488,68	246,58	39.770,88	0,00	0,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS					941.059,00		0,18%	1.650,41	2,37%	22.337,17		918.721,83
7.1	ÁGUA FRIA					79.030,35			1.181,74	14,10%	11.139,44		67.890,91
7.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	889,00	32,30	39,90	35.471,10		12,00	478,80	55,24	2.204,07	833,76	33.267,03
7.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00	46,27	57,15	9.144,00		12,30	702,94	53,30	3.046,09	106,70	6.097,91
7.2	ESGOTO SANITÁRIO					175.940,44			468,67	4,60%	8.097,59		167.842,85
7.2.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	235,00	41,75	51,57	12.118,95		6,50	335,20	21,00	1.082,96	214,00	11.035,99
7.2.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM + PROLONGADOR (EXCLUSIVE GRELHA E PORTA GRELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	36,02	44,49	800,82		3,00	133,47	4,00	177,96	14,00	622,86
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					1.193.101,20		7,47%	89.121,53	22,28%	265.851,22		927.249,98
8.5	HIDRANTES					252.370,94			85.223,44	34,49%	87.046,43		165.324,51
8.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	242,00	237,09	292,87	70.874,54		146,97	43.043,10	146,97	43.043,10	95,03	27.831,44
8.5.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	145,71	286,26	353,61	51.524,51		114,43	40.463,59	114,43	40.463,59	31,28	11.060,92
8.5.5	SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	168,00	22,10	27,30	4.586,40		50,00	1.365,00	50,00	1.365,00	118,00	3.221,40
8.5.6	SUPORTE PARA TUBOS/ DUTOS E/OU ELETROCALHAS VERTICAIS (CHUMBADORES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	40,68	50,25	1.457,25		7,00	351,75	7,00	351,75	22,00	1.105,50
8.6	SPRINKLERS					521.299,50			3.898,09	34,30%	178.804,79		342.494,71
8.6.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	109,00	237,09	292,87	31.922,83		13,31	3.898,09	92,00	26.944,02	17,00	4.978,81
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA					5.365.186,69		2,56%	137.591,72	10,46%	561.196,62		4.803.990,07

9.3	INFRAESTRUTURA					1.555.470,98		107.485,59	33,52%	521.406,01		1.034.064,97
9.3.1	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 50 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.373,00	77,39	95,59	131.245,07	405,91	38.800,93	997,26	95.328,05	375,74	35.917,02
9.3.2	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 100 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	698,00	93,97	116,08	81.023,84	67,40	7.823,79	408,01	47.361,77	289,99	33.662,07
9.3.4	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 150 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	491,00	113,68	140,42	68.946,22	44,36	6.229,03	383,04	53.786,46	107,96	15.159,76
9.3.5	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 250 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,00	151,64	187,32	60.879,00	59,89	11.218,59	223,33	41.834,16	101,67	19.044,84
9.3.6	LEITO GALVANIZADO PESADO - L = 300MM - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00	256,41	316,74	53.845,80	57,93	18.348,74	57,93	18.348,74	112,07	35.497,06
9.3.12	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.773,00	39,33	48,58	183.292,34	6,05	293,90	1.063,15	51.647,80	2.709,85	131.644,54
9.3.13	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 25 (1") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.975,00	47,78	59,02	116.564,50	254,59	15.025,90	441,89	26.080,34	1.533,11	90.484,16
9.3.14	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 2,25 MM - DIAMETRO NOMINAL 50 (2") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	402,00	93,85	115,93	46.603,86	73,46	8.516,21	73,46	8.516,21	328,54	38.087,65
9.3.16	SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3.302,00	22,10	27,30	90.144,60	45,00	1.228,50	468,00	12.776,40	2.834,00	77.368,20
9.4	CONDUTORES E CABOS					1.103.775,66		30.106,13	3,60%	39.790,61		1.063.985,05
9.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67.456,00	3,87	4,78	322.439,68	5.343,93	25.543,98	7.191,93	34.377,42	60.264,07	288.062,26
9.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.635,00	6,38	7,88	75.923,80	155,00	1.221,40	263,00	2.072,44	9.372,00	73.851,36
9.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.368,00	16,80	20,75	90.636,00	161,00	3.340,75	161,00	3.340,75	4.207,00	87.295,25
12	CLIMATIZAÇÃO					4.455.597,11	4,00%	178.089,40	7,88%	351.064,02		4.104.533,09
12.9	DUTOS DE AR					564.672,17		62.484,99	23,03%	130.019,86		434.652,31
12.9.3	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #24	M²	2.282,42	146,92	181,49	414.236,40	331,79	60.216,56	550,68	99.942,89	1.731,74	314.293,51
12.9.4	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #26	M²	384,25	110,83	136,90	52.603,82	16,57	2.268,43	77,07	10.550,87	307,18	42.052,95
12.10	GRELHAS, DIFUSORES E ACESSÓRIOS PARA DUTOS					143.235,85		1.950,64	1,36%	1.950,64		141.285,21
12.10.33	DAMPER DE REGULAGEM - DIMENSÃO CONFORME TAMANHO DO DUTO	UN	106,00	197,39	243,83	25.845,98	8,00	1.950,64	8,00	1.950,64	98,00	23.895,34
12.12	ISOLAMENTO TÉRMICO - TUBULAÇÕES E DUTOS					783.397,45		113.653,77	27,59%	216.135,55		567.261,90
12.12.15	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ALUMINIZADA - MANTA DE 15 MM - ARMADUCT OU EQUIVALENTE	M2	2.217,00	254,98	314,97	698.288,49	360,84	113.653,77	686,21	216.135,55	1.530,79	482.152,94
14	SERVIÇOS GERAIS					234.157,38	1,88%	4.406,47	45,11%	105.621,05		128.536,33
14.1	TRANSPORTE DE MATERIAL					51.745,20		1.523,16	27,49%	14.223,26		37.521,94
14.1.1	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M²	780,00	53,71	66,34	51.745,20	22,96	1.523,16	214,40	14.223,26	565,60	37.521,94
14.2	LIMPEZA DA OBRA					96.372,88		2.188,71	40,83%	39.349,78		57.023,10
14.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	325,60	402,21	40.221,00	4,16	1.673,19	33,29	13.388,20	66,71	26.832,80
14.2.2	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	280,00	75,06	92,72	25.961,60	5,56	515,52	280,00	25.961,58	0,00	0,02
14.5	TAXAS DE CONSTRUÇÃO					54.660,31		694,60	95,22%	52.048,01		2.612,30
14.5.2	CÓPIAS REPROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	500,00	12,23	15,10	7.550,00	46,00	694,60	327,00	4.937,70	173,00	2.612,30
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					2.672.342,00	2,11%	56.265,28	7,85%	209.888,77		2.462.453,23
15.1	INSUMOS PÚBLICOS					101.200,00		2.130,73	7,85%	7.948,33		93.251,67
15.1.1	INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	819,24	1.012,00	101.200,00	2,11	2.130,73	7,85	7.948,33	92,15	93.251,67
15.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.571.142,00		54.134,55	7,85%	201.940,44		2.369.201,56
15.2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	16.964,81	20.956,62	2.095.662,00	2,11	44.123,48	7,85	164.595,72	92,15	1.931.066,28
15.2.2	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	100,00	3.849,11	4.754,80	475.480,00	2,11	10.011,07	7,85	37.344,72	92,15	438.135,28

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI	R\$	665.242,28	R\$	2.481.152,03	R\$	29.110.859,61
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI E COM REAJUSTE	R\$	701.165,36	R\$	2.582.484,12		


TABELA PARA O REAJUSTE CRONOGRAMA 28/06											
DESCRIÇÃO	SUBTOTAL COM BDI	PREVISTO	REALIZADO	ESTÁ EM ATRASO		VALOR EM ATRASO NO MOMENTO DO SEGUNDO REAJUSTE	VALOR ADIANTADO NO MOMENTO DO SEGUNDO REAJUSTE	VALOR EXECUTADO NA 8ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 8ª MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NA 9ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 9ª MEDIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.116,52	R\$ 56.885,15	R\$ 56.885,15	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404,97	R\$ 307,56	R\$ 0,00	R\$ 307,56
		74,73%	74,73%		😊						
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 166.895,56	R\$ 1.719,89	R\$ 1.719,89	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.058,89	R\$ 245,23	R\$ 0,00	R\$ 245,23
		1,03%	1,03%		😊						
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 372.192,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		😊						
ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 387.887,79	R\$ 31.938,44	R\$ 31.938,44	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.103,86	R\$ 1.847,41	R\$ 0,00	R\$ 1.847,41
		8,23%	8,23%		😊						
ARQUITETURA	R\$ 10.883.731,21	R\$ 290.256,85	R\$ 290.256,85	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.591,17	R\$ 18.609,15	R\$ 0,00	R\$ 18.609,15
		2,67%	2,67%		😊						
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 459.919,12	R\$ 58.671,64	R\$ 58.671,64	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.958,58	R\$ 7.366,98	R\$ 0,00	R\$ 7.366,98
		12,76%	12,76%		😊						
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 944.990,20	R\$ 7.053,63	R\$ 7.053,63	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,41	R\$ 825,31	R\$ 0,00	R\$ 825,31
		0,75%	0,75%		😊						
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.193.101,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.121,53	R\$ 14.355,97	R\$ 0,00	R\$ 14.355,97
		0,00%	0,00%		😊						
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 5.365.186,69	R\$ 24.793,36	R\$ 24.793,36	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.591,72	R\$ 28.965,78	R\$ 0,00	R\$ 28.965,78
		0,46%	0,46%		😊						
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1.087.133,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 12,61
		0,00%	0,00%		😊						
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	2.540.238,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		😊						
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.455.597,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.089,40	R\$ 18.957,46	R\$ 0,00	R\$ 18.957,46
		0,00%	0,00%		😊						
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 756.454,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		😊						
SERVIÇOS GERAIS	234.157,38	R\$ 82.137,65	R\$ 82.137,65	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.406,47	R\$ 1.268,10	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10
		35,08%	35,08%		😊						
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.672.342,00	R\$ 51.175,29	R\$ 51.175,29	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.265,28	R\$ 8.570,53	R\$ 0,00	R\$ 8.570,53
		1,91%	1,91%		😊						
TOTAIS EM ATRASO OU ADIANTADO SEGUNDO O CRONOGRAMA APÓS A QUARTA MEDIÇÃO.						0,00	R\$ 0,00		R\$ 35.923,08		R\$ 0,00


ÍNDICE INCC-DI, ACUMUALADO ATÉ MAIO DE 2023 FGV	5,40%		PREÇO TOTAL DO CONTRATO	R\$ 31.595.942,84		A PAGAR APARTIR DA 5ª PARCELA	R\$ 30.991.310,94		A PAGAR COM O PRIMEIRO REJUSTE	R\$ 30.991.310,94
	Cronograma 06/04	Cronograma 28/06								
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 5ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$281.102,49					VALORES A PAGAR PELO MPF 5ª MEDIÇÃO	=	REAJUSTE	MEDIÇÃO	TOTAL
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 6ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$392.742,49					VALORES A PAGAR PELO MPF 6ª MEDIÇÃO	=	R\$15.179,53	R\$408.691,94	R\$423.871,47
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 7ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$401.584,41					VALORES A PAGAR PELO MPF 7ª MEDIÇÃO	=	R\$21.208,09	R\$395.621,29	R\$416.829,38
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 8ª PARCELA DE MEDIÇÃO.		R\$665.242,28				VALORES A PAGAR PELO MPF 8ª MEDIÇÃO	=	R\$21.685,56	R\$406.964,62	R\$428.650,18
								R\$35.923,08	R\$665.242,28	R\$701.165,36

13.0 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

13.1 Climatização



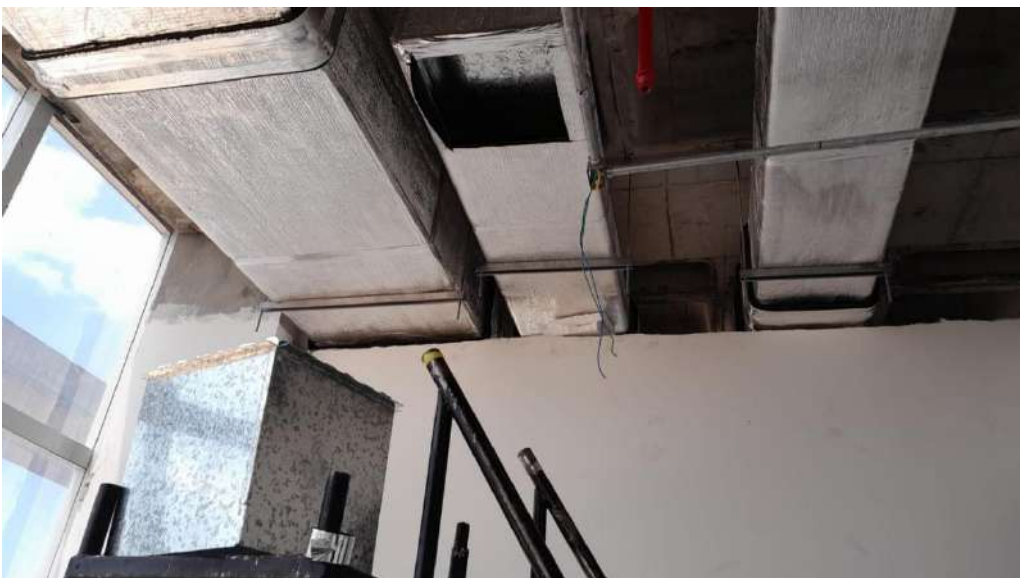

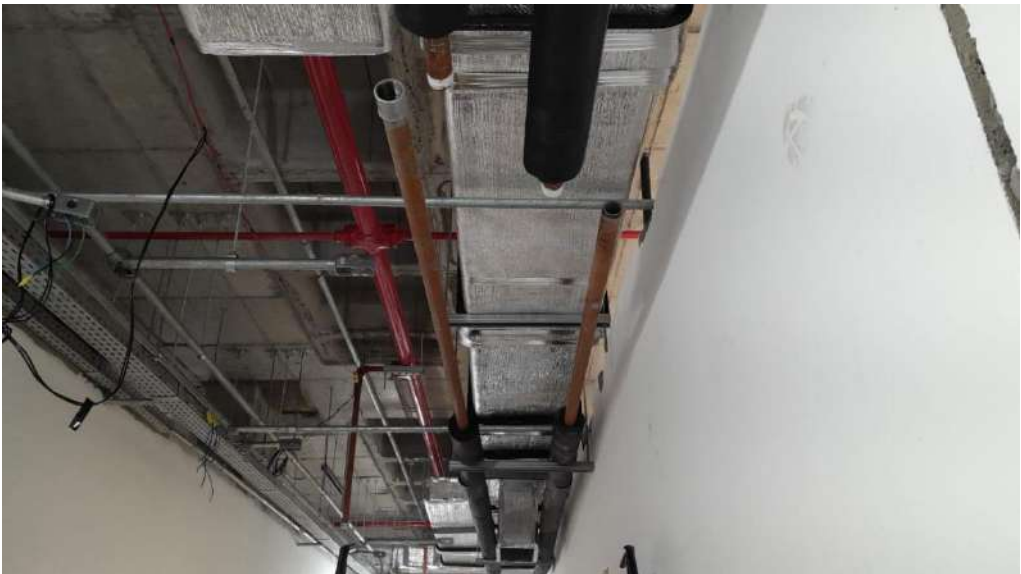













13.2 Papa entulho











13.3 Pintura e selador

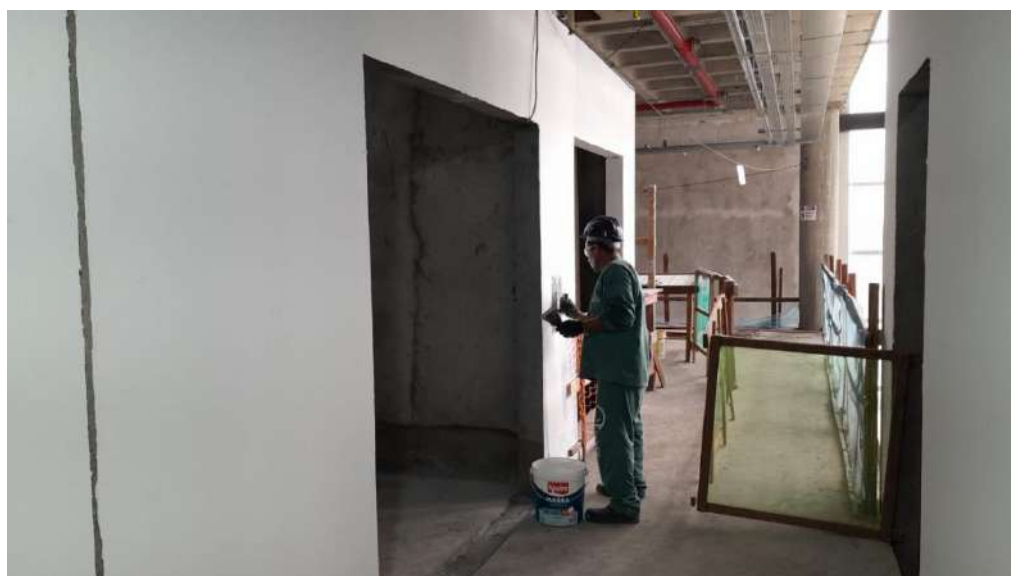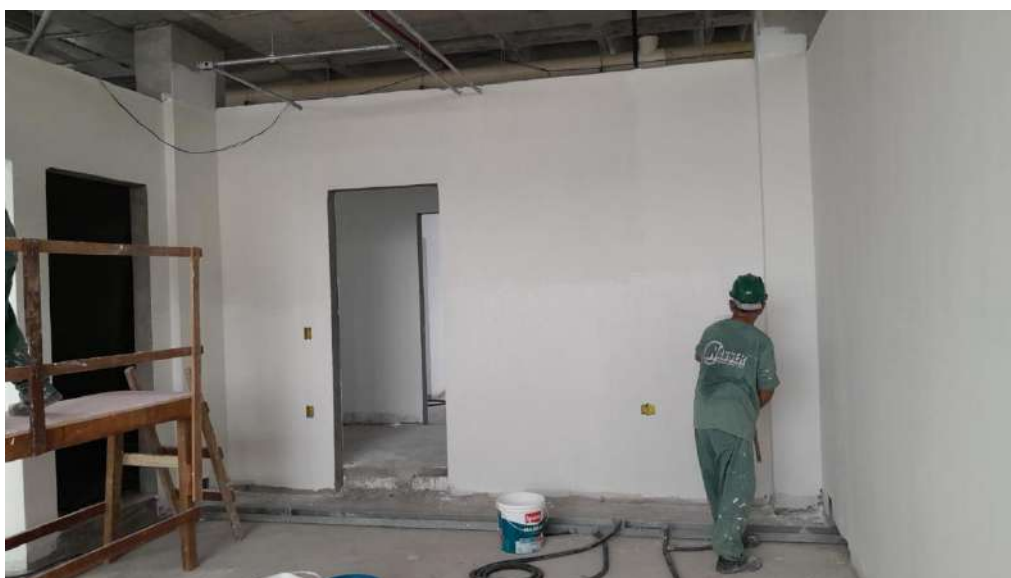




















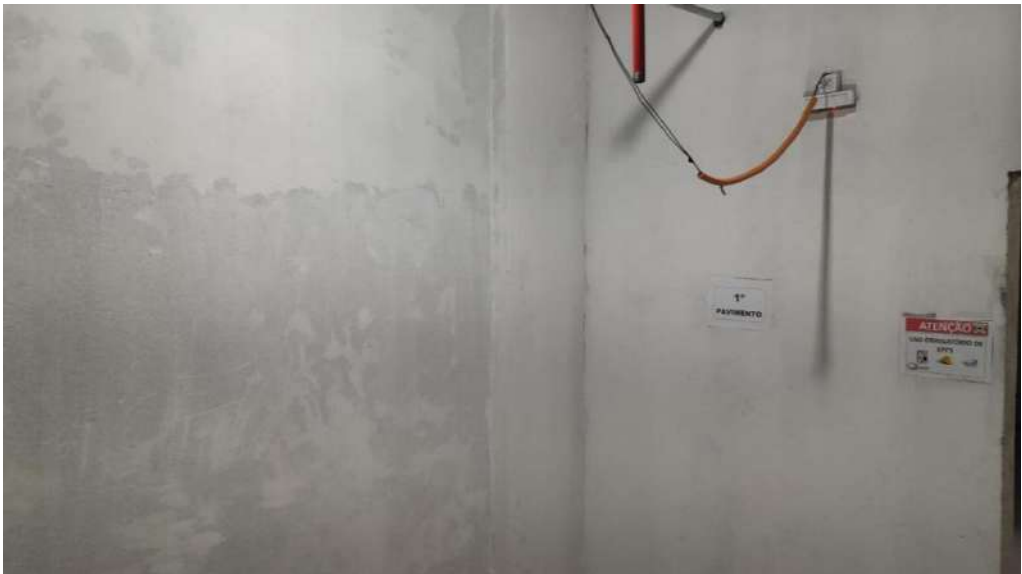



13.4 Alvenaria e blocos de vedação



























13.5 Rebocos e chapiscos e esquadris





















13.6 Infraestructura eléctrica




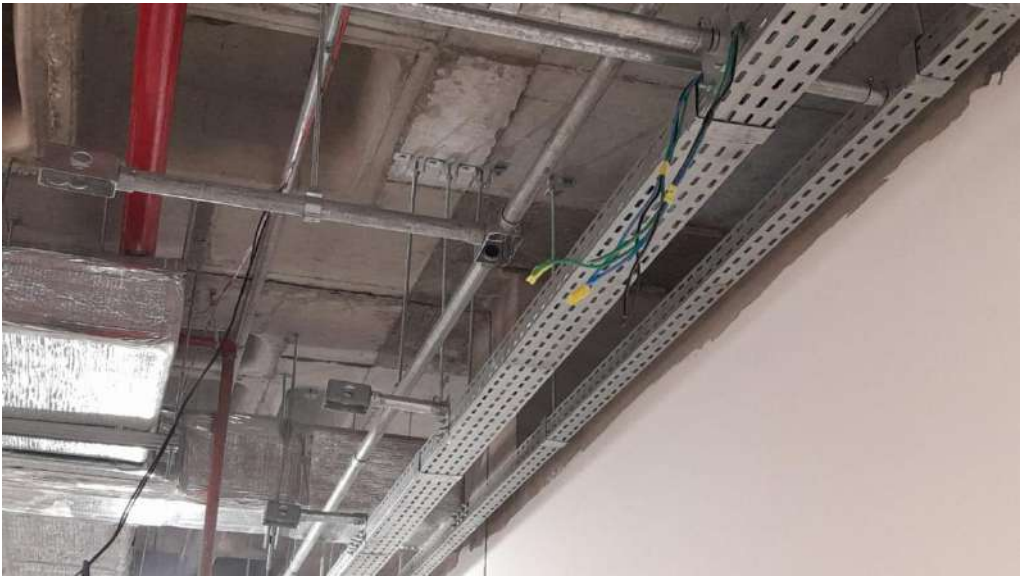



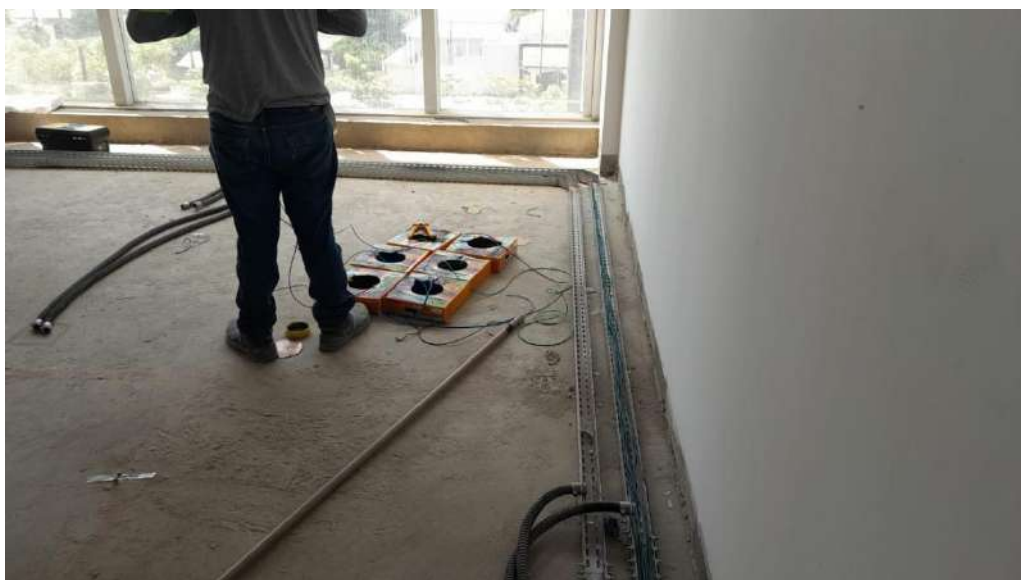




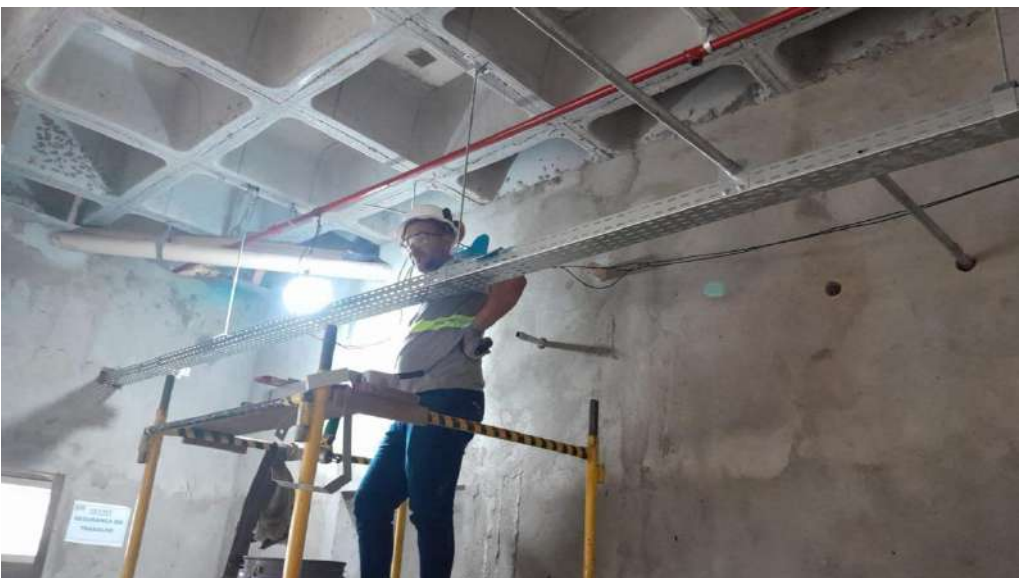





13.7 Rede de incêndio

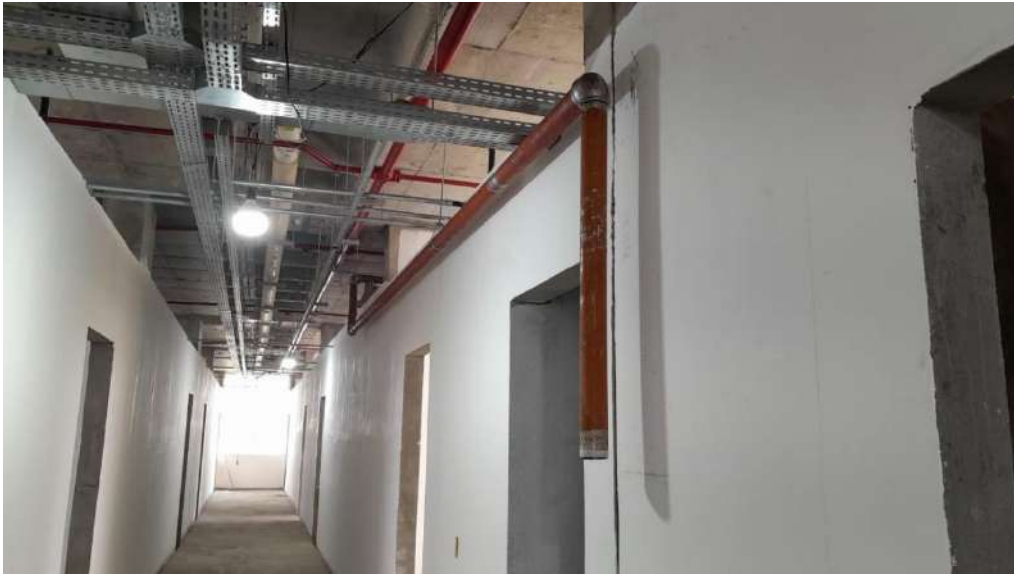











13.8 Vigas









13.9 Limpeza mecanizada











13.10 Porcelanato











13.11 Estrutura metálica

















13.12 Ancoragem



13.1 Regularização e impermeabilização da cobertura







14.0 - CONTROLE DE RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA

Descrição do item	Data da retirada do entulhos da obra
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	16/08/2023 Recibo 001621
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	23/08/2023 Recibo 001697
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	30/08/2023 Recibo 001766
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	04/09/2023 Recibo 001797
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	06/09/2023 Recibo 001846
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	11/09/2023 Recibo 001881
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	16/09/2023 Recibo 001924

15.0 - RELAÇÃO DOS COLABORADORES COM A FUNÇÃO NA EMPRESA J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	Colaborador	Função
1	ALCIDES NOGUEIRA SENA NETO	AUX. ADMINISTRATIVO
2	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
3	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
4	ANANIAS VIEIRA DA SILVA	SERVENTE
5	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
6	ANTONIES DIEGO DE SOUZA CORDEIRO	SERVENTE
7	ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	CARPINTEIRO
8	ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	ELETRICISTA
9	BRUNO SILVA CASTRO	SERVENTE
10	DARLISON COSMOS PENA	BOMBEIRO HIDRAULICO
11	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
12	DIEGO SIMAO BURUM	SERVENTE
13	ELIEZIO MEIRELE RODRIGUES	PEDREIRO

14	ELIZEU LIMA DA SILVA	SERVENTE
15	ERIVAN LOURENÇO MACHADO	PEDREIRO
16	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA
17	FELIPE GRALHADA OLIVEIRA	SERVENTE
18	FRANCISCO EMICIO	BOMBEIRO HIDRAULICO
19	GILVAN LEITE RIBEIRO	PEDREIRO
20	IGOR ANTONIO PINO	PINTOR
21	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVENTE
22	JOSE MARCELO ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR	MESTRE DE OBRAS
23	JOSE RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
24	JOSÉ VERAS BARROS	OP. BETONEIRA
25	JOSINALDO DA SILVA ALMEIDA	CARPINTEIRO
26	JUVENAL GUILHERME SOBRINHO	CALDEIREIRO
27	JOSE MARIA FROTA CONRADO	PINTOR
28	LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA	ALMOXARIFE
29	MARLON BORGES PEREIRA	TECNICO DE SEGURANÇA
30	MOISES FERREIRA CHAVES	CARPINTEIRO
31	NILDO OLIVEIRA DA SILVA	PEDREIRO
32	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
33	RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE	PEDREIRO
34	RAUDI RAFAEL MARTINES	CARPINTEIRO
35	RONNY DE SOUZA ANICETO	SERVENTE
36	SEBASTIÃO ASSIS DE FREITAS	PINTOR
37	SERGIO GOMES DA SILVA	SERVENTE
39	SIVANILSON VIERA DA SILVA	PEDREIRO
38	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
40	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA

41	YANN PEREIRA NUNES	SERVENTE
42	ZEDEQUIAS DOS SANTOS	IMPERMEABILIZADOR

15.1 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).

Nº	Colaborador	Função
1	DANIEL ASSIS CARNEIRO	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO	ELETRICISTA
3	GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ	ELETRICISTA
4	JORGE LUIZ GOZALEZ LOPES	PEDREIRO
5	RIBAMAR SILVA SANTANA	ELETRICISTA
6	ROMÁRIO DA SILVA BENTO	ELETRICISTA
7	SIMON ENRIQUE OLIVEROS LINARES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
8	FABIO VIEIRA DA SILVA	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

15.2 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa FERREIRA & FERREIRA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Nº	Colaborador	Função
1	ALLAN GUIMARÃES FARIAS	AUXILIAR DE FUNILARIA
2	SAMUEL LOBATO	FUNILEIRO
3	LUIZ MIGUEL MAURERA	AUXILIAR DE FUNILARIA
4	MIGUEL ALEXANDER JIMENES RIVAS	AUXILIAR DE FUNILARIA

16.0 - A FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO SERÁ DEFINIDA PELA SOMA DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS OCORRÊNCIAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, CONFORME TABELA ABAIXO:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre da Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 - Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5
4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4

10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6
12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24

17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção
----	--	--------------------------	---

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 - Pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 - Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.

17.3 - A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme a tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				00
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: 00%				

18.0 - ANEXO: DIÁRIOS DE OBRA

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	213
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	519		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	16/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 15/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
06 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.
- Cabeamento de tomadas e iluminação, exaustão do 3º Pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.
- Alvenaria, chapisco e reboco do Shafts do 1º pavimento.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de arcondionados do 3º pavimento.
- Colocação dos pontos de ancoragem na cobertura do lado B - (Furos + Haste roscada+ Chumbador químico).
- Demolição de proteção mecânica da laje da tampa da caixa d'agua.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:16/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
3.2 CONFEÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
3.3 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.6 COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM;
3.7 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MÊCANICA DA COBERTURA;
3.8 FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA/INTERRUPTOR DO 3 PAVIMENTO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	214
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	518		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	17/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 17/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.
- Cabeamento de tomadas e iluminação, exaustão do 3º Pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.
- Assentamento de bloco para elevação da alvenaria ate 2m - San04 3º pavimento.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de ar condicionado do 3º pavimento.
-Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.

4 - Ocorrências: Durante a execução da rede secundaria de dutos do 3º pavimento, observou que as posições dos difusores de climatização com localização baseadas nas luminárias estavam conflitanto a rede de eletrodutos já cabeadas de elétrica. As posições das luminárias do projetos de climatização estão diferentes do projetos de elétrica executado, tanto em localização, modelo e quantidade. O serviço de montagem de dutos dos difusores foram paralisadas momentaneamente ate a fiscalização nos informar qual projeto adotar para as posições dos difusores.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	215
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	517		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	18/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:17/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
3.2 CONFEÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
3.3 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.6 COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM;
3.7 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MÊCANICA DA COBERTURA;
3.8 FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA/INTERRUPTOR DO 3 PAVIMENTO;
3.9 BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO NO SAN. 5;
3.10 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA FRIA.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:18/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
- 3.2 CONFEÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
- 3.3 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
- 3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
- 3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
- 3.6 COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM;
- 3.7 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MÊCANICA DA COBERTURA;
- 3.8 FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA/INTERRUPTOR DO 3 PAVIMENTO;
- 3.9 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA FRIA;
- 3.10 BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO NO SAN. 5.

4.0 - OCORRÊNCIAS: (SEM OCORRÊNCIAS)

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	216
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	516		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	19/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	217
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	515		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	20/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	218
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	514		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	21/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 18/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.
- Cabeamento de tomadas e iluminação, exaustão do 3º Pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.
- Assentamento de bloco para elevação da alvenaria ate 2m - San04 - 2º pavimento.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de arcondicionado do 3º pavimento.
-Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.

4 - Ocorrências: Os difusores dos dutos de arcondicionados serão realocados da melhor forma com o projeto de elétrica/luminárias executado.

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 21/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;

03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.
- Cabeamento de tomadas e iluminação, exaustão do 3º Pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Sprinkler do Térreo.
- Assentamento de bloco para elevação da alvenaria ate 2m - San04 2º pavimento.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de arcondicionado do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:21/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

3 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
3.2 CONFEÇÃO DA REDE DE SPRINKLER DO TÉRREO;
3.3 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.6 COLOCAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM;
3.7 DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA DA COBERTURA;
3.8 FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA/INTERRUPTOR DO 3 PAVIMENTO;
3.9 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA FRIA;
3.10 BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO NO SAN. 5.

4.0 - OCORRÊNCIAS:

4.1 TELHAS AMASSADAS;
4.2 DESCOLAMENTO DA MANTA DA COBERTURA;
4.3 FISSURA DA PROTEÇÃO MECÂNICA DA LAJE DO HALL DE ENTRADA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	219
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	513		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	22/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 22/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoхарife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante 2º pavimento.
- Assentamento de bloco para elevação da alvenaria ate 2m - San04 1º pavimento.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de arcondionado do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Chapisco e reboco de pilares do pavimento técnico - Área da antena.

4 - Ocorrências: As telhas serão substituída, e manta e proteção corrigido.

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:22/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
3.2 ALVENARIA E CHAPISCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.3 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.6 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA GELADA;
3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.8 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA.

4.0 - OCORRÊNCIAS:

4.1 FOI COMUNICADO À ENGENHEIRA PARA REFAZER O REPARO DE MANTA E PROTEÇÃO MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS;
4.2 VAZAMENTO COM VÁRIOS PONTOS PELA PAREDE DA CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR, FAZENDO-SE NECESSÁRIO REFAZER O SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NELA, O QUAL JÁ FORA PAGO;
4.3 SECAGEM DA CAIXA D'ÁGUA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	220
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	512		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	23/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 23/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Assentamento de bloco para elevação da alvenaria ate 2m - San04 1º pavimento.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de arcondionado do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Forma dos pilaretes da platibanda.
- Chapisco e reboco de pilares do pavimento técnico - Área da antena.

4 - Ocorrências: A caixa d'água que estava em teste exatamente com a finalidade de testar a estanqueidade da impermeabilização. Foi observado alguns pontos de vazamentos. A caixa d'água foi seca para para verificar se o problema é na execução da impermeabilização ou tratamento do concreto realizado pela empresa anterior.

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:23/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
3.2 ALVENARIA E CHAPISCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.3 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.6 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA GELADA;
3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.8 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA.

4.0 - OCORRÊNCIAS:

4.1 VAZAMENTO COM VÁRIOS PONTOS PELA PAREDE DA CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR, FAZENDO-SE NECESSÁRIO REFAZER O SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NELA, O QUAL JÁ FORA PAGO;

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	221
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	511		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	24/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 24/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos e seatubo do 1º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de ar condicionado do 3º pavimento.
- Confecção da rede de agua gelada do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Forma dos pilaretes da platibanda.
- Chapisco e reboco de pilares do pavimento técnico - Área da antena.
- Chapisco e reboco de alvenaria em bloco da Área técnica 3º pavimento.
- Instalação hidráulica da caixa d'água.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:24/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
3.2 ALVENARIA E CHAPISCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.3 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.6 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA GELADA;
3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.8 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	222
EMPRESA					
CONTRATO Nº					
INÍCIO	05-2022	DIAS FALTANTES	510		
	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	25/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 25/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoхарife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos do 1º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de ar condicionado do 3º pavimento.
- Confecção da rede de agua gelada do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Forma dos pilaretes da platibanda.
- Chapisco e reboco de pilares do pavimento técnico - Área da antena.
- Chapisco e reboco de alvenaria em bloco da Área técnica 3º pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:25/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
3.2 ALVENARIA E CHAPISCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.3 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.6 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA GELADA;
3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.8 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	223
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	509		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	26/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	224
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	508		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	27/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	225
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	507		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	28/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 28/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoхарife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de ar condicionado do 3º pavimento.
- Confecção da rede de agua gelada do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Forma dos pilaretes da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria em bloco da Área técnica 3º pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	226
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	506		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	29/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 29/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
02 - Técnico em Edificações;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
10 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
03 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, eletrodutos do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 2º pavimento.
- Isolamento dos dutos de ar condicionado do 3º pavimento.
- Confecção da rede de agua gelada do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Chapisco e reboco do platibanda.
- Forma e concreto dos pilaretes da platibanda.
- Demolição de alvenaria das vergas das portas do térreo.
- Verga das portas do Térreo

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:28/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
3.2 ALVENARIA E CHAPISCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.3 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
3.6 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA GELADA;
3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.8 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA.

4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:29/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
2 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO 1º PAVIMENTO;
- 3.2 ALVENARIA E CHAPISCO DOS SHAFTS E REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
- 3.3 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
- 3.4 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO 2º PAVIMENTO;
- 3.5 ISOLAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO;
- 3.6 INSTALAÇÃO E ISOLAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA GELADA;
- 3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
- 3.8 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	227
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	505		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	30/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:30/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.2 FIAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTOR MECÂNICO 3º PAVIMENTO
3.3 FIXAÇÃO/SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.4 REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.5 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.6 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA;
3.7 SELADOR NA ESCADA
3.8 ISOLAMENTO/ENVELOPAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO E CONFECÇÃO DE DUTOS;
3.9 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.10 EXECUÇÃO DE VERGA;
3.11 ARMADURA DA VIGA DO PLATIBANDA DA COBERTURA.

4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências

4.1 - SOBRE A INFORMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA DE CLIMATIZAÇÃO, VAMOS VERIFICAR O QUE PODE SER FEITO COMO SOLUÇÃO E INFORMAR. PARA SURTIR SOLUÇÕES DE MELHOR ADAPTAÇÃO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	228
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	504		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	31/08/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 30/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
10 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
01 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Isolamento dos dutos de ar condicionado do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Chapisco e reboco do platibanda.
- Forma e concreto dos pilaretes da platibanda.
- Demolição de alvenaria das vergas das portas do térreo.
- Verga das portas do Térreo
- Escavação da viga do gradil

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 31/08/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
11 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;

02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Reparos de rebocos soltos em pilares do 1º pavimento.
- Isolamento dos dutos de ar condicionado do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Chapisco e reboco do platibanda.
- Forma e armação da viga de amarração da platibanda.
- Demolição de alvenaria das vergas das portas do térreo.
- Verga das portas do Térreo
- Escavação da viga do gradil
- Pontos de ancoragem sobre a laje do auditório.
- Alvenaria do Shaft do Incêndio do Térreo.

4 - Ocorrências: A bota do funcionário mencionado pelo fiscal, foi substituída ainda pela manhã.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:31/08/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.2 FIAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTOR MECÂNICO 3º PAVIMENTO
3.3 FIXAÇÃO/SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.4 REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.5 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.6 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA;
3.7 EMASSAMENTO E LIXAMENTO
3.8 ISOLAMENTO/ENVELOPAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO E CONFECÇÃO DE DUTOS;
3.9 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.10 EXECUÇÃO DE VERGA;
3.11 ARMADURA DA VIGA DO PLATIBANDA DA COBERTURA;
3.12 CONCRETAGEM DA VIGA INVERTIDA DO HALL DO 2º PAVIMENTO;
3.13 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DA VIGA DO GLADIL.

4.0 - OCORRÊNCIAS:

4.1 - FUNCIONÁRIO ESTAVA NAS DEPENDÊNCIAS DA OBRA, ACOMPANHANDO O SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM DEVIDO EPI, BOTA. ELE FOI ORIENTADO A SAIR DA ÁREA E IR PRA A ÁREA TÉCNICA DE SEGURANÇA DE TRABALHO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	229
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	503		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	01/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 01/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoхарife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
11 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Reparos de rebocos soltos em pilares do 1º pavimento.
- Isolamento dos dutos de ar condicionado do 3º pavimento.
- Alvenaria do Platibanda da cobertura da Área técnica.
- Chapisco e reboco do platibanda.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Demolição de alvenaria das vergas das portas do térreo.
- Verga das portas do Térreo
- Escavação da viga do gradil
- Pontos de ancoragem sobre a laje do auditório.
- Alvenaria do Shaft do Incêndio do Térreo.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:01/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.2 FIXAÇÃO/SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.3 REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.5 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA;
3.6 EMASSAMENTO E LIXAMENTO
3.7 ISOLAMENTO/ENVELOPAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO E CONFEÇÃO DE DUTOS;
3.8 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.9 EXECUÇÃO DE VERGA;
3.10 ARMADURA DA VIGA DO PLATIBANDA DA COBERTURA;

4.0 - OCORRÊNCIAS:

4.1 REFAZER O SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR. ESPERAMOS UM PRAZO DA CONRATADA, VISTO QUE FOI INFORMADO QUE O IMPERMEABILIZADOR CHEGARIA SEGUNDA-FEIRA, 04/09/2023, ACREDITAMOS QUE O MESMO JÁ INICIARIA OS SERVIÇOS.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	230
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	502		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	02/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	231
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	501		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	03/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	232
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	500		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	04/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 04/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoхарife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
11 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Reparos de rebocos soltos em pilares do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria
- Pontos de ancoragem do pórtico.
- Chapisco e reboco do Shaft do Incêndio do Térreo.
- Assentamento de Porcelanato de parede da Copa.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:04/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.2 FIXAÇÃO/SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.3 REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.5 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA;
3.6 EMASSAMENTO E LIXAMENTO
3.7 ISOLAMENTO/ENVELOPAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO E CONFECÇÃO DE DUTOS;
3.8 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.9 EXECUÇÃO DE VERGA;
3.10 ARMADURA DA VIGA DO PLATIBANDA DA COBERTURA;
3.11 REVESTIMENTO COM PORCELANATO DO PISO DA COPA

4.0 - OCORRÊNCIAS:

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	233
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	499		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	05/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 05/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
09 - Pedreiro;
11 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Reparos de rebocos soltos em pilares do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria
- Pontos de ancoragem do pórtico.
- Chapisco e reboco do Shaft do Incêndio do Térreo.
- Assentamento de Porcelanato de parede da Copa e San 03.
- Montagem da estrutura metálica do pavimento técnico.
- Contrapiso da calha da cobertura do pavimento técnico.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:05/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.2 FIXAÇÃO/SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.3 REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.5 ALVENARIA DO PLATIBANDA DA COBERTA;
3.6 EMASSAMENTO E LIXAMENTO
3.7 ISOLAMENTO/ENVELOPAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO E CONFEÇÃO DE DUTOS;
3.8 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.9 EXECUÇÃO DE VERGA;
3.10 ARMADURA DA VIGA DO PLATIBANDA DA COBERTURA;
3.11 REVESTIMENTO COM PORCELANATO DO PISO DA COPA;
3.12 INÍCIO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO PLATIBANDA NO COROAMENTO DA COBERTURA

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	234
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	498		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	06/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 06/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
09 - Pedreiro;
11 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Reparos de rebocos soltos em pilares do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria
- Pontos de ancoragem do pórtico.
- Chapisco e reboco do Shaft do Incêndio do Térreo.
- Assentamento de Porcelanato de parede da Copa e San 03.
- Montagem da estrutura metálica do pavimento técnico.
- Contrapiso da calha da cobertura do pavimento técnico.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:06/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.2 FIXAÇÃO/SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.3 REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.5 EMASSAMENTO E LIXAMENTO
3.6 ISOLAMENTO/ENVELOPAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO E CONFECÇÃO DE DUTOS;
3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.8 EXECUÇÃO DE VERGA;
3.9 ARMADURA DA VIGA DO PLATIBANDA DA COBERTURA;
3.10 REVESTIMENTO COM PORCELANATO DO PISO DA COPA E SANs PCD;
3.11 ESTRUTURAS METÁLICAS DO PLATIBANDA NO COROAMENTO DA COBERTURA;
3.12 CABEAMENTO DAS TOMADAS DE PISO;
3.13 CONCRETAGEM DAS VIGAS DA COBERTURA.

4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	235
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	497		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	07/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 07/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo;
04 - Carpinteiro;
09 - Pedreiro;
11 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Passagens de cabeamento do eletrocalhas de piso - 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Contrapiso para regularização de calha.
- Chapisco e reboco do Shaft do Incêndio do Térreo.
- Assentamento de Porcelanato de parede da Copa e San 03.
- Montagem da estrutura metálica do pavimento técnico e colocação de telhas.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	236
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	496		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	08/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 08/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
02 - Carpinteiro;
05 - Pedreiro;
10 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Passagens de cabeamento do eletrocalhas de piso - 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Contrapiso para regularização de calha.
- Assentamento de revestimento cerâmico de parede do San 04.
- Montagem da estrutura metálica do pavimento técnico e colocação de telhas.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ/TARDE. DATA:08/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.2 FIXAÇÃO/SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.3 REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.5 EMASSAMENTO E LIXAMENTO
3.6 ISOLAMENTO/ENVELOPAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO E CONFECÇÃO DE DUTOS;
3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.8 EXECUÇÃO DE VERGA;
3.9 ARMADURA DA VIGA DO PLATIBANDA DA COBERTURA;
3.10 REVESTIMENTO COM PORCELANATO DO PISO DA COPA E SANs PCD;
3.11 ESTRUTURAS METÁLICAS DO PLATIBANDA NO COROAMENTO DA COBERTURA;
3.12 CABEAMENTO DAS TOMADAS DE PISO;
3.13 CONCRETAGEM DAS VIGAS DA COBERTURA.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	237
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	495		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	09/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	238
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	494		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	10/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	239
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	493		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	11/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 09/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
02 - Carpinteiro;
05 - Pedreiro;
08 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Passagens de cabeamento do eletrocalhas de piso - 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Contrapiso para regularização de calha.
- Assentamento de revestimento cerâmico de parede do San 04.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 11/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã: Chuva forte e tarde: Tempo nublado com chuva

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
10 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;

01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Passagens de cabeamento do eletrocalhas de piso - 3º pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Contrapiso para regularização de calha.
- Assentamento de revestimento cerâmico de parede do San 04.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - PANCADAS DE CHUVA MANHÃ/ SOL PELA TARDE. DATA:11/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.2 FIXAÇÃO/SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA DO TÉRREO;
3.3 REPARO DE REBOCO EXISTENTE;
3.4 REBOCO NA ÁREA TÉCNICA DA COBERTURA;
3.5 EMASSAMENTO E LIXAMENTO
3.6 ISOLAMENTO/ENVELOPAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO E CONFECÇÃO DE DUTOS;
3.7 INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE;
3.8 EXECUÇÃO DE VERGA;
3.9 ARMADURA DA VIGA DO PLATIBANDA DA COBERTURA;
3.10 REVESTIMENTO COM PORCELANATO DO PISO DA COPA E SANs PCD;
3.11 ESTRUTURAS METÁLICAS DO PLATIBANDA NO COROAMENTO DA COBERTURA;
3.12 CABEAMENTO DAS TOMADAS DE PISO;
3.13 CONCRETAGEM DAS VIGAS DA COBERTURA.

4.0 - OCORRÊNCIAS:

4.1 FORTES PANCADAS DE CHUVA PELA MANHÃ PARANDO OS SERVIÇOS DA COBERTURA PELA MANHÃ

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	240
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	492		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	12/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 11/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã: Tempo nublado e tarde: Tempo nublado com pancadas de chuvas no final da tarde

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
10 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Passagens de cabeamento do eletrocalhas de piso - 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Contrapiso para regularização de calha.
- Assentamento de revestimento cerâmico de parede do San 04.

4 - Ocorrências: Visita da equipe da SEA para verificação do andamento da obra, avaliação dos projetos de climatização passagens de dutos (auditório e área técnica), estudo para o encaminhamento da tubulação de agua gelada na área externa e entre forro no térreo, passagens de tubulações de agua geladas dentro dos shafts não existentes dentro das áreas técnicas, espaço físico da casa de maquina para colocação do Chiller.

Necessidade de aditivo para execução da viga do gradil, muro lateral e contenção da calçada na lateral do prédio.

- Foi colocada lona plásticas reforçada para proteção do rufos da pele de vidro e evitar a passagem de agua de chuvas e permitir o andamentos de serviços internos como cabeamentos de dados, pintura e etc, porém com a forte chuva e a forte ventania no período da tarde a lona se rasgou em seu total comprimento.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	241
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	491		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	13/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 13/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
10 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Passagens de cabeamento do eletrocalhas de piso - 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Contrapiso para regularização de calha.
- Assentamento de revestimento cerâmico de parede do San 04.
- Impermeabilização de calha da cobertura do pavimento técnico.

4 - Ocorrências: Visita da equipe da SEA na obra.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - PANCADAS DE CHUVA PELA MANHÃ/ SOL PELA TARDE. DATA:12/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO.
3.2PASSAGENS DE CABEAMENTO DO ELETROCALHAS DE PISO - 3º PAVIMENTO. CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.
3.3APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO 1º PAVIMENTO.
3.4MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.5FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA.
3.6CHAPISCO E REBOCO DE ALVENARIA DO PLATIBANDA.
3.7CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DE CALHA.
3.8ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE DO SAN 04.

4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:13/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONCRETAGEM DAS ESTACAS DA VIGA DO GRADIL

3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO.

3.3 PASSAGENS DE CABEAMENTO DO ELETROCALHAS DE PISO - 3º PAVIMENTO. CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.

3.4 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO 1º PAVIMENTO.

3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.

3.6 FÔRMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA.

3.7 CHAPISCO E REBOCO DE ALVENARIA DO PLATIBANDA.

3.8 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DE CALHA.

3.9 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE DO SAN 04.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	242
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	490		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	14/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 14/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
04 - Carpinteiro;
07 - Pedreiro;
10 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Passagens de cabeamento do eletrocalhas de piso - 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Contrapiso para regularização de calha.
- Assentamento de revestimento cerâmico de parede do San 04.
- Impermeabilização de calha da cobertura do pavimento técnico.

4 - Ocorrências: Visita da equipe da SEA na obra.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:14/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORA DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 CONCRETAGEM DAS ESTACAS DA VIGA DO GRADIL
3.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO.
3.3 PASSAGENS DE CABEAMENTO DO ELETROCALHAS DE PISO - 3º PAVIMENTO. CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.
3.4 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO 1º PAVIMENTO.
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.6 FÔRMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA.
3.7 CHAPISCO E REBOCO DE ALVENARIA DO PLATIBANDA.
3.8 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DE CALHA.
3.9 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE DO SAN 04.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	243
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	489		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	15/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 15/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
04 - Carpinteiro;
06 - Pedreiro;
11 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do 1º pavimento.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Contrapiso para regularização de calha.
- Assentamento de revestimento cerâmico de parede do San 04 e San 05.
- Impermeabilização de calha da cobertura do pavimento técnico.
- Forma e concretagem da viga do gradil.
- Instalação de divisórias.
- Proteção mecânica da calha.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	244
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	488		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	16/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	245
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	487		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	17/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	246
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	486		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	18/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 16/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheira Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
02 - Carpinteiro;
06 - Pedreiro;
09 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Assentamento de revestimento cerâmico de parede do San 04 e San 05.
- Impermeabilização de calha da cobertura do pavimento técnico.
- Forma e concretagem da viga do gradil.
- Instalação de divisórias.
- Proteção mecânica da calha.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 18/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo
04 - Carpinteiro;
08 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;

02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03.
- Impermeabilização de calha da cobertura do pavimento técnico.
- Forma e concretagem da viga do gradil.
- Instalação de divisórias dos San04 e San 05 do 3º Pavimento.
- Proteção mecânica da calha.

4 - Ocorrências: Autorizado a alteração de largura da divisória do mictório de 70cm para 40cm.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:14/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO.
3.2 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.
3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO 1º PAVIMENTO.
3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.5 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA.
3.6 CHAPISCO E RÊBOCO DE ALVENARIA DO PLATIBANDA.
3.7 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DE CALHA.
3.8 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE E DIVISÓRIA DE GRANITO DO SAN 04 E SAN 05.
3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.
3.10 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
3.11 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.
3.12 PROTEÇÃO MECÂNICA DA CALHA.

4.0 - OCORRÊNCIAS:

4.1 MODIFICAÇÃO DA PEDRA DIVISÓRIA DO MICTÓRIO, DE 70CM PARA 40CM

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	247
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	485		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	19/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 19/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo
04 - Carpinteiro;
08 - Pedreiro;
12 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Confeção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03.
- Impermeabilização de calha da cobertura do pavimento técnico.
- Forma e concretagem da viga do gradil.
- Instalação de divisórias dos San04 e San 05 do 3º Pavimento.
- Proteção mecânica da calha.
- Limpeza do terreno, demolição de piso de concreto e regularização da área externa.
- Serviço de bota-fora decorrentes da demolições de piso, remoção de camada vegetal do terreno com uso de caçamba e pá carregadeira.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:19/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO.
3.2 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.
3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO 1º PAVIMENTO.
3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.5 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA.
3.6 CHAPISCO E RÉBOCO DE ALVENARIA DO PLATIBANDA.
3.7 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DE CALHA.
3.8 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03.
3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.
3.10 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
3.11 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.
3.12 PROTEÇÃO MECÂNICA DA CALHA.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	248
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	484		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	20/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:20/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO.
3.2 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.
3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO 1º PAVIMENTO.
3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.5 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA.
3.6 CHAPISCO E RÉBOCO DE ALVENARIA DO PLATIBANDA.
3.7 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DE CALHA.
3.8 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03.
3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.
3.10 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
3.11 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.
3.12 PROTEÇÃO MECÂNICA DA CALHA;
3.13 LIMPEZA DO TERRENO, DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO E REGULARIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA.
3.14 SERVIÇO DE BOTA-FORA DECORRENTES DA DEMOLIÇÕES DE PISO, REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DO TERRENO COM USO DE CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA.

4.0 - Ocorrências: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

