



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA**

TERMO DE RECEBIMENTO DE PARCELA DE OBRA

Assunto: 04.435 | Administração - Controle de pagamentos | CNMP 930028

PGEA nº: 1.32.000.000037/2023-73

1. Com fundamento no art. 73 da [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada](#), no art. 140 da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), no art. 12, VIII, da [Portaria SG/MPF nº 174, de 20 de março de 2019](#), e no art. 40, § 2º, da [Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, alterada](#), **atesto o recebimento** do objeto da fatura / nota fiscal indicada a seguir, em razão das informações e documentos indicados neste quadro:

Contrato nº:	05/2022 - PRRR/MPF		
Contratado(a):	J NASSER ENGENHARIA LTDA		
CNPJ / CPF:	04.618.096/0001-07		
Fatura / nota fiscal (NF) nº:	355 e 356	Etiqueta:	PR-RR-00026217/2023
Objeto da fatura / NF:	8ª parcela da obra de construção da nova sede do Ministério Público Federal em Boa Vista - RR, referente ao período de 16/08/2023 a 20/09/2023, e correspondente parcela de reajuste anual de preços.		
Valor total nas faturas / NF:	R\$ 665.242,28 + R\$ 35.923,08 = R\$ 701.165,36	Mês de competência	09/2023
Boletim de medição (fiscalização técnica)	DESPACHO 946/2023 SECGC/PRRR - PR-RR-00026025/2023		
Ficha de avaliação documental (fiscalização administrativa)	RELATÓRIO DE ANÁLISE SECGC/PRRR - PR-RR-00026618/2023		

Glosas: (x) não () sim, detalhadas no quadro à direita	Item	Indicador	Incidência	Quant.	Pontuação
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	Somatório da pontuação:				-
	Percentual de desconto aplicado na nota fiscal (%)*:				-
	Valor do desconto (R\$):				-
* conforme o tópico 4.6 do Instrumento de Medição do Resultado (IMR) anexo ao termo do contrato em referência.					
Ressalvas: () sem ressalvas (x) com ressalvas, descritas à direita	Detalhamento das ressalvas (se houver): Constatou-se que um trabalhador da obra se encontra afastado do serviço, sem documentação hábil de tal afastamento. Será emitido ofício à contratada, para complemento documental ou justificativas.				
Anexos deste termo (íntegra complementar), se marcados:	(x) Planilha comparativa da medição com o cronograma de referência (x) Planilha e gráficos de análise do valor agregado (x) Declaração quanto à regularidade do fornecedor, emitida pelo Sicaf				
Observações	1. Foi considerado neste atesto o cronograma físico-financeiro estabelecido no 2º aditivo ao contrato em referência (documento PR-RR-00019925/2023). 2. Resta pendente apreciar um pedido de reavaliação de glosa aplicada com base no IMR sobre o valor da fatura referente à 4ª medição da obra (CARTA J NASSER ENGENHARIA LTDA - PR-RR-00015478/2023 , de 12/05/2023). 3. Em 21/08/2023, a contratada apresentou sua CARTA 26/2023 (...) J NASSER ENGENHARIA LTDA - PR-RR-00022557/2023 , reiterando relato de achados que interferem no andamento da obra e correspondente pedido de providências a cargo do ente contratante. 4. A oitava parcela da obra se mostra 79,84% adiantada em relação ao cronograma físico-financeiro vigente. 5. Da análise do valor agregado (planilha anexa), evidencia-se que: • a execução financeira da obra se encontra adiantada em R\$ 1.137.564,29 em relação ao cronograma				

	físico-financeiro vigente (conforme o total da coluna do indicador de variação de prazo); • as medidas atuais dos indicadores de disponibilidade de recursos (IDR-1 e IDR-2) levam a concluir que há necessidade de buscar/planejar novos recursos financeiros para garantir a continuidade da obra (faixa amarela).		
Ato de designação dos(as) fiscais e gestores(as) do contrato	Portaria SE/PRRR nº 2, de 9 de janeiro de 2023		
Valor total a liquidar (considerando eventuais glosas e descontos):	R\$ 701.165,36 (setecentos e um mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).		
Dados bancários:	Banco	Agência	Conta corrente
	104 (CEF)	4246	900612-9 operação: 003
Prazo para pagamento:	16/10/2023		

2. Isto posto, encaminho o feito à Coordenadoria de Administração (CA), a fim de dar prosseguimento ao trâmite do pagamento e/ou outras providências.

Boa Vista, 26 de setembro de 2023.

assinado digitalmente

SIDNEY WANDERLEY DE OLIVEIRA

Gestor do Contrato

Comparativo do executado com o cronograma - 8ª medição.xlsx

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS / PARCELA 08		
			PREVISTO NO CROGRAMA (2º ADITIVO)	EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO	SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (2º ADITIVO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.116,52	R\$ 761,16 1,00%	R\$ 1.404,97 1,85%	ADIANTADO
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 166.895,56	R\$ 1.140,39 0,68%	R\$ 1.058,89 0,63%	ATRASADO
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 372.192,17	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	EM DIA
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 387.887,79	R\$ 3.878,88 1,00%	R\$ 18.103,86 4,67%	ADIANTADO
5	ARQUITETURA	R\$ 10.883.731,21	R\$ 88.837,31 0,82%	R\$ 152.591,17 1,40%	ADIANTADO
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 459.919,12	R\$ 23.323,89 5,07%	R\$ 24.958,58 5,43%	ADIANTADO
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 944.990,20	R\$ 540,00 0,06%	R\$ 1.650,40 0,17%	ADIANTADO
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.193.101,20	R\$ 45.455,24 3,81%	R\$ 89.121,53 7,47%	ADIANTADO
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 5.365.186,69	R\$ 87.303,73 1,63%	R\$ 137.591,72 2,56%	ADIANTADO
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 1.087.133,12	R\$ 22.613,99 2,08%	R\$ - 0,00%	ATRASADO
11	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	R\$ 2.540.238,09	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	EM DIA
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.455.597,11	R\$ 62.430,86 1,40%	R\$ 178.089,40 4,00%	ADIANTADO
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 756.454,68	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	EM DIA
14	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234.157,38	R\$ 2.341,57 1,00%	R\$ 4.406,47 1,88%	ADIANTADO
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.672.342,00	R\$ 31.286,81 1,17%	R\$ 56.265,28 2,11%	ADIANTADO
TOTAL		R\$ 31.595.942,84	R\$ 369.913,83	R\$ 665.242,27	ADIANTADO
			1,17%	2,11%	
			DIFERENÇA RELATIVA:		+79,84%

Dados

Parcela	Data inicial	Data final	Valor planejado da parcela (R\$)	Valor planejado acumulado (R\$)	Valor agregado da parcela (R\$)	Valor agregado acumulado (R\$)	Reajuste da parcela (R\$)	Reajuste acumulado (R\$)	Valor de aditamento em análise (R\$)	Valor de aditamento no período (R\$)	Valor de aditamentos acumulado (R\$)	Valor total aditado da obra <u>sem</u> reajuste (R\$)
			(V _p ')	(V _p '')	(V _A ')	(V _A '')	(R')	(R'')	(A'?)	(A')	(A'')	(T _A)
-	29/12/2022	15/01/2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.595.942,84
1ª	16/01/2023	16/02/2023	65.957,32	65.957,32	65.957,32	65.957,32		-			-	31.595.942,84
2ª	17/02/2023	16/03/2023	92.800,08	158.757,40	117.811,94	183.769,26		-			-	31.595.942,84
3ª	17/03/2023	16/04/2023	238.045,57	396.802,97	238.045,57	421.814,83		-			-	31.595.942,84
4ª	17/04/2023	16/05/2023	207.828,93	604.631,90	207.828,93	629.643,76		-			-	31.595.942,84
5ª	17/05/2023	16/06/2023	408.692,13	1.013.324,03	408.692,13	1.038.335,89	15.179,53	15.179,53			-	31.595.942,84
6ª	17/06/2023	16/07/2023	245.345,23	1.258.669,26	395.621,29	1.433.957,18	21.208,09	36.387,62			-	31.595.942,84
7ª	17/07/2023	16/08/2023	298.802,30	1.557.471,56	406.964,62	1.840.921,80	21.685,56	58.073,18	103.438,68		-	31.595.942,84
8ª	17/08/2023	16/09/2023	369.913,83	1.927.385,39	665.242,28	2.506.164,08	35.923,08	93.996,26			-	31.595.942,84
9ª	17/09/2023	16/10/2023	578.053,14	2.505.438,53				93.996,26			-	31.595.942,84
10ª	17/10/2023	16/11/2023	902.485,90	3.407.924,43							-	
11ª	17/11/2023	16/12/2023	1.357.680,80	4.765.605,23							-	
12ª	17/12/2023	16/01/2024	1.359.455,67	6.125.060,90							-	
13ª	17/01/2024	16/02/2024	1.547.552,49	7.672.613,39							-	
14ª	17/02/2024	16/03/2024	1.560.881,34	9.233.494,73							-	
15ª	17/03/2024	16/04/2024	1.657.724,90	10.891.219,63							-	
16ª	17/04/2024	16/05/2024	1.565.613,33	12.456.832,96							-	
17ª	17/05/2024	16/06/2024	2.115.028,08	14.571.861,04							-	
18ª	17/06/2024	16/07/2024	1.576.510,58	16.148.371,62							-	
19ª	17/07/2024	16/08/2024	2.274.345,83	18.422.717,45							-	
20ª	17/08/2024	16/09/2024	2.481.859,82	20.904.577,27							-	
21ª	17/09/2024	16/10/2024	2.837.463,51	23.742.040,78							-	
22ª	17/10/2024	16/11/2024	3.145.793,01	26.887.833,79							-	
23ª	17/11/2024	16/12/2024	3.067.140,47	29.954.974,26							-	
24ª	17/12/2024	16/01/2025	1.640.968,58	31.595.942,84							-	

Dados


Parcela	Data inicial	Data final	Valor total aditado da obra com reajuste (R\$)	Valor empenhado no período (R\$)	Valor liquidado no período (R\$)	Saldo de empenho (R\$)	Valor empenhado acumulado (R\$)	Valor liquidado acumulado (R\$)	Valor medido reajustado (R\$)
			(T _R)	(E')	(L')	(S)	(E'')	(L'')	(V _R) = Σ(V _A ' + R')
-	29/12/2022	15/01/2023	31.595.942,84	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	-
1ª	16/01/2023	16/02/2023	31.595.942,84	-	-	500.000,00	500.000,00	-	65.957,32
2ª	17/02/2023	16/03/2023	31.595.942,84	-	65.957,32	434.042,68	500.000,00	65.957,32	183.769,26
3ª	17/03/2023	16/04/2023	31.595.942,84	-	92.800,08	341.242,60	500.000,00	158.757,40	421.814,83
4ª	17/04/2023	16/05/2023	31.595.942,84	370.000,00	238.045,57	473.197,03	870.000,00	396.802,97	629.643,76
5ª	17/05/2023	16/06/2023	31.611.122,37	550.000,00	205.750,64	817.446,39	1.420.000,00	602.553,61	1.053.515,42
6ª	17/06/2023	16/07/2023	31.632.330,46	-	408.692,13	408.754,26	1.420.000,00	1.011.245,74	1.470.344,80
7ª	17/07/2023	16/08/2023	31.654.016,02	1.100.000,00	395.621,29	1.113.132,97	2.520.000,00	1.406.867,03	1.898.994,98
8ª	17/08/2023	16/09/2023	31.689.939,10	-	465.037,80	648.095,17	2.520.000,00	1.871.904,83	2.600.160,34
9ª	17/09/2023	16/10/2023	31.689.939,10	1.250.000,00	701.165,36	1.196.929,81	3.770.000,00	2.573.070,19	
10ª	17/10/2023	16/11/2023							
11ª	17/11/2023	16/12/2023							
12ª	17/12/2023	16/01/2024							
13ª	17/01/2024	16/02/2024							
14ª	17/02/2024	16/03/2024							
15ª	17/03/2024	16/04/2024							
16ª	17/04/2024	16/05/2024							
17ª	17/05/2024	16/06/2024							
18ª	17/06/2024	16/07/2024							
19ª	17/07/2024	16/08/2024							
20ª	17/08/2024	16/09/2024							
21ª	17/09/2024	16/10/2024							
22ª	17/10/2024	16/11/2024							
23ª	17/11/2024	16/12/2024							
24ª	17/12/2024	16/01/2025							

Indicadores

Parcela	Data inicial	Data final	Variação de prazo (R\$)	Índice de performance de prazo	Avaliação do andamento	Percentual físico medido (andamento da obra)	Percentual financeiro executado	Indicador de disponibilidade de recursos (1)	Indicador de disponibilidade de recursos (2)
			$(\Delta_p) = V_A'' - V_P''$	$(I_p) = V_A'' / V_P''$		$(P_{FM}) = V_A'' / T_A$	$(P_{\$E}) = L'' / T_R$	$(IDR-1) = E'' / T_R$	$(IDR-2) = L'' / E''$
-	29/12/2022	15/01/2023	-	-		-	-	-	-
1ª	16/01/2023	16/02/2023	-	1,00	EM DIA	0,21%	0,00%	1,58%	0,00%
2ª	17/02/2023	16/03/2023	25.011,86	1,16	ADIANTADO	0,58%	0,21%	1,58%	13,19%
3ª	17/03/2023	16/04/2023	25.011,86	1,06	ADIANTADO	1,34%	0,50%	1,58%	31,75%
4ª	17/04/2023	16/05/2023	25.011,86	1,04	ADIANTADO	1,99%	1,26%	2,75%	45,61%
5ª	17/05/2023	16/06/2023	25.011,86	1,02	ADIANTADO	3,29%	1,91%	4,49%	42,43%
6ª	17/06/2023	16/07/2023	175.287,92	1,14	ADIANTADO	4,54%	3,20%	4,49%	71,21%
7ª	17/07/2023	16/08/2023	283.450,24	1,18	ADIANTADO	5,83%	4,44%	7,96%	55,83%
8ª	17/08/2023	16/09/2023	578.778,69	1,30	ADIANTADO	7,93%	5,91%	7,95%	74,28%
9ª	17/09/2023	16/10/2023					8,12%	11,90%	68,25%
10ª	17/10/2023	16/11/2023							
11ª	17/11/2023	16/12/2023							
12ª	17/12/2023	16/01/2024							
13ª	17/01/2024	16/02/2024							
14ª	17/02/2024	16/03/2024							
15ª	17/03/2024	16/04/2024							
16ª	17/04/2024	16/05/2024							
17ª	17/05/2024	16/06/2024							
18ª	17/06/2024	16/07/2024							
19ª	17/07/2024	16/08/2024							
20ª	17/08/2024	16/09/2024							
21ª	17/09/2024	16/10/2024							
22ª	17/10/2024	16/11/2024							
23ª	17/11/2024	16/12/2024							
24ª	17/12/2024	16/01/2025							

Construção da nova sede do MPF/RR

Análise do valor agregado

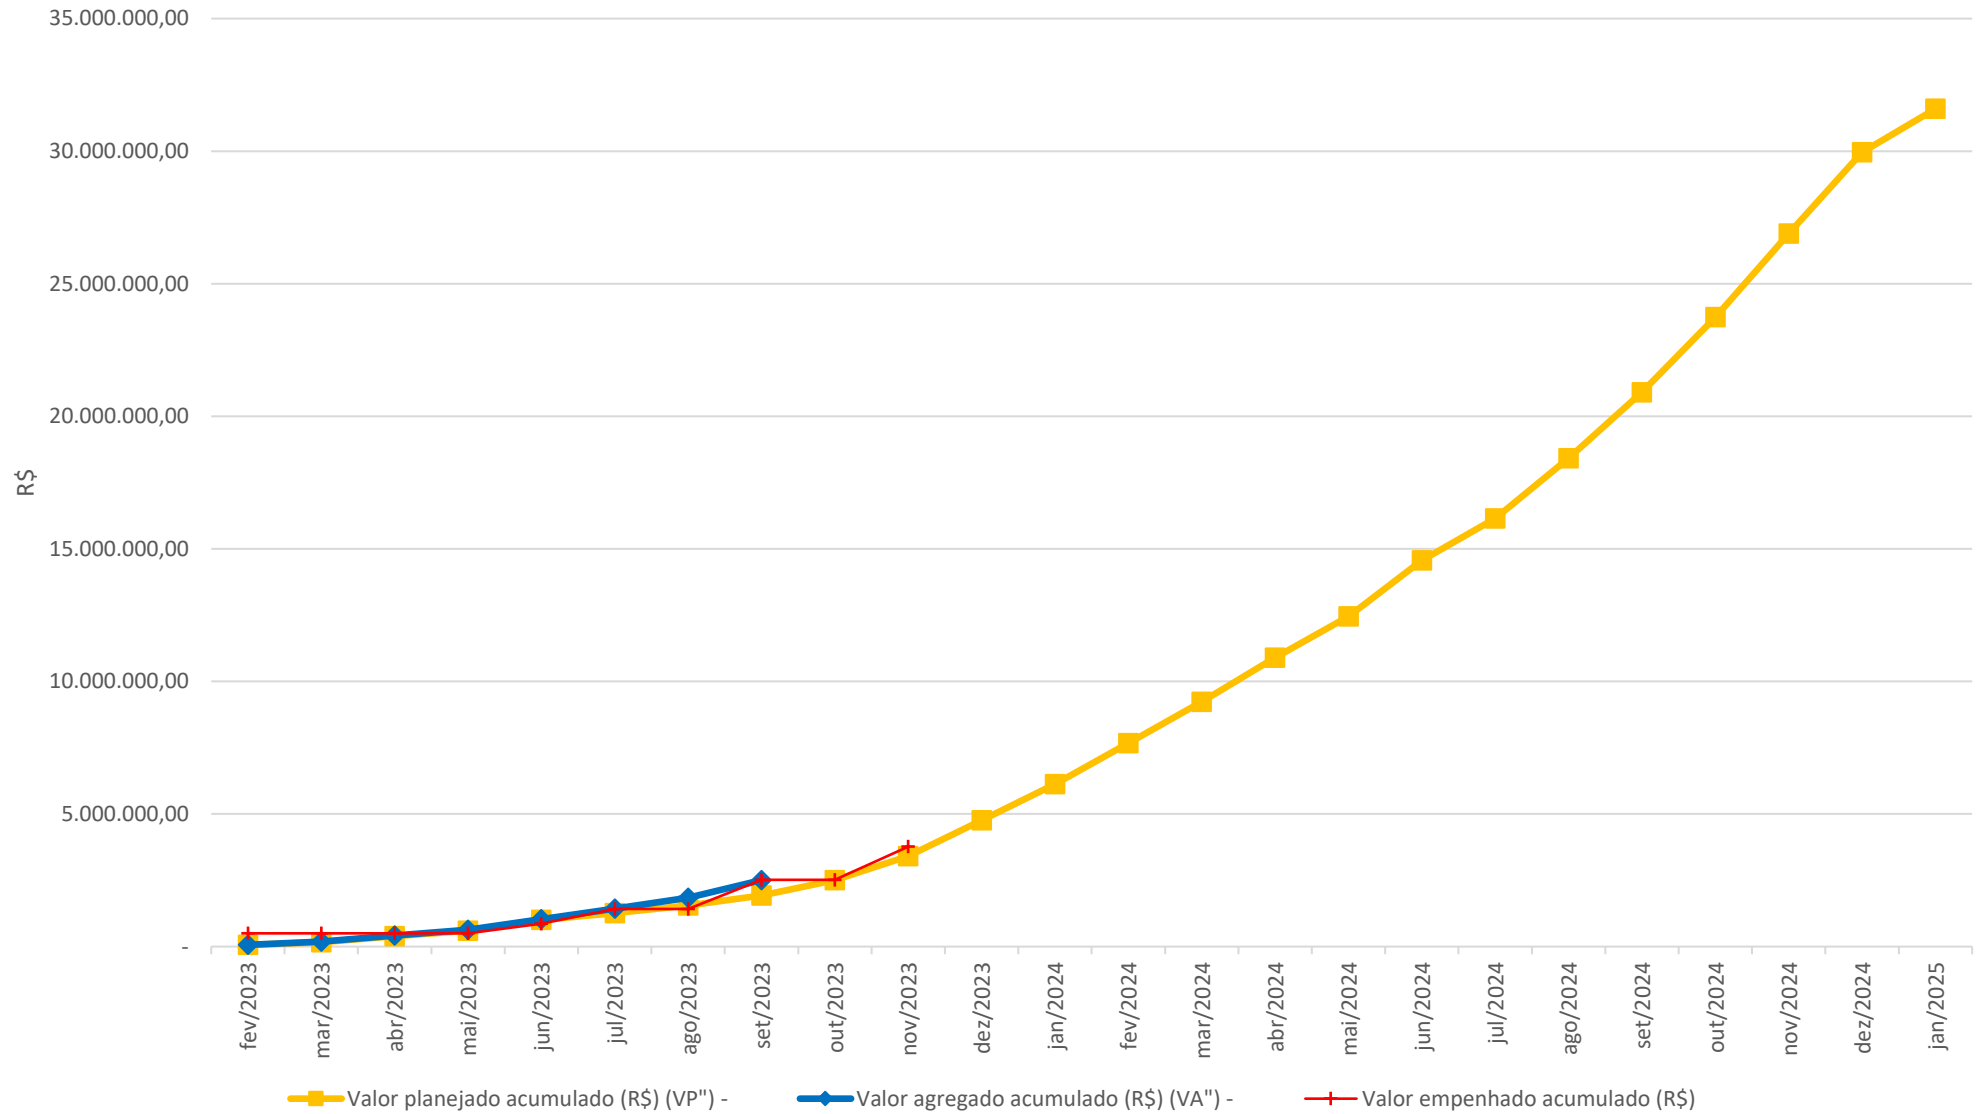



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.618.096/0001-07 DUNS®: 899863955
Razão Social: J NASSER ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: J NASSER ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/10/2023
FGTS	Validade:	11/10/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/03/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/10/2023
Receita Municipal	Validade:	01/10/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024
