

PR-RR-00029157/2023



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 9ª MEDIÇÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 09/2023		
INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA:		16 de janeiro de 2023
PERÍODO DO RELATÓRIO		De 20 de setembro a 20 de outubro de 2023
SERVIÇOS PREVISTOS PARA NONA MEDIÇÃO		Instalação de infraestrutura elétrica, combate à incêndio, sistema de climatização, execução de alvenaria chapisco, emboço e emassamento, cabeamento, base do muro, viga do gradil, revestimento cerâmico, divisórias dos sanitários, caixas de drenagem,
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF		
Nome:	Engenheiro Marcos Eduardo Silva Madureira	
Telefone:	(95) 3198-2005	
E-mail:	marcoseduardo@mpf.mp.br	
1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)		
Nome:	Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira	
Portaria:	SE/PR-RR nº02/2023	
Telefone:	(95) 3198-2025 / 2073	
E-mail:	prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br	
2.0 - ESCOPO E LOCAL		
DADOS DO CONTRATO:	Nº Contrato: 05/2022	PPA/LOA: AÇÃO 110E
Empresa Contratada	J. NASSER ENGNHARIA LTDA	CNPJ 04.618.096/0001-07

Matrícula CEI da Obra	51.235.89823/71			
Valor Atual do Contrato	R\$31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)			
Percentual de reajuste	6,0%			
Saldo de Empenho	5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022			
Local/UF	Boa Vista – RR			
Responsável Técnico	José Nasser – ART de Execução: RR20230111507			
Corresponsável Técnico	Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835			
Nota Fiscal Eletrônica de Referência	R\$ 671.813,53 (seiscentos e setenta e um mil oitocentos e treze reais e cinquenta e três centavos)			
Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste	R\$ 36.277,93 (trinta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.			
DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA				
Medição nº	% Previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
3	1,16%	0,75%	1,40%	1,25%
4	0,88%	0,66%	1,93%	1,91%
5	1,64%	1,29%	3,57%	3,21%
6	1,94%	1,25%	5,51%	4,46%
7	0,95%	1,29%	4,93%	5,75%
8	1,17%	2,11%	6,10%	7,85%
9	1,83%	2,13%	7,93%	9,98%
TOTAL EXECUTADO				9,98%
TOTAL A EXECUTAR				90,02%
Identificação do processo de fiscalização		1.32.000.000464/2022-71		
Tipo de obra		Prédio Público		
Objeto da fiscalização		Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima		
Período abrangido pela fiscalização		20/09/2023 a 20/10/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)		
3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO				
Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a serviço de alvenaria/chapisco/emboço, colocação de granito (peitoril), instalações hidrossanitários,				

instalação de incêndio, sistema de climatização (envelopamento), instalações de infra de elétrica como interruptor e tomada baixa ou alta, fiação de iluminação e tomada/interruptor, pontos de ancoragem, aplicação de selador e massa latéx em paredes, estrutura metálica da cobertura, escavação e concretagem da viga do gradil, revestimento de piso e parede com cerâmica, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados). Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: IMPERMEABILIZAÇÃO;

Constatação do Período nº 2: Em resposta à carta 34/2023, a mudança de data do fechamento da mediação, do dia 16/10/2023 a 19/10/2023, não prejudica o andamento da obra, e pela fiscalização pode fechar até o dia 20/10/2023. Visto que estão faltando alguns materiais devido ao não fornecimento destes na data esperada, o que pode ocasionar atrasos. Por conta disso, fica recomendado à empresa um melhor planejamento em função do cronograma e da logística, fazendo os pedidos dos materiais com antecedência.

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

A) Elaboração de projeto de reforma e layout, para atender as novas necessidades da sede, dos órgãos que vão dividir o espaço da edificação, como o MPM e MPT, reorganizar salas que estariam em desuso nos pavimento térreo, 1º pavimento, 2º pavimento e 3º pavimento, além de serem adaptadas salas para ficarem disoníveis para futuras instalações.

B) Elaboração do projeto do muro de conteção da lateral esquerda e dos fundos da edificação, para criar mais rotas de acesso ao auditório.

C) Em resposta à carta 32/2023, especificação do PISO ELEVADO que será utilizado, foi analisado a especificação do piso que a empresa apresentou, estando de acordo tanto com a planilha orçamentária quanto caderno de especificação.

D) Elaboração do projeto de shaft da climatização do auditório.

6.0 – CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.

7.0 – ANEXOS

A) 13.0 Relatório fotográfico do período

8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 20 de outubro de 2023

9.0 - FÉ DO MEMBRO DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO

CONTRATO Nº 05/2022	
Declaramos que as metas estabelecidas na 8ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas.	
_____ Marcos Eduardo Silva Madureira Engenheiro Civil/Membro da Comissão	
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	
10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL	
() Não foram identificados vícios. () Ver Nota Técnica ou Despacho constante da _____ folha _____ de n.º. _____	_____ Igor José Barbosa Duarte Lopes Secretário Estadual
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 9ª MEDIÇÃO

11.0 - A NONA MEDIÇÃO FOI EFETUADA PELO FISCAL DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, MATRÍCULA 31143, NO DIA 20/10/2023

11.1 - Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma (%)	Percentual executado <i>in loco</i> (%)	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E PROTEÇÃO	82,90%	84,45%		X
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,36%	4,54%		X
ESTRUTURAS DE CONCRETO				
GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS	12,35%	26,64%		X
ARQUITETURA				
VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS,	6,43%	7,67%		X

ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS				
IMPERMEABILIZAÇÃO				
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	49,35%	48,47%	X	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				
ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO	1,61%	3,47%		X
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E SPRINKLERS	23,72%	24,53%		X
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				
SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO	10,68%	12,34%		X
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV,	5,24%	10,15%		X
CLIMATIZAÇÃO				
ÁGUA GELADA, VRF, SPLIT, VENTILAÇÃO MECÂNICA-, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS, LIGACÕES E DUTOS DE AR	4,91%	9,76%		X
SERVIÇOS GERAIS				
TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO	43,20%	46,55%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				
INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA	7,93%	9,98%		X

12.0 SEGUE ABAIXO A PLANILHA CONTENDO O RESUMO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E PACTUADOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

Item	Descrição	Unid.	MEDICÃO	QUANTITATIVOS		Saldo	Unitário com BDI [R\$]	EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS		
			ACUMULADA	%	Finais para avaliação			Mês 9		
								Medição Unitária	% executado	Valor com BDI
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						0			
1.3.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M3	17,02%	4136,66	3.432,43	1,82	704,23	17,02%	1.281,69	
1.4	PROTEÇÃO						0			
1.4.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA PROTEÇÕES - ROLO DE 4X100M - 80 MICRAS	M2	41,82%	3200,00	1.861,88	3,00	140,46	4,39%	421,38	
Subtotais			84,45%			0,00			1.703,07	
2.	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS						0,00			
2.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0			
2.1.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2/MÉS	0,45%	11.160,00	11.109,60	5,15	50,40	0,45%	259,56	
2.1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	M/MÉS	54,18%	640,00	293,28	15,49	68,36	10,68%	1.058,89	
Subtotais			4,54%						1.318,45	
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1	LIMPEZA DO TERRENO						0,00			
3.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	81,06%	12.921,00	2.447,85	0,21	10.473,15	81,06%	2.199,36	
3.2	ESCAVAÇÕES						0,00			
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M2	3,07%	500,00	484,64	3,94	15,36	3,07%	60,51	
3.3	ATERRO E REATERRO						0,00			
3.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	2,61%	4.836,20	4.710,20	75,46	126,00	2,61%	9.507,96	
Subtotais						0,00			11.767,83	
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO						0			
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO - GRADIL						0,00			
4.1.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_ 05/2020	M	84,09%	44,00	7,00	82,22	16,00	36,36%	1.315,52	
4.1.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. DE 3,4 ATÉ 6,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	100,00%	138,90	0,00	21,08	95,81	68,98%	2.019,67	
4.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,30 ATÉ 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	100,00%	261,40	0,00	19,39	142,65	54,57%	2.765,98	
4.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, PILARES, BALDRAMES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	100,00%	104,00	0,00	93,88	72,03	69,26%	6.762,17	
4.1.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	100,00%	11,80	0,00	1.338,31	7,85	66,53%	10.505,73	
4.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M³	100,00%	23,40	0,00	79,55	8,78	37,52%	698,44	
4.2	ESTRUTURA DE CONCRETO E VEDAÇÃO - MURO						0,00			
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO).	M²	100,00%	22,50	0,00	93,72	22,50	100,00%	2.108,70	
4.2.4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 01/2020	M	0,00%	12,00	12,00	219,22	12,00	100,00%	2.630,64	
4.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,30 ATÉ 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	100,00%	44,07	0,00	19,39	44,07	100,00%	854,51	
4.2.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. DE 3,4 ATÉ 6,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	61,76%	96,25	36,81	21,08	59,44	61,76%	1.252,99	
4.2.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	100,00%	2,60	0,00	1.376,86	2,60	100,00%	3.579,83	
4.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, PILARES, BALDRAMES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	57,10%	42,00	18,02	93,88	23,98	57,10%	2.251,24	
4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						0,00			
4.5.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015	UN	100,00%	21,00	0,00	70,12	6,00	28,57%	420,72	
Subtotais			26,64%			0,00			37.166,14	
5.	ARQUITETURA						0			
5.1	VEDAÇÕES					0,00	0,00			
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO).	M²	96,30%	364,00	13,46	93,72	40,24	11,05%	3.771,29	
5.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO QUADRICULADO COM 16 FUIROS EM ARGAMASSA PRENSADA COM LÂMINAS HORIZONTAIS INCLINADAS EM VENEZIANA 39X39X7CM - REF. 90 NEOREX OU EQUIVALENTE	M²	100,00%	7,00	0,00	368,78	7,00	100,00%	2.581,46	
5.1.4	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_ 01/2021	M²	38,05%	182,00	112,75	917,96	46,22	25,40%	42.428,11	
5.2	PISOS						0,00			
5.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_ 06/2014	M²	100,00%	355,00	0,00	51,99	27,48	7,74%	1.428,68	
5.2.8	PISO EM PORCELANATO 90X90CM, SUPERFÍCIE NATURAL RETIFICADO - REF.: MINERAL OFF WHITE, NATURAL RETIFICADO DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	M²	7,94%	1.960,98	1.805,32	390,31	85,43	4,36%	33.344,18	
5.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS						0,00			
5.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60 CM - COM REJUNTE ACRILICO - REF.: PORTOBELLO BIANCO ACETINADO RETIFICADO OU EQUIVALENTE	M²	31,82%	1.508,70	1.028,63	202,89	309,57	20,52%	62.808,65	
5.3.8	PEITORIL EM GRANITO (CINZA ANDORINHA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	58,69%	60,40	24,95	780,06	6,79	11,24%	5.296,60	
5.8	PINTURA						0,00			
5.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_ 06/2014	M²	42,05%	11.292,52	6.544,09	16,51	1.155,70	10,23%	19.080,60	
5.8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M²	56,35%	10.594,50	4.624,26	2,66	467,38	4,41%	1.243,23	
5.9	PISOS						0,00			
5.9.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2013	UN	34,04%	47,00	31,00	142,68	16,00	34,04%	2.282,88	
5.9.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,57%	7,00	5,00	237,28	2,00	28,57%	474,56	
5.9.11	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA LAVATÓRIO L=55,0 CM COM SAIA L=7,0 CM E RODABANCA L=10,0 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,72%	44,92	30,22	1.015,52	14,70	32,72%	14.928,14	
5.9.12	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA L=60,0 CM COM SAIA DUPLA E RODABANCA L=10,0 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,46%	24,02	13,82	1.000,69	10,20	42,46%	10.207,03	
Subtotais			7,67%			0,00			199.875,41	
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO						0			
6.1	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO					0,00	0,00			
6.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_ 11/2014	M²	48,15%	876,82	454,65	56,11	57,49	6,56%	3.225,76	
6.1.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_ 06/2018	M²	29,50%	655,00	461,76	103,35	61,37	9,37%	6.342,58	
6.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃO, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_ 06/2018	M²	44,91%	2.100,40	1.157,05	58,59	118,64	5,65%	6.951,11	

6.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER E IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESINA TERMOPLÁSTICA	M²	52,79%	566,37	267,37	125,98	89,90	15,87%	11.325,60
Subtotais			48,47%			0,00			27.845,05
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS					0			
7.1	ÁGUA FRIA				0,00	0,00			
7.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,03%	357,00	239,10	28,20	8,75	2,45%	246,75
7.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,44%	889,00	831,76	39,90	2,00	0,22%	79,80
7.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,31%	160,00	98,70	57,15	8,00	5,00%	457,20
7.2	ESGOTO SANITÁRIO				0,00	0,00			
7.2.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM + PROLONGADOR (EXCLUSIVE GRELHA E PORTA GRELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,89%	18,00	11,00	44,49	3,00	16,67%	133,47
7.3	ÁGUAS PLUVIAIS				0,00	0,00			
7.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M²	18,70%	295,63	240,35	79,55	55,28	18,70%	4.397,52
7.3.9	CAIXA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 90X70 X100 CM EM ALVENARIA - COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO - INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	7,14%	56,00	52,00	1.274,49	4,00	7,14%	5.097,96
Subtotais			3,47%			0,00			10.412,70
8.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					0			
8.4	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO				0,00	0,00			
8.4.1	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIÂMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,17%	2.000,00	1.916,66	48,58	83,34	4,17%	4.048,65
8.5	HIDRANTES					0,00			
8.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,83%	242,00	34,28	292,87	60,75	25,10%	17.791,85
8.5.3	PINTURA DE TUBOS / ELETRODUTOS COM ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	100,00%	387,71	0,00	7,65	149,41	38,54%	1.142,98
8.5.5	SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,31%	168,00	107,00	27,30	11,00	6,55%	300,30
8.5.6	SUORTE PARA TUBOS/ DUTOS E/OU ELETROCALHAS VERTICAIS (CHUMBADORES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,93%	29,00	18,00	50,25	4,00	13,79%	201,00
8.6	SPRINKLERS				0,00	0,00			
8.6.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	94,84%	109,00	5,62	292,87	11,38	10,44%	3.332,86
Subtotais			24,53%			0,00			26.817,64
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA					0			
9.3	INFRAESTRUTURA				0,00	0,00			
9.3.1	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 50 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,06%	1.373,00	342,45	95,59	33,29	2,42%	3.182,19
9.3.2	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 100 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,59%	698,00	191,29	116,08	98,70	14,14%	11.457,09
9.3.4	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 150 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	79,61%	491,00	100,12	140,42	7,84	1,60%	1.100,89
9.3.5	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 250 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	77,09%	325,00	74,47	187,32	27,20	8,37%	5.095,10
9.3.8	SUORTE PARA TUBOS/ DUTOS/ ELETROCALHA HORIZONTAIS (CHUMBADORES, TIRANTES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,96%	1.319,00	449,00	68,79	184,00	13,95%	12.657,36
9.3.12	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIÂMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,52%	3.773,00	2.206,60	48,58	503,25	13,34%	24.447,88
9.3.13	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIÂMETRO NOMINAL 25 (1") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,92%	1.975,00	1.245,87	59,02	287,24	14,54%	16.952,90
9.3.16	SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,32%	3.302,00	2.532,00	27,30	302,00	9,15%	8.244,60
9.3.22	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEAL TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	93,61%	3.734,00	238,43	26,36	358,04	9,59%	9.437,93
9.8	SPDA E ATERRAMENTO					0,00			
9.8.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,19%	599,00	514,00	74,79	85,00	14,19%	6.357,15
Subtotais			12,34%			0,00			100.659,00
10.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					0			
10.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO				0,00	0,00			0,00
10.1.1	CABO CAT.6 U/UTP LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,42%	52.352,00	42.187,00	10,83	10.165,00	19,42%	110.086,95
Subtotais			10,15%			0,00			110.086,95
12.	CLIMATIZAÇÃO					0			
12.4	EQUIPAMENTOS - VENTILAÇÃO MECÂNICA					0,00			
12.4.4	CAIXA PARA EXAUSTÃO MOD. BBT 160 VAZÃO 1440 M³/H PD. 35,0 MMCA	UN	25,00%	4,00	3,00	2.627,82	1,00	25,00%	2.627,82
12.4.5	CAIXA PARA EXAUSTÃO MOD. BBT 160 VAZÃO 1530 M³/H PD. 32,0 MMCA	UN	25,00%	4,00	3,00	2.627,82	1,00	25,00%	2.627,82
12.5	TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA					0,00			
12.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 20 MM (3/4")	M	1,52%	50,00	49,24	85,28	0,76	1,52%	64,81
12.5.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 25 MM (1")	M	24,43%	120,00	90,69	96,40	29,31	24,43%	2.825,48
12.5.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4")	M	37,80%	110,00	68,42	126,07	41,58	37,80%	5.241,99
12.5.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2")	M	15,64%	25,00	21,09	146,19	3,91	15,64%	571,60
12.5.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 65 MM (2 1/2")	M	12,68%	75,00	65,49	247,09	9,51	12,68%	2.349,82
12.6	TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA - CONEXÕES					0,00			
12.6.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,04%	46,00	40,00	103,15	6,00	13,04%	618,90
12.6.3	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00%	6,00	0,00	115,14	6,00	100,00%	690,84
12.6.4	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00%	1,00	0,00	126,14	1,00	100,00%	126,14
12.6.6	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	14,29%	28,00	24,00	205,22	4,00	14,29%	820,88
12.6.10	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,33%	6,00	4,00	89,22	2,00	33,33%	178,44
12.6.12	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00%	2,00	0,00	94,98	2,00	100,00%	189,96
12.6.17	TE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00%	2,00	0,00	126,87	2,00	100,00%	253,74
12.6.19	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00%	2,00	0,00	252,91	2,00	100,00%	505,82

12.9	DUTOS DE AR						0,00		
12.9.3	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #24	M²	27,04%	2.282,42	1.665,24	181,49	66,50	2,91%	12.069,08
12.9.4	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #26	M²	40,27%	384,25	229,53	136,90	77,65	20,21%	10.630,28
12.12	ISOLAMENTO TÉRMICO - TUBULAÇÕES E DUTOS						0,00		
12.12.4	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 3/4" 32MM	M	1,73%	44,00	43,24	32,46	0,76	1,73%	24,66
12.12.5	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 1" 32MM	M	24,43%	120,00	90,69	34,18	29,31	24,43%	1.001,81
12.12.7	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 1.1/4" 32MM	M	37,80%	110,00	68,42	53,56	41,58	37,80%	2.227,02
12.12.8	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 1.1/2" 32MM	M	15,64%	25,00	21,09	59,45	3,91	15,64%	232,44
12.12.10	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 2.1/2" 32MM	M	12,68%	75,00	65,49	87,87	9,51	12,68%	835,64
12.12.15	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ALUMINIZADA - MANTA DE 15 MM - ARMADUCT OU EQUIVALENTE	M2	35,49%	2.217,00	1.430,19	314,97	100,60	4,54%	31.685,98
12.13	SUPORTES - TUBULAÇÕES E DUTOS						0,00		
12.13.1	SUPORTE PARA TUBOS/ DUTOS/ ELETROCALHA HORIZONTAIS (CHUMBADORES, TIRANTES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,33%	750,00	635,00	68,79	72,00	9,60%	4.952,88
12.13.3	SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,67%	150,00	128,00	27,30	22,00	14,67%	600,60
Subtotais			9,76%				0,00		83.954,45
14.	SERVIÇOS GERAIS						0		
14.1	TRANSPORTE DE MATERIAL						0,00		
14.1.1	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	30,74%	780,00	540,24	66,34	25,36	3,25%	1.682,38
14.2	LIMPEZA DA OBRA						0,00		
14.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	37,45%	100,00	62,55	402,21	4,16	4,16%	1.673,19
14.2.2	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	100,00%	280,00	0,00	92,72			0,00
14.5	LIMPEZA DA OBRA						0,00		
14.5.1	TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE E DEMAIS TAXAS)	UN	100,00%	1,00	0,00	47.110,31			0,00
14.5.2	CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	65,80%	500,00	171,00	15,10	2,00	0,40%	30,20
Subtotais			46,55%		0,00				3.385,77
Subtotais									614.992,45
TOTAL GERAL sem BDI e sem ADMINISTRAÇÃO									614.992,45
15.	ADMINISTRAÇÃO								
15.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
15.1.1	INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	%	9,98%	100,00	99,90	1.012,00	0,02	2,13%	2.151,78
15.1.2	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	9,98%	0,00	0,00	0,00	-	2,13%	0,00
15.1.3	PROJETOS AS BUILT (TODAS AS DISCIPLINAS)	M2	9,98%	0,00	0,00	0,00	-	2,13%	0,00
15.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	9,98%	100,00	99,90	20.956,62	0,02	2,13%	44.559,33
15.1.5	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	9,98%	100,00	90,02	4.754,80	2,13	2,13%	10.109,97
01.04.06	CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	9,98%	0,00	0,00	0,00	-	2,13%	0,00
01.04.07	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CACAMBA 5,0 M³	M3	9,98%	0,00	0,00	0,00	-	2,13%	0,00
Subtotais			9,98%						56.821,08
ADMINISTRAÇÃO									56.821,08

	% Realizado	TOTAL R\$
TOTAL 9ª Medição R\$	2,13%	671.813,53

TABELA PARA O REAJUSTE											
DESCRIÇÃO	SUBTOTAL COM BDI	PREVISTO	REALIZADO	ESTÁ EM ATRASO		VALOR EM ATRASO NO MOMENTO DO SEGUNDO REAJUSTE	VALOR ADIANTADO NO MOMENTO DO SEGUNDO REAJUSTE	VALOR EXECUTADO NA 8ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 8ª MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NA 9ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 9ª MEDIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.116,52	R\$ 56.885,15	R\$ 56.885,15	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404,97	R\$ 307,56	R\$ 1.703,07	R\$ 399,53
		74,73%	74,73%		😊						
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 166.895,56	R\$ 1.719,89	R\$ 1.719,89	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.058,89	R\$ 245,23	R\$ 1.318,45	R\$ 316,43
		1,03%	1,03%		😊						
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 372.192,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.767,83	R\$ 635,46
		0,00%	0,00%		😊						
ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 387.887,79	R\$ 31.938,44	R\$ 31.938,44	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.103,86	R\$ 1.847,41	R\$ 37.166,14	R\$ 3.854,38
		8,23%	8,23%		😊						
ARQUITETURA	R\$ 10.883.731,21	R\$ 290.256,85	R\$ 290.256,85	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.591,17	R\$ 18.609,15	R\$ 199.875,41	R\$ 29.402,42
		2,67%	2,67%		😊						
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 459.919,12	R\$ 58.671,64	R\$ 58.671,64	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.958,58	R\$ 7.366,98	R\$ 27.845,05	R\$ 8.870,62
		12,76%	12,76%		😊						
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 944.990,20	R\$ 7.053,63	R\$ 7.053,63	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,41	R\$ 825,31	R\$ 10.412,70	R\$ 1.387,60
		0,75%	0,75%		😊						
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.193.101,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.121,53	R\$ 14.355,97	R\$ 26.817,64	R\$ 15.804,12
		0,00%	0,00%		😊						
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 5.365.186,69	R\$ 24.793,36	R\$ 24.793,36	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.591,72	R\$ 28.965,78	R\$ 100.659,00	R\$ 34.401,36
		0,46%	0,46%		😊						
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1.087.133,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,61	R\$ 110.086,95	R\$ 5.957,31
		0,00%	0,00%		😊						
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	2.540.238,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		😊						
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.455.597,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.089,40	R\$ 18.957,46	R\$ 83.954,45	R\$ 23.491,00
		0,00%	0,00%		😊						
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 756.454,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		😊						
SERVIÇOS GERAIS	234.157,38	R\$ 82.137,65	R\$ 82.137,65	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.406,47	R\$ 1.268,10	R\$ 3.385,77	R\$ 1.450,94
		35,08%	35,08%		😊						
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.672.342,00	R\$ 51.175,29	R\$ 51.175,29	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.265,28	R\$ 8.570,53	R\$ 56.821,08	R\$ 11.638,87
		1,91%	1,91%		😊						
TOTAIS EM ATRASO OU ADIANTADO SEGUNDO O CRONOGRAMA APÓS A QUARTA MEDIÇÃO.						0,00	R\$ 0,00		R\$ 35.923,08		R\$ 36.277,93

ÍNDICE INCC-DI, ACUMUALADO ATÉ MAIO DE 2023 FGV	5,40%	PREÇO TOTAL DO CONTRATO	R\$ 31.595.942,84
---	-------	-------------------------	-------------------

Cronograma 06/04		Cronograma 28/06				REAJUSTE	MEDICAO	TOTAL
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 5ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$281.102,49			VALORES A PAGAR PELO MPF 5ª MEDIÇÃO	=	R\$15.179,53	R\$408.691,94	R\$423.871,47
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 6ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$392.742,49			VALORES A PAGAR PELO MPF 6ª MEDIÇÃO	=	R\$21.208,09	R\$395.621,29	R\$416.829,38
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 7ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$401.584,41			VALORES A PAGAR PELO MPF 7ª MEDIÇÃO	=	R\$21.685,56	R\$406.964,62	R\$428.650,18
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 8ª PARCELA DE MEDIÇÃO.		R\$665.242,28		VALORES A PAGAR PELO MPF 8ª MEDIÇÃO	=	R\$35.923,08	R\$665.242,28	R\$701.165,36
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 9ª PARCELA DE MEDIÇÃO.		R\$671.813,53		VALORES A PAGAR PELO MPF 9ª MEDIÇÃO	=	R\$36.277,93	R\$671.813,53	R\$708.091,46

14.0 - CONTROLE DE RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA

Descrição do item	Data da retirada do entulhos da obra
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	18/09/2023 001925
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	20/09/2023 001946
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	22/09/2023 001972
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	25/09/2023 001998
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	27/09/2023 00026
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	28/09/2023 00039
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	04/10/2023 00099

15.0 - RELAÇÃO DOS COLABORADORES COM A FUNÇÃO NA EMPRESA J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	Colaborador	Função
1	ALCIDES NOGUEIRA SENA NETO	AUX. ADMINISTRATIVO
2	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
3	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
4	ANANIAS VIEIRA DA SILVA	SERVENTE
5	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
6	ANTONIES DIEGO DE SOUZA CORDEIRO	SERVENTE
7	ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	CARPINTEIRO
8	ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	ELETRICISTA
9	BRUNO SILVA CASTRO	SERVENTE
10	DARLISON COSMOS PENA	BOMBEIRO HIDRAULICO
11	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
12	DIEGO SIMAO BURUM	SERVENTE
13	ELIEZIO MEIRELE RODRIGUES	PEDREIRO

14	ELIZEU LIMA DA SILVA	SERVENTE
15	ERIVAN LOURENÇO MACHADO	PEDREIRO
16	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA
17	FELIPE GRALHADA OLIVEIRA	SERVENTE
18	FRANCISCO EMICIO	BOMBEIRO HIDRAULICO
19	GILVAN LEITE RIBEIRO	PEDREIRO
20	IGOR ANTONIO PINO	PINTOR
21	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVENTE
22	JOSE MARCELO ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR	MESTRE DE OBRAS
23	JOSE RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
24	JOSÉ VERAS BARROS	OP. BETONEIRA
25	JOSINALDO DA SILVA ALMEIDA	CARPINTEIRO
26	JUVENAL GUILHERME SOBRINHO	CALDEIREIRO
27	JOSE MARIA FROTA CONRADO	PINTOR
28	LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA	ALMOXARIFE
29	MARLON BORGES PEREIRA	TECNICO DE SEGURANÇA
30	MOISES FERREIRA CHAVES	CARPINTEIRO
31	NILDO OLIVEIRA DA SILVA	PEDREIRO
32	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
33	RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE	PEDREIRO
34	RAUDI RAFAEL MARTINES	CARPINTEIRO
35	RONNY DE SOUZA ANICETO	SERVENTE
36	SEBASTIÃO ASSIS DE FREITAS	PINTOR
37	SERGIO GOMES DA SILVA	SERVENTE
39	SIVANILSON VIERA DA SILVA	PEDREIRO
38	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
40	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA

41	YANN PEREIRA NUNES	SERVENTE
42	ZEDEQUIAS DOS SANTOS	IMPERMEABILIZADOR

15.1 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).

Nº	Colaborador	Função
1	DANIEL ASSIS CARNEIRO	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO	ELETRICISTA
3	GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ	ELETRICISTA
4	JORGE LUIZ GOZALEZ LOPES	PEDREIRO
5	RIBAMAR SILVA SANTANA	ELETRICISTA
6	ROMÁRIO DA SILVA BENTO	ELETRICISTA
7	SIMON ENRIQUE OLIVEROS LINARES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
8	FABIO VIEIRA DA SILVA	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

15.2 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa FERREIRA & FERREIRA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Nº	Colaborador	Função
1	ALLAN GUIMARÃES FARIAS	AUXILIAR DE FUNILARIA
2	SAMUEL LOBATO	FUNILEIRO
3	LUIZ MIGUEL MAURERA	AUXILIAR DE FUNILARIA
4	MIGUEL ALEXANDER JIMENES RIVAS	AUXILIAR DE FUNILARIA

16.0 - A FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO SERÁ DEFINIDA PELA SOMA DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS OCORRÊNCIAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, CONFORME TABELA ABAIXO:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre da Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 - Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5
4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4

10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6
12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24

17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção
----	--	--------------------------	---

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 - Pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 - Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.



17.3 - A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme a tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:


ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				00
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: 00%				


18.0 - ANEXO: DIÁRIOS DE OBRA

13.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

13.1 CLIMATIZAÇÃO

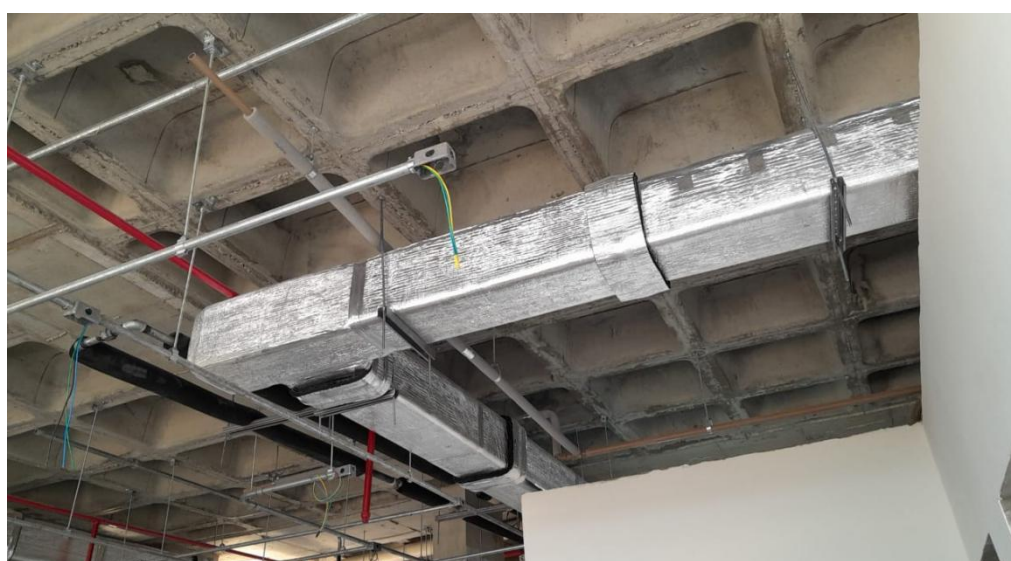
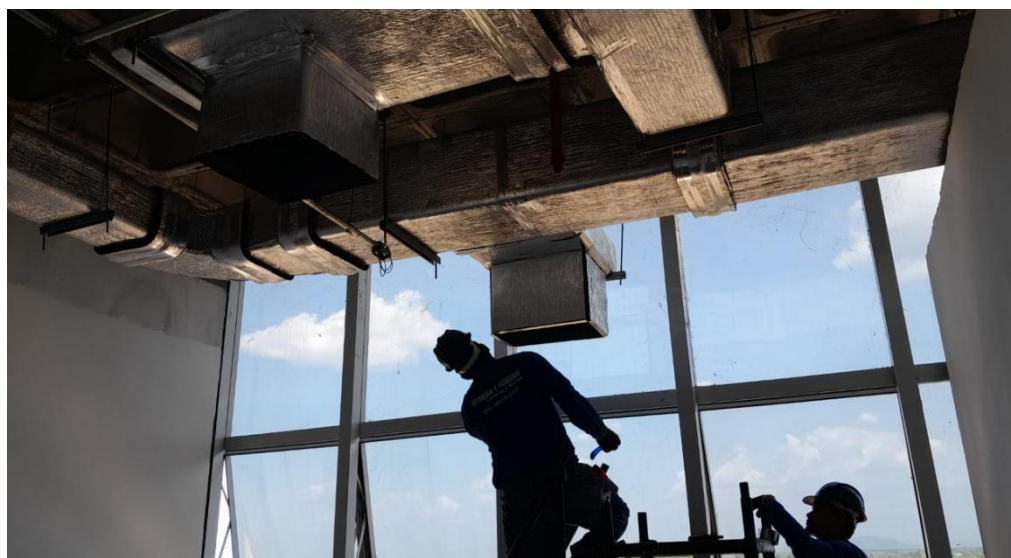


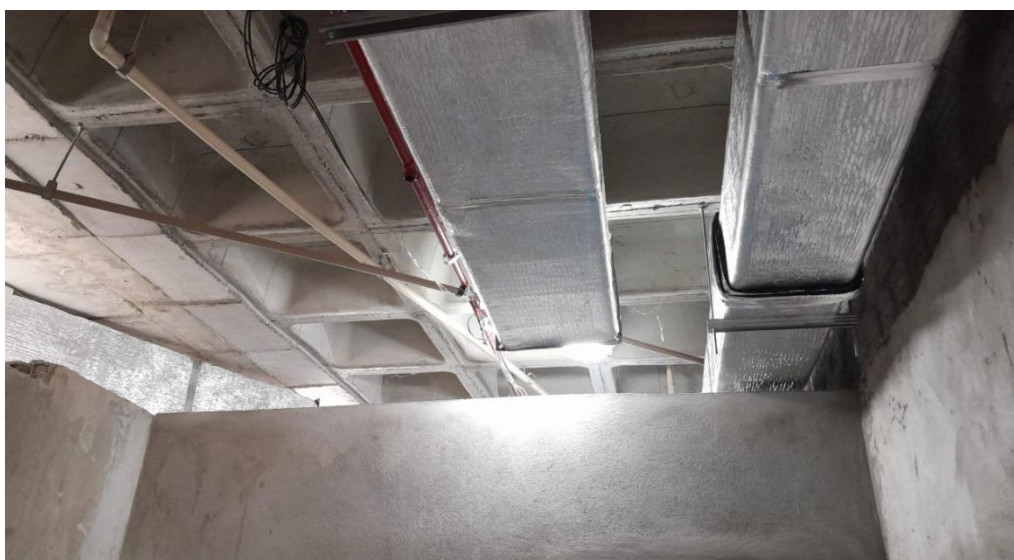

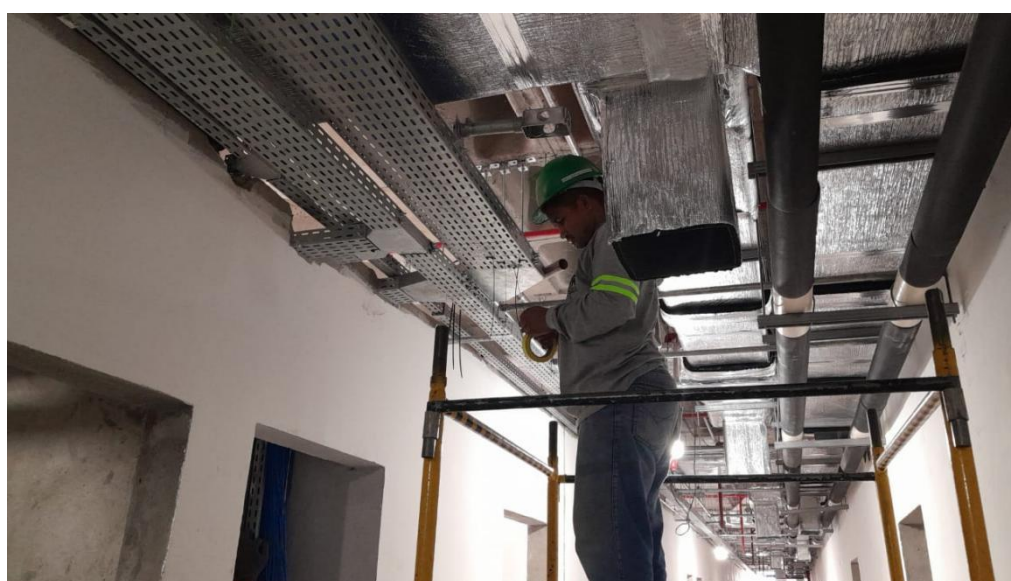



13.2 ELÉTRICA

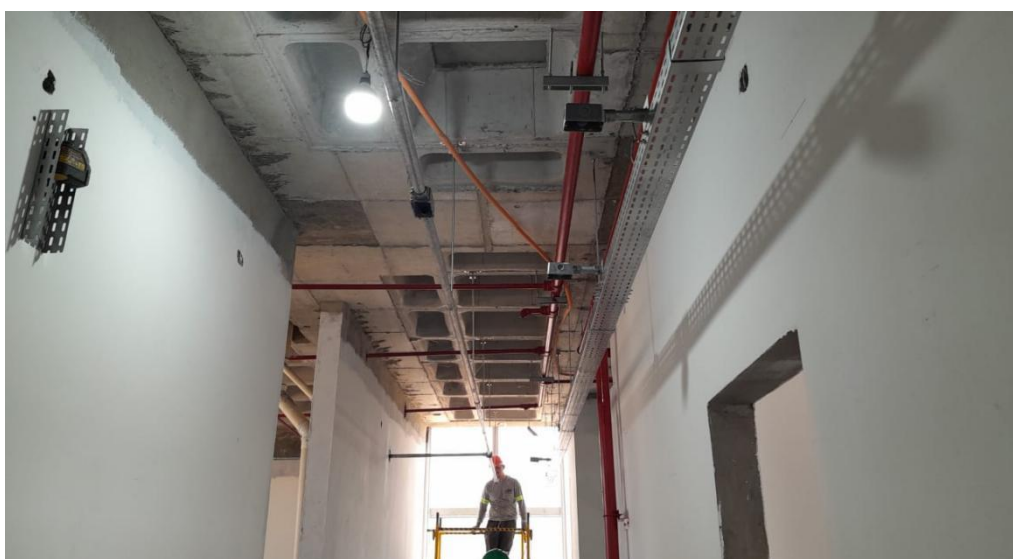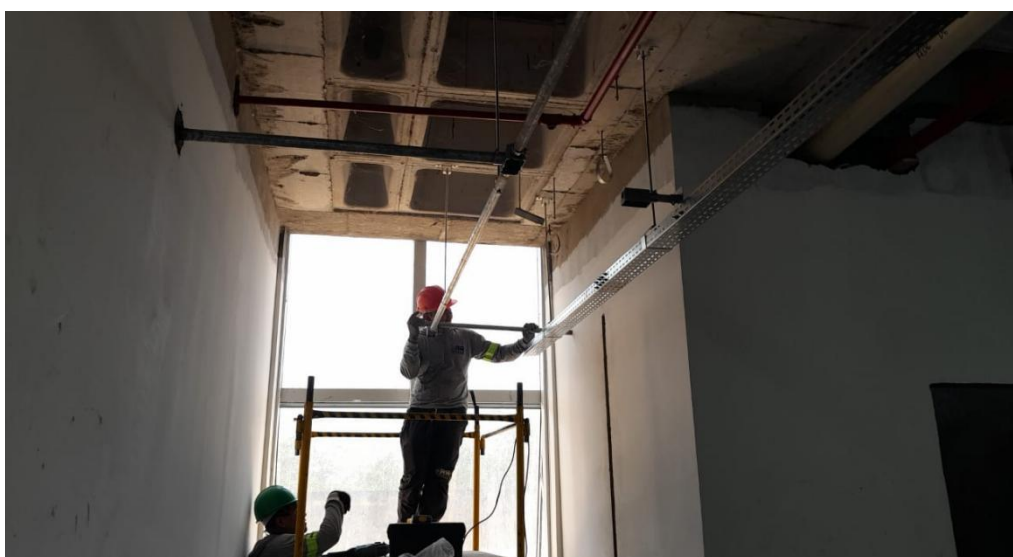














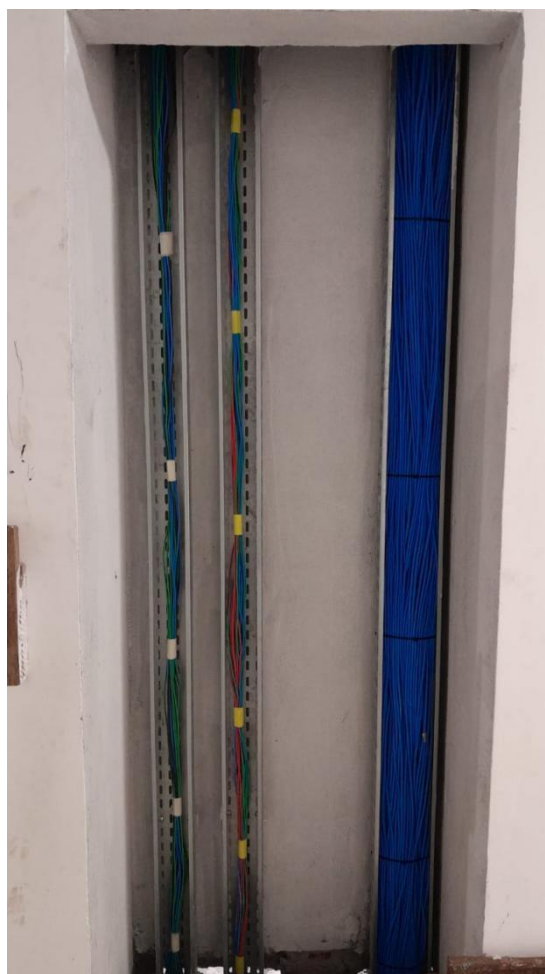

13.3 INCÊDIO







13.4 LIMPEZA DO TERRENO













13.5 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E SELADOR





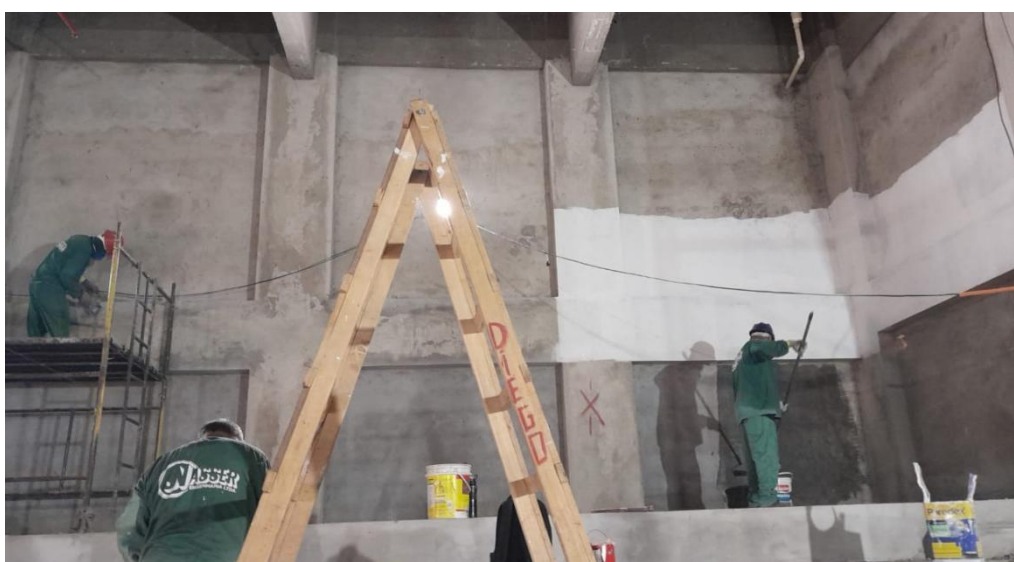

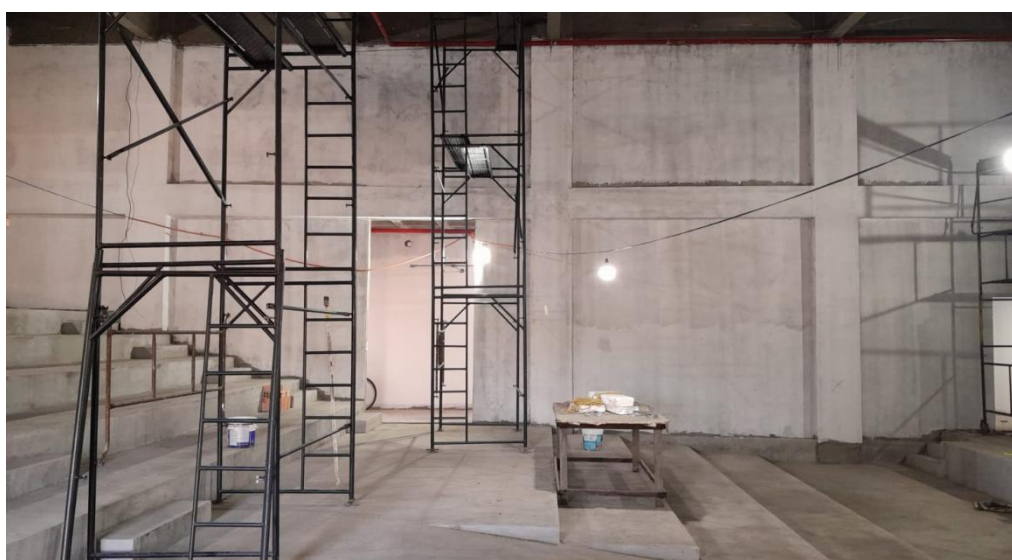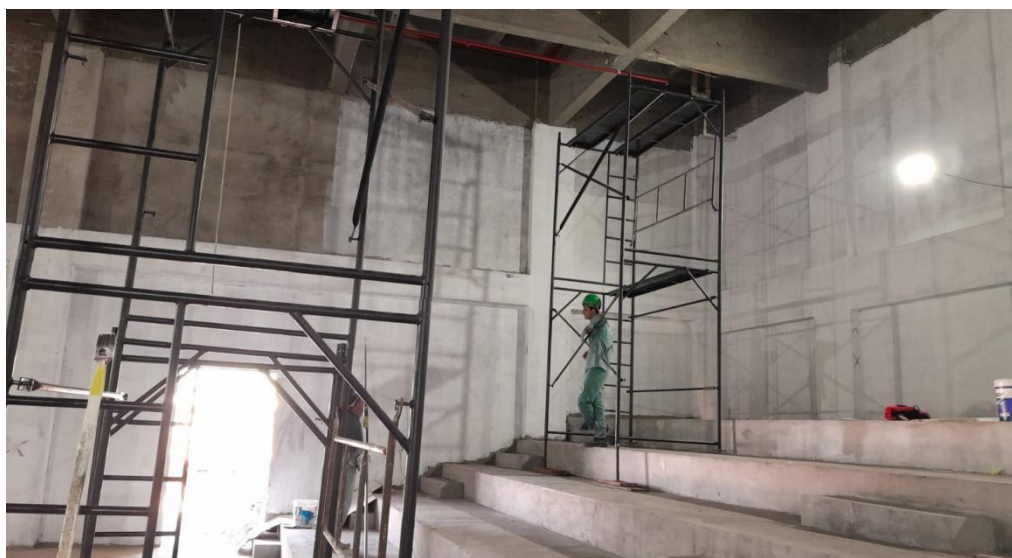

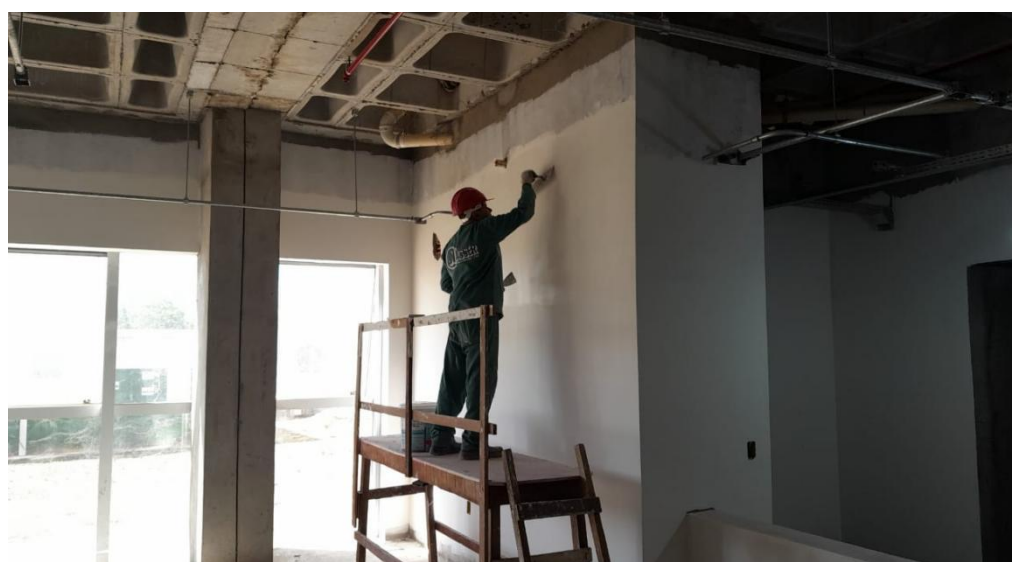





13.6 PORCELANATO






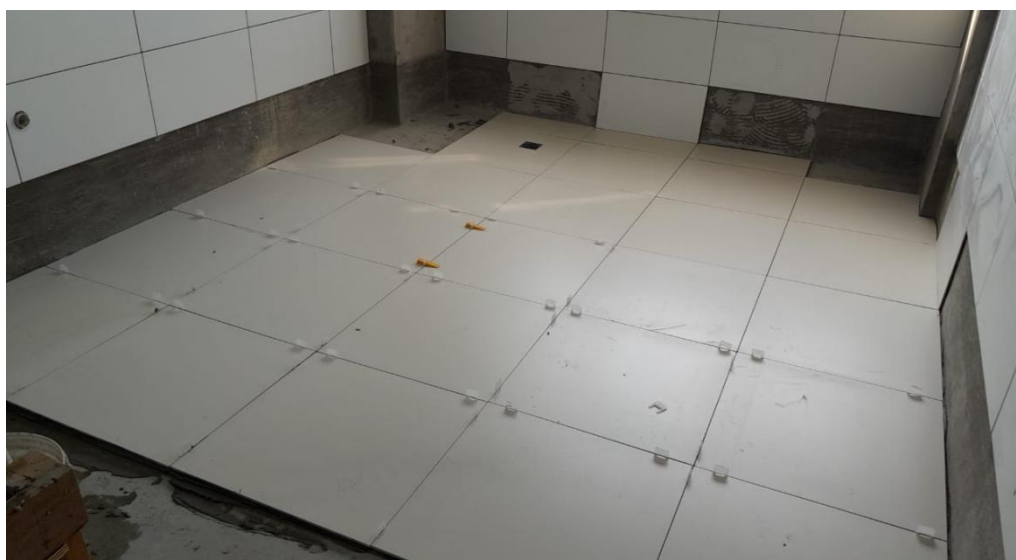



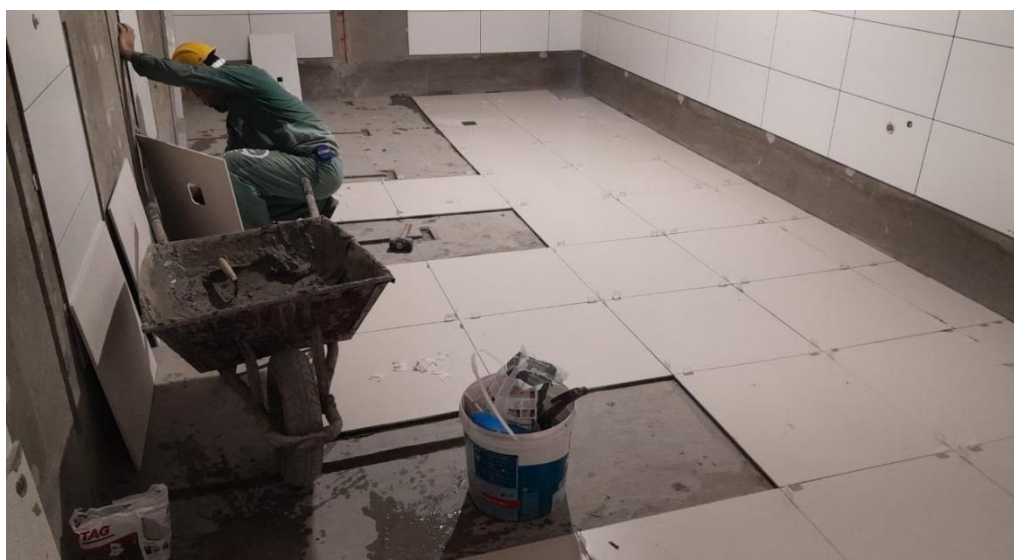

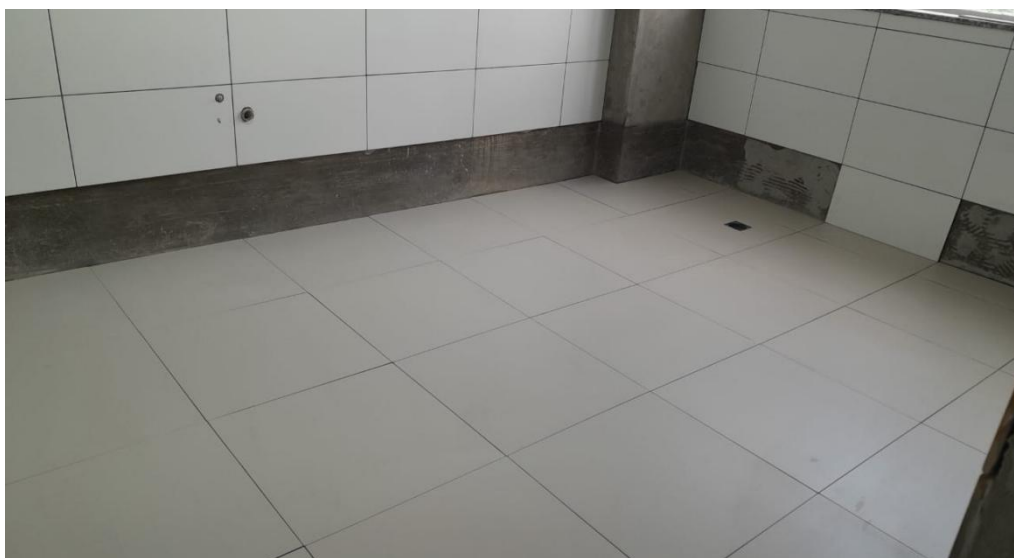










13.7 VIGA DO GRADIL





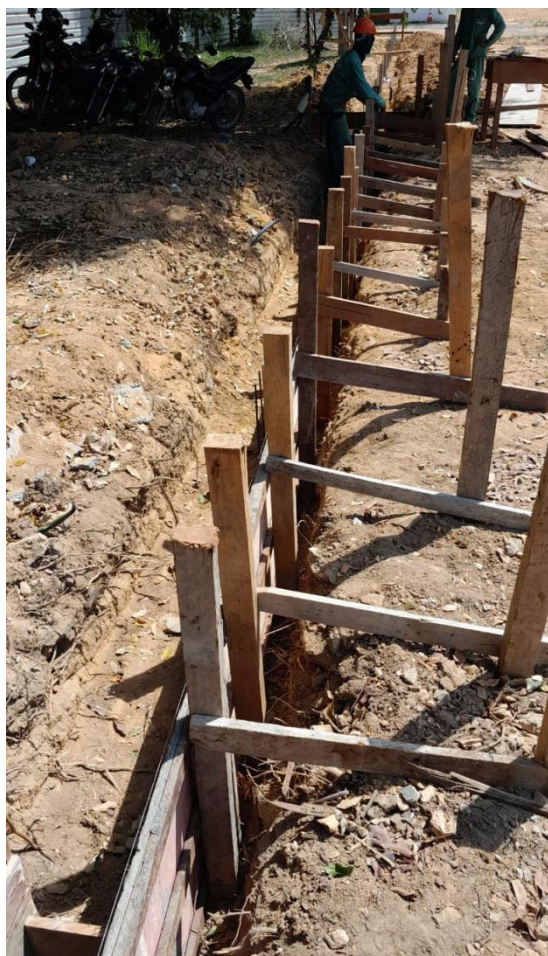











13.8 PAPA ENTULHO





13.9 GRANITO











13.10 CAIXA DE DRENAGEM








13.11 ESTACAS





13.12 Cobogó

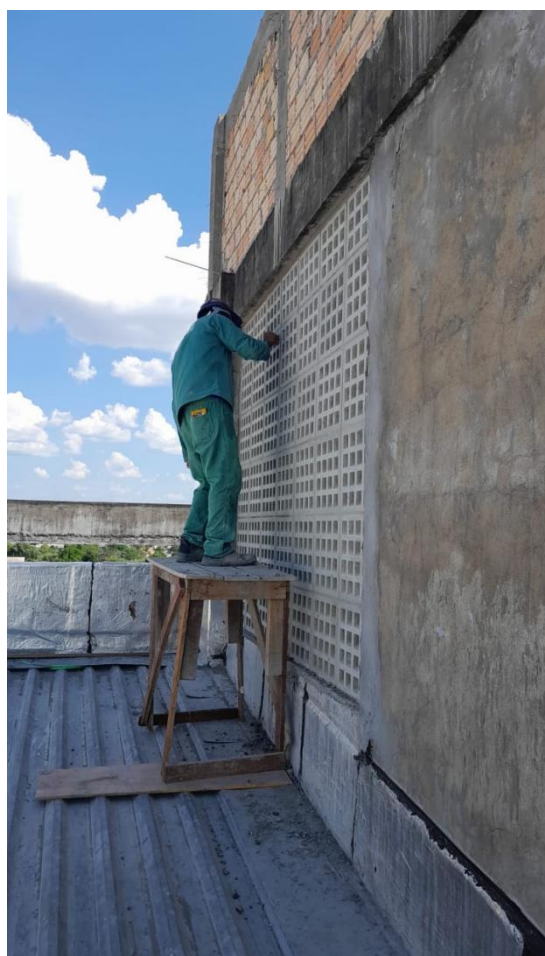

13.13 Piso



13.14 ALVENARIA



DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	248
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	484		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	20/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 20/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 01 - Aux. administrativo
- 04 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 12 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 01 - Operador de caldeira;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

- 05 - Aux de funilaria
- 01 - Funileiro
- 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03.
- Forma e concretagem da viga do gradil.
- Instalação de divisórias dos San04 e San 05 do 3º Pavimento.
- Proteção mecânica da calha.
- Limpeza do terreno, demolição de piso de concreto e regularização da área externa.
- Serviço de bota-fora decorrentes da demolições de piso, remoção de camada vegetal do terreno com uso de caçamba e pá carregadeira.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ TARDE. DATA:20/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

- 2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
- 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
- 1 MESTRE DE OBRA
- 1 ALMOXARIFE
- 1 AUX. ADMINISTRATIVO
- 5 PEDREIRO
- 4 CARPINTEIRO
- 12 SERVENTE
- 1 IMPERMEABILIZADOR
- 1 ELETRICISTA
- 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 CALDEIREIRO
- 1 OPERADOR DE BETONEIRA
- 2 VIGIA
- 3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
- 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
- 4 ELETRICISTA
- 1 PEDREIRO
- 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

- 5 AUXILIAR DE FUNILARIA
- 1 FUNILEIRO
- 1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO.
- 3.2 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.
- 3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO 1º PAVIMENTO.
- 3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
- 3.5 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA.
- 3.6 CHAPISCO E RÊBOCO DE ALVENARIA DO PLATIBANDA.
- 3.7 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DE CALHA.
- 3.8 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03.
- 3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.
- 3.10 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
- 3.11 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.
- 3.12 PROTEÇÃO MECÂNICA DA CALHA;
- 3.13 LIMPEZA DO TERRENO, DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO E REGULARIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA.
- 3.14 SERVIÇO DE BOTA-FORA DECORRENTES DA DEMOLIÇÕES DE PISO, REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DO TERRENO COM USO DE CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA.

4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	249
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	483		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	21/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 21/09/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda.					
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03.					
- Forma e concretagem da viga do gradil.					
- Instalação de divisórias dos San04 e San 05 do 3º Pavimento.					
- Proteção mecânica da calha.					
- Limpeza do terreno, demolição de piso de concreto e regularização da área externa.					
- Serviço de bota-fora decorrentes da demolições de piso, remoção de camada vegetal do terreno com uso de caçamba e pá carregadeira.					
- Lançamento de concreto da vida do gradil.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	250
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	482		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	22/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 23/09/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almojarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 08 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda. - Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03. - Forma, armação e concretagem da viga do gradil. 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ TARDE. DATA:22/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

- 2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
- 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
- 1 MESTRE DE OBRA
- 1 ALMOXARIFE
- 1 AUX. ADMINISTRATIVO
- 5 PEDREIRO
- 4 CARPINTEIRO
- 12 SERVENTE
- 1 IMPERMEABILIZADOR
- 1 ELETRICISTA
- 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 CALDEIREIRO
- 1 OPERADOR DE BETONEIRA
- 2 VIGIA
- 3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
- 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
- 4 ELETRICISTA
- 1 PEDREIRO
- 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

- 5 AUXILIAR DE FUNILARIA
- 1 FUNILEIRO
- 1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO;
- 3.2 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE;
- 3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO PAVIMENTO TÉRREO;
- 3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO;
- 3.5 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
- 3.6 REPARO DA IMPERMEABILIZAÇÃO NAS DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS;
- 3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DOS SANITÁRIO DOS GABINETES DO 3º PAVIMENTO;
- 3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.
- 3.9 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.
- 3.10 LIMPEZA DO TERRENO E REGULARIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA.
- 3.11 SERVIÇO DE BOTA-FORA DECORRENTES DA DEMOLIÇÕES DE PISO, REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DO TERRENO COM USO DE CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA.

4.0 - OCORRÊNCIAS:

- 4.1 PIA DA COPA TERÁ ALTERAÇÃO NO NÍVEL DA ÁREA MOLHA E ENXUTA, SEM ADITIVO

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	251
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	481		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	23/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	252
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	480		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	24/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	253
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	479		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	25/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 25/09/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoхарife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda. - Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03. - Forma, armação e concretagem da viga do gradil.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ TARDE. DATA:25/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO
 1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO;
 3.2 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE;
 3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO PAVIMENTO TÉRREO;
 3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO;
 3.5 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
 3.6 REPARO DA IMPERMEABILIZAÇÃO NAS DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS;
 3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DOS SANITÁRIO DOS GABINETES DO 3º PAVIMENTO;
 3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.
 3.9 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS.
 3.10 LIMPEZA DO TERRENO E REGULARIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA.
 3.11 SERVIÇO DE BOTA-FORA DECORRENTES DA DEMOLIÇÕES DE PISO, REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL DO TERRENO COM USO DE CAÇAMBA E PÁ CARREGADEIRA.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	254
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	478		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	26/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 26/09/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 02 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 10 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda. - Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 03). - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02). - Forma, armação e concretagem da viga do gradil. - Reparo da impermeabilização nas divisórias dos sanitários. 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ TARDE. DATA:26/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
 1 MESTRE DE OBRA
 1 ALMOXARIFE
 1 AUX. ADMINISTRATIVO
 5 PEDREIRO
 4 CARPINTEIRO
 12 SERVENTE
 1 IMPERMEABILIZADOR
 1 ELETRICISTA
 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 1 CALDEIREIRO
 1 OPERADOR DE BETONEIRA
 2 VIGIA
 3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
 4 ELETRICISTA
 1 PEDREIRO
 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
 1 FUNILEIRO
 1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO;
 3.2 CONFECCÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE;
 3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO PAVIMENTO TÉRREO;
 3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO;
 3.5 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
 3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE;
 3.8 CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA DO PLATIBANDA
 3.9 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGAM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DO PLATIBANDA

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	255
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	477		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	27/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 27/09/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 02 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoхарife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 10 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Forma, armação e concretagem da viga de amarração da platibanda. - Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02). - Forma, armação e concretagem da viga do gradil. - Reparo da impermeabilização nas divisórias dos sanitários. 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ TARDE. DATA:27/09/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO;
3.2 CONFECCÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE;
3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO PAVIMENTO TÉRREO;
3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO;
3.5 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE;
3.8 CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA DO PLATIBANDA
3.9 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGAM DA VIGA DE AMARRAÇÃO DO PLATIBANDA

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	256
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	476		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	28/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 28/09/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 02 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 10 - Pedreiro; 13 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Chapisco e reboco de alvenaria do Platinbanda. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02). - Forma, armação e concretagem da viga do gradil. - Contrapiso do pavimento técnico. 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	257
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	475		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	29/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	258
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	474		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	30/09/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

FiscalizaçãoContratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	259
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	473		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	01/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	260
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	472		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	02/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 29/09/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
 01 - Mestre de Obra;
 01 - Almoxarife;
 01 - Aux. administrativo
 04 - Carpinteiro;
 10 - Pedreiro;
 12 - Servente;
 01 - Eletricista
 03 - Pintor;
 01 - Operador de caldeira;
 02 - Bombeiro Hidráulico;
 01 - Op. Betoneira;
 01 - Impermeabilizador
 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
 02 - Eletricista
 01 - Pedreiro
 03 - Aux. de serviços gerais
 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
 01 - Funileiro
 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
 - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
 - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
 - Montagem de dutos do 2º pavimento.
 - Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
 - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02).
 - Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
 - Contrapiso do pavimento técnico.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 02/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
 01 - Mestre de Obra;
 01 - Almoxarife;
 01 - Aux. administrativo
 04 - Carpinteiro;
 10 - Pedreiro;
 13 - Servente;
 01 - Eletricista
 03 - Pintor;
 01 - Operador de caldeira;
 02 - Bombeiro Hidráulico;
 01 - Op. Betoneira;

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
- Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
- Contrapiso para regularização da caixa d'agua.
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	261
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	471		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	03/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:03/10/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:
2.1.1-RR DOMÓTICA
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA
5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS DO TÉRREO;
3.2 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE;
3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO PAVIMENTO TÉRREO;
3.4 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO;
3.5 FORMA E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE;
3.8 CHAPISCO E REBOCO DA ALVENARIA DO PLATIBANDA
4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	262
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	470		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	04/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 03/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
 01 - Mestre de Obra;
 01 - Almoxarife;
 01 - Aux. administrativo
 04 - Carpinteiro;
 10 - Pedreiro;
 13 - Servente;
 01 - Eletricista
 03 - Pintor;
 01 - Operador de caldeira;
 02 - Bombeiro Hidráulico;
 01 - Op. Betoneira;
 01 - Impermeabilizador
 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
 02 - Eletricista
 01 - Pedreiro
 03 - Aux. de serviços gerais
 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
 01 - Funileiro
 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
 - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
 - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
 - Montagem de dutos do 2º pavimento.
 - Chapisco e reboco de alvenaria do Platibanda.
 - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
 - Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
 - Contrapiso para regularização da caixa d'água.
 - Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 04/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
 01 - Mestre de Obra;
 01 - Almoxarife;
 01 - Aux. administrativo
 04 - Carpinteiro;
 10 - Pedreiro;
 13 - Servente;
 01 - Eletricista
 03 - Pintor;
 01 - Operador de caldeira;
 02 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

- 05 - Aux de funilaria
- 01 - Funileiro
- 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Confeção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Lavagem das paredes do auditório para recebimento de pintura.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
- Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
- Contrapiso para regularização da caixa d'agua.
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Assentamento de elemento vazado na área técnica.
- Colocação de telhas da cobertura do pavimento técnico.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	263
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	469		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	05/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 05/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo
04 - Carpinteiro;
10 - Pedreiro;
13 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Lavagem das paredes do auditório para recebimento de pintura.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
- Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
- Impermeabilização da caixa d'agua.
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Assentamento de elemento vazado na área técnica.
- Escavação de estacas da fundação do muro lateral.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	264
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	468		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	06/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:04/10/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.
3.2 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO.
3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.
3.4 LAVAGEM DAS PAREDES DO AUDITÓRIO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 02 E PAV. 01).
3.7 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
3.8 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.
3.9 REDE DE DRENAGEM DA ÁREA EXTERNA - CONFECÇÃO DE CAIXAS.
3.10 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECEBIMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DE DRENAGEM.
3.11 ASSENTAMENTO DE ELEMENTO VAZADO NA ÁREA TÉCNICA.
3.12 COLOCAÇÃO DE TELHAS DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:06/10/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
5 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.
- 3.2 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO.
- 3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.
- 3.4 LAVAGEM DAS PAREDES DO AUDITÓRIO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.
- 3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
- 3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 02 E PAV. 01).
- 3.7 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
- 3.8 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA.
- 3.9 REDE DE DRENAGEM DA ÁREA EXTERNA - CONFECÇÃO DE CAIXAS.
- 3.10 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECEBIMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DE DRENAGEM.
- 3.11 ASSENTAMENTO DE ELEMENTO VAZADO NA ÁREA TÉCNICA.
- 3.12 COLOCAÇÃO DE TELHAS DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.

4.0 - Ocorrências: sem ocorrências

Estamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	265
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	467		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	07/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	266
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	466		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	08/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	267
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	465		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	09/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 06/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo
04 - Carpinteiro;
10 - Pedreiro;
13 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pintor;
01 - Operador de caldeira;
02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Lavagem das paredes do auditório para recebimento de pintura.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
- Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
- Impermeabilização da caixa d'agua.
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Assentamento de elemento vazado na área técnica.
- Escavação de estacas da fundação do muro lateral.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 09/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

02 - Engenheiro Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
01 - Almoxarife;
01 - Aux. administrativo
04 - Carpinteiro;
10 - Pedreiro;
13 - Servente;
01 - Eletricista

02 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Op. Betoneira;
01 - Impermeabilizador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Cabeamento de dados do 3º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Lavagem das paredes do auditório para recebimento de pintura.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
- Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
- Impermeabilização da caixa d'agua.
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Assentamento de elemento vazado na área técnica.
- Escavação de estacas da fundação do muro lateral.
- Instalação de divisórias do San 04/ San 05 - 2º pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:09/10/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)

1 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

1 MESTRE DE OBRA

1 ALMOXARIFE

1 AUX. ADMINISTRATIVO

5 PEDREIRO

4 CARPINTEIRO

12 SERVENTE

1 IMPERMEABILIZADOR

1 ELETRICISTA

3 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 CALDEIREIRO

1 OPERADOR DE BETONEIRA

2 VIGIA

3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA

1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

4 ELETRICISTA

1 PEDREIRO

1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

5 AUXILIAR DE FUNILARIA

1 FUNILEIRO

1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.

3.2 CONFECCÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO.

3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.

3.4 LAVAGEM DAS PAREDES DO AUDITÓRIO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.

3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.

3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 02 E PAV. 01).

3.7 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.

3.8 CONTRAPISO PARA REGULARIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.

3.9 REDE DE DRENAGEM DA ÁREA EXTERNA - CONFECCÃO DE CAIXAS.

3.10 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECEBIMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DE DRENAGEM.

3.11 ASSENTAMENTO DE ELEMENTO VAZADO NA ÁREA TÉCNICA.

3.12 COLOCAÇÃO DE TELHAS DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	268
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	464		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	10/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 10/10/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Cabeamento de dados do 3º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01). - Forma, armação e concretagem da viga do gradil. - Impermeabilização da caixa d'agua. - Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas. - Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem. - Assentamento de elemento vazado na área técnica. - Escavação de viga e blocos da fundação do muro lateral. - Confecção de forma dos blocos de fundação do muro lateral. - Instalação de divisórias do San 04/ San 05 - 2º pavimento. 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	269
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	463		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	11/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 11/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;
 01 - Técnico em Edificações;
 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
 01 - Mestre de Obra;
 01 - Almoxarife;
 01 - Aux. administrativo
 04 - Carpinteiro;
 09 - Pedreiro;
 12 - Servente;
 01 - Eletricista
 03 - Pintor;
 01 - Operador de caldeira;
 02 - Bombeiro Hidráulico;
 01 - Op. Betoneira;
 01 - Impermeabilizador
 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
 02 - Eletricista
 01 - Pedreiro
 03 - Aux. de serviços gerais
 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
 01 - Funileiro
 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Cabeamento de dados do 3º pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
- Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
- Impermeabilização da caixa d'agua.
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Assentamento de elemento vazado na área técnica.
- Escavação de viga e blocos da fundação do muro lateral.
- Confeção de forma dos blocos de fundação do muro lateral.
- Instalação de divisórias do San 04/ San 05 - 1º pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	270
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	462		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	12/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	271
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	461		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	13/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

FiscalizaçãoContratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	272
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	460		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	14/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

FiscalizaçãoContratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	273
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	459		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	15/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	274
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	458		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	16/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 16/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;
 01 - Técnico em Edificações;
 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
 01 - Mestre de Obra;
 01 - Almoxarife;
 01 - Aux. administrativo
 04 - Carpinteiro;
 09 - Pedreiro;
 12 - Servente;
 01 - Eletricista
 03 - Pintor;
 01 - Operador de caldeira;
 02 - Bombeiro Hidráulico;
 01 - Op. Betoneira;
 01 - Impermeabilizador
 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
 02 - Eletricista
 01 - Pedreiro
 03 - Aux. de serviços gerais
 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
 01 - Funileiro
 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Cabeamento de dados do 3º pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
- Forma, armação e concretagem da viga do gradil.
- Impermeabilização da caixa d'agua.
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confeção de contrapiso da área técnica.
- Confeção de forma e concretagem dos blocos de fundação do muro lateral.
- Instalação de bancadas de granito - 3º pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ TARDE. DATA: 16/10/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

- 2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
- 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
- 1 MESTRE DE OBRA
- 1 ALMOXARIFE
- 1 AUX. ADMINISTRATIVO
- 5 PEDREIRO
- 4 CARPINTEIRO
- 12 SERVENTE
- 1 IMPERMEABILIZADOR
- 1 ELETRICISTA
- 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 CALDEIREIRO
- 1 OPERADOR DE BETONEIRA
- 2 VIGIA
- 3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
- 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
- 4 ELETRICISTA
- 1 PEDREIRO
- 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

- 5 AUXILIAR DE FUNILARIA
- 1 FUNILEIRO
- 1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.
- 3.2 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO.
- 3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.
- 3.4 CABEAMENTO DE DADOS DO 3º PAVIMENTO.
- 3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
- 3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 02 E PAV. 01).
- 3.7 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
- 3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.
- 3.9 REDE DE DRENAGEM DA ÁREA EXTERNA - CONFECÇÃO DE CAIXAS.
- 3.10 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECEBIMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DE DRENAGEM.
- 3.11 EXECUÇÃO DE CONTRAPISODA ÁREA TÉCNICA.
- 3.12 EXECUÇÃO DE FÔRMA E CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DO MURO LATERAL.
- 3.13 INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO - 3º PAVIMENTO

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	275
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	457		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	17/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

FiscalizaçãoContratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	276
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DÍAS FALTANTES	456		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	18/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 18/10/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Cabeamento de dados do 3º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01). - Impermeabilização da caixa d'agua. - Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas. - Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem. - Confecção de contrapiso da área técnica. - Confecção de forma e concretagem dos blocos de fundação do muro lateral. - Alvenaria do muro lateral. - Instalação de bancadas de granito - 3º pavimento. - Escavação para colocação de malha inferior do SPDA .					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ TARDE. DATA: 18/10/2023

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

- 2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
- 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
- 1 MESTRE DE OBRA
- 1 ALMOXARIFE
- 1 AUX. ADMINISTRATIVO
- 5 PEDREIRO
- 4 CARPINTEIRO
- 12 SERVENTE
- 1 IMPERMEABILIZADOR
- 1 ELETRICISTA
- 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 CALDEIREIRO
- 1 OPERADOR DE BETONEIRA
- 2 VIGIA
- 3 PINTOR

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
- 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
- 4 ELETRICISTA
- 1 PEDREIRO
- 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

- 5 AUXILIAR DE FUNILARIA
- 1 FUNILEIRO
- 1 SOLDADOR

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.
- 3.2 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO.
- 3.3 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.
- 3.4 CABEAMENTO DE DADOS DO 3º PAVIMENTO.
- 3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
- 3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 02 E PAV. 01).
- 3.7 FORMA, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA VIGA DO GRADIL.
- 3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.
- 3.9 REDE DE DRENAGEM DA ÁREA EXTERNA - CONFECÇÃO DE CAIXAS.
- 3.10 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECEBIMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DE DRENAGEM.
- 3.11 EXECUÇÃO DE CONTRAPISODA ÁREA TÉCNICA.
- 3.12 EXECUÇÃO DE FÔRMA E CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DO MURO LATERAL.
- 3.13 INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO - 3º PAVIMENTO

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	277
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	455		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	19/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 19/10/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Cabeamento de dados do 3º pavimento. - Confeção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Confeção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01). - Impermeabilização da caixa d'agua. - Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas. - Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem. - Alvenaria do muro lateral. - Instalação de bancadas de granito - 3º e 2º pavimento. - Escavação para colocação de malha inferior do SPDA .					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	278
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	454		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	20/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 20/10/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;
 01 - Técnico em Edificações;
 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
 01 - Mestre de Obra;
 01 - Almoxarife;
 01 - Aux. administrativo
 04 - Carpinteiro;
 09 - Pedreiro;
 12 - Servente;
 01 - Eletricista
 03 - Pintor;
 01 - Operador de caldeira;
 02 - Bombeiro Hidráulico;
 01 - Op. Betoneira;
 01 - Impermeabilizador
 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
 02 - Eletricista
 01 - Pedreiro
 03 - Aux. de serviços gerais
 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
 01 - Funileiro
 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Cabeamento de dados do 3º pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.
- Confeção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01).
- Impermeabilização da caixa d'agua.
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Alvenaria do muro lateral.
- Instalação de bancadas de granito - 3º e 2º pavimento.
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada
