



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR/RR

Despacho nº 1096/2023

Referência: 1.32.000.000003/2023-89

Assunto: Relatório técnico da 10ª medição da obra da Nova Sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima

Segue em anexo o relatório técnico da 10ª medição

Nota Fiscal Eletrônica de Referência R\$ 601.986,59 (seiscentos e um mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste R\$ 32.507,28 (trinta e dois mil quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.

Boa Vista, 21 de novembro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 10ª MEDIÇÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 10/2023		
INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA:		16 de janeiro de 2023
PERÍODO DO RELATÓRIO		De 20 de outubro a 20 de novembro de 2023
SERVIÇOS PREVISTOS PARA DÉCIMA MEDIÇÃO		Instalação de infraestrutura elétrica e SPDA, combate à incêndio, sistema de climatização, execução de alvenaria chapisco, emboço e emassamento, cabeamento, caixas de esgoto, revestimento cerâmico, divisórias dos sanitários, caixas de drenagem, instalação da cordoalha, colocação de meiofio.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF		
Nome:	Engenheiro Marcos Eduardo Silva Madureira	
Telefone:	(95) 3198-2005	
E-mail:	marcoseduardo@mpf.mp.br	
1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)		
Nome:	Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira	
Portaria:	SE/PR-RR nº02/2023	
Telefone:	(95) 3198-2025 / 2073	
E-mail:	prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br	
2.0 - ESCOPO E LOCAL		
DADOS DO CONTRATO:	Nº Contrato: 05/2022	PPA/LOA: AÇÃO 110E
Empresa Contratada	J. NASSER ENGNHARIA	CNPJ 04.618.096/0001-07

	LTDA			
Matrícula CEI da Obra	51.235.89823/71			
Valor Atual do Contrato	R\$31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)			
Percentual de reajuste	5,40%			
Saldo de Empenho	5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022			
Local/UF	Boa Vista – RR			
Responsável Técnico	José Nasser – ART de Execução: RR20230111507			
Corresponsável Técnico	Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835			
Nota Fiscal Eletrônica de Referência	R\$ 601.986,59 (seiscentos e um mil e novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)			
Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste	R\$ 32.507,28 (trinta e dois mil quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.			
DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA				
Medição nº	% Previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
3	1,16%	0,75%	1,40%	1,25%
4	0,88%	0,66%	1,93%	1,91%
5	1,64%	1,29%	3,57%	3,21%
6	1,94%	1,25%	5,51%	4,46%
7	0,95%	1,29%	4,93%	5,75%
8	1,17%	2,11%	6,10%	7,85%
9	1,83%	2,13%	7,93%	9,98%
10	2,86%	1,91%	10,79%	11,88%
TOTAL EXECUTADO				11,88%
TOTAL A EXECUTAR				88,12%
Identificação do processo de fiscalização		1.32.000.000464/2022-71		
Tipo de obra		Prédio Público		
Objeto da fiscalização		Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima		
Período abrangido pela fiscalização		20/10/2023 a 20/11/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)		

3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a serviço de alvenaria/chapisco/emboço, colocação de granito (divisórias e bancadas), instalações hidrossanitários, instalação de incêndio, sistema de climatização (envelopamento e tubulação), instalações de infra de elétrica como interruptor e tomada baixa ou alta, fiação de iluminação e tomada/interruptor, instalação da cordoalha do SPDA, aplicação de selador e massa latéx em paredes, movimentação de terra, confecção das caixas de drenagem de água pluviais, junto com a tubulação do sistema, confecção das caixas de passagem e tubulação de esgoto, revestimento de piso e parede com cerâmica, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: IMPERMEABILIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA;

Constatação do Período nº 2: Foi observado um funcionário sem cinto e fora da área da barreira de proteção, realizando tarefas na beira da laje do primeiro pavimento, caso acontecesse uma queda para o térreo esta seria de mais de três metros;

Constatação do Período nº 3: Em consulta ao sistema do MPF, no dia 20/11/2023, ficou constatado que os funcionários das subcontratadas não possuem o certificados de cursos referentes à NR-35, trabalhos em altura, assim a Ocorrência 1 tem mais esse agravante. Se a empresa possui tal certificado fica recomendado a entrega dele ao MPF;

Constatação do Período nº 4: Mestre de obra operou maquinário, restroescavadeira, sem a devida autorização, o mesmo foi alertado a sair do maquinário e chamar o operador de retorescavadeira, mas ele se recusou e continuou operando a máquina até o local de armazenamento dela.

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

A) Em resposta a Carta 36/2023 AM - JNASSER ENGENHARIA LTDA venho através deste, esclarecer que a execução da rede de águas pluviais/drenagem deverá ser conforme o projeto atual, sem necessidade de mudanças. Decisão tomada em conjunto com a engenharia da SEA.

B) Após a apresentação do projeto de arquitetura, onde através das plantas Baixas de Reforma e plantas Baixas de Layout, foram aprovado pela PR-RR e SEA. Serão apresentadas o novo Layout para os órgãos do MPT e MPM.

C) O engenheiro mecânico da equipe da SEA realizou análise da equivalência técnica dos equipamentos de climatização propostos pela J. NASSER Engenharia.

6.0 – CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.	
7.0 – ANEXOS	
A) 13.0 Relatório fotográfico do período	
8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO	
Boa Vista – Roraima, 20 de novembro de 2023	
9.0 - FÉ DO MEMBRO DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022	
Declaramos que as metas estabelecidas na 10ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas.	
 Marcos Eduardo Silva Madureira Engenheiro Civil/Membro da Comissão	
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	
10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL	
☐ Não foram identificados vícios. ☐ Ver Nota Técnica ou Despacho constante da _____ folha _____ de n.º. _____	 Igor José Barbosa Duarte Lopes Secretário Estadual
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 10ª MEDIÇÃO

11.0 - A DÉCIMA MEDIÇÃO FOI EFETUADA PELO FISCAL DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, MATRÍCULA 31143, NO DIA 20/11/2023

11.1 - Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma (%)	Percentual executado <i>in loco</i> (%)	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E PROTEÇÃO	84,90%	86,06%		X
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,05%	5,33%		X
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO	0,00%	4,79%		X
ESTRUTURAS DE CONCRETO				
GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS	12,35%	29,13%		X

ARQUITETURA				
VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS, ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	8,65%	9,68%		X
IMPERMEABILIZAÇÃO				
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	62,02%	53,88%	X	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				
ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO	4,11%	7,75%		X
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E SPRINKLERS	30,04%	26,35%	X	
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				
SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO	15,24%	13,58%	X	
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV,	10,16%	10,15%	X	
CLIMATIZAÇÃO				
ÁGUA GELADA, VRF, SPLIT, VENTILAÇÃO MECÂNICA-, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS, LIGACÕES E DUTOS DE AR	7,71%	13,28%		X
SERVIÇOS GERAIS				
TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS	44,20%	48,23%		X

BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				
INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA	10,79%	11,89%		X

12.0 SEGUE ABAIXO A PLANILHA CONTENDO O RESUMO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E PACTUADOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

Item	Descrição	Unid.	MEDIÇÃO ACUMULADA	EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS		
			%	Mês 10		
				Medição Unitária	% executado	Valor com BDI
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.3.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M3	23,22%	256,18	6,19%	466,24
1.4	PROTEÇÃO					
1.4.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA PROTEÇÕES - ROLO DE 4X100M - 80 MICRAS	M2	49,71%	252,50	7,89%	757,50
	Subtotais		86,06%			1.223,74
2.	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS					
2.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2.1.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2/MÊS	0,90%	50,40	0,45%	259,56
2.1.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	M/MÊS	64,86%	68,36	10,68%	1.058,89
	Subtotais		5,33%			1.318,45
3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1	LIMPEZA DO TERRENO					
3.1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	100,00%	3,00	100,00%	347,79
3.1.3	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	100,00%	3,00	100,00%	553,29
3.2	ESCAVAÇÕES					
3.2.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M2	18,44%	76,86	15,37%	302,82
3.3	ATERRO E REATERRO					
3.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	3,93%	64,13	1,33%	4.839,24
	Subtotais		4,79%			6.043,14
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO					
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO - GRADIL					
4.1.7	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	92,68%	11,90	92,68%	573,81
4.2	ESTRUTURA DE CONCRETO E VEDAÇÃO - MURO					
4.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	100,00%	45,00	100,00%	370,35
4.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	100,00%	45,00	100,00%	2.047,05
4.2.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. DE 3,4 ATÉ 6,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM	KG	99,99%	36,80	38,23%	775,74
4.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, PILARES, BALDRAMES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	100,00%	18,02	42,90%	1.691,71
4.2.9	ESCORAMENTO DE LAJES E VIGAS COM ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	100,00%	20,00	100,00%	243,60
4.2.10	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA – CONFORME PROJETO	UN	100,00%	1,00	100,00%	3.969,43
	Subtotais		29,13%			9.671,69
5.	ARQUITETURA					
5.1	VEDAÇÕES					
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO).	M²	96,75%	1,64	0,45%	153,70
5.1.4	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	71,08%	60,12	33,03%	55.187,75
5.1.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), VERDE, COM DUAS FACES E ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	22,97%	33,53	22,97%	5.048,61
5.2	PISOS					
5.2.8	PISO EM PORCELANATO 90X90CM, SUPERFÍCIE NATURAL RETIFICADO - REF.: MINERAL OFF WHITE, NATURAL RETIFICADO DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	M²	15,08%	140,10	7,14%	54.682,43
5.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS					
5.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60 CM - COM REJUNTE ACRÍLICO - REF.: PORTOBELLO BIANCO ACETINADO RETIFICADO OU EQUIVALENTE	M²	55,41%	355,88	23,59%	72.204,49
5.8	PINTURA					
5.8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	46,19%	467,38	4,14%	7.716,44
5.8.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M²	2,72%	26,25	0,44%	647,06
5.9	PISOS					
5.9.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	51,06%	8,00	17,02%	1.141,44
5.9.9	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,86%	1,00	14,29%	237,28

5.9.11	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA LAVATÓRIO L=55,0 CM COM SAIA L=7,0 CM E RODABANCA L=10,0 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	49,09%	7,35	16,36%	7.464,07
5.9.12	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA L=60,0 CM COM SAIA DUPLA E RODABANCA L=10,0 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	63,70%	5,10	21,23%	5.103,51
5.12	URBANIZAÇÃO					
5.12.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	9,50%	125,15	9,50%	8.761,75
Subtotais			9,68%			218.348,53
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO					
6.1	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO					
6.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	54,70%	57,49	6,56%	3.225,76
6.1.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	M²	34,46%	32,46	4,96%	3.354,74
6.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M²	50,56%	118,64	5,65%	6.951,11
6.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER E IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESINA TERMOPLÁSTICA	M²	68,67%	89,90	15,87%	11.325,60
Subtotais			53,88%			24.857,21
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS					
7.1	ÁGUA FRIA					
7.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,41%	8,50	2,38%	239,70
7.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,63%	13,30	8,31%	760,09
7.2	ESGOTO SANITÁRIO					
7.2.5	TUBO PVC ESGOTO OU ÁGUA PLUVIAL PREDIAL DN 150MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	57,29%	76,19	57,29%	8.038,04
7.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	17,47%	36,57	17,47%	2.909,14
7.2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	82,36%	31,19	82,36%	1.107,86
7.2.9	PINTURA DE TUBOS / ELETRODUTOS COM ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	0,00%			0,00
7.2.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM + PROLONGADOR (EXCLUSIVE GRELHA E PORTA GRELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55,56%	3,00	16,67%	133,47
7.3	ÁGUAS PLUVIAIS					
7.3.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	22,55%	158,10	22,55%	19.563,29
7.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	36,80%	53,50	18,10%	4.255,92
7.3.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	38,06%	96,75	38,06%	3.436,56
Subtotais			7,75%			40.444,07
8.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
8.4	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					
8.4.1	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIÂMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,69%	90,49	4,52%	4.396,00
8.4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	10,92%	52,00	10,92%	2.337,40
8.4.5	SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,23%	92,00	15,23%	2.511,60
8.4.7	PINTURA DE TUBOS / ELETRODUTOS COM ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS (DIÂMETROS VARIADOS)	M	8,69%	173,83	8,69%	1.329,80
8.5	HIDRANTES					
8.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM) - CLASSE MÉDIA, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	99,70%	33,55	13,86%	9.825,78
8.5.4	PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA - 2 DEMÃOS DE TINTA BETUMINOSA + FITA DE PROTEÇÃO (TOROFITA)	M	62,14%	13,05	62,14%	1.177,76
8.5.5	SUORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,69%	4,00	2,38%	109,20
Subtotais			26,35%			21.687,53
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA					
9.3	INFRAESTRUTURA					
9.3.12	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIÂMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,23%	177,89	4,71%	8.641,89

9.3.13	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 25 (1") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,87%		18,71	0,95%	1.104,26
9.3.14	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 2,25 MM - DIAMETRO NOMINAL 50 (2") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,33%		24,35	6,06%	2.822,89
9.3.16	SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,47%		71,00	2,15%	1.938,30
9.3.20	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, DE 2" (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,54%		360,00	18,54%	4.597,20
9.3.21	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, DE 4" (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,93%		60,00	18,93%	1.198,20
9.4	CONDUTORES E CABOS						
9.4.1	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 50 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,36%		7.215,52	10,70%	34.490,18
9.8	SPDA E ATERRAMENTO						
9.8.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	41,12%		161,30	26,93%	12.063,62
	Subtotais		13,58%				66.856,54
12.	CLIMATIZAÇÃO						
12.5	TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA						
12.5.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 25 MM (1")	M	49,35%		29,91	24,93%	2.883,32
12.5.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4")	M	46,98%		10,10	9,18%	1.273,30
12.5.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 40 MM (1 1/2")	M	66,52%		12,72	50,88%	1.859,53
12.5.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 50 MM (2")	M	9,49%		8,54	9,49%	1.415,16
12.6	TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA - CONEXÕES						
12.6.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,09%		6,00	13,04%	618,90
12.6.5	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00%		9,00	25,00%	1.347,39
12.6.10	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,67%		2,00	33,33%	178,44
12.6.21	TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 32 X 25 MM (1 1/4 X 1")	UN	100,00%		2,00	100,00%	217,46
12.6.22	TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50 X 25 MM (2 X 1")	UN	50,00%		2,00	50,00%	363,32
12.6.23	TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50 X 32 MM (2 X 1 1/4")	UN	50,00%		1,00	50,00%	181,66
12.9	DUTOS DE AR						
12.9.3	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #24	M²	38,84%		269,29	11,80%	48.873,44
12.9.4	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #26	M²	40,76%		1,89	0,49%	258,74
12.12	ISOLAMENTO TÉRMICO - TUBULAÇÕES E DUTOS						
12.12.15	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ALUMINIZADA - MANTA DE 15 MM - ARMADUCT OU EQUIVALENTE	M2	48,77%		294,35	13,28%	92.711,41
12.13	SUPORTES - TUBULAÇÕES E DUTOS						
12.13.1	SUPORTE PARA TUBOS/ DUTOS/ ELETROCALHA HORIZONTAIS (CHUMBADORES, TIRANTES, PERFILADO E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,93%		57,00	7,60%	3.921,03
12.13.3	SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,33%		22,00	14,67%	600,60
	Subtotais		13,28%				156.703,70
14.	SERVIÇOS GERAIS						
14.1	TRANSPORTE DE MATERIAL						
14.1.1	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	35,07%		33,82	4,34%	2.243,61
14.2	LIMPEZA DA OBRA						
14.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	41,61%		4,16	4,16%	1.673,19
	Subtotais		48,23%				3.916,80
	Subtotais						551.071,41
	TOTAL GERAL sem BDI e sem ADMINISTRAÇÃO						551.071,41
15.	ADMINISTRAÇÃO						
15.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
15.1.1	INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	%	11,89%		0,02	1,91%	1.928,12
15.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	11,89%		0,02	1,91%	39.927,92
15.1.5	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	11,89%		1,91	1,91%	9.059,15
	Subtotais		11,89%				50.915,19
	ADMINISTRAÇÃO						50.915,19

	% Realizado	TOTAL R\$
TOTAL R\$	1,91%	601.986,59

TABELA PARA O REAJUSTE													
DESCRIÇÃO	SUBTOTAL COM BDI	PREVISTO	REALIZADO	ESTÁ EM ATRASO		VALOR EM ATRASO NO MOMENTO DO SEGUNDO REAJUSTE	VALOR ADIANTADO NO MOMENTO DO SEGUNDO REAJUSTE	VALOR EXECUTADO NA 8ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 8ª MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NA 9ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 9ª MEDIÇÃO	VALOR EXECUTADO NA 10ª MEDIÇÃO	VALOR ACUMULADO NA 10ª MEDIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 76.116,52	R\$ 56.885,15	R\$ 56.885,15	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404,97	R\$ 307,56	R\$ 1.703,07	R\$ 399,53	R\$ 1.223,74	R\$ 465,61
		74,73%	74,73%		😊								
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 166.895,56	R\$ 1.719,89	R\$ 1.719,89	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.058,89	R\$ 245,23	R\$ 1.318,45	R\$ 316,43	R\$ 1.318,45	R\$ 387,62
		1,03%	1,03%		😊								
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 372.192,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.767,83	R\$ 635,46	R\$ 6.043,14	R\$ 961,79
		0,00%	0,00%		😊								
ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 387.887,79	R\$ 31.938,44	R\$ 31.938,44	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.103,86	R\$ 1.847,41	R\$ 37.166,14	R\$ 3.854,38	R\$ 9.671,69	R\$ 4.376,65
		8,23%	8,23%		😊								
ARQUITETURA	R\$ 10.883.731,21	R\$ 290.256,85	R\$ 290.256,85	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.591,17	R\$ 18.609,15	R\$ 199.875,41	R\$ 29.402,42	R\$ 218.348,53	R\$ 41.193,24
		2,67%	2,67%		😊								
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 459.919,12	R\$ 58.671,64	R\$ 58.671,64	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.958,58	R\$ 7.366,98	R\$ 27.845,05	R\$ 8.870,62	R\$ 24.857,21	R\$ 10.212,90
		12,76%	12,76%		😊								
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 944.990,20	R\$ 7.053,63	R\$ 7.053,63	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,41	R\$ 825,31	R\$ 10.412,70	R\$ 1.387,60	R\$ 40.444,07	R\$ 3.571,58
		0,75%	0,75%		😊								
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.193.101,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.121,53	R\$ 14.355,97	R\$ 26.817,64	R\$ 15.804,12	R\$ 21.687,53	R\$ 16.975,25
		0,00%	0,00%		😊								
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	R\$ 5.365.186,69	R\$ 24.793,36	R\$ 24.793,36	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.591,72	R\$ 28.965,78	R\$ 100.659,00	R\$ 34.401,36	R\$ 66.856,54	R\$ 38.011,62
		0,46%	0,46%		😊								
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1.087.133,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,61	R\$ 110.086,95	R\$ 5.957,31	R\$ 0,00	R\$ 5.957,31
		0,00%	0,00%		😊								
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	2.540.238,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		😊								
CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.455.597,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.089,40	R\$ 18.957,46	R\$ 83.954,45	R\$ 23.491,00	R\$ 156.703,70	R\$ 31.953,00
		0,00%	0,00%		😊								
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 756.454,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		0,00%	0,00%		😊								
SERVIÇOS GERAIS	234.157,38	R\$ 82.137,65	R\$ 82.137,65	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.406,47	R\$ 1.268,10	R\$ 3.385,77	R\$ 1.450,94	R\$ 3.916,80	R\$ 1.662,44
		35,08%	35,08%		😊								
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.672.342,00	R\$ 51.175,29	R\$ 51.175,29	SIM	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.265,28	R\$ 8.570,53	R\$ 56.821,08	R\$ 11.638,87	R\$ 50.915,19	R\$ 14.388,29
		1,91%	1,91%		😊								
TOTAIS EM ATRASO OU ADIANTADO SEGUNDO O CRONOGRAMA APÓS A QUARTA MEDIÇÃO.						0,00	R\$ 0,00		R\$ 35.923,08		R\$ 36.277,93		R\$ 32.507,28



ÍNDICE INCC-DI, ACUMUALADO ATÉ MAIO DE 2023 FGV	5,40%	PREÇO TOTAL DO CONTRATO	R\$ 31.595.942,84
---	-------	-------------------------	-------------------

Cronograma 06/04		Cronograma 28/06	
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 5ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$281.102,49		
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 6ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$392.742,49		
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 7ª PARCELA DE MEDIÇÃO.	R\$401.584,41		
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 8ª PARCELA DE MEDIÇÃO.		R\$665.242,28	
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 9ª PARCELA DE MEDIÇÃO.		R\$671.813,53	
VALORES SOBRE OS QUAIS DEVEM INCIDIR O REAJUSTE NA 10ª PARCELA DE MEDIÇÃO.		R\$601.986,59	

		REAJUSTE	MEDIÇÃO	TOTAL
VALORES A PAGAR PELO MPF 5ª MEDIÇÃO	=	R\$15.179,53	R\$408.691,94	R\$423.871,47
VALORES A PAGAR PELO MPF 6ª MEDIÇÃO	=	R\$21.208,09	R\$395.621,29	R\$416.829,38
VALORES A PAGAR PELO MPF 7ª MEDIÇÃO	=	R\$21.685,56	R\$406.964,62	R\$428.650,18
VALORES A PAGAR PELO MPF 8ª MEDIÇÃO	=	R\$35.923,08	R\$665.242,28	R\$701.165,36
VALORES A PAGAR PELO MPF 9ª MEDIÇÃO	=	R\$36.277,93	R\$671.813,53	R\$708.091,46
VALORES A PAGAR PELO MPF 10ª MEDIÇÃO	=	R\$32.507,28	R\$601.986,59	R\$634.493,87

13.0 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

13.1 CLIMATIZAÇÃO

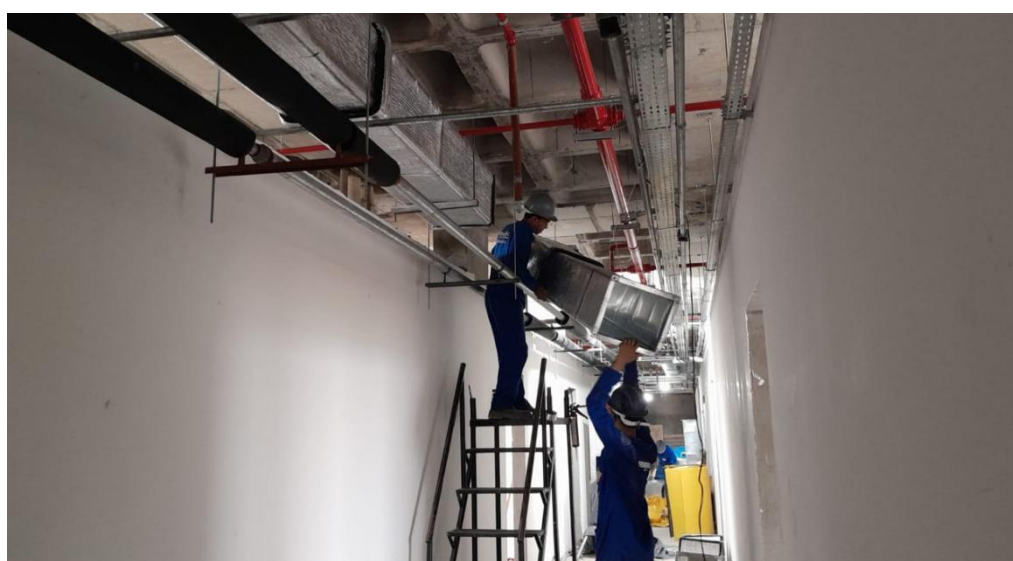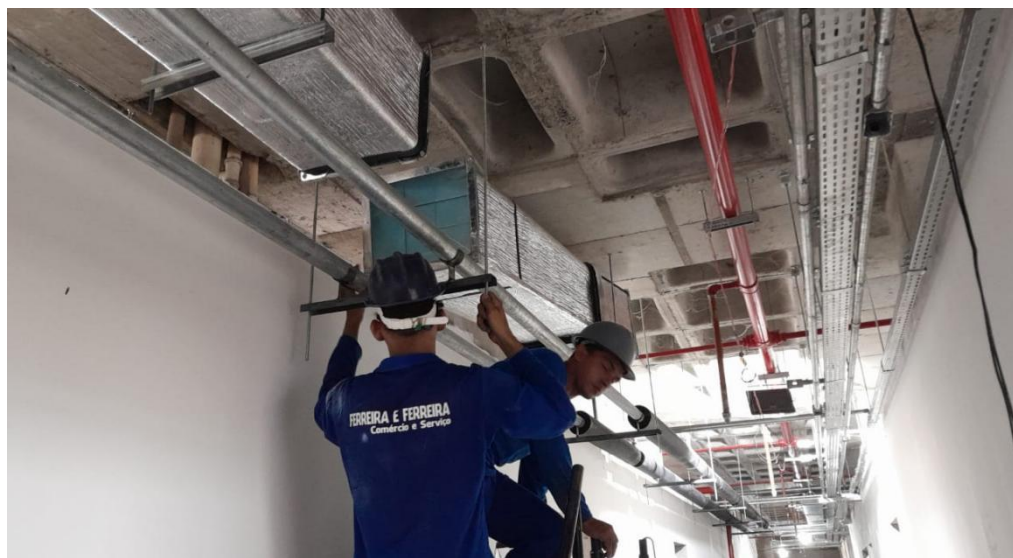













13.2 CORDOALHA

























13.3 ELÉTRICA








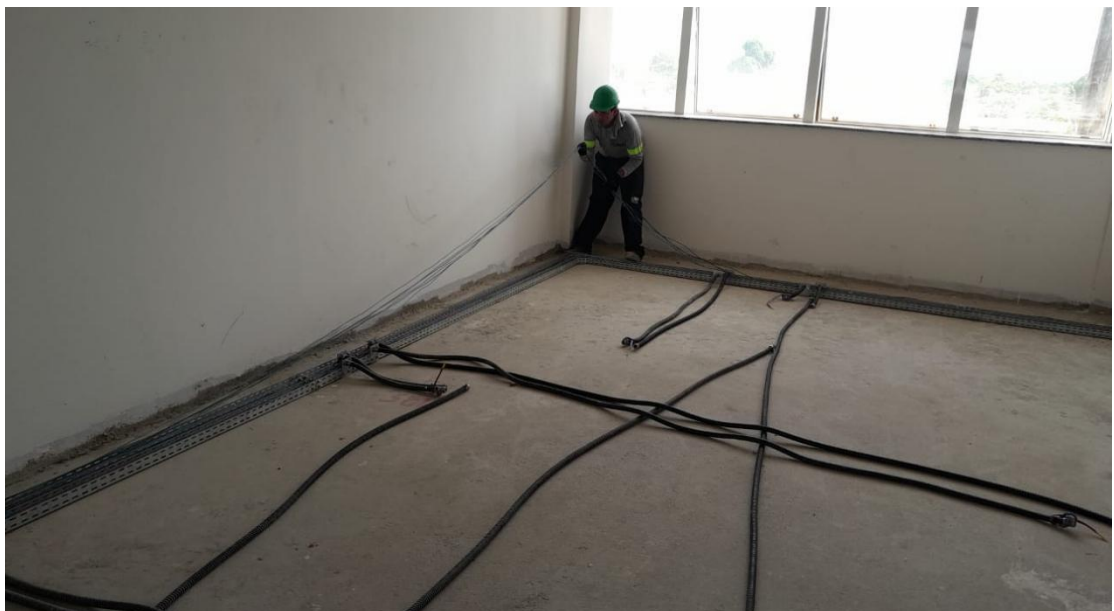


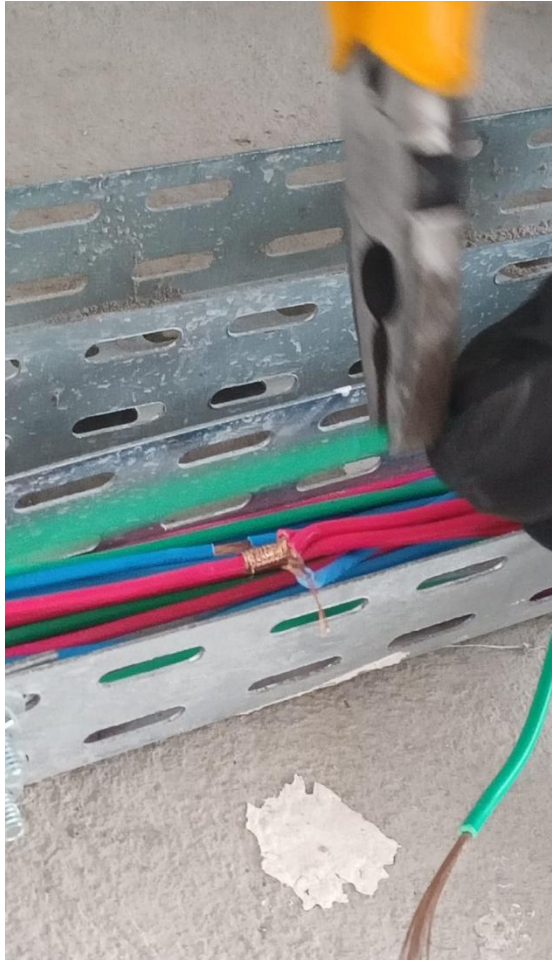






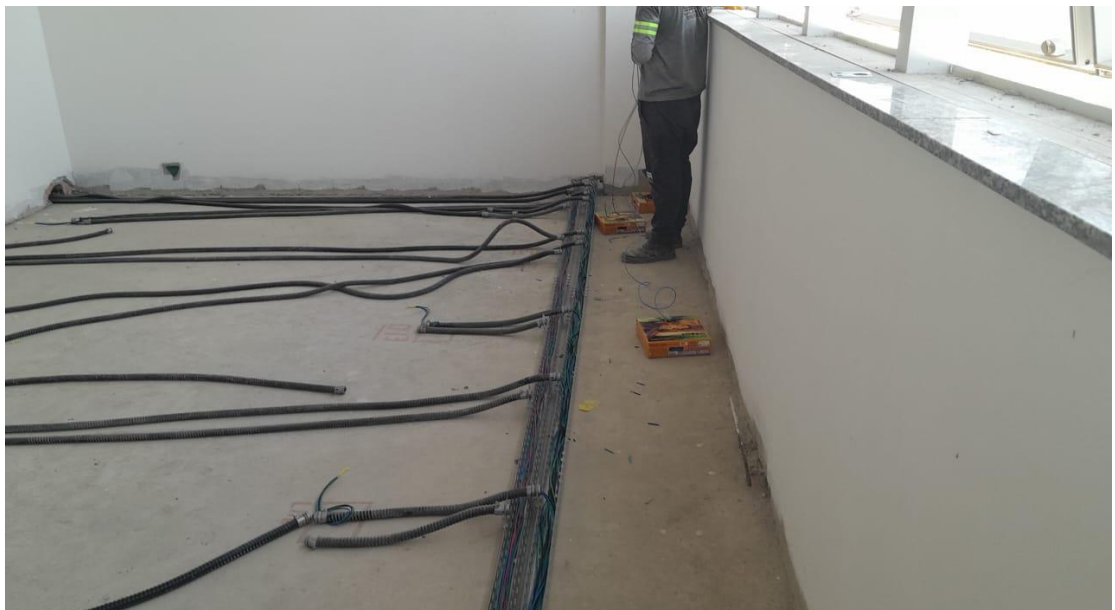

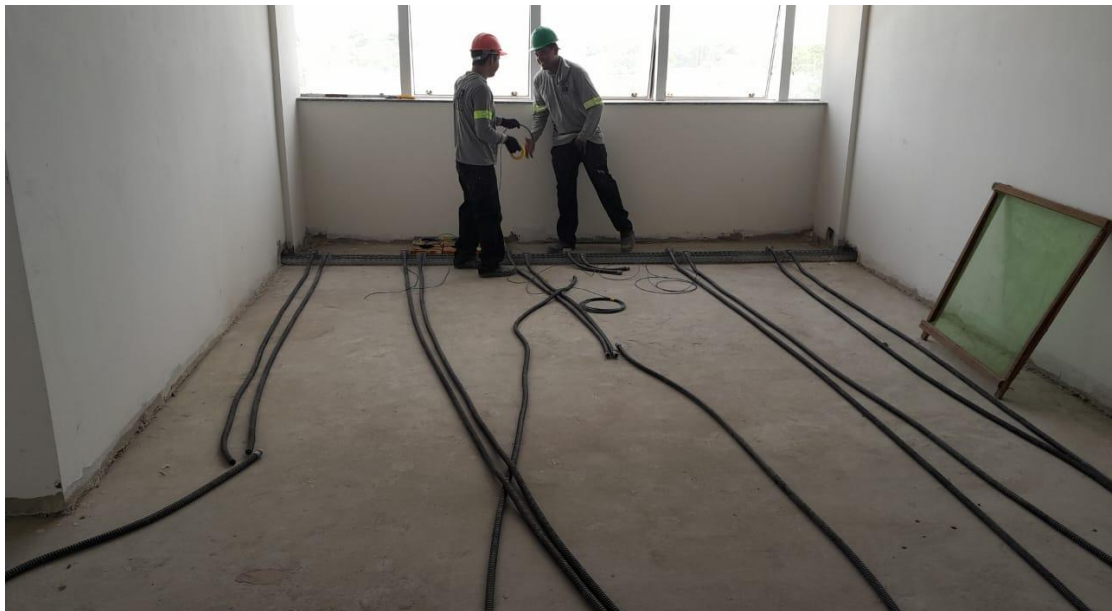

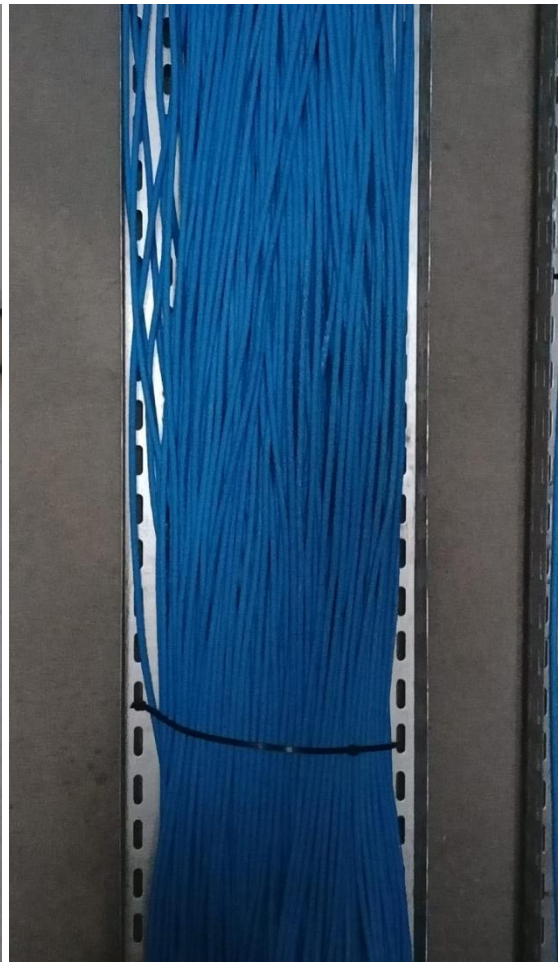







13.4 MEIO-FIO









13.5 PORCELANATO















13.6 REDE DE DRENAGEM















13.7 REDE DE ESGOTO



















13.8 INCÊNDIO











13.9 GRANITO







13.10 OUTROS

























14.0 - CONTROLE DE RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA

Descrição do item	Data da retirada do entulhos da obra
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	06/10/2023 00116
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	11/10/2023 00224
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	17/10/2023 00221
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	25/10/2023 00285
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	25/10/2023 00296
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	30/10/2023 00333
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	06/11/2023 00370
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	13/11/2023 00429
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	14/11/2023 00434

15.0 - RELAÇÃO DOS COLABORADORES COM A FUNÇÃO NA EMPRESA J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	Colaborador	Função
1	ALCIDES NOGUEIRA SENA NETO	AUX. ADMINISTRATIVO
2	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
3	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
4	ANANIAS VIEIRA DA SILVA	SERVENTE
5	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
6	ANTONIES DIEGO DE SOUZA CORDEIRO	SERVENTE
7	ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	CARPINTEIRO
8	ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	ELETRICISTA
9	BRUNO SILVA CASTRO	SERVENTE
10	DARLISON COSMOS PENA	BOMBEIRO HIDRAULICO

11	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
12	DIEGO SIMAO BURUM	SERVENTE
13	ELIEZIO MEIRELE RODRIGUES	PEDREIRO
14	ELIZEU LIMA DA SILVA	SERVENTE
15	ERIVAN LOURENÇO MACHADO	PEDREIRO
16	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA
17	FELIPE GRALHADA OLIVEIRA	SERVENTE
18	FRANCISCO EMICIO	BOMBEIRO HIDRAULICO
19	GILVAN LEITE RIBEIRO	PEDREIRO
20	IGOR ANTONIO PINO	PINTOR
21	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVENTE
22	JOSE MARCELO ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR	MESTRE DE OBRAS
23	JOSE RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
24	JOSÉ VERAS BARROS	OP. BETONEIRA
25	JOSINALDO DA SILVA ALMEIDA	CARPINTEIRO
26	JUVENAL GUILHERME SOBRINHO	CALDEIREIRO
27	JOSE MARIA FROTA CONRADO	PINTOR
28	LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA	ALMOXARIFE
29	MARLON BORGES PEREIRA	TECNICO DE SEGURANÇA
30	MOISES FERREIRA CHAVES	CARPINTEIRO
31	NILDO OLIVEIRA DA SILVA	PEDREIRO
32	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
33	RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE	PEDREIRO
34	RAUDI RAFAEL MARTINES	CARPINTEIRO
35	RONNY DE SOUZA ANICETO	SERVENTE
36	SEBASTIÃO ASSIS DE FREITAS	PINTOR
37	SERGIO GOMES DA SILVA	SERVENTE

39	SIVANILSON VIERA DA SILVA	PEDREIRO
38	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
40	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA
41	YANN PEREIRA NUNES	SERVENTE
42	ZEDEQUIAS DOS SANTOS	IMPERMEABILIZADOR

15.1 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).

Nº	Colaborador	Função
1	DANIEL ASSIS CARNEIRO	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO	ELETRICISTA
3	GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ	ELETRICISTA
4	JORGE LUIZ GOZALEZ LOPES	PEDREIRO
5	RIBAMAR SILVA SANTANA	ELETRICISTA
6	ROMÁRIO DA SILVA BENTO	ELETRICISTA
7	SIMON ENRIQUE OLIVEROS LINARES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
8	FABIO VIEIRA DA SILVA	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

15.2 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa FERREIRA & FERREIRA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Nº	Colaborador	Função
1	ALLAN GUIMARÃES FARIAS	AUXILIAR DE FUNILARIA
2	SAMUEL LOBATO	FUNILEIRO
3	LUIZ MIGUEL MAURERA	AUXILIAR DE FUNILARIA
4	MIGUEL ALEXANDER JIMENES RIVAS	AUXILIAR DE FUNILARIA

16.0 - A FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO SERÁ DEFINIDA PELA SOMA DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS OCORRÊNCIAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, CONFORME TABELA ABAIXO:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre da Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada

61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 - Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5
4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3

8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4
10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6
12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12

16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24
17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção

16.2 - Ocorrência 1: Consta-se que o trabalhador da FERREIRA & FERREIRA- SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO) executava uma atividade na beirada de uma laje sem cinto de segurança ou barreira de proteção. Ocorrência foi no dia 31/10/2023

Ocorrência 2: Em consulta ao sistema do MPF, no dia 20/11/2023, ficou constatado que os funcionários das subcontratadas não possuem o certificados de cursos referentes à NR-35, trabalhos em altura, assim a Ocorrência 1 tem mais esse agravante. Se a empresa possui tal certificado fica recomendado a entrega dele ao MPF.



Ocorrência 3: Mestre de obra operou maquinário, retroescavadeira, sem a devida autorização, o mesmo foi alertado a sair do maquinário e chamar o operador de retroescavadeira, mas ele se recusou e continuou operando a máquina até o local de armazenamento dela. Ocorrência foi no dia 16/11/2023



17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 - Pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 - Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.

17.3 - A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme a tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção	Por dia e por	1	2

	individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	empregado/ Colaborador		
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	1	2
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	1	11
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				15
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: 0,50%				

18.0 - ANEXO: DIÁRIOS DE OBRA

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	278
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	454	DATA	20/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 20/10/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Cabeamento de dados do 3º pavimento. - Confeção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Confeção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 02 e Pav. 01). - Impermeabilização da caixa d'agua. - Rede de drenagem da área externa - confeção de caixas. - Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem. - Alvenaria do muro lateral. - Instalação de bancadas de granito - 3º e 2º pavimento. - Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA . 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	279
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	453	DATA	21/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	280
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	452	DATA	22/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	281
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	451	DATA	23/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 23/10/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã: Chuva forte e tarde: Tempo nublado					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Cabeamento de dados do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.					
- Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 01).					
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.					
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Alvenaria do muro lateral.					
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	282
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	450	DATA	24/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 24/10/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Cabeamento de dados do 3º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.					
- Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 01).					
- Rede de drenagem da área externa - confecção de caixas.					
- Escavação de valas para recebimento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Alvenaria do muro lateral.					
- Fôrma e concreto dos pilares dos muros.					
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .					
4 - Ocorrências: Sem ocorrencias					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	283
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	449	DATA	25/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:25/10/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 1 AUX. ADMINISTRATIVO 5 PEDREIRO 4 CARPINTEIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 CALDEIREIRO 1 OPERADOR DE BETONEIRA 2 VIGIA 3 PINTOR 2.1- SUBCONTRATAÇÃO: 2.1.1-RR DOMÓTICA 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 4 ELETRICISTA 1 PEDREIRO 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL 2.1.2- FERREIRA E FERREIRA 5 AUXILIAR DE FUNILARIA 1 FUNILEIRO 1 SOLDADOR 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO. 3.2 CABEAMENTO DE DADOS DO 3º PAVIMENTO. 3.3 CONFECCÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO. 3.4 CONFECCÃO DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO. 3.5 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO. 3.6 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO. 3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 01). 3.8 REDE DE DRENAGEM DA ÁREA EXTERNA - CONFECCÃO DE CAIXAS. 3.9 ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA RECEBIMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DE DRENAGEM. 3.10 ALVENARIA DO MURO LATERAL. 3.11 FÔRMA E CONCRETO DOS PILARES DOS MUROS. 3.12 COLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE 50MM² DA MALHA INFERIOR DO SPDA . 4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	284
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	448	DATA	26/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 26/10/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoхарife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 01). - Aplicação de chapisco e reboco do muro lateral. - Fôrma e concreto de vigas dos muros. - Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA . - Escavação para assentamento de meio- fio. 4 - Ocorrências: Após levantamento Planialtimétrico do Terreno realizado pela construtora, com objetivo de verificar as cotas de níveis de piso acabado de estacionamento, fundo de igarapé, poço de visita da concessionária de esgoto. Com a execução conforme projeto fornecido à Construtora, a rede de drenagem que possui 425m de comprimentos e declividade 0,5%, a tubulação em concreto armado com diâmetro de 500mm chega 63 cm acima do leito do igarapé. A construtora solicita orientação quanto a execução da rede de águas pluviais/drenagem, e se diante do exposto acima a obra segue com a execução conforme projeto, ou se a Fiscalização fará um novo projeto para execução. Outra situação relevante para o andamento de serviços da obra, é REDE DE ESGOTO conforme projeto, a caixa de passagem anterior a ETE possui profundidade de 1,50m. Conforme levantamento planialtimétrico, o poço de visita da CAER localizado à frente da obra tem profundidade 1,20m. Logo, todo o esgoto da obra após tratamento da ETE, terá que ser bombeado. O serviço encontra-se paralisado até a obra a fiscalização dar retorno. Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	285
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	447		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	27/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA				
Diário de Obra - Data: 27/10/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hdrante e Sprinkler do auditório. - Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 01). - Aplicação de chapisco e reboco do muro lateral. - Fôrma e concreto de vigas dos muros. - Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA . - Escavação para assentamento de meio- fio. 4 - Ocorrências: Após levantamento Planialtimétrico do Terreno realizado pela construtora, com objetivo de verificar as cotas de níveis de piso acabado de estacionamento, fundo de igarapé, poço de visita da concessionária de esgoto. Com a execução conforme projeto fornecido à Construtora, a rede de drenagem que possui 425m de comprimentos e declividade 0,5%, a tubulação em concreto armado com diâmetro de 500mm chega 63 cm acima do leito do igarapé. A construtora solicita orientação quanto a execução da rede de águas pluviais/drenagem, e se diante do exposto acima a obra segue com a execução conforme projeto, ou se a Fiscalização fará um novo projeto para execução. Outra situação relevante para o andamento de serviços da obra, é REDE DE ESGOTO conforme projeto, a caixa de passagem anterior a ETE possui profundidade de 1,50m. Conforme levantamento planialtimétrico, o poço de visita da CAER localizado à frente da obra tem profundidade 1,20m. Logo, todo o esgoto da obra após tratamento da ETE, terá que ser bombeado. O serviço encontra-se paralisado até a fiscalização dar retorno. Estamos a disposição para esclarecimentos				

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO				

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	286
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	446	DATA	28/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 28/10/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoхарife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Limpeza de pele interna de pele de vidro. - Corte de três árvores. - Remoção de troncos de três árvores. - Montagem de dutos do 2º pavimento. 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos	
RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	287
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	445	DATA	29/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	288
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	444		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	30/10/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 28/10/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.					
- Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 01).					
- Aplicação de chapisco e reboco do muro lateral.					
- Fôrma e concreto de vigas dos muros.					
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .					
- Escavação para assentamento de meio- fio.					
4 - Ocorrências: Após levantamento Planialtimétrico do Terreno realizado pela construtora, com objetivo de verificar as cotas de níveis de piso acabado de estacionamento, fundo de igarapé, poço de visita da concessionária de esgoto. Com a execução conforme projeto fornecido à Construtora, a rede de drenagem que possui 425m de comprimentos e declividade 0,5%, a tubulação em concreto armado com diâmetro de 500m chega 63 cm acima do leito do igarapé.					
A construtora solicita orientação quanto a execução da rede de aguas pluviais/drenagem, e se diante do exposto acima a obra segue com a execução conforme projeto, ou se a Fiscalização fará um novo projeto para execução. Outra situação relevante para o andamento de serviços da obra, é REDE DE ESGOTO conforme projeto, a caixa de passagem anterior a ETE possui profundidade de 1,50m. Conforme levantamento planialtimétrico, o poço de visita da CAER localizado à frente da obra tem profundidade 1,20m. Logo, todo o esgoto da obra após tratamento da ETE, terá que ser bombeado. O serviço encontra-se paralisado até a fiscalização dar retorno.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:30/10/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
5 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 APLICAÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO NO MURO LATERAL	
3.3 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO.	
3.4 CONFECÇÃO DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.6 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 01).	
3.8 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.9 ALVENARIA DO MURO LATERAL.	
3.10 FÔRMA E CONCRETO DAS VIGAS DOS MUROS.	
3.11 COLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE 50MM² DA MALHA INFERIOR DO SPDA .	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	289
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	443	DATA	31/10/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 31/10/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório.					
- Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 01).					
- Aplicação de chapisco e reboco do muro lateral.					
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .					
- Escavação para assentamento de meio- fio.					
- Confecção de caixas da rede esgoto - externas.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:31/10/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO	
3.3 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO.	
3.4 CONFECÇÃO DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.6 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 01).	
3.8 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.9 COLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE 50MM² DA MALHA INFERIOR DO SPDA .	
3.10 CONFECÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	290
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	442	DATA	01/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 01/11/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 01). - Aplicação de chapisco e reboco do muro lateral. - Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA . - Escavação para assentamento de meio- fio. - Confecção de caixas da rede esgoto - externas. - Cabeamento de 2º pavimento 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	291
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	441	DATA	02/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	292
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	440	DATA	03/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 03/11/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 01 - Aux. administrativo 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 12 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler do auditório. - Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Dml, Copa e San03 (Pav. 01). - Aplicação de chapisco e reboco do muro lateral. - Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA . - Escavação para assentamento de meio- fio. - Confecção de caixas da rede esgoto - externas. - Cabeamento de 2º pavimento					
4 - Ocorrências: Será substituída peças de cerâmicas que foram danificadas durante a instalação de bancadas dos sanitários. A engenheira informou a fiscalização da obra e a SEA(Fiscal Antônio), sobre a dificuldade encontrada pela construtora na execução do revestimento de pisos e paredes das áreas molhadas, devido as paredes dos ambientes apresentarem substrato fora de prumo e esquadro (serviço não executados pela contratada), outro fator importante é que os revestimentos possuem tamanhos distintos (piso 604 mm e parede 600mm), acumulando mais dificuldade para o perfeito alinhamento da juntas. Conforme projeto de paginação, o alinhamento de juntas dos revestimento de piso e parede são a mesma, mas que diante das dificuldade para a execução, estão apresentando pequenos desalinhamentos. Foi sugerido a fiscalização duas possíveis soluções, a execução de novo reboco para regularização dos substratos para recebimento dos revestimentos, qual seria necessário aprovação de aditivo de valores e/ou executar as juntas de pisos e paredes intercaladas. A fiscalização da SEA informou que poderia dar continuidade no serviço, com o mesmo alinhamento de juntas de piso e parede, sendo aceitável os desalinhamentos conforme executados nos sanitários do 3º, 2º e 1º pavimento.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:03/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO	
3.3 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER DO AUDITÓRIO.	
3.4 CONFECÇÃO DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.6 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.7 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 01).	
3.8 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.9 COLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE 50MM² DA MALHA INFERIOR DO SPDA .	
3.10 CONFECÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO	
3.11 PINTURA DE TUBOS DE INCÊNDIO	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	293
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	439	DATA	04/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	294
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	438	DATA	05/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	295
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	437	DATA	06/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:06/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
9 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR
1 OPERADOR DE CALDEIRA
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:
2.1.1-RR DOMÓTICA
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA
5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.
3.2 INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO
3.3 TROCA DE PORCELANATOS AVARIADOS
3.4 CONFECÇÃO DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 01).
3.7 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.
3.8 COLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE 50MM² DA MALHA INFERIOR DO SPDA .
3.9 CONFECÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO
4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	296
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	436	DATA	07/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 03/11/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 01 - Aux. administrativo
- 04 - Carpinteiro;
- 09 - Pedreiro;
- 12 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 01 - Operador de caldeira;
- 03 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador
- 01 - Rejuntadora
- 01 - Gesseiro
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 FERREIRA E FERREIRA

- 05 - Aux de funilaria
- 01 - Funileiro
- 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler.
- Confecção de rede de detecção e alarme do 3º pavimento.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04- Térreo.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 3º pavimento.
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .
- Escavação para assentamento de meio- fio.
- Confecção de caixas da rede esgoto - externas.
- Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa.

4 - Ocorrências Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:07/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO	
3.3 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER	
3.4 CONFECÇÃO DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO DML, COPA E SAN03 (PAV. 01).	
3.7 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.8 COLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE 50MM² DA MALHA INFERIOR DO SPDA .	
3.9 CONFECÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO	
3.10 COLOCAÇÃO DOS TUBOS DE DRENAGEM, 300MM.	
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES DO TÉRREO	
3.12 APLICAÇÃO DE REJUNTE NO 3º PAVIMENTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	297
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	435	DATA	08/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 08/11/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler.					
- Pintura da rede de detecção e alarme do 3º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04- Térreo.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento.					
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .					
- Escavação para assentamento de meio- fio.					
- Confecção de caixas da rede esgoto - externas.					
- Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa.					
4 - Ocorrências Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:08/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO	
3.3 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER	
3.4 CONFEÇÃO DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 1, 2 E 4 DO TÉRREO	
3.7 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.8 COLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE 50MM² DA MALHA INFERIOR DO SPDA .	
3.9 CONFEÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO	
3.10 COLOCAÇÃO DOS TUBOS DE DRENAGEM, 300MM.	
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES DO TÉRREO	
3.12 APLICAÇÃO DE REJUNTE NO 2º PAVIMENTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	298
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	434	DATA	09/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 09/11/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.					
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler.					
- Pintura da rede de detecção e alarme do 3º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04- Térreo.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento.					
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .					
- Escavação para assentamento de meio- fio.					
- Confecção de caixas da rede esgoto - externas.					
- Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa.					
4 - Ocorrências Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:09/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO	
3.3 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER	
3.4 CONFECÇÃO DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 1, 2 E 4 DO TÉRREO	
3.7 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.8 COLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE 50MM² DA MALHA INFERIOR DO SPDA .	
3.9 CONFECÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO	
3.10 COLOCAÇÃO DOS TUBOS DE DRENAGEM, 300MM.	
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES DO TÉRREO	
3.12 APLICAÇÃO DE REJUNTE NO 2º PAVIMENTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	299
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	433	DATA	10/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	300
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	432	DATA	11/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 10/11/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
01 - Aux. administrativo					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
12 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.					
- Confeccção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler.					
- Pintura da rede de detecção e alarme do 3º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04- Térreo.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento.					
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .					
- Escavação para assentamento de meio- fio.					
- Confeccção de caixas da rede esgoto - externas.					
- Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa.					
- Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento.					
- Instalação de divisórias do Sanitários 1 e 2 - Térreo.					
4 - Ocorrências: Rede de esgoto externa - Após avaliação da contratante e a fiscalização, modificou-se o diâmetro da tubulação de 100mm para 150mm da rede de esgoto externa (estacionamento/ frente).					
Estamos a disposição para esclarecimentos					
Diário de Obra - Data: 11/11/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
06 - Pedreiro;					
04 - Servente;					

01 - Carpinteiro;
01 - Bombeiro Hidráulico;
02 - Vigia.

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

05 - Aux de funilaria
01 - Funileiro
01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.
- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.
- Confecção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler.
- Pintura da rede de detecção e alarme do 3º pavimento.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04- Térreo.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento.
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .
- Escavação para assentamento de meio- fio.
- Confecção de caixas da rede esgoto - externas.
- Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa.
- Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento.
- Instalação de divisórias do Sanitários 1 e 2 - Térreo.

4 - Ocorrências: Rede de esgoto externa - Após avaliação da contratante e a fiscalização, modificou-se o diâmetro da tubulação de 100mm para 150mm da rede de esgoto externa (estacionamento/ frente).

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	301
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	431		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	12/11/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	302
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	430	DATA	13/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 13/11/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almojarife; 06 - Pedreiro; 04 - Servente; 01 - Carpinteiro; 01 - Bombeiro Hidráulico; 02 - Vigia. 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Cabeamento elétrico do 2º pavimento. - Confeccção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler. - Pintura da rede de detecção e alarme do 3º pavimento. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04- Térreo. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento. - Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA . - Escavação para assentamento de meio- fio. - Confeccção de caixas da rede esgoto - externas. - Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa. - Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento. - Instalação de divisórias do Sanitários 1 e 2 - Térreo. 4 - Ocorrências: Sem ocorrência Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:13/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO	
3.3 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER	
3.4 PINTURA DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 1, 2 E 4 DO TÉRREO	
3.7 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.8 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO NOS SANITÁRIOS 1 E 2 DO TÉRREO .	
3.9 CONFEÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO	
3.10 COLOCAÇÃO DOS TUBOS DE DRENAGEM, 300MM.	
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES DO TÉRREO	
3.12 APLICAÇÃO DE REJUNTE NO 2º PAVIMENTO	
3.13 PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS DO 3º PAVIMENTO	
4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	303
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	429	DATA	14/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 14/11/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
06 - Pedreiro;					
04 - Servente;					
01 - Carpinteiro;					
01 - Bombeiro Hidráulico;					
02 - Vigia.					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo.					
- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.					
- Confeccção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler.					
- Pintura da rede de detecção e alarme do 3º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04- Térreo.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento.					
- Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA .					
- Escavação para assentamento de meio- fio.					
- Confeccção de caixas da rede esgoto - externas.					
- Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa.					
- Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento.					
- Instalação de divisórias do Sanitários 1 e 2 - Térreo.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrência					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:14/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO	
3.3 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER	
3.4 PINTURA DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 1, 2 E 4 DO TÉRREO	
3.7 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.8 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO NOS SANITÁRIOS 1 E 2 DO TÉRREO .	
3.9 CONFEÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO	
3.10 COLOCAÇÃO DOS TUBOS DE DRENAGEM, 300MM.	
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES DO TÉRREO	
3.12 APLICAÇÃO DE REJUNTE NO 2º PAVIMENTO	
3.13 PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS DO 3º PAVIMENTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	304
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	428	DATA	15/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 14/11/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 11 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 01 - Rejuntador 01 - Gesseiro 02 - Vigia. 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Cabeamento elétrico do 2º pavimento. - Confeccção e montagem da rede de Hidrante e Sprinkler. - Pintura da rede de detecção e alarme do 3º pavimento. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04- Térreo. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento. - Colocação de cordoalha de 50mm² da malha inferior do SPDA . - Escavação para assentamento de meio- fio. - Confeccção de caixas da rede esgoto - externas. - Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa. - Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento. - Instalação de divisórias do Sanitários 1 e 2 - Térreo. 4 - Ocorrências: Sem ocorrência
RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	305
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	427	DATA	16/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:16/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
2 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
9 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR
1 OPERADOR DE CALDEIRA
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:
2.1.1-RR DOMÓTICA
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA
5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.
3.2 CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO
3.3 CONFECÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER
3.4 PINTURA DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 1, 2 E 4 DO TÉRREO
3.7 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.
3.8 INSTALAÇÃO DE DIVISÓIS EM GRANITO NOS SANITÁRIOS1 E 2 DO TÉRREO .
3.9 CONFECÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO
3.10 COLOCAÇÃO DOS TUBOS DE DRENAGEM, 300MM.
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES DO TÉRREO
3.12 APLICAÇÃO DE REJUNTE NO 2º PAVIMENTO
3.13 PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS DO 3º PAVIMENTO
4.0 - OCORRÊNCIAS:
4.1 MESTRE DE OBRA OPERANDO MAQUINÁRIO, RETROESCAVADEIRA, SEM AUTORIZAÇÃO
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	306
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	426	DATA	17/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:17/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:
2.1.1- MARMOCENTER
4 MARMOARISTAS
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:
3.1 INSTALAÇÕES DE BANCADAS DE LAVATÓRIOS E PIAS
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	307
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	425	DATA	18/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	308
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	424	DATA	19/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	309
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	423	DATA	20/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:20/11/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 VIGIA 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1 SEM ATIVIDADES 4.0 - OCORRÊNCIAS: 4.1 FERIADO PARA AS EMPRESAS 4.2 EM CONSULTA AO SISTEMA DO MPF, NO DIA 20/11/2023, FICOU CONSTATADO QUE OS FUNCIONÁRIOS DAS SUBCONTRATADAS NÃO POSSUEM O CERTIFICADOS DE CURSOS REFERENTES À NR-35, TRABALHOS EM ALTURA ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

