



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR/RR

Despacho nº 1197/2023

Referência: 1.32.000.000003/2023-89

Assunto: Relatório técnico da 11ª medição da obra da Nova Sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima

Segue em anexo o relatório técnico da 11ª medição

Nota Fiscal Eletrônica de Referência R\$ 442.558,85 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste R\$ 23.898,18 (vinte e três mil oitocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.

Boa Vista, 19 de dezembro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)

MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 11ª MEDIÇÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 11/2023		
INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA:		16 de janeiro de 2023
PERÍODO DO RELATÓRIO		De 20 de novembro a 19 de Dezembro de 2023
SERVIÇOS PREVISTOS PARA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO		Instalação de infraestrutura elétrica, combate à incêndio, sistema de climatização, execução de alvenaria chapisco, emboço e emassamento, cabeamento, caixas de esgoto, revestimento cerâmico, divisórias dos sanitários, caixas de drenagem, colocação de meio fio, uso de dry-wall nos shafts e uso de granito.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF		
Nome:	Engenheiro Marcos Eduardo Silva Madureira	
Telefone:	(95) 3198-2005	
E-mail:	marcoseduardo@mpf.mp.br	
1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)		
Nome:	Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira	
Portaria:	SE/PR-RR nº02/2023	
Telefone:	(95) 3198-2025 / 2073	
E-mail:	prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br	
2.0 - ESCOPO E LOCAL		
DADOS DO CONTRATO:	Nº Contrato: 05/2022	PPA/LOA: AÇÃO 110E
Empresa Contratada	J. NASSER ENGNHARIA	CNPJ 04.618.096/0001-07

	LTDA			
Matrícula CEI da Obra	51.235.89823/71			
Valor Atual do Contrato	R\$31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)			
Percentual de reajuste	5,40%			
Saldo de Empenho	5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022			
Local/UF	Boa Vista – RR			
Responsável Técnico	José Nasser – ART de Execução: RR20230111507			
Corresponsável Técnico	Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835			
Nota Fiscal Eletrônica de Referência	R\$ 442.558,85 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)			
Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste	R\$ 23.898,18 (vinte e três mil oitocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.			
DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA				
Medição nº	% Previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
3	1,16%	0,75%	1,40%	1,25%
4	0,88%	0,66%	1,93%	1,91%
5	1,64%	1,29%	3,57%	3,21%
6	1,94%	1,25%	5,51%	4,46%
7	0,95%	1,29%	4,93%	5,75%
8	1,17%	2,11%	6,10%	7,85%
9	1,83%	2,13%	7,93%	9,98%
10	2,86%	1,91%	10,79%	11,88%
11	4,30%	1,40%	15,08%	13,28%
TOTAL EXECUTADO				13,28%
TOTAL A EXECUTAR				86,72%
Identificação do processo de fiscalização		1.32.000.000464/2022-71		
Tipo de obra		Prédio Público		
Objeto da fiscalização		Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima		
Período abrangido pela fiscalização		20/11/2023 a 19/12/2023 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)		

3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a serviço de alvenaria/chapisco/emboço, instalações hidrossanitários, instalação de incêndio, sistema de climatização (envelopamento e tubulação), instalações de infra de elétrica como interruptor e tomada baixa ou alta, fiação de iluminação e tomada/interruptor, movimentação de terra, confecção das caixas de drenagem de água pluviais, junto com a tubulação do sistema, confecção das caixas de passagem e tubulação de esgoto, revestimento de piso e parede com cerâmica, bancada, peitoril e divisórias de granito, e fechamento de shafts com dry-wall, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas.

4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: ARQUITETURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA, INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE, E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;

Constatação do Período nº 2: Foram observados dois funcionários subindo ao reservatório da cobertura da casa de máquinas sem cinto de segurança em altura superior a dois metros;

Constatação do Período nº 3: Foi informado à fiscalização, por funcionários, um acidente de trabalho no dia 15/11/2023, feriado, onde um funcionário teve um corte profundo na mão, sendo afirmado que o mesmo estava sem luva de proteção. Além disso, a fiscalização não recebeu a comunicação de acidente de trabalho (CAT);

Constatação do Período nº 4: Funcionário da subcontratada FERREIRA & FERREIRA não fazia uso de EPI, luva de proteção, ao executar serviços de instalação de climatização, sendo constatado pela fiscalização que não fora a primeira vez que o mesmo foi observado sem luva, sendo alertado pela própria.

5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

A) Após a apresentação do projeto de arquitetura, onde através das plantas Baixas de Reforma e plantas Baixas de Layout, foram aprovado pela PR-RR e SEA. Serão apresentadas o novo Layout para os órgãos do MPT e MPM. Foram acrescentados novos banheiros para PCD.

B) O engenheiro mecânico da equipe da SEA apresentou a J NASSER o projeto da climatização do Auditório.

C) A reforma da escada foi colocada em análise para desenvolvimento de aditivo e execução;

D) A pele de vidro também encontra-se em análise pela engenharia da SEA.

6.0 – CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise

documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma.	
7.0 – ANEXOS	
A) 13.0 Relatório fotográfico do período	
8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO	
Boa Vista – Roraima, 19 de dezembro de 2023	
9.0 - FÉ DO MEMBRO DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022	
Declaramos que as metas estabelecidas na 11ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas.	
 Marcos Eduardo Silva Madureira Engenheiro Civil/Membro da Comissão	
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	
10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL	
☐ Não foram identificados vícios. ☐ Ver Nota Técnica ou Despacho constante da _____ folha _____ de n.º. _____	 Igor José Barbosa Duarte Lopes Secretário Estadual
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 11ª MEDIÇÃO

11.0 - A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO FOI EFETUADA PELO FISCAL DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, MATRÍCULA 31143, NO DIA 16/12/2023

11.1 - Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma (%)	Percentual executado <i>in loco</i> (%)	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E PROTEÇÃO	86,90%	87,66%		X
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,00%	6,12%		X
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO	0,00%	7,01%		X
ESTRUTURAS DE CONCRETO				
GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS	15,27%	29,13%		X

ARQUITETURA				
VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS, ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	13,86%	11,17%	X	
IMPERMEABILIZAÇÃO				
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	74,68%	55,90%	X	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				
ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO	6,61%	13,17%		X
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E SPRINKLERS	35,88%	26,35%	X	
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				
SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO	19,71%	15,52%	X	
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV,	15,08%	10,19%	X	
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE				
QUADROS, SENSORES E TERMOSTATOS, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO, COMISSIONAMENTO	2,00%	0,00%	X	
CLIMATIZAÇÃO				
ÁGUA GELADA, VRF, SPLIT, VENTILAÇÃO MECÂNICA-, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS, LIGACÕES E DUTOS DE AR	11,18%	14,73%		X

SERVIÇOS GERAIS				
TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO	45,20%	49,29%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				
INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA	15,08%	13,28%	X	

12.0 SEGUE ABAIXO A PLANILHA CONTENDO O RESUMO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E PACTUADOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - 11ª MEDIÇÃO
OBRA: NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA - MPF - 2022
LOCAL: AVENIDA GENERAL SAMPAIO S/Nº, BAIRRO TREZE DE SETEMBRO - BOA VISTA/ RR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATADOS							11ª. MEDIÇÃO		ACUMULADO NA 11ª	
		UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	COM BDI	PESO (%)	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.	TOTAL COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						76.116,52	0,24%	1,60%	1.216,50	87,66%	66.724,04
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						10.098,24	0,03%		403,05	46,75%	4.720,46
1.3.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	4.136,66	1,48	1,82		7.528,72	0,02%	221,46	403,05	1.181,87	2.150,98
1.4	PROTEÇÃO						9.600,00	0,03%		813,45	58,18%	5.585,31
1.4.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA PROTEÇÕES - ROLO DE 4X100M - 80 MICRAS	M²	3.200,00	2,43	3,00		9.600,00	0,03%	271,15	813,45	1.861,77	5.585,31
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS						166.895,56	0,53%	0,79%	1.318,45	6,12%	10.216,58
2.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						166.895,56	0,53%		1.318,45	6,12%	10.216,58
2.1.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2/MÊS	11.160,00	4,17	5,15		57.474,00	0,18%	50,40	259,56	151,20	778,68
2.1.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	MMÊS	640,00	12,54	15,49		9.913,60	0,03%	68,36	1.058,89	483,44	7.488,46
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						372.192,17	1,18%	2,22%	8.280,62	7,01%	26.091,59
3.2	ESCAVAÇÕES						1.970,00	0,01%		410,90	39,30%	774,23
3.2.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	500,00	3,19	3,94		1.970,00	0,01%	104,29	410,90	196,51	774,23
3.3	ATERRO E REATERRO						364.939,65	1,16%		7.869,72	6,09%	22.216,92
3.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M³	4.836,20	61,09	75,46		364.939,65	1,16%	104,29	7.869,72	294,42	22.216,92
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO						387.887,79	1,23%	0,00%	-	29,13%	112.987,49
5	ARQUITETURA						10.883.731,21	34,45%	1,49%	162.347,35	11,21%	1.219.642,54
5.1	VEDAÇÕES						401.563,21	1,27%		16.816,92	44,93%	180.410,24
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO (PRÉDIO).	M²	364,00	75,87	93,72		34.114,08	0,11%	11,86	1.111,51	364,00	34.114,03
5.1.4	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE. EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	182,00	743,11	917,96		167.068,72	0,53%	4,83	4.433,74	138,78	127.394,47
5.1.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), VERDE, COM DUAS FACES E ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	146,00	121,89	150,57		21.983,22	0,07%	74,86	11.271,67	108,39	16.320,28
5.2	PISOS						3.080.170,94	9,75%		42.916,54	15,51%	477.630,80
5.2.8	PISO EM PORCELANATO 90X90CM, SUPERFÍCIE NATURAL RETIFICADO - REF.: MINERAL OFF WHITE, NATURAL RETIFICADO DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	M²	1.960,98	315,97	390,31		765.390,10	2,42%	108,57	42.375,95	404,33	157.814,03
5.2.9	RODAPÉ DE PORCELANATO 15X90CM - REF.: MINERAL OFF WHITE NATURAL PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	M	719,00	36,75	45,39		32.635,41	0,10%	11,91	540,59	11,91	540,59
5.3	REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS						2.370.814,97	7,50%		71.547,41	13,06%	309.701,54
5.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60 CM - COM REJUNTE ACRÍLICO - REF.: PORTOBELLO BIANCO ACETINADO RETIFICADO OU EQUIVALENTE	M²	1.508,70	164,25	202,89		306.100,14	0,97%	348,22	70.650,35	1.184,17	240.256,23
5.3.8	PEITORIL EM GRANITO (CINZA ANDORINHA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	60,40	631,48	780,06		47.115,62	0,15%	1,15	897,06	36,60	28.550,17
5.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES						193.093,34	0,61%		7.667,90	37,24%	71.904,77
5.5.3	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE, COM 23CM, TRIANGULAR, TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA	M	518,00	59,44	73,42		38.031,56	0,12%	60,00	4.405,20	60,00	4.405,20
5.5.4	CALHA, RUFO OU CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 20 (E = 0,95MM), INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM, SELANTE E ACABAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	273,00	192,23	237,46		64.826,58	0,21%	13,74	3.262,70	13,74	3.262,70
5.9	LOUÇAS E BANCADAS						206.797,21	0,65%		23.398,58	31,55%	65.237,49
5.9.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	47,00	115,51	142,68		6.705,96	0,02%	22,00	3.138,96	46,00	6.563,28
5.9.11	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA LAVATÓRIO L=55,0 CM COM SAIA L=7,0 CM E RODABANCA L=10,0 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	44,92	822,09	1.015,52		45.617,15	0,14%	19,95	20.259,62	42,00	42.651,83
6	IMPERMEABILIZAÇÃO						459.919,12	1,46%	2,02%	9.296,33	55,90%	257.095,83
6.1	SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO						459.919,12	1,46%		9.296,33	55,90%	257.095,83
6.1.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	M²	655,00	83,67	103,35		67.694,25	0,21%	89,95	9.296,33	315,65	32.622,40
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS						941.059,00	2,98%	5,45%	51.271,61	13,23%	124.465,55
7.1	ÁGUA FRIA						79.030,35	0,25%		951,33	17,56%	13.874,31
7.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	357,00	22,83	28,20		10.067,40	0,03%	17,32	488,42	143,72	4.052,90
7.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00	46,27	57,15		9.144,00	0,03%	8,10	462,91	82,70	4.726,29
7.2	ESGOTO SANITÁRIO						175.940,44	0,56%		13.278,45	19,15%	33.698,02
7.2.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00	31,78	39,25		6.280,00	0,02%	9,10	357,17	99,97	3.923,79
7.2.4	TUBO PVC ESGOTO OU AGUA PLUVIAL PREDIAL DN 100MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	387,00	61,90	76,46		29.590,02	0,09%	4,61	352,48	12,11	925,93
7.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	209,35	64,40	79,55		16.653,79	0,05%	40,95	3.257,57	77,52	6.166,71
7.2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	37,87	28,76	35,52		1.345,14	0,00%	6,68	237,27	37,87	1.345,13
7.2.15	CAIXA DE PASAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS - INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DIM 80 X 215 X 80	UN	4,00	4.158,54	5.137,04		20.548,16	0,07%	1,20	6.164,44	1,20	6.164,44
7.2.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM + PROLONGADOR (EXCLUSIVE GRELHA E PORTA GRELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	36,02	44,49		800,82	0,00%	2,00	88,98	12,00	533,88


7.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	20,00	761,10	940,18	18.803,60	0,06%	3,00	2.820,54	3,00	2.820,54
7.3	ÁGUAS PLUVIAIS					535.579,24	1,70%		37.041,83	14,36%	76.893,22
7.3.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO	M	701,00	100,17	123,74	86.741,74	0,27%	106,95	13.233,99	265,05	32.797,28
7.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	295,63	64,40	79,55	23.517,36	0,07%	117,28	9.329,62	226,06	17.983,06
7.3.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	254,21	28,76	35,52	9.029,53	0,03%	66,98	2.379,12	163,73	5.815,68
7.3.7	CAIXA DE PASSAGEM 70X70X90CM EM ALVENARIA - COM TAMPA CEGA DE CONCRETO - MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	35,00	1.166,01	1.440,37	50.412,95	0,16%	8,40	12.099,10	8,40	12.099,10

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA					5.365.186,69	16,98%	1,94%	104.028,94	15,52%	832.736,66
9.3	INFRAESTRUTURA					1.555.470,98	4,92%		35.026,91	43,14%	671.037,51
9.3.1	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, PERFURADA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 50 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.373,00	77,39	95,59	131.245,07	0,42%	17,40	1.663,26	1.047,95	100.173,50
9.3.5	ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, CHAPA #18 - PAREDE 1,25 MM - DIM. 250 X 50 - INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,00	151,64	187,32	60.879,00	0,19%	17,87	3.347,40	268,40	50.276,66
9.3.13	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 25 (1") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.975,00	47,78	59,02	116.564,50	0,37%	25,69	1.516,22	773,53	45.653,72
9.3.14	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 2,25 MM - DIAMETRO NOMINAL 50 (2") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	402,00	93,85	115,93	46.603,86	0,15%	101,25	11.737,91	199,06	23.077,01
9.3.20	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, DE 2" (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.942,00	10,34	12,77	24.799,34	0,08%	162,17	2.070,91	522,17	6.668,11
9.3.21	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, DE 4" (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	317,00	16,17	19,97	6.330,49	0,02%	106,29	2.122,61	166,29	3.320,81
9.3.35	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	17,00	371,27	458,62	7.796,54	0,02%	1,80	825,51	1,80	825,51
9.3.37	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	98,09	121,17	3.271,59	0,01%	6,00	727,02	6,00	727,02
9.3.38	ESCOVAÇÃO E REATERRO PARA PASSAGEM DE DUTOS - DIMENSAO DE 40 CM X 70 CM	M	1.100,00	28,96	35,77	39.347,00	0,12%	15,63	559,08	15,63	559,08
9.3.41	ESCOVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS (60 CM X 100 CM), COM PROTEÇÃO EM CONCRETO (10 CM) E FITA DE ADVERTÊNCIA	M	276,00	127,72	157,77	43.544,52	0,14%	66,28	10.456,99	66,28	10.456,99
9.4	CONDUTORES E CABOS					1.103.775,66	3,49%		69.002,03	12,98%	143.278,38
9.4.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67.456,00	3,87	4,78	322.439,68	1,02%	9.384,79	44.859,29	23.791,31	113.722,45
9.4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.635,00	6,38	7,88	75.923,80	0,24%	1.200,96	9.463,56	1.463,96	11.536,00
9.4.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.331,00	9,83	12,14	40.438,34	0,13%	78,25	949,95	78,25	949,95
9.4.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.368,00	16,80	20,75	90.636,00	0,29%	661,65	13.729,23	822,65	17.069,98
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					1.087.133,12	3,44%	0,04%	466,29	10,19%	110.786,82
10.4	SISTEMA DE SOM/TV					40.380,53	0,13%		466,29	1,73%	699,87
10.4.3	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	11,13	13,74	687,00	0,00%	15,00	206,10	32,00	439,68
10.4.7	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	10,03	12,39	371,70	0,00%	21,00	260,19	21,00	260,19
12	CLIMATIZAÇÃO					4.455.597,11	14,10%	1,45%	64.420,63	14,73%	656.143,15
12.5	TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA					244.675,90	0,77%		12.870,32	12,82%	31.355,33
12.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 20 MM (3/4")	M	50,00	69,04	85,28	4.264,00	0,01%	4,05	345,38	4,81	410,19
12.5.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 25 MM (1")	M	120,00	78,04	96,40	11.568,00	0,04%	47,09	4.539,47	106,31	10.248,27
12.5.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 32 MM (1 1/4")	M	110,00	102,06	126,07	13.867,70	0,04%	14,09	1.776,32	65,77	8.291,61
12.5.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA Ø 50 MM (2")	M	90,00	134,15	165,71	14.913,90	0,05%	37,47	6.209,15	46,01	7.624,31
12.6	TUBULAÇÃO - ÁGUA GELADA - CONEXÕES					37.672,70	0,12%		1.760,28	21,37%	8.052,17
12.6.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00	83,51	103,15	4.744,90	0,02%	12,00	1.237,80	24,00	2.475,60
12.6.10	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	72,23	89,22	535,32	0,00%	2,00	178,44	6,00	535,32
12.6.18	TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	139,26	172,02	344,04	0,00%	2,00	344,04	2,00	344,04
12.9	DUTOS DE AR					564.672,17	0,02		16.124,73	38,60%	217.976,13
12.9.3	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #24	M²	2.282,42	146,92	181,49	414.236,40	1,31%	81,59	14.807,76	968,06	175.693,17
12.9.4	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM "TDC" #26	M²	384,25	110,83	136,90	52.603,82	0,17%	9,62	1.316,97	166,23	22.756,86
12.12	ISOLAMENTO TÉRMICO - TUBULAÇÕES E DUTOS					783.397,45	0,02		33.665,30	48,32%	378.520,16
12.12.4	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 3/4" 32MM	M	44,00	26,28	32,46	1.428,24	0,00%	4,05	131,46	4,81	156,12
12.12.5	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 1" 32MM	M	120,00	27,67	34,18	4.101,60	0,01%	47,09	1.609,53	76,40	2.611,34
12.12.7	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 1.1/4" 32MM	M	110,00	43,36	53,56	5.891,60	0,02%	14,09	754,66	55,67	2.981,68
12.12.8	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA -T 1.1/2" 32MM	M	25,00	48,13	59,45	1.486,25	0,00%	21,09	1.253,80	25,00	1.486,24
12.12.15	ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ALUMINIZADA - MANTA DE 15 MM - ARMADUCT OU EQUIVALENTE	M2	2.217,00	254,98	314,97	698.288,49	2,21%	94,98	29.915,85	1.176,14	370.448,79
14	SERVIÇOS GERAIS					234.157,38	0,01	1,06%	2.481,11	48,99%	114.710,13
14.1	TRANSPORTE DE MATERIAL					51.745,20	0,00		672,02	36,37%	18.821,27
14.1.1	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	780,00	53,71	66,34	51.745,20	0,16%	10,13	672,02	283,71	18.821,27
14.2	LIMPEZA DA OBRA					96.372,88	0,00		1.673,19	46,04%	44.369,35
14.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	325,60	402,21	40.221,00	0,13%	4,16	1.673,19	45,77	18.407,77
14.5	TAXAS DE CONSTRUÇÃO					54.660,31	0,00		135,90	94,25%	51.519,51
14.5.2	CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	500,00	12,23	15,10	7.550,00	0,02%	9,00	135,90	292,00	4.409,20
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					2.672.342,00	0,08	1,40%	37.431,02	13,30%	355.379,57
15.1	INSUMOS PÚBLICOS					101.200,00	0,00		1.417,49	13,30%	13.457,96
15.1.1	INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	819,24	1.012,00	101.200,00	0,32%	1,40	1.417,49	13,30	13.457,96
15.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.571.142,00	0,08		36.013,53	13,30%	341.921,61
15.2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	16.964,81	20.956,62	2.095.662,00	6,63%	1,40	29.353,57	13,30	278.690,26

15.2.2	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	100,00	3.849,11	4.754,80	475.480,00	1,51%	1,40	6.659,96	13,30	63.231,35
--------	---	---	--------	----------	----------	------------	-------	------	----------	-------	-----------

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI		R\$	442.558,85	R\$	4.201.336,34
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI E COM REAJUSTE		R\$	466.457,03	R\$	4.394.572,70


Porcentagens das medições

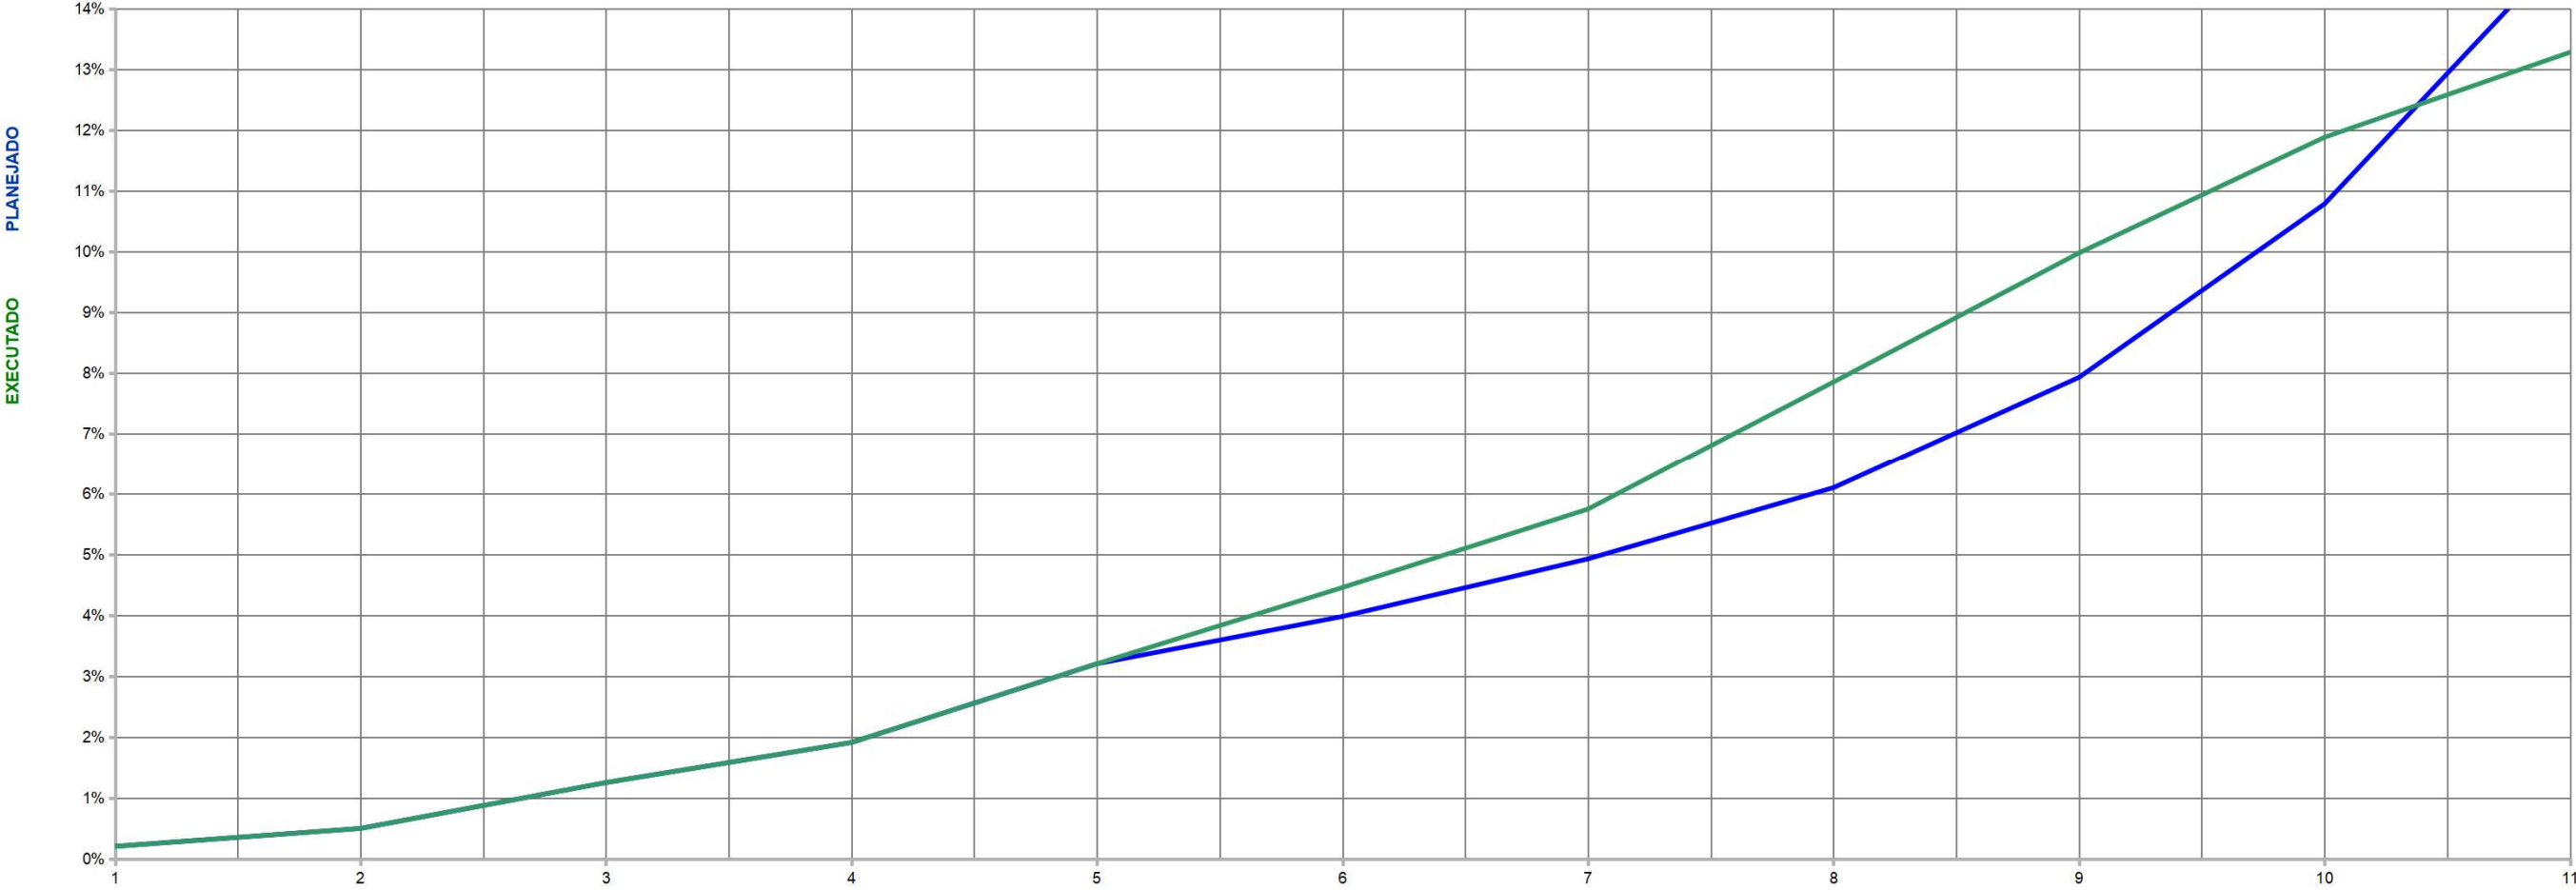

		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,21	R\$ 67,85	R\$ 29,63	R\$ 75,87	R\$ 91,97	R\$ 66,08	R\$ 65,69
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,26	R\$ 54,37	R\$ 72,43	R\$ 57,18	R\$ 7.209,89	R\$ 71,20	R\$ 71,20
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,46	R\$ 326,33	R\$ 447,15
ESTRUTURAS DE CONCRETO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,79	R\$ 10,88	R\$ 441,13	R\$ 977,61	R\$ 2.006,97	R\$ 522,27	R\$ -
ARQUITETURA	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.135,51	R\$ 2.443,01	R\$ 2.790,71	R\$ 8.466,95	R\$ 10.793,07	R\$ 11.790,82	R\$ 8.766,76
IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.929,18	R\$ 1.798,88	R\$ 1.785,89	R\$ 1.347,76	R\$ 1.503,63	R\$ 1.342,29	R\$ 502,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.046,83	R\$ 2.768,67
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.231,53	R\$ 3.815,84	R\$ 1.885,35	R\$ 4.812,56	R\$ 1.448,15	R\$ 1.171,13	R\$ -
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.323,68	R\$ 7.761,14	R\$ 6.995,44	R\$ 7.429,71	R\$ 5.435,59	R\$ 3.610,25	R\$ 5.617,56
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.944,70	R\$ -	R\$ 25,18
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CLIMATIZAÇÃO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668,01	R\$ 3.138,60	R\$ 5.534,02	R\$ 9.616,83	R\$ 4.533,56	R\$ 8.462,00	R\$ 3.478,71
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS GERAIS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,88	R\$ 298,01	R\$ 292,26	R\$ 200,44	R\$ 182,83	R\$ 211,51	R\$ 133,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.838,49	R\$ 1.806,90	R\$ 1.858,71	R\$ 3.055,81	R\$ 3.068,32	R\$ 2.749,42	R\$ 2.021,28
Total		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.179,53	R\$ 21.208,09	R\$ 21.685,56	R\$ 36.040,73	R\$ 42.854,14	R\$ 32.370,12	R\$ 23.898,18

13.0 Relatório fotográfico

13.1 Serviços externos

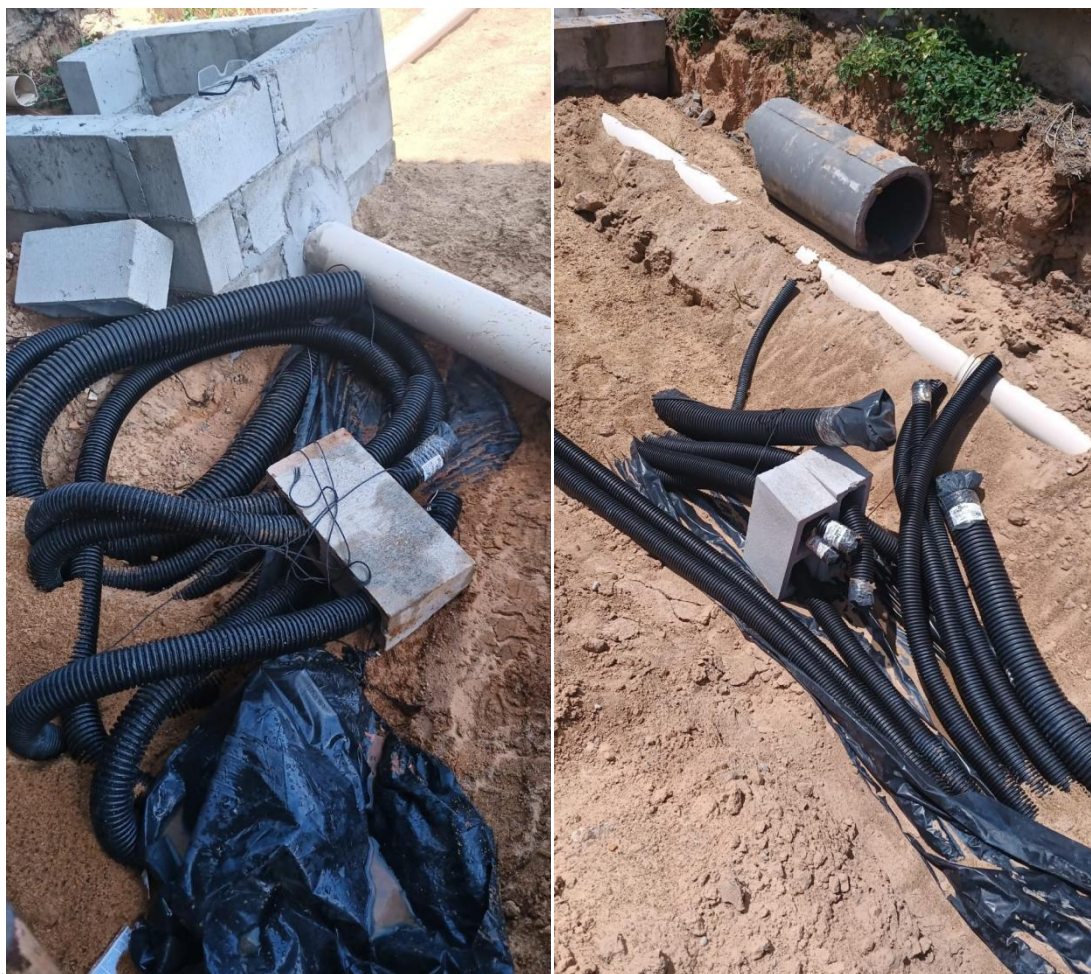




















































13.2 Instalações elétricas







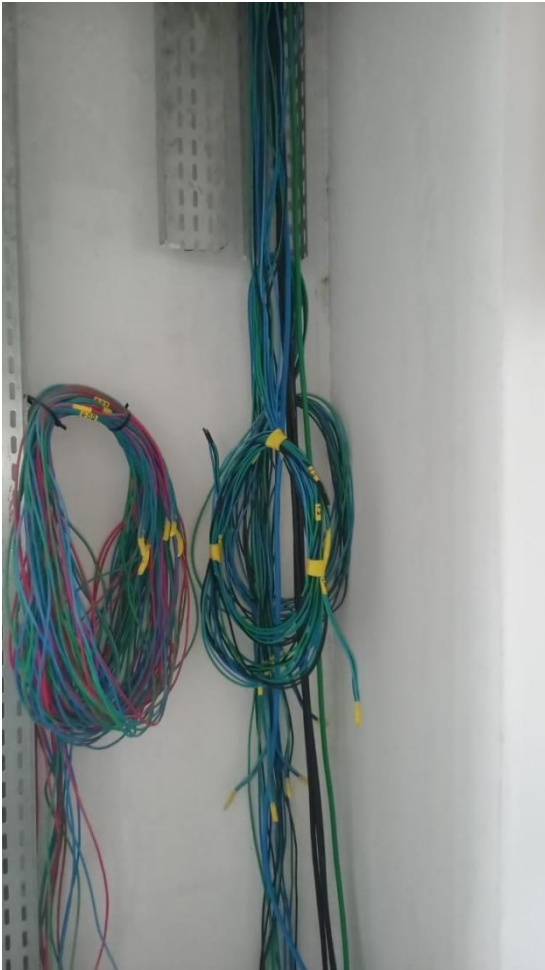









13.3 Climatização









13.4 Porcelanato









13.5 Pintura e selamento







13.6 Papa Entulho







13.7 Shafts







13.8 Guarda corpo





13.9 Outros





Contrapiso








Instalações de incêndio









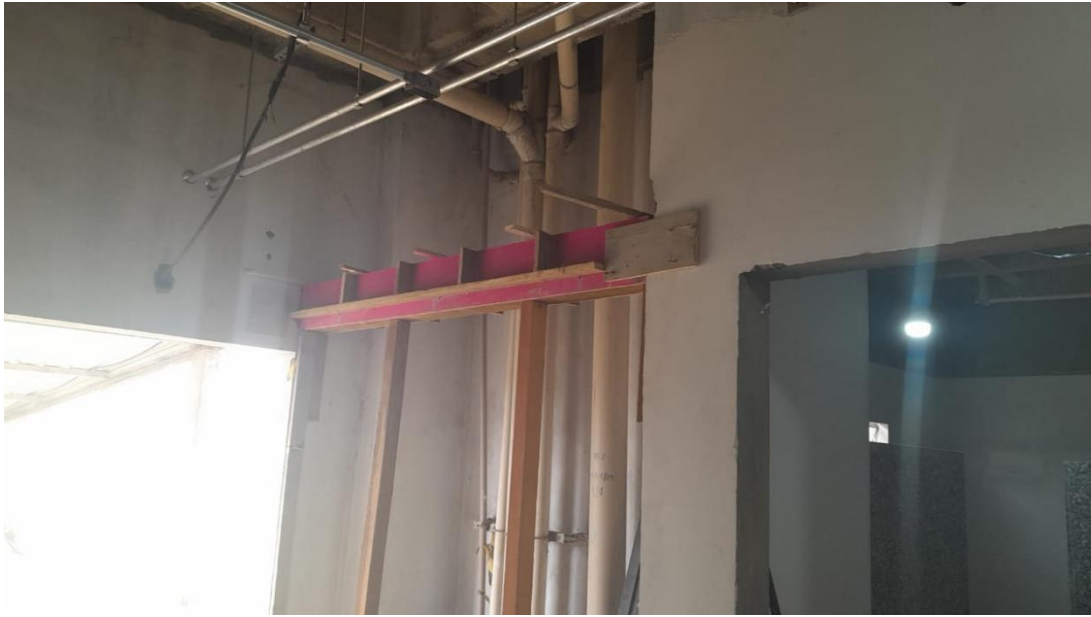







14.0 - CONTROLE DE RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA

Descrição do item	Data da retirada do entulhos da obra
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	23/11/2023 00512
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	07/12/2023 00625
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	13/12/2023 00681
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	14/12/2023 00695
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	15/12/2023 00707

15.0 - RELAÇÃO DOS COLABORADORES COM A FUNÇÃO NA EMPRESA J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	Colaborador	Função
1	ALCIDES NOGUEIRA SENA NETO	AUX. ADMINISTRATIVO
2	ALAN COELHO DA SILVA	VIGIA
3	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
4	ANANIAS VIEIRA DA SILVA	SERVENTE
5	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
6	ANTONIES DIEGO DE SOUZA CORDEIRO	SERVENTE
7	ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO	CARPINTEIRO
8	ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	ELETRICISTA
9	BRUNO SILVA CASTRO	SERVENTE
10	DARLISON COSMOS PENA	BOMBEIRO HIDRAULICO
11	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
12	DIEGO SIMAO BURUM	SERVENTE
13	ELIEZIO MEIRELE RODRIGUES	PEDREIRO
14	ELIZEU LIMA DA SILVA	SERVENTE
15	ERIVAN LOURENÇO MACHADO	PEDREIRO
16	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA

17	FELIPE GRALHADA OLIVEIRA	SERVENTE
18	FRANCISCO EMICIO	BOMBEIRO HIDRAULICO
19	GILVAN LEITE RIBEIRO	PEDREIRO
20	IGOR ANTONIO PINO	PINTOR
21	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVENTE
22	JOSE MARCELO ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR	MESTRE DE OBRAS
23	JOSE RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
24	JOSÉ VERAS BARROS	OP. BETONEIRA
25	JOSINALDO DA SILVA ALMEIDA	CARPINTEIRO
26	JUVENAL GUILHERME SOBRINHO	CALDEIREIRO
27	JOSE MARIA FROTA CONRADO	PINTOR
28	LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA	ALMOXARIFE
29	MARLON BORGES PEREIRA	TECNICO DE SEGURANÇA
30	MOISES FERREIRA CHAVES	CARPINTEIRO
31	NILDO OLIVEIRA DA SILVA	PEDREIRO
32	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
33	RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE	PEDREIRO
34	RAUDI RAFAEL MARTINES	CARPINTEIRO
35	RONNY DE SOUZA ANICETO	SERVENTE
36	SEBASTIÃO ASSIS DE FREITAS	PINTOR
37	SERGIO GOMES DA SILVA	SERVENTE
39	SIVANILSON VIERA DA SILVA	PEDREIRO
38	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
40	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA
41	YANN PEREIRA NUNES	SERVENTE
42	ZEDEQUIAS DOS SANTOS	IMPERMEABILIZADOR

15.1 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS

DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).

Nº	Colaborador	Função
1	DANIEL ASSIS CARNEIRO	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO	ELETRICISTA
3	GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ	ELETRICISTA
4	JORGE LUIZ GOZALEZ LOPES	PEDREIRO
5	RIBAMAR SILVA SANTANA	ELETRICISTA
6	ROMÁRIO DA SILVA BENTO	ELETRICISTA
7	SIMON ENRIQUE OLIVEROS LINARES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
8	FABIO VIEIRA DA SILVA	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA

15.2 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa FERREIRA & FERREIRA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Nº	Colaborador	Função
1	ALLAN GUIMARÃES FARIAS	AUXILIAR DE FUNILARIA
2	SAMUEL LOBATO	FUNILEIRO
3	LUIZ MIGUEL MAURERA	AUXILIAR DE FUNILARIA
4	MIGUEL ALEXANDER JIMENES RIVAS	AUXILIAR DE FUNILARIA

16.0 - A FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO SERÁ DEFINIDA PELA SOMA DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS OCORRÊNCIAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, CONFORME TABELA ABAIXO:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre da Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 - Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5
4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4
10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4

11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6
12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24
17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção


16.2 - Ocorrência 1: No dia 24/11/2023 foi informado a fiscalização que um funcionário teria se

acidentado durante o feriado do dia 15/11/2023, tendo cortado sua mão. Segundo relatos, o mesmo não estaria usando luva de proteção e, além disso, a fiscalização não foi informada do acidente seja por CAT ou por comunicação da empresa, J NASSER, sendo informada pelos funcionários. No dia em que a fiscalização tomou ciência do ocorrido foi realizado um despacho, 1110/2023, requisitando esclarecimentos e um CAT.




Ocorrência 2: Dois funcionários estavam subindo o reservatório (casa de máquinas) sem cinto de segurança em altura superior a 2 metros. Ocorrência do dia 24/11/2023



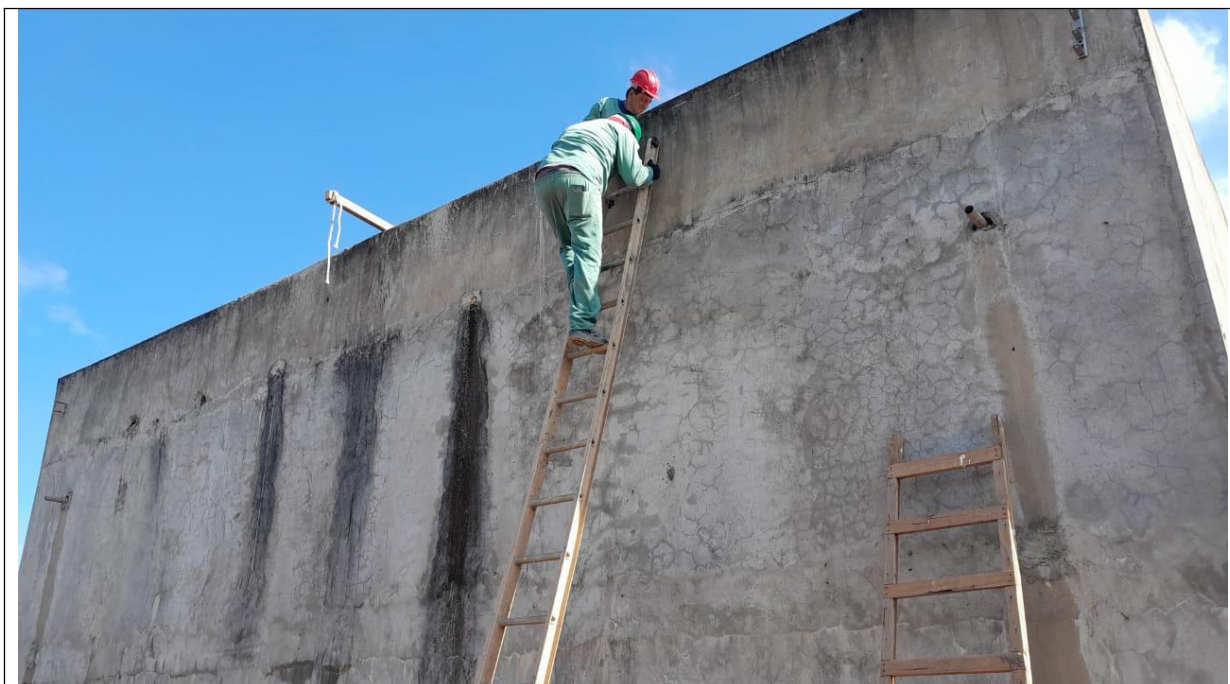

Ocorrência 3: Funcionário da subcontratada FERREIRA E FERREIRA não fazia uso de EPI, luva de proteção, ao executar serviços de instalação de climatização, sendo constatado pela fiscalização que não fora a primeira vez que o mesmo foi observado sem luva, sendo alertado pela própria. Ocorrido do dia 12/12/2023

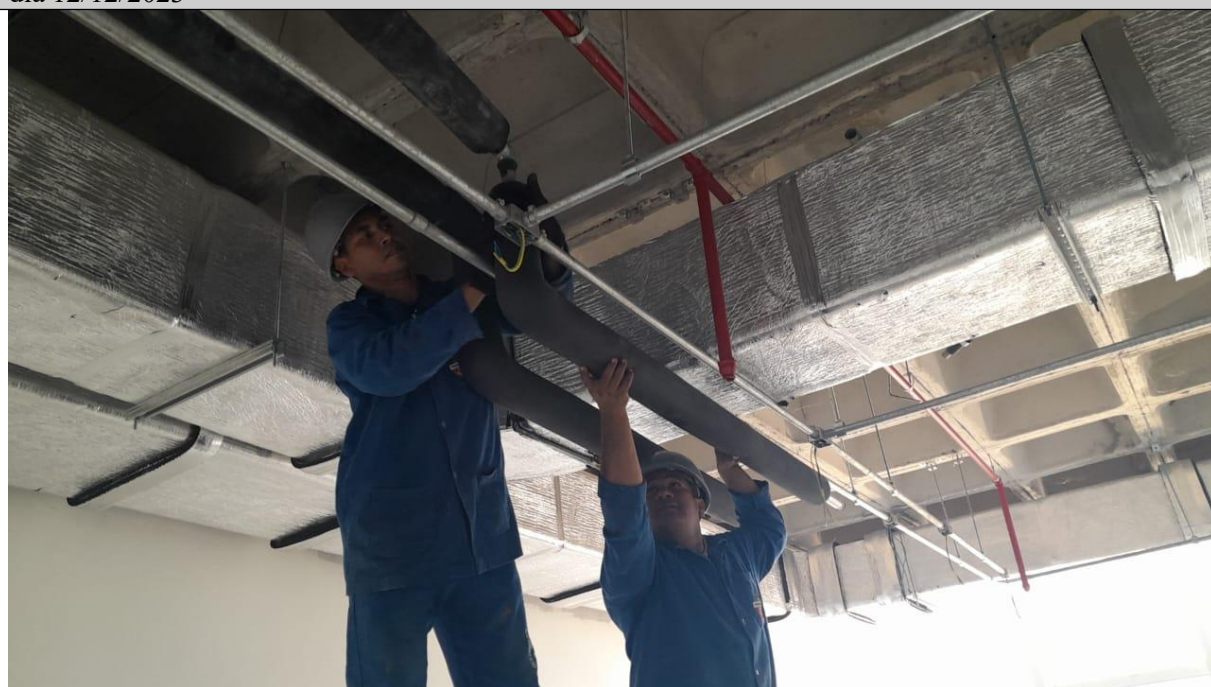

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 - Pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 - Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.

17.3 - A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme a tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/ Colaborador	4	8
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				8
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: -				

18.0 - ANEXO: DIÁRIOS DE OBRA

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	309
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	423	DATA	20/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:20/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
1 VIGIA
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:
3.1 SEM ATIVIDADES
4.0 - OCORRÊNCIAS:
4.1 FERIADO PARA AS EMPRESAS
4.2 EM CONSULTA AO SISTEMA DO MPF, NO DIA 20/11/2023, FICOU CONSTATADO QUE OS FUNCIONÁRIOS DAS SUBCONTRATADAS NÃO POSSUEM O CERTIFICADOS DE CURSOS REFERENTES À NR-35, TRABALHOS EM ALTURA
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	310
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	422	DATA	21/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 21/11/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 11 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 01 - Rejuntador 01 - Gesseiro 02 - Vigia. 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Cabeamento elétrico do 2º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Hidrante. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04 e San 05- Térreo. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento. - Escavação para assentamento de meio- fio. - Confecção de caixas da rede esgoto - externas. - Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa. - Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento. - Confecção de forma e concretagem de viga invertida do Hall do 1º pavimento. 4 - Ocorrências: As documentações dos treinamentos das Nr's da Subcontratada Ferreira e Ferreira encontram-se no Setor do SESMET na obra para que em casos da fiscalização tanto da contratante MPF como Ministério do Trabalho possam verificar em casos de inspeção, a penalidade existente no contrato refere-se a falta de treinamento aos funcionários, o treinamento foi realizado e esteve sempre a disposição caso a fiscalização solicitasse. A documentação será Protocolada junto MPF. Foi realizada uma reunião com Sr. Robson, Sidnei, Fiscal Marcos, Sr Jose Nasser, Marcos Fernandes, Euzielen Mendonça, Claudio sobre reavaliação do aditivo de Pele de vidro, plano de contingência do MPF das parcelas de medição11, 12, 13 e 14.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	311
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	421		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	22/11/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 22/11/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 11 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 01 - Operador de caldeira; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 01 - Rejuntador 01 - Gesseiro 02 - Vigia. 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Instalação elétrica e cabeamento estruturado - Infraestruturas com eletrocalhas, leitos e eletrodutos do Térreo. - Cabeamento elétrico do 2º pavimento. - Confecção e montagem da rede de Hidrante. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do San 01, San 02, San 04 e San 05- Térreo. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 2º pavimento. - Escavação para assentamento de meio- fio. - Confecção de caixas da rede esgoto - externas. - Colocação de tubos de concretos 300mm - rede de drenagem externa. - Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento. - Confecção de forma e concretagem de viga invertida do Hall do 1º pavimento. 4 - Ocorrências: Sem ocorrência					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	312
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	420	DATA	23/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 23/11/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
01 - Operador de caldeira;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.					
- Confeccção e montagem da rede de Hidrante.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, San 04 e San 05- Térreo.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 1º pavimento.					
- Escavação para assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento.					
4 - Ocorrências: A Obra encontra-se há 3 dias sem cimento, os fornecedores estão temporariamente sem fornecimento de cimento devido a vazante da região Amazônica. De acordo com as sondagens, estamos com o menor nível de água em Manaus nos últimos 10 anos e seguem indicando que a Enseada do Rio Madeira passou a ser o local mais crítico para navegação. Portanto, os embarques para Manaus foram reduzidos proporcionalmente a redução de capacidade operacional.					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:23/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - INFRAESTRUTURAS COM ELETROCALHAS, LEITOS E ELETRODUTOS DO TÉRREO.	
3.2 CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO	
3.3 CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE E SPRINKLER	
3.4 PINTURA DE REDE DE DETECÇÃO E ALARME DO 3º PAVIMENTO.	
3.5 MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.6 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 1, 2 E 4 DO TÉRREO	
3.7 ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO.	
3.8 INSTALAÇÃO DE DIVISÓIS EM GRANITO NOS SANITÁRIOS1 E 2 DO TÉRREO .	
3.9 CONFEÇÃO DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTO	
3.10 COLOCAÇÃO DOS TUBOS DE DRENAGEM, 300MM.	
3.11 APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDES DO TÉRREO	
3.12 APLICAÇÃO DE REJUNTE NO 2º PAVIMENTO	
3.13 PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS DO 3º PAVIMENTO	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 FOI OBSERVADO QUE A CORDOALHA TINHA 16 VEIAS, MAS O PROJETO E NORMA ESPECIFICAM UMA CORDOALHA DE EXATAS 7 VEIAS E 3MM, ESSA OBSERVAÇÃO FOI REPASSADA À EMPRESA QUE SE PRONTIFICOU A SUBSTITUIR A CORDOALHA . DE ACORDO COM NBR5419-3 / 2015: SPDA E ATERRAMENTO, DEVE SER O ENCORDOADO DE 50MM² O DIÂMETRO DE CADA FIO CORDOALHA 3MM. A ESPEFICAÇÃO DO PROJETO 50MM² / 7 FIOS 3MMM.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	313
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	419	DATA	24/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 24/11/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 04 - Carpinteiro;
- 09 - Pedreiro;
- 11 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 01 - Operador de caldeira;
- 03 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador
- 01 - Rejuntador
- 01 - Gesseiro
- 02 - Vigia.

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 05 - Aux de funilaria
- 01 - Funileiro
- 01 - Soldador

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.
- Confeção e montagem da rede de Hidrante.
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.
- Montagem de dutos do 2º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, San 04 e San 05- Térreo.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 1º pavimento.
- Escavação para assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.
- Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento.

4 - Ocorrências: A Obra encontra-se há 3 dias sem cimento, os fornecedores estão temporariamente sem fornecimento de cimento devido a vazante da região Amazônica. De acordo com as sondagens, estamos com o menor nível de água em Manaus nos últimos 10 anos e seguem indicando que a Enseada do Rio Madeira passou a ser o local mais crítico para navegação. Portanto, os embarques para Manaus foram reduzidos proporcionalmente a redução de capacidade operacional. Os funcionários que subiram para execução de serviços na laje da casa de máquina sofreram advertência por escrito conforme procedimentos da Construtora. Será enviada as documentações do acidente de trabalho ocorrido na obra no dia 15/11/2023, a empresa seguiu os procedimentos legais e cabíveis. Funcionário já encontra-se trabalhando normalmente.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:24/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1.CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO.	
3.2.CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.	
3.3.APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.4.MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.5.ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 06, SAN 07, SAN 04 E SAN 05- TÉRREO.	
3.6.REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO 1º PAVIMENTO.	
3.7.ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.	
3.8.PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS - 3º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS:	
4.1 FOI INFORMADO À FISCALIZAÇÃO, POR FUNCIONÁRIOS, UM ACIDENTE DE TRABALHO NO DIA 15/11/2023, FERIADO, ONDE UM FUNCIONÁRIO TEVE UM CORTÉ PROFUNDO NA MÃO, SENDO AFIRMADO QUE O MESMO ESTAVA SEM LUVAS DE PROTEÇÃO.	
4.2 DOIS FUNCIONÁRIOS ESTAVAM SUBINDO O RESERVATÓRIO (CASA DE MÁQUINAS) SEM CINTO DE SEGURANÇA EM ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	314
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	418	DATA	25/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	315
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	417	DATA	26/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	316
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	416	DATA	27/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 27/11/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 11 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 01 - Rejuntador 01 - Gesseiro 02 - Vigia. 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Cabeamento elétrico do 2º pavimento. - Infraestrutura de rede elétrica externa - Confecção e montagem da rede de Hidrante. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, San 04 e San 05- Térreo. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 1º pavimento. - Escavação para assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem. - Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento. 4 - Ocorrências: A Obra encontra-se há 7 dias sem cimento, os fornecedores estão temporariamente sem fornecimento de cimento devido a vazante da região Amazônica. De acordo com as sondagens, estamos com o menor nível de água em Manaus nos últimos 10 anos e seguem indicando que a Enseada do Rio Madeira passou a ser o local mais crítico para navegação. Portanto, os embarques para Manaus foram reduzidos proporcionalmente a redução de capacidade operacional. Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	317
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	415		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	28/11/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 28/11/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 11 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 01 - Rejuntador 01 - Gesseiro 02 - Vigia. 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Cabeamento elétrico do 2º pavimento. - Infraestrutura de rede elétrica externa - Confeccção e montagem da rede de Hidrante. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, Lanchonete, Copa Foyer - Térreo. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 1º pavimento. - Escavação para assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem. - Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento. 4 - Ocorrências: A Obra encontra-se há 8 dias sem cimento, os fornecedores estão temporariamente sem fornecimento de cimento devido a vazante da região Amazônica. De acordo com as sondagens, estamos com o menor nível de água em Manaus nos últimos 10 anos e seguem indicando que a Enseada do Rio Madeira passou a ser o local mais crítico para navegação. Portanto, os embarques para Manaus foram reduzidos proporcionalmente a redução de capacidade operacional. Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	318
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	414	DATA	29/11/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 29/11/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Cabeamento elétrico do 2º pavimento.					
- Infraestrutura de rede elétrica externa					
- Confecção e montagem da rede de Hidrante.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, Lanchonete, Copa Foyer - Térreo.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 1º pavimento.					
- Escavação para assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento.					
4 - Ocorrências: A Obra encontra-se há 9 dias sem cimento, os fornecedores estão temporariamente sem fornecimento de cimento devido a vazante da região Amazônica. De acordo com as sondagens, estamos com o menor nível de água em Manaus nos últimos 10 anos e seguem indicando que a Enseada do Rio Madeira passou a ser o local mais crítico para navegação. Portanto, os embarques para Manaus foram reduzidos proporcionalmente a redução de capacidade operacional. Diversas frentes paralisadas por falta de cimento como: Rede de drenagem com tubos de concretos, assentamento de meio fio, fechamentos de rasgos em paredes etc....					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:29/11/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1.CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO.	
3.2.CONFEÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.	
3.3.APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.4.MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.5.ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 06, SAN 07, SAN 04 E SAN 05- TÉRREO.	
3.6.REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO 1º PAVIMENTO.	
3.7.ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.	
3.8.PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS - 3º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	319
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	413		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	30/11/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA
Diário de Obra - Data: 30/11/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 11 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 01 - Rejuntador 01 - Gesseiro 02 - Vigia. 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Cabeamento elétrico do 2º pavimento. - Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico. - Confecção e montagem da rede de Hidrante. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, Lanchonete, Copa Foyer - Térreo. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do 1º pavimento. - Escavação para assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem. - Paredes em Drywall dos Shafts - 3º Pavimento. - Demolição de parede para atender ao novo Layout enviado pelo MPF - Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes 4 - Ocorrências: Sem ocorrencias Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	320
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	412	DATA	01/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	321
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	411	DATA	02/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 01/12/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, Lanchonete, Copa Foyer - Térreo.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo.					
- Escavação para assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto					
- Paredes em Drywall dos Shafts.					
- Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes.					
- Lançamento de concreto para camada de proteção dos eletrodutos - Vala 01.					
- Instalação hidráulica e esgoto de pontos dos sanitários para atender ao projeto de arquitetura.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					
Diário de Obra - Data: 02/12/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
03 - Pedreiro;					
02 - Servente;					
02 - Vigia.					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, Lanchonete, Copa Foyer - Térreo.					
- Escavação para assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto					

4 - Ocorrências: Sem ocorrências
Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	322
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	410	DATA	03/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	323
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	409	DATA	04/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:04/12/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
1 AUX. ADMINISTRATIVO
9 PEDREIRO
4 CARPINTEIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 CALDEIREIRO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
3 PINTOR
1 OPERADOR DE CALDEIRA
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:
2.1.1-RR DOMÓTICA
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA
4 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA
5 AUXILIAR DE FUNILARIA
1 FUNILEIRO
1 SOLDADOR
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:
3.1.CABEAMENTO ELÉTRICO DO 2º PAVIMENTO.
3.2.CONFECCÃO E MONTAGEM DA REDE DE HIDRANTE.
3.3.APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.
3.4.MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.
3.5.ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 06, SAN 07, SAN 04 E SAN 05- TÉRREO.
3.6.REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO 1º PAVIMENTO.
3.7.ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.
3.8.PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS - 3º PAVIMENTO.
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	324
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	408		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	05/12/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 05/12/2023	
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):	
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol	
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):	
01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 11 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 01 - Rejuntador 01 - Gesseiro 02 - Vigia.	
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA	
01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica	
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA	
05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador	
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS	
- Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do San 06, San 07, Lanchonete, Copa Foyer - Térreo. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo. - Escavação e assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem. - Escavação e assentamento de tubulação da rede de esgoto. - Confeção de caixas de drenagem e esgoto. - Paredes em Drywall dos Shafts. - Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes. - Lançamento de concreto para camada de proteção dos eletrodutos - Vala 01. - Proteção mecânica do fundo caixa d'agua.	
4 - Ocorrências: Sem ocorrências	
Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:05/12/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA EXTERNA E PAVIMENTO TÉCNICO.	
3.2. APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.3. MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 06, SAN 07, LANCHONETE, COPA FOYER - TÉRREO.	
3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO TÉRREO.	
3.6. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.	
3.7. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.	
3.8. CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ESGOTO.	
3.9. PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS.	
3.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO - REPAROS EM PONTOS EXISTENTES.	
3.11. LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA CAMADA DE PROTEÇÃO DOS ELETRODUTOS - VALA 01.	
3.12. PROTEÇÃO MECÂNICA DO FUNDO CAIXA D'AGUA.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	325
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	407	DATA	06/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 06/12/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Lanchonete, Copa, Dml e Sanitários de Gabinete do 3º e 2º pav.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo.					
- Escavação e assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Escavação e assentamento de tubulação da rede de esgoto.					
- Confeção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Paredes em Drywall dos Shafts.					
- Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes.					
- Lançamento de concreto para camada de proteção dos eletrodutos - Vala 01.					
- Proteção mecânica do fundo caixa d'agua.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:06/12/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA EXTERNA E PAVIMENTO TÉCNICO.	
3.2. APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.3. MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 06, SAN 07, LANCHONETE, COPA FOYER - TÉRREO.	
3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO TÉRREO.	
3.6. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.	
3.7. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.	
3.8. CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ESGOTO.	
3.9. PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS.	
3.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO - REPAROS EM PONTOS EXISTENTES.	
3.11. LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA CAMADA DE PROTEÇÃO DOS ELETRODUTOS - VALA 01.	
3.12. PROTEÇÃO MECÂNICA DO FUNDO CAIXA D'AGUA.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	326
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	406	DATA	07/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 07/12/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Lanchonete, Copa, Dml e Sanitários de Gabinete do 3º e 2º pav.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo.					
- Escavação e assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Escavação e assentamento de tubulação da rede de esgoto.					
- Confeção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Paredes em Drywall dos Shafts.					
- Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes.					
- Lançamento de concreto para camada de proteção dos eletrodutos - Vala 01.					
- Proteção mecânica do fundo caixa d'agua.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:07/12/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA EXTERNA E PAVIMENTO TÉCNICO.	
3.2. APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.3. MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO SAN 06, SAN 07, LANCHONETE, COPA FOYER - TÉRREO.	
3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO TÉRREO.	
3.6. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.	
3.7. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.	
3.8. CONFEÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ESGOTO.	
3.9. PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS.	
3.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO - REPAROS EM PONTOS EXISTENTES.	
3.11. LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA CAMADA DE PROTEÇÃO DOS ELETRODUTOS - VALA 01.	
3.12. PROTEÇÃO MECÂNICA DO FUNDO CAIXA D'AGUA.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	327
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	405	DATA	08/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA	
Diário de Obra - Data: 08/12/2023 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoxarife; 04 - Carpinteiro; 09 - Pedreiro; 11 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 03 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador 01 - Rejuntador 01 - Gesseiro 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 02 - Eletricista 01 - Pedreiro 03 - Aux. de serviços gerais 01 - Técnico em eletrotécnica 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 05 - Aux de funilaria 01 - Funileiro 01 - Soldador 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico. - Aplicação de massa PVA em parede do Térreo. - Montagem de dutos do 2º pavimento. - Assentamento de revestimento de piso e parede do Lanchonete, Copa, Dml e Sanitários de Gabinete do 3º e 2º pav. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo. - Escavação e assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem. - Escavação e assentamento de tubulação da rede de esgoto. - Confecção de caixas de drenagem e esgoto. - Paredes em Drywall dos Shafts. - Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes. - Lançamento de concreto para camada de proteção dos eletrodutos - Vala 01. - Colocação de rufos metálico da cobertura do pavimento técnico. - Confecção de chapim de concreto do muro lateral 4 - Ocorrências: Sem ocorrências Estamos a disposição para esclarecimentos	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	328
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	404	DATA	09/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 09/12/2023

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo chuvoso

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

01 - Engenheiro Civil;
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
01 - Mestre de Obra;
02 - Carpinteiro;
04 - Pedreiro;
03 - Servente;
01 - Operador de maquina pesadas
02 - Vigia.

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Assentamento de revestimento de piso e parede do Lanchonete, Copa, Dml e Sanitários de Gabinete do 3º e 2º pav.

- Escavação e assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.

- Escavação e assentamento de tubulação da rede de esgoto.

- Confecção de chapim de concreto do muro lateral

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	329
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	403	DATA	10/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	330
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	402	DATA	11/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	331
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	401	DATA	12/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 12/12/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Rejuntador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Lanchonete, Copa, Dml e Sanitários de Gabinete do 3º e 2º pav.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo.					
- Escavação e assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Escavação e assentamento de tubulação da rede de esgoto.					
- Confeção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Paredes em Drywall dos Shafts.					
- Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes.					
- Colocação de rufos metálico da cobertura do pavimento técnico.					
- Confeção de chapim de concreto do muro lateral					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:12/12/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA EXTERNA E PAVIMENTO TÉCNICO.	
3.2. APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.3. MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DA LANCHONETE, COPA, DML, SANITÁRIOS DE GABINETE DO 3º E 2º PAVIMENTO.	
3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO TÉRREO.	
3.6. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.	
3.7. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.	
3.8. CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ESGOTO.	
3.9. PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS.	
3.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO - REPAROS EM PONTOS EXISTENTES.	
3.11. COLOCAÇÃO DE RUFO METÁLICO DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO	
3.12. CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	332
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	400	DATA	13/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 13/12/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Lanchonete, Copa, Dml e Sanitários de Gabinete do 3º e 2º pav.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo.					
- Escavação e assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Escavação e assentamento de tubulação da rede de esgoto.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Paredes em Drywall dos Shafts.					
- Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes.					
- Colocação de rufos metálico da cobertura do pavimento técnico.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:13/12/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA EXTERNA E PAVIMENTO TÉCNICO.	
3.2. APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.3. MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DA LANCHONETE, COPA, DML, SANITÁRIOS DE GABINETE DO 3º E 2º PAVIMENTO.	
3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO TÉRREO.	
3.6. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.	
3.7. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.	
3.8. CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ESGOTO.	
3.9. PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS.	
3.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO - REPAROS EM PONTOS EXISTENTES.	
3.11. COLOCAÇÃO DE RUFO METÁLICO DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO	
3.12. CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	333
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	399	DATA	14/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 14/12/2023					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
04 - Carpinteiro;					
09 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador					
01 - Gesseiro					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
05 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
01 - Soldador					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Infraestrutura de rede elétrica externa e pavimento técnico.					
- Aplicação de massa PVA em parede do Térreo.					
- Montagem de dutos do 2º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede do Lanchonete, Copa, Dml e Sanitários de Gabinete do 3º e 2º pav.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo.					
- Escavação e assentamento de tubulação de concreto da rede drenagem.					
- Escavação e assentamento de tubulação da rede de esgoto.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Paredes em Drywall dos Shafts.					
- Instalação hidráulica e esgoto - Reparos em pontos existentes.					
- Colocação de rufos metálico da cobertura do pavimento técnico.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral					
4 - Ocorrências: Visita técnica da SEA.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA:14/12/2023
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
1 AUX. ADMINISTRATIVO	
9 PEDREIRO	
4 CARPINTEIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA	
4 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
5 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
1 SOLDADOR	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA EXTERNA E PAVIMENTO TÉCNICO.	
3.2. APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO.	
3.3. MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO.	
3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DA LANCHONETE, COPA, DML, SANITÁRIOS DE GABINETE DO 3º E 2º PAVIMENTO.	
3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO TÉRREO.	
3.6. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM.	
3.7. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.	
3.8. CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ESGOTO.	
3.9. PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS.	
3.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO - REPAROS EM PONTOS EXISTENTES.	
3.11. COLOCAÇÃO DE RUFO METÁLICO DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO	
3.12. CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	334
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	398	DATA	15/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	335
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	397		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	16/12/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	336
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	396		
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	17/12/2023

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	337
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	395	DATA	18/12/2023
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA:18/12/2023 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 1 AUX. ADMINISTRATIVO 9 PEDREIRO 4 CARPINTEIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 CALDEIREIRO 1 OPERADOR DE BETONEIRA 2 VIGIA 3 PINTOR 1 OPERADOR DE CALDEIRA 2.1- SUBCONTRATAÇÃO: 2.1.1-RR DOMÓTICA 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 1 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 4 ELETRICISTA 1 PEDREIRO 1 AUX. DE SERVIÇO GERAL 2.1.2- FERREIRA E FERREIRA 5 AUXILIAR DE FUNILARIA 1 FUNILEIRO 1 SOLDADOR 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1. INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA EXTERNA E PAVIMENTO TÉCNICO. 3.2. APLICAÇÃO DE MASSA PVA EM PAREDE DO TÉRREO. 3.3. MONTAGEM DE DUTOS DO 2º PAVIMENTO. 3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DA LANCHONETE, COPA, DML, SANITÁRIOS DE GABINETE DO 3º E 2º PAVIMENTO. 3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO TÉRREO. 3.6. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA REDE DRENAGEM. 3.7. ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO. 3.8. CONFECÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM E ESGOTO. 3.9. PAREDES EM DRYWALL DOS SHAFTS. 3.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO - REPAROS EM PONTOS EXISTENTES. 3.11. COLOCAÇÃO DE RUFO METÁLICO DA COBERTURA DO PAVIMENTO TÉCNICO 3.12. CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL 4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.


Fiscalização

Contratada


100



AVENIDA GENERAL SAMPAIO

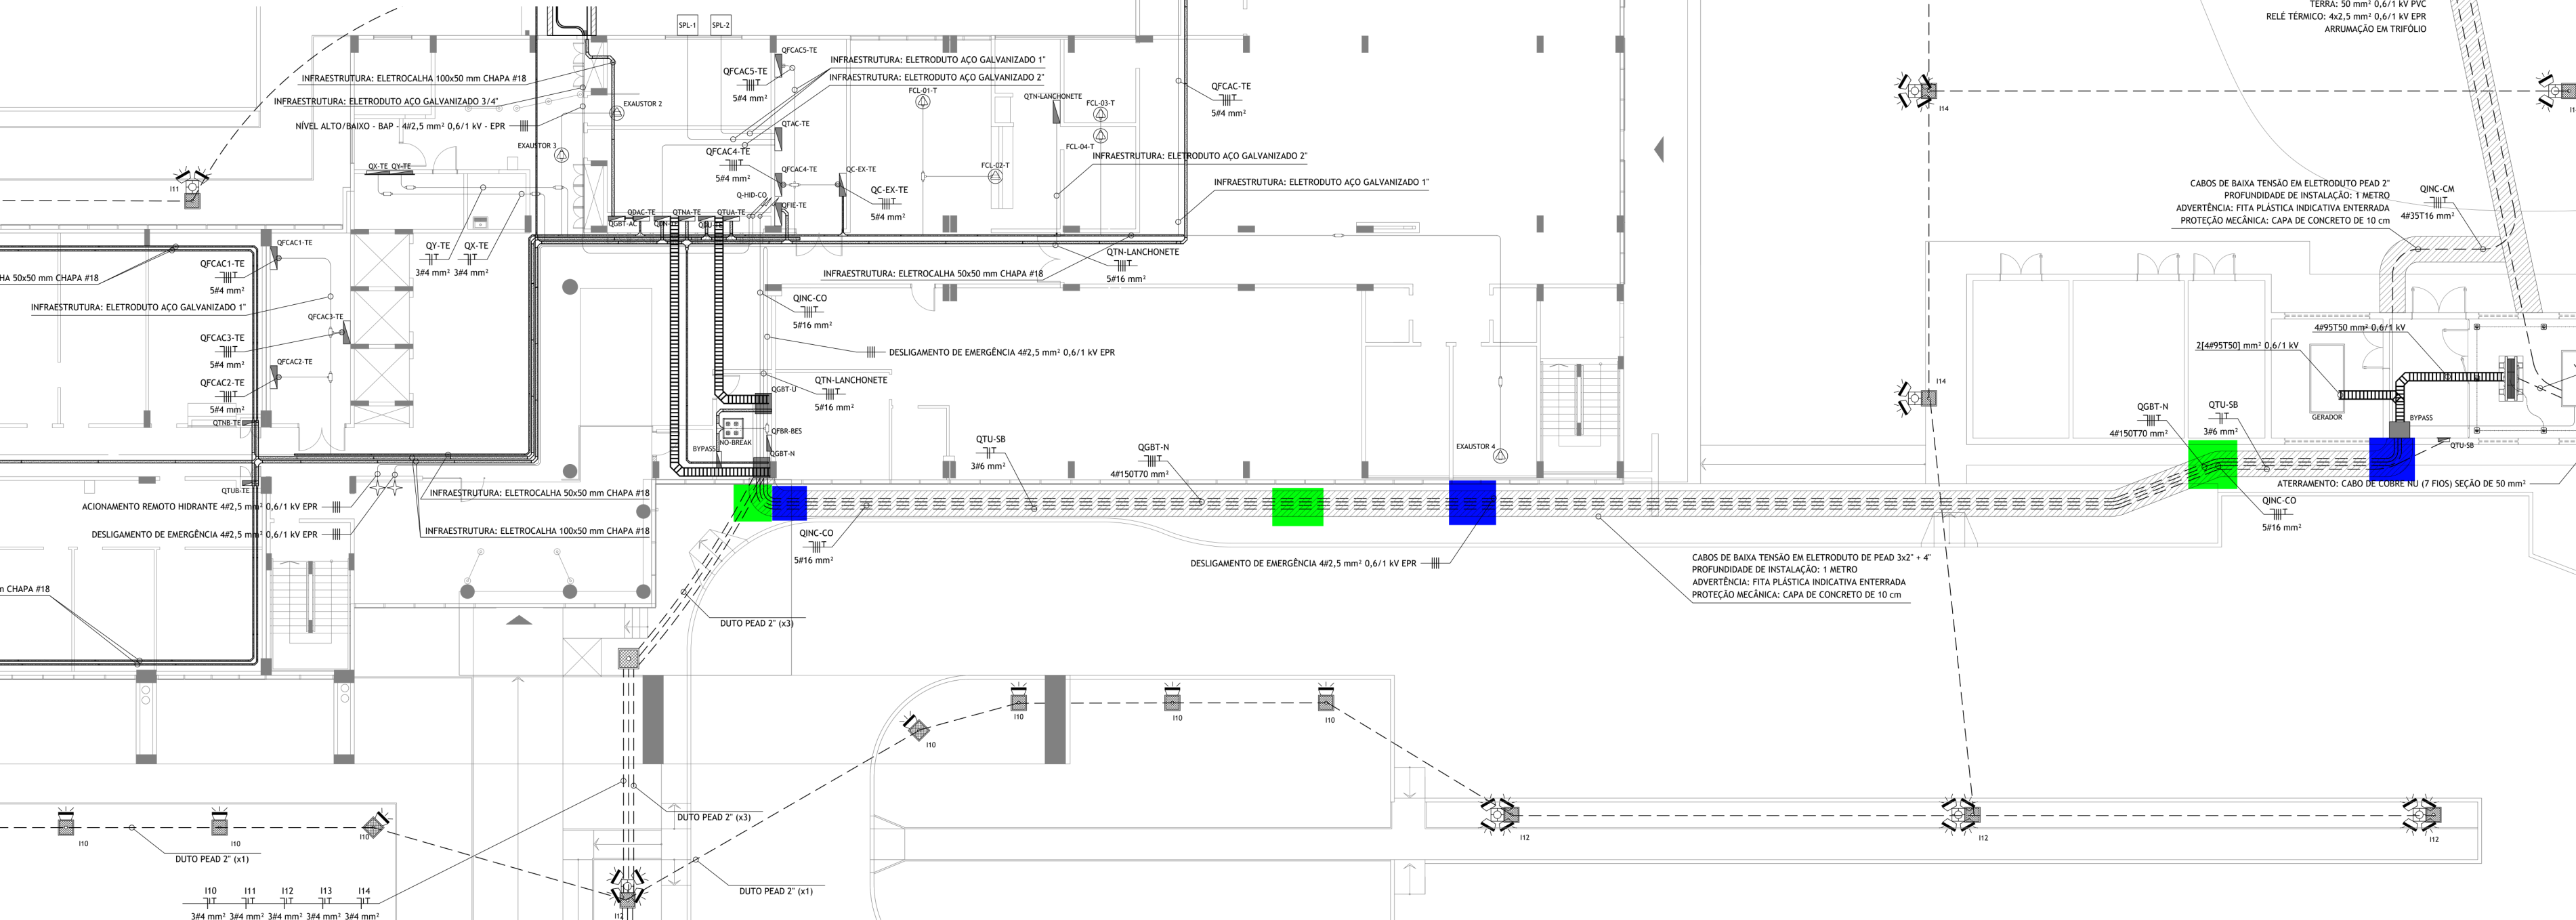


Caixa de esgoto

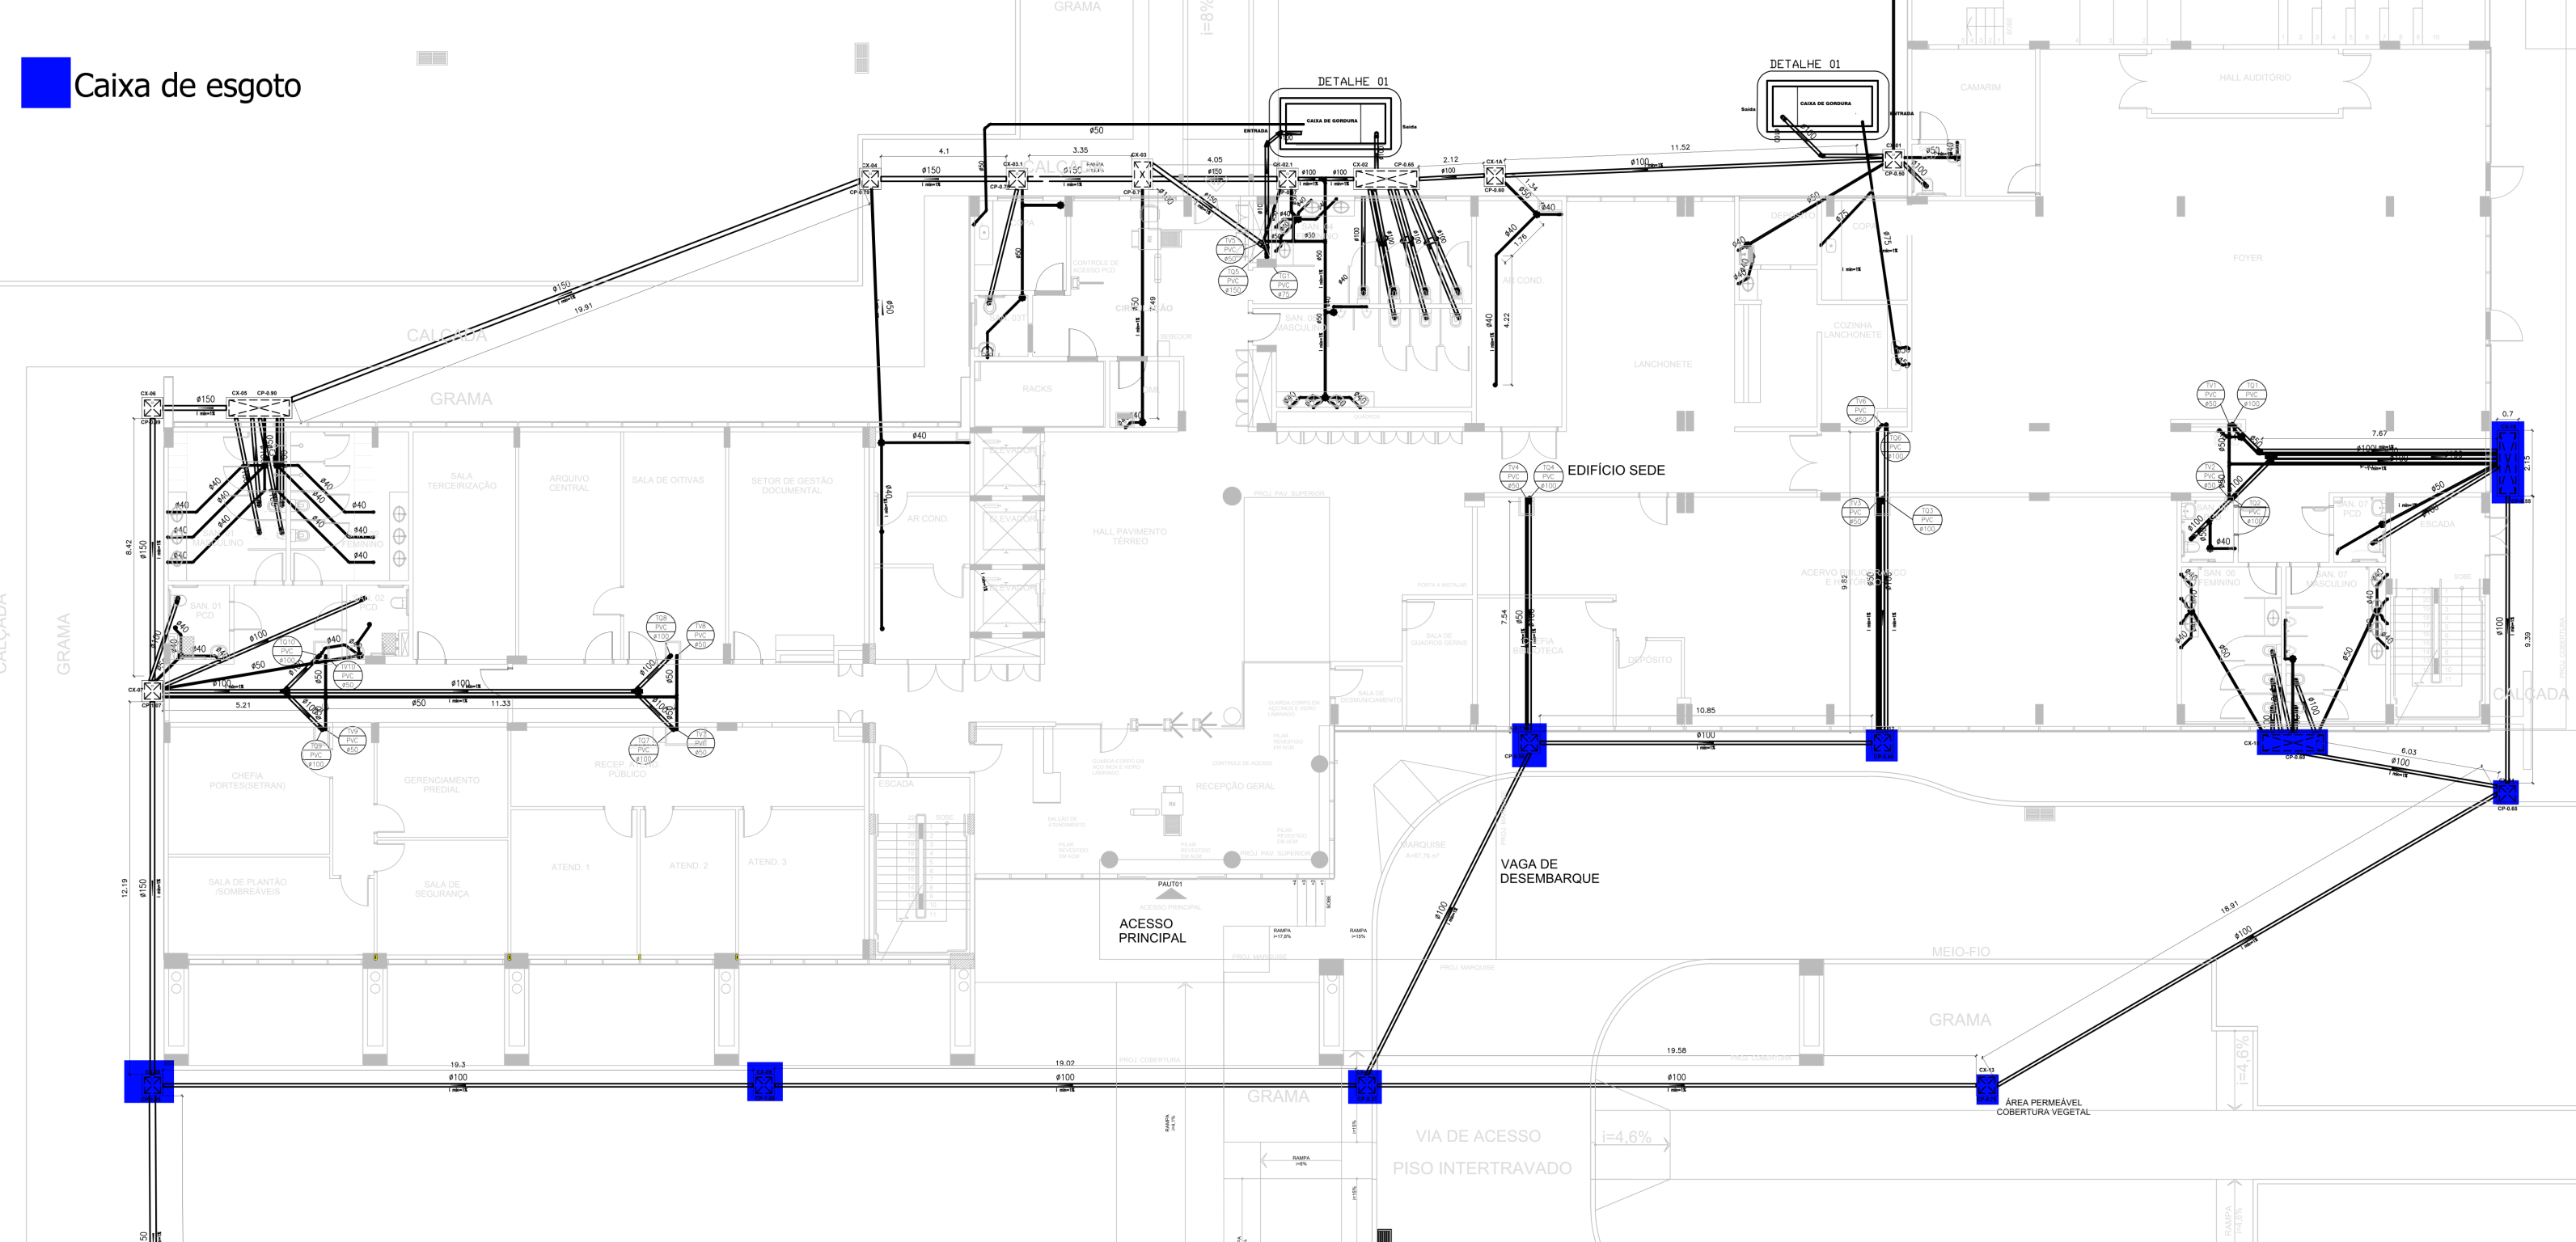




Piso em porcelanado 90x90 - Térreo

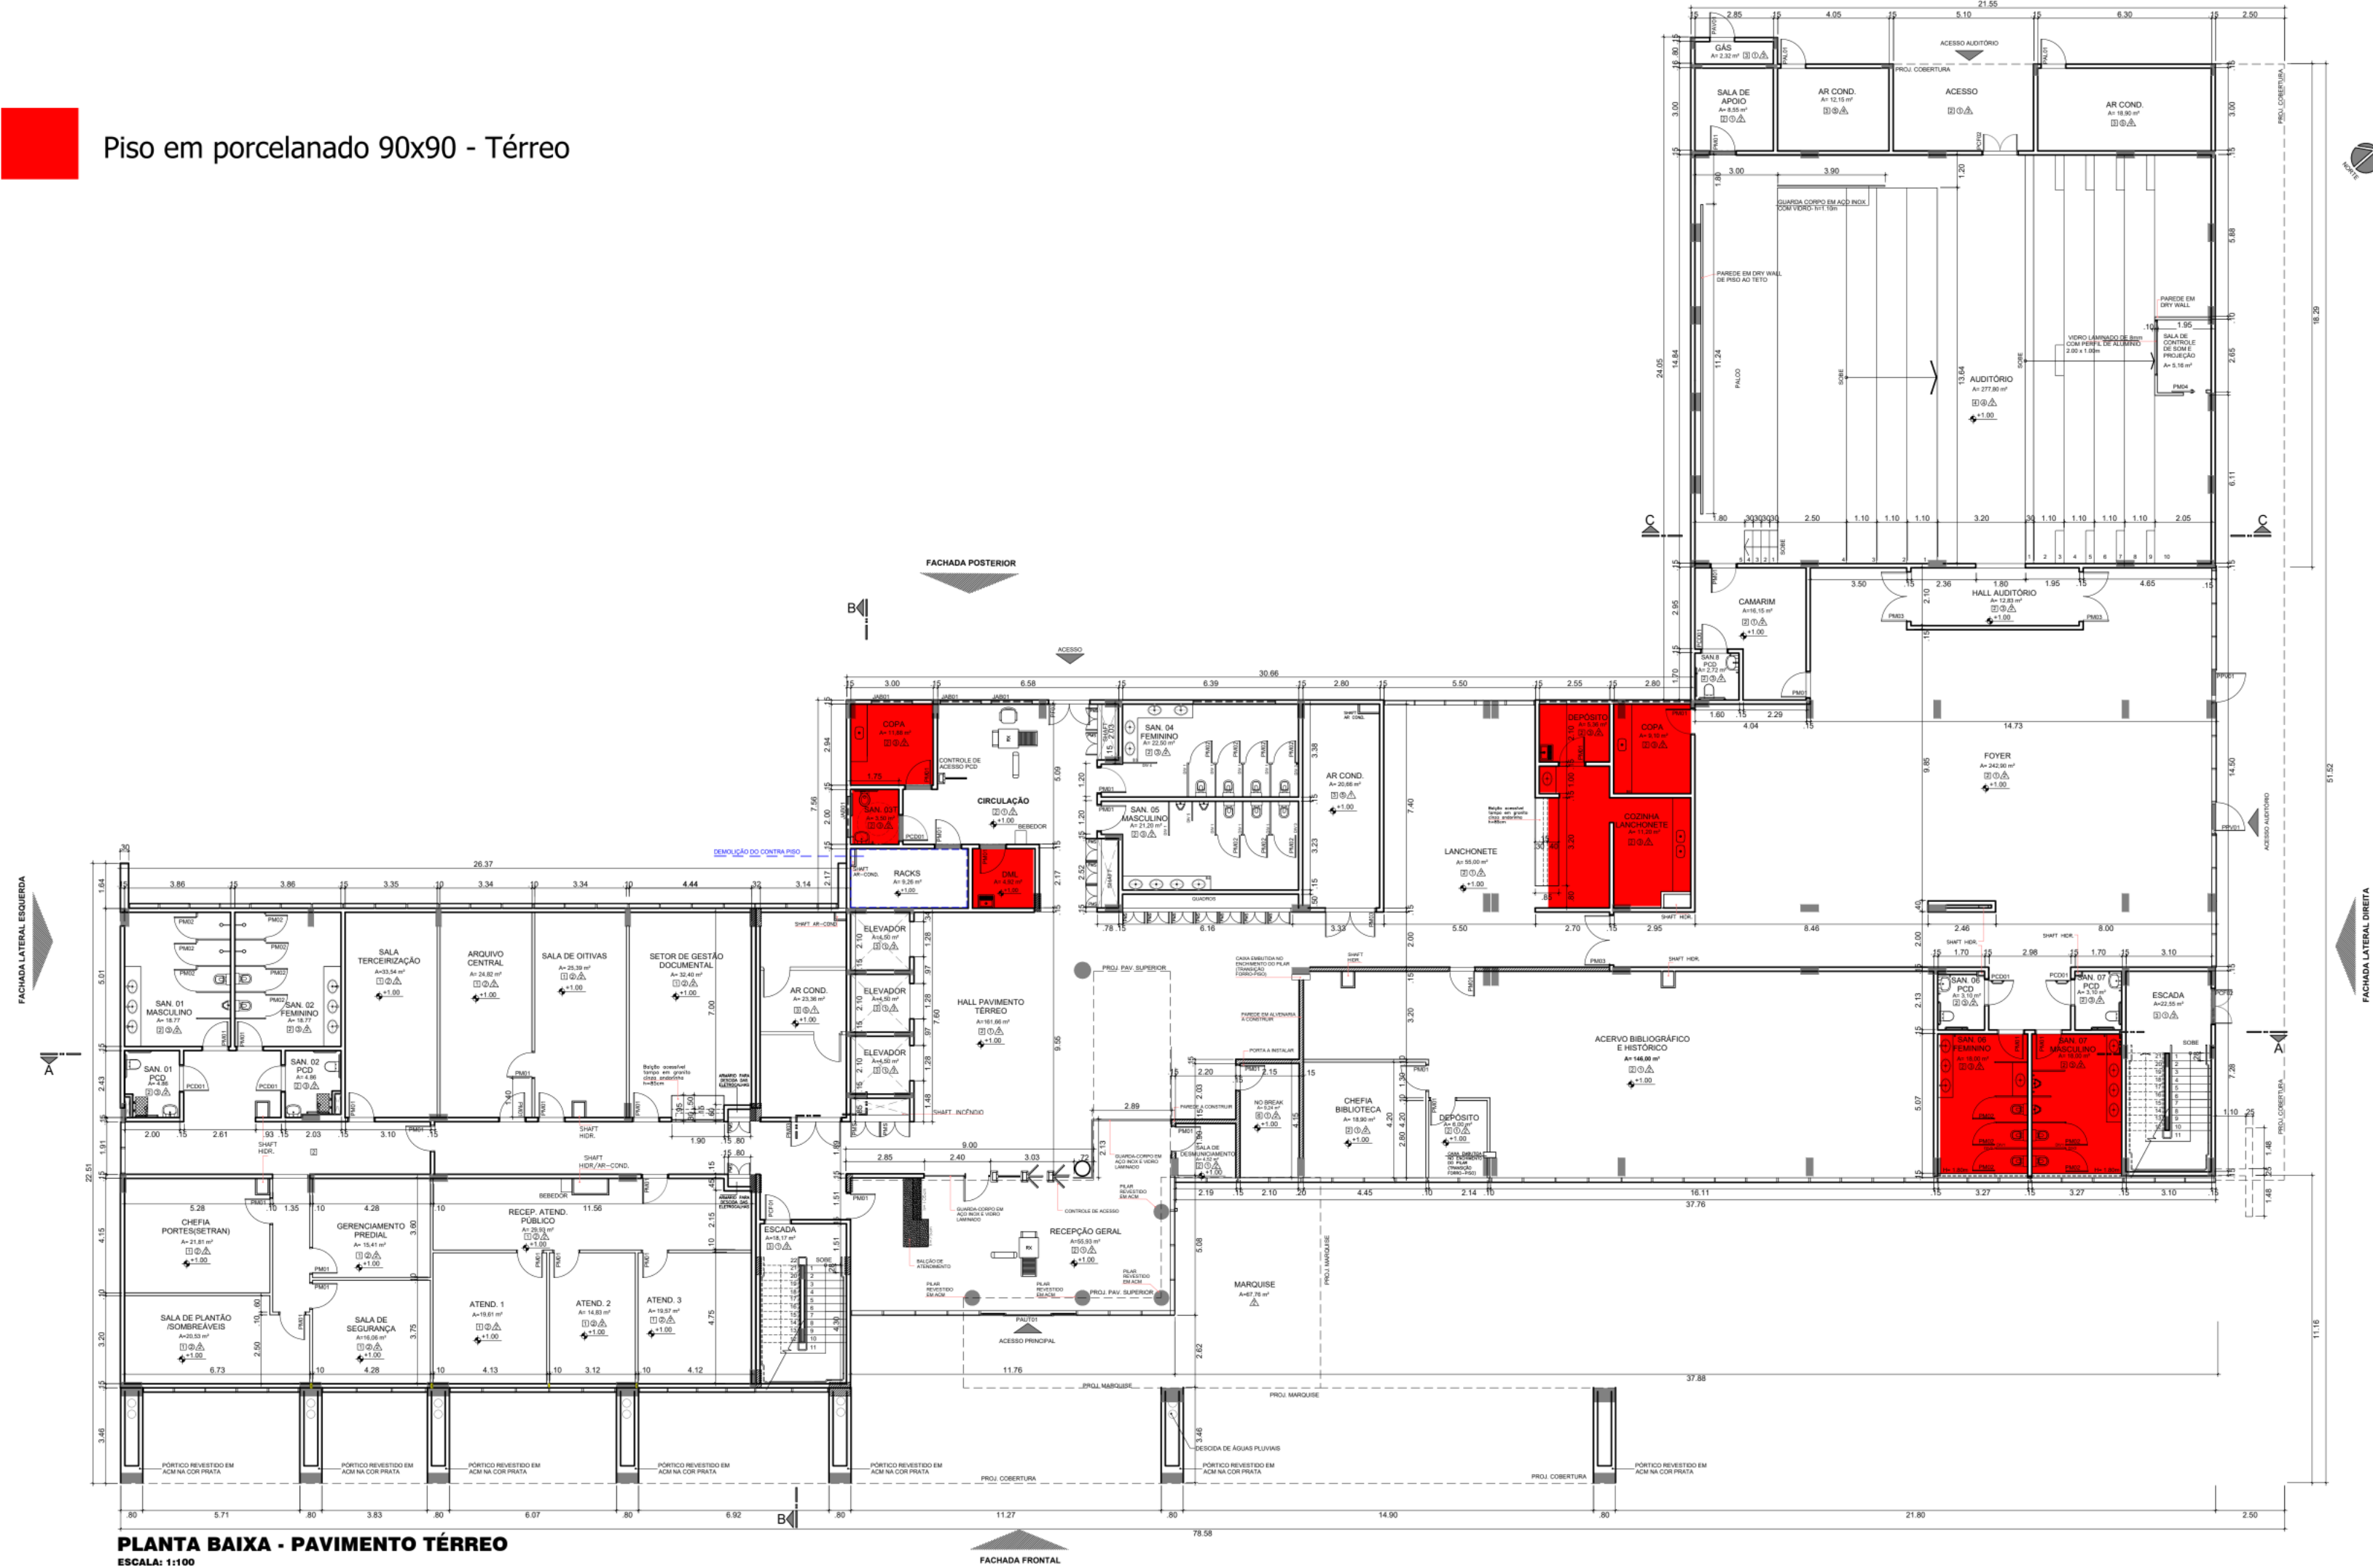




Piso em porcelanato 90x90 - 2º pavimento

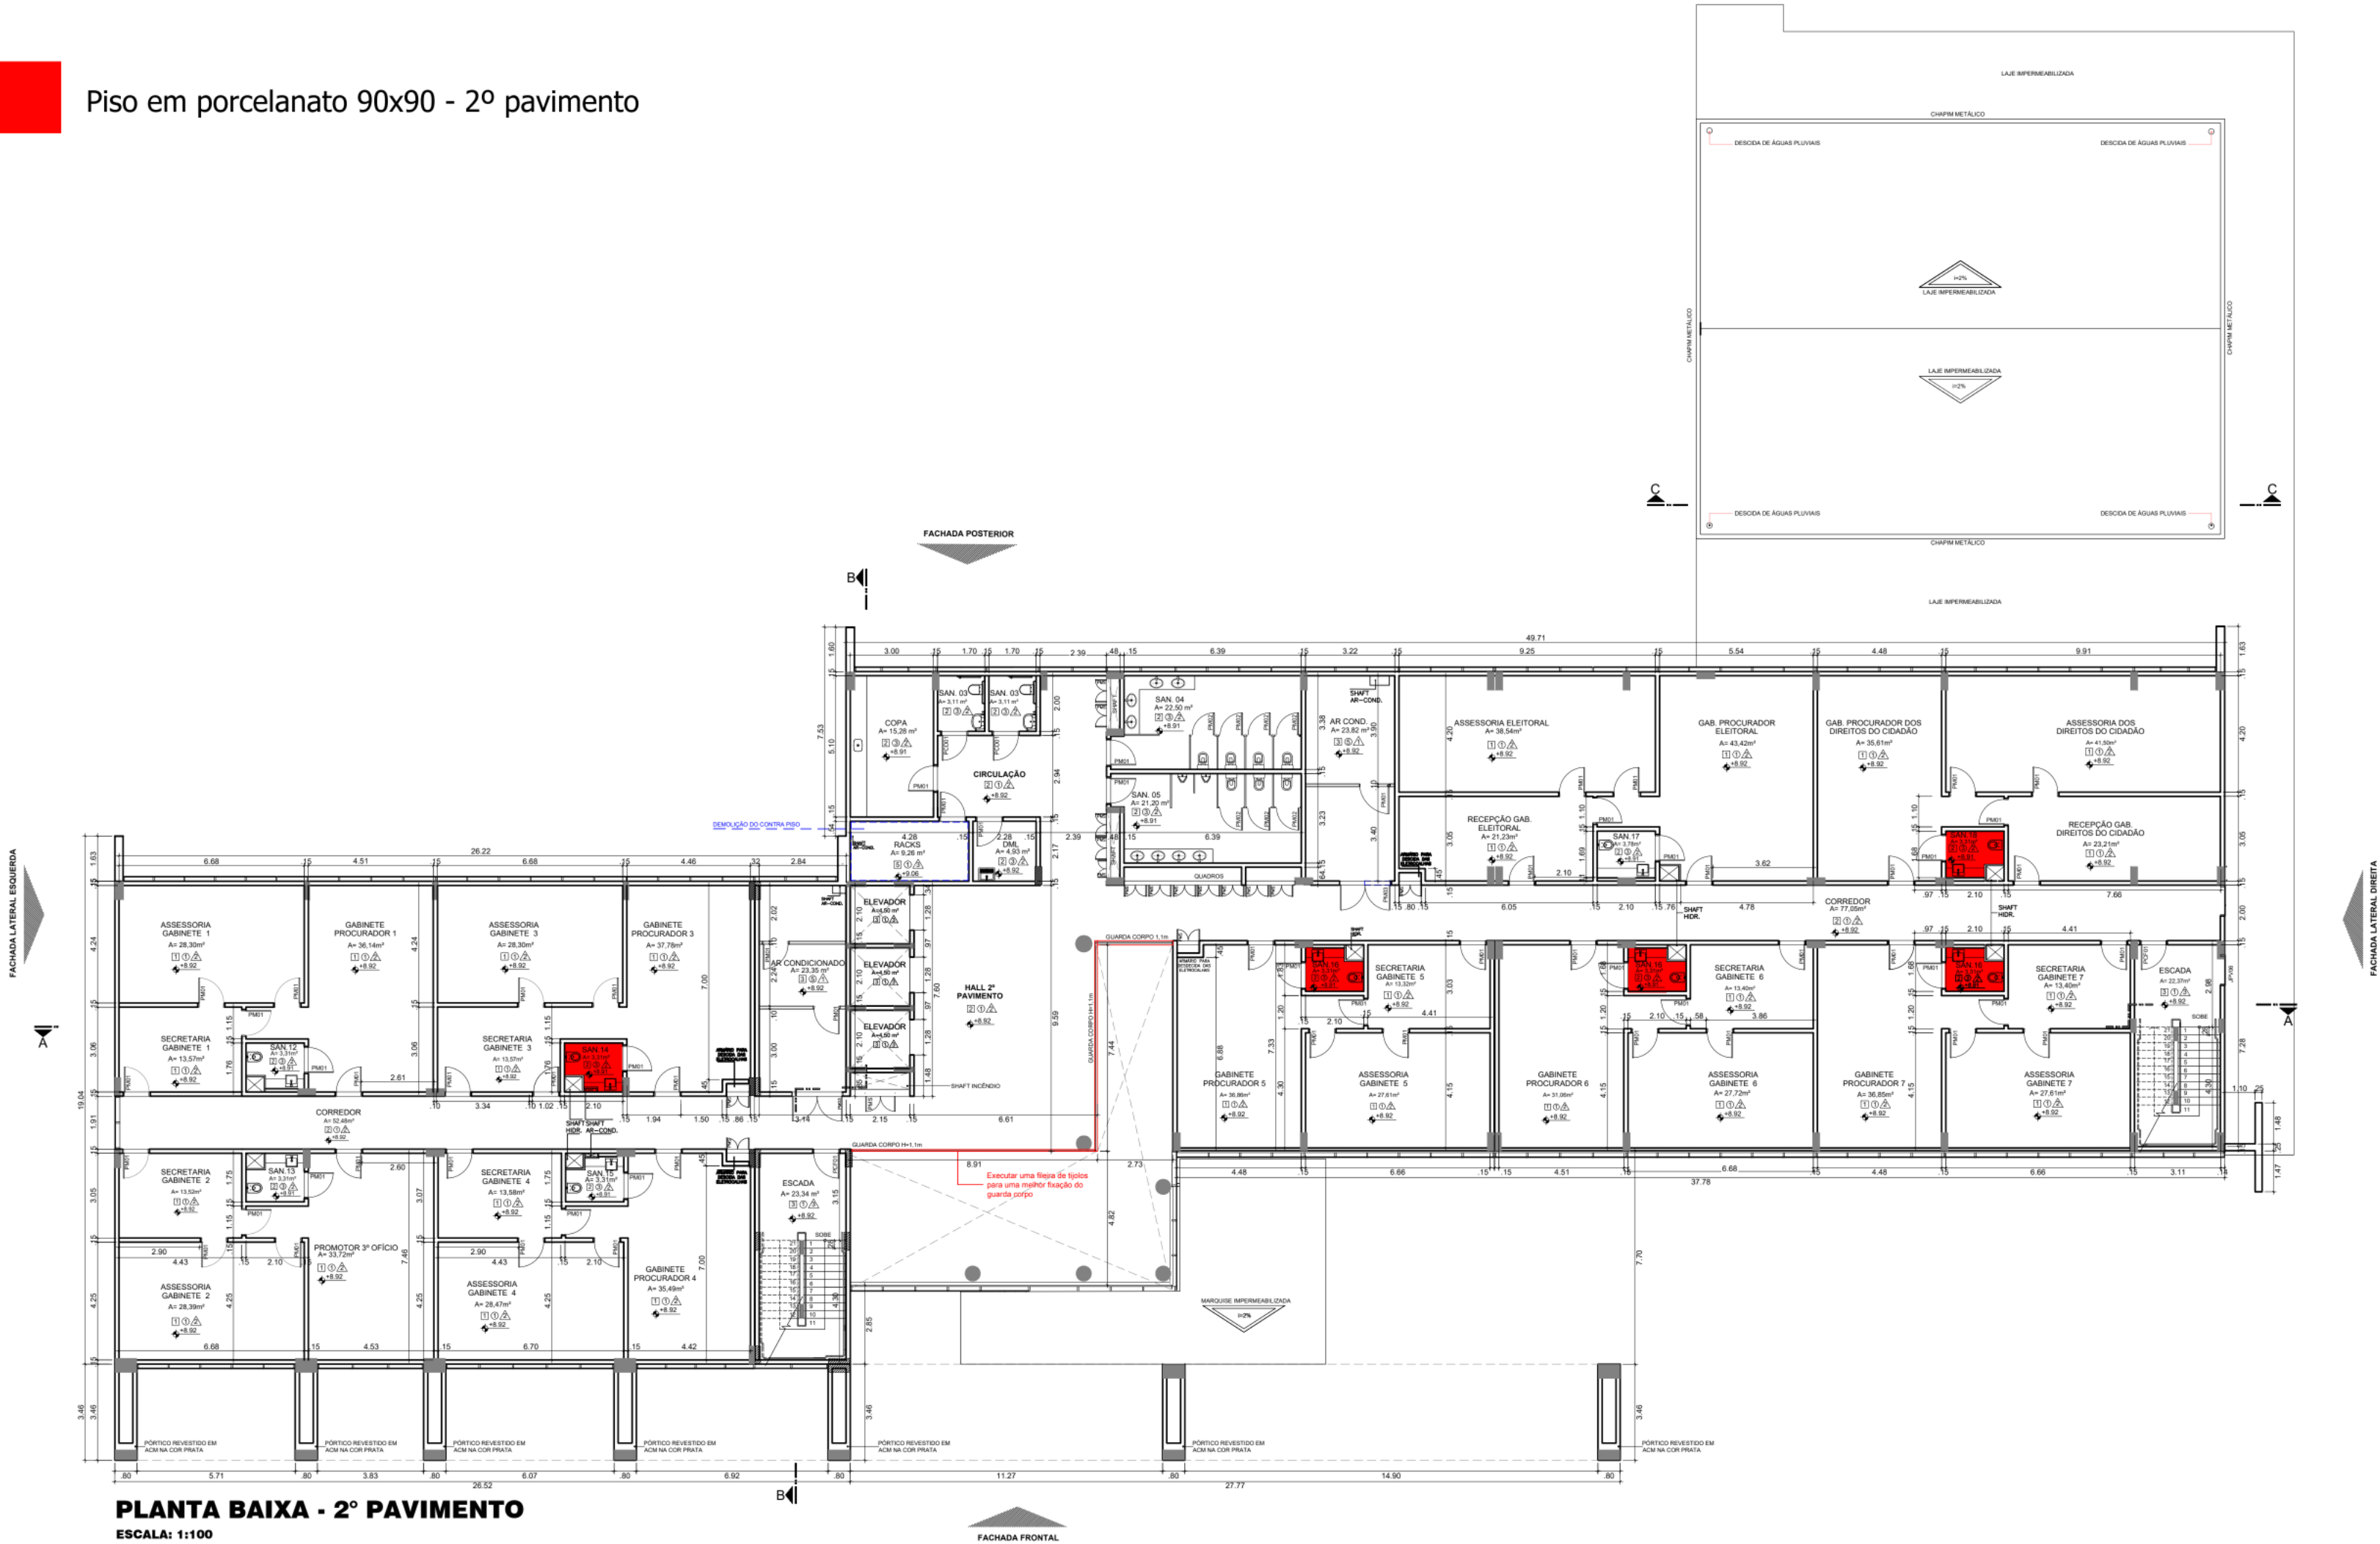



Piso em porcelanato 90x90 - 3º pavimento

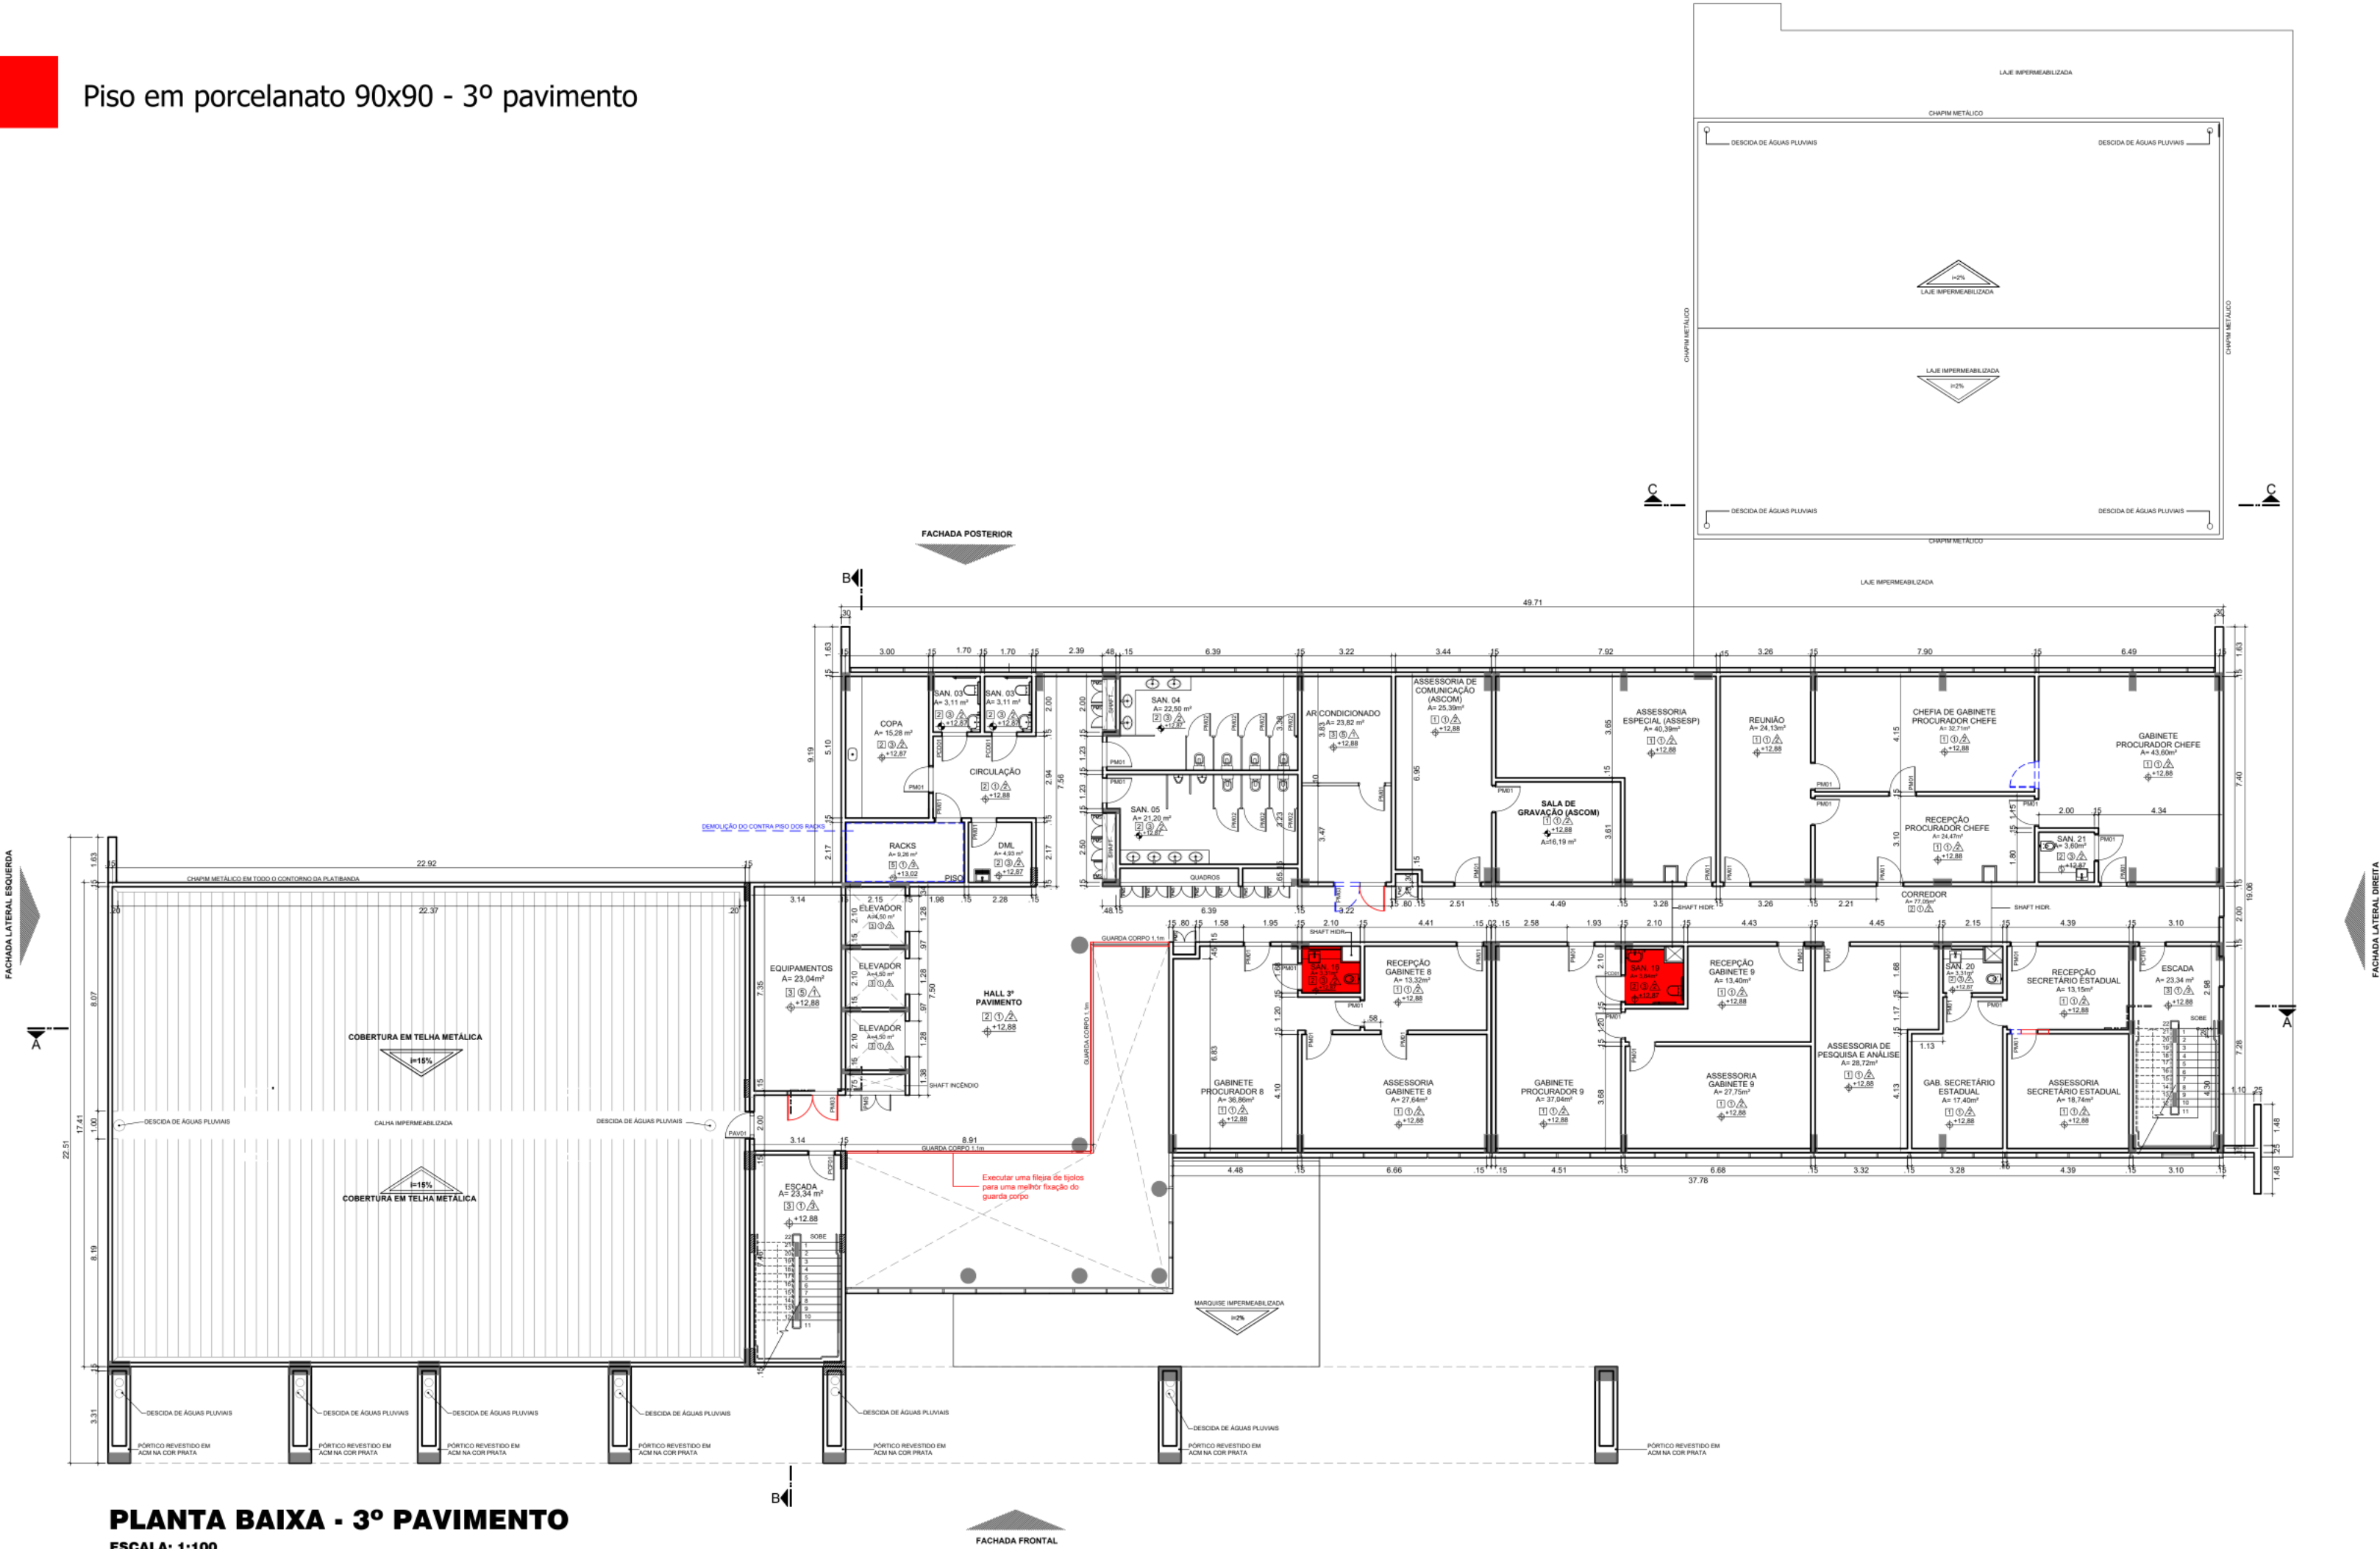

PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO

ESCALA: 1:100
