



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR/RR

Despacho nº 141/2024

Referência: 1.32.000.000003/2023-89

Assunto: Relatório técnico da 13ª medição da obra da Nova Sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Segue em anexo o relatório técnico da 13ª medição

Nota Fiscal Eletrônica de Referência R\$527.456,85 (quinhentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste R\$ 28.482,67 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.

Boa Vista, 20 de fevereiro de 2024.

(Assinado Eletronicamente)

MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 13ª MEDIÇÃO





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 13/2023		
INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA:		16 de janeiro de 2023
PERÍODO DO RELATÓRIO		De 18 de Janeiro a 19 de fevereiro de 2024
SERVIÇOS PREVISTOS PARA DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO		Instalação de infraestrutura elétrica, combate à incêndio (reparo e teste do sistema), sistema de climatização, execução de meio fio, emboço e emassamento, cabeamento, caixas de esgoto, caixas de drenagem, revestimento cerâmico, trabalhos em granito (soleira, bancadas etc.), uso de dry-wall nos shafts, forro de gesso acartonado, chapim no muro.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF		
Nome:	Engenheiro Marcos Eduardo Silva Madureira	
Telefone:	(95) 3198-2005	
E-mail:	marcoseduardo@mpf.mp.br	
1.0 - COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)		
Nome:	Nazareno Nunes Rodrigues / Sidney Wanderley de Oliveira / Marcos Eduardo Silva Madureira	
Portaria:	SE/PR-RR nº02/2023	
Telefone:	(95) 3198-2025 / 2073	
E-mail:	prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br prrr-contratos@mpf.mp.br	
2.0 - ESCOPO E LOCAL		
DADOS DO CONTRATO:	Nº Contrato: 05/2022	PPA/LOA: AÇÃO 110E

Empresa Contratada	J. NASSER ENGNHARIA LTDA	CNPJ 04.618.096/0001-07
Matrícula CEI da Obra	51.235.89823/71	
Valor Atual do Contrato	R\$31.595.942,84 (trinta e um milhões e quinhentos e noventa e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)	
Percentual de reajuste	5,40%	
Saldo de Empenho	5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) – 106/2022 SEOF/PRRR - PR-RR-00034113/2022	
Local/UF	Boa Vista – RR	
Responsável Técnico	José Nasser – ART de Execução: RR20230111507	
Corresponsável Técnico	Euzielen da Silva Mendonça – ART Co-Responsável: RR20230111507 / Obra serviço nº RR20230111835	
Nota Fiscal Eletrônica de Referência	R\$ 527.456,85 (quinhentos e vinte e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).	
Nota Fiscal Eletrônica de Reajuste	R\$ 28.482,67 (vinte e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), referente ao reajuste de 5,40%, de acordo com o índice INCC vigente.	

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% Previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,07%	0,21%	0,07%	0,21%
2	0,17%	0,29%	0,24%	0,50%
3	1,16%	0,75%	1,40%	1,25%
4	0,88%	0,66%	1,93%	1,91%
5	1,64%	1,29%	3,57%	3,21%
6	1,94%	1,25%	5,51%	4,46%
7	0,95%	1,29%	4,93%	5,75%
8	1,17%	2,11%	6,10%	7,85%
9	1,83%	2,13%	7,93%	9,98%
10	2,86%	1,91%	10,79%	11,88%
11	4,30%	1,40%	15,08%	13,28%
12	4,30%	1,58%	19,39%	14,86%
13	1,34%	1,65%	17,03%	16,37%
TOTAL EXECUTADO				16,37%
TOTAL A EXECUTAR				83,33%

Identificação do processo de fiscalização	1.32.000.000464/2022-71
Tipo de obra	Prédio Público
Objeto da fiscalização	Construção da nova sede da Procuradoria da República

	no Estado de Roraima
Período abrangido pela fiscalização	18/01/2024 a 19/02/2024 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)
3.0 - ATIVIDADES DO PERÍODO	
Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa J. NASSER ENGENHARIA LTDA desde a serviço de alvenaria/chapisco/emboço, instalações hidrossanitários, instalação de incêndio, sistema de climatização (Exaustão mecânica), instalações de infra de elétrica como interruptor e tomada baixa ou alta, fiação de iluminação e tomada/interruptor, movimentação de terra, confecção das caixas de drenagem de água pluviais, junto com a tubulação do sistema, confecção das caixas de passagem e tubulação de esgoto, revestimento de piso e parede com cerâmica, bancada de granito, chapim de concreto, fechamento de shafts com dry-wall e forro de gesso acartonado, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados). Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades não foram concluídas.	
4.0 - CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO	
Constatação do Período nº 1: Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro com os itens: SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ESTRUTURA DE CONCRETO, ARQUITETURA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, SERVIÇOS GERAIS E SPDA, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;	
5.0 - OCORRÊNCIAS TÉCNICAS	
A) Ficou determinado pela Fiscalização da obra e Sea que a inclinação das tabulação de águas pluviais será 0,5%, em virtude do reservatório de água de reuso já construído esta acima da cota necessária para a tubulação com inclinação de 1%. Bem como correção do diâmetro da tubulação de 150mm para 200mm ao lado auditório. No projeto a tubulação iniciava neste trecho com 200mm e diminuiu para 150mm, a fiscalização determinou continuar com a tubulação de 200mm até a caixa com 02(dois) de 150mm; B) Devido ao acréscimo do custo da obra, ao serem somados os preços dos aditivos nas medições anteriores, e a atualização do cronograma, as porcentagens executivas previstas diminuíram.	
6.0 – CONCLUSÃO	
Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada não executou os serviços listados no cronograma.	
7.0 – ANEXOS	
A) 13.0 Relatório fotográfico do período	

8.0 - LOCAL E DATA DO RELATÓRIO	
Boa Vista – Roraima, 20 de fevereiro de 2024	
9.0 - FÉ DO MEMBRO DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022	
Declaramos que as metas estabelecidas na 13ª etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro não foram atendidas.	
 Marcos Eduardo Silva Madureira Engenheiro Civil/Membro da Comissão	
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	
10.0 - PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL	
☐ Não foram identificados vícios. ☐ Ver Nota Técnica ou Despacho constante da _____ folha _____ de n.º. _____	 Igor José Barbosa Duarte Lopes Secretário Estadual
Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com rubricas em todas as suas folhas .	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 13ª MEDIÇÃO

11.0 - A DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO FOI EFETUADA PELO FISCAL DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA, MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA, MATRÍCULA 31143, NO DIA 18/01/2023

11.1 - Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma (%)	Percentual executado <i>in loco</i> (%)	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
PLACA DE OBRA, CANTEIRO DE OBRA, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E PROTEÇÃO	91,39%	80,24%	X	
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,70%	8,04%		X
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÕES, ATERRO E REATERRO	0,00%	7,01%		X
ESTRUTURAS DE CONCRETO				
GRADIL, MURO, VIGA DA COBERTURA, CANALETA DE CONCRETO, REPAROS E COMPLEMENTOS	38,48%	27,36%	X	

ARQUITETURA				
VEDAÇÃO, PISOS, REVESTIMENTOS DE PAREDES E FACHADAS, FORROS, COBERTURA E PROTEÇÕES, PORTAS, ESQUADRIAS, PINTURAS, LOUÇAS E BANCADAS, METAIS, SERRALHERIA, URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E DIVERSOS	15,25%	14,83%	X	
IMPERMEABILIZAÇÃO				
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	54,65%	54,65%		X
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS				
ÁGUA FRIA, ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUAS PLUVIAIS E IRRIGAÇÃO	25,22%	23,18%	X	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES E SPRINKLERS	34,09%	25,39%	X	
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA				
SUBESTAÇÃO, GERADOR E UPS, INFRAESTRUTURA, CONDUTORES CABOS, PAINÉIS E QUADROS, TOMADAS, SPDA E ATERRAMENTO	19,43%	18,28%	X	
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				
CABEAMENTO ESTRUTURADO, EQUIPAMENTOS, CERTIFICAÇÃO, SISTEMA DE SOM/TV,	22,39%	31,81%		X
INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE				
QUADROS, SENSORES E TERMOSTATOS, INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO, COMISSIONAMENTO	0,00%	0,00%	X	
CLIMATIZAÇÃO				
ÁGUA GELADA, VRF, SPLIT, VENTILAÇÃO MECÂNICA-, TUBULAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS, LIGACÕES E DUTOS DE AR	15,02%	14,95%	X	

SERVIÇOS GERAIS				
TRANSPORTE DE MATERIAIS, LIMPEZA DA OBRA, DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA, PROJETO AS BUILT E TAXAS DE CONSTRUÇÃO	53,55%	50,11%	X	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				
INSUMOS PÚBLICOS, ADMISTRAÇÃO DA OBRA	16,80%	16,53%	X	

12.0 SEGUE ABAIXO A PLANILHA CONTENDO O RESUMO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE REALIZADOS E PACTUADOS PARA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES CONTRATADOS						13ª. MEDIÇÃO		ACUMULADO NA 13ª	
		UND	QUANT.	VALOR UNIT SEM BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	COM BDI	PESO (%)	QUANT.	TOTAL COM BDI	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					76.116,52	0,24%	2,27%	1.726,41	90,79%	69.108,74
1.4	PROTEÇÃO					9.600,00	0,03%		1.726,41	83,02%	7.970,01
1.4.1	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA PARA PROTEÇÕES - ROLO DE 4X100M - 80 MICRAS	M²	3.200,00	2,43	3,00	9.600,00	0,03%	575,47	1.726,41	2.656,67	7.970,01
2	SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS					166.895,56	0,53%	0,96%	1.600,78	8,04%	13.418,14
2.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					166.895,56	0,53%		1.600,78	8,04%	13.418,14
2.1.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2/MÊS	11.160,00	4,17	5,15	57.474,00	0,18%	50,40	259,56	252,00	1.297,80
2.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	640,00	15,89	19,62	12.556,80	0,04%	68,36	1.341,22	236,08	4.631,88
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO					387.887,79	1,23%	1,02%	3.959,20	30,15%	116.946,69
4.5	REPAROS E COMPLEMENTOS					75.659,69	0,24%		3.959,20		50.280,69
4.5.9	BASE EM CONCRETO POLIMÉRICO PARA PROTEÇÃO DO PÉ (CHAPA E PARAFUSOS) DOS PILARES DA COBERTURA DE VEÍCULOS	UN	160,00	65,41	80,80	12.928,00	0,04%	49,00	3.959,20	49,00	3.959,20
5	ARQUITETURA					10.883.731,21	34,45%		250.256,54	15,07%	1.640.146,04
5.2	PISOS					3.080.170,94	9,75%		200.430,16	24,98%	769.550,85
5.2.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	131,00	98,60	121,80	15.955,80	0,05%	18,73	2.281,31	18,73	2.281,31
5.2.8	PISO EM PORCELANATO 90X90CM, SUPERFÍCIE NATURAL RETIFICADO - REF.: MINERAL OFF WHITE, NATURAL RETIFICADO DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	M²	1.960,98	315,97	390,31	765.390,10	2,42%	470,55	183.660,37	1.095,62	427.631,42
5.2.9	RODAPÉ DE PORCELANATO 15X90CM - REF.: MINERAL OFF WHITE NATURAL PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	M	719,00	36,75	45,39	32.635,41	0,10%	319,20	14.488,48	448,60	20.361,94
5.4	FORROS					415.907,13	1,32%		27.258,70	8,92%	37.101,33
5.4.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	4.539,00	71,99	88,92	403.607,88	1,28%	242,52	21.564,87	326,04	28.991,46
5.4.2	TABICA PARA FORRO DRYWALL, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	775,00	12,85	15,87	12.299,25	0,04%	358,78	5.693,83	511,02	8.109,87
5.5	COBERTURAS E PROTEÇÕES					193.093,34	0,61%		9.036,53	44,59%	86.095,38

5.5.3	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE, COM 23CM, TRIANGULAR, TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA	M	518,00	59,44	73,42	38.031,56	0,12%	123,08	9.036,53	253,28	18.595,81
5.9	LOUÇAS E BANCADAS					206.797,21	0,65%		1.158,20	36,96%	76.434,92
5.9.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	47,00	115,51	142,68	6.705,96	0,02%	1,00	142,68	47,00	6.705,96
5.9.11	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA LAVATÓRIO L=55,0 CM COM SAIA L=7,0 CM E RODABANCA L=10,0 CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	44,92	822,09	1.015,52	45.617,15	0,14%	1,00	1.015,52	43,00	43.667,35
5.12	URBANIZAÇÃO					1.557.981,65	4,93%		12.372,95	1,36%	21.134,70
5.12.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE	M	100,00	62,39	77,07	7.707,00	0,02%	37,00	2.851,59	37,00	2.851,59
5.12.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE	M	1.316,93	56,68	70,01	92.198,26	0,29%	136,00	9.521,36	261,15	18.283,11
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS					941.059,00	2,98%	4,93%	46.428,48	23,68%	222.847,19
7.2	ESGOTO SANITÁRIO					175.940,44	0,56%		5.146,34	40,00%	70.373,27
7.2.4	TUBO PVC ESGOTO OU AGUA PLUVIAL PREDIAL DN 100MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	387,00	61,90	76,46	29.590,02	0,09%	40,85	3.123,39	85,16	6.511,33
7.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	209,35	64,40	79,55	16.653,79	0,05%	25,43	2.022,95	209,35	16.653,78
7.3	ÁGUAS PLUVIAIS					535.579,24	1,70%		41.282,14	25,88%	138.599,50
7.3.1	TUBO PVC ESGOTO OU AGUA PLUVIAL PREDIAL DN 100MM, SERIE REFORÇADA, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00	87,27	107,80	8.624,00	0,03%	50,32	5.424,49	50,32	5.424,49
7.3.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO	M	701,00	100,17	123,74	86.741,74	0,27%	119,97	14.845,08	448,48	55.494,90
7.3.9	CAIXA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 90X70 X100 CM EM ALVENARIA - COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO - INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	56,00	1.031,73	1.274,49	71.371,44	0,23%	4,00	5.097,96	11,00	14.019,39
7.3.19	TUBO PVC ESGOTO OU AGUA PLUVIAL PREDIAL DN 200MM, SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	105,00	173,28	214,05	22.475,25	0,07%	74,35	15.914,61	74,35	15.914,61
8	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					1.193.101,20	3,78%	0,84%	10.076,31	27,19%	324.432,70
8.4	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					367.445,98	1,16%		10.076,31	6,72%	24.699,75
8.4.1	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO (IMERSÃO A QUENTE), PESADO, PAREDE DE 1,50MM - DIAMETRO NOMINAL 20 (3/4") - NBR 5624 - INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.000,00	39,33	48,58	97.160,00	0,31%	91,43	4.441,66	265,26	12.886,31
8.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,00	11,23	13,87	887,68	0,00%	10,00	138,70	10,00	138,70

8.4.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	476,00	36,39	44,95	21.396,20	0,07%	67,00	3.011,65	119,00	5.349,05
8.4.5	SUPORTE PARA TUBOS HORIZONTAIS ENTRE 1/2" E 3" (CHUMBADORES, TIRANTES E ABRAÇADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	604,00	22,10	27,30	16.489,20	0,05%	91,00	2.484,30	183,00	4.995,90
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA					5.365.186,69	16,98%	0,66%	35.634,69	18,28%	980.633,88
9.3	INFRAESTRUTURA					1.555.470,98	4,92%		8.562,36	46,94%	730.114,22
9.3.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDES, CONTRAPISOS, DIVISÓRIAS E OUTROS ELEMENTOS -	M	1.388,00	8,70	10,74	14.907,12	0,05%	195,15	2.095,91	547,23	5.877,23
9.3.20	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, DE 2" (NBR 15715) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.942,00	10,34	12,77	24.799,34	0,08%	203,15	2.594,22	1.017,35	12.991,55
9.3.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	554,00	13,44	16,60	9.196,40	0,03%	106,00	1.759,60	325,00	5.395,00
9.3.29	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00	15,87	19,60	862,40	0,00%	4,00	78,40	4,00	78,40
9.3.38	ESCAVAÇÃO E REATERRO PARA PASSAGEM DE DUTOS - DIMENSÃO DE 40 CM X 70 CM	M	1.100,00	28,96	35,77	39.347,00	0,12%	56,87	2.034,23	364,53	13.039,22
9.4	CONDUTORES E CABOS					1.103.775,66	3,49%		23.412,75	20,33%	224.409,63
9.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.635,00	6,38	7,88	75.923,80	0,24%	1.416,03	11.158,31	2.879,99	22.694,31
9.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.331,00	9,83	12,14	40.438,34	0,13%	671,00	8.145,94	749,25	9.095,89
9.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.368,00	16,80	20,75	90.636,00	0,29%	198,00	4.108,50	1.020,65	21.178,48
9.7	ILUMINAÇÃO					465.767,92	1,47%		3.659,58	0,79%	3.659,58
9.7.1	LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO E REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM LÂMPADAS LED E ACESSÓRIOS, FORMATO: 60X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	338,00	504,75	623,51	210.746,38	0,67%	3,00	1.870,53	3,00	1.870,53
9.7.2	LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO E REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM LÂMPADAS LED E ACESSÓRIOS, FORMATO: 120X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	207,00	468,74	579,03	119.859,21	0,38%	2,00	1.158,06	2,00	1.158,06
9.7.3	LUMINÁRIA EM ACRÍLICO HERMÉTICA COM LÂMPADAS LED E ACESSÓRIOS, FORMATO: 120X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	166,00	375,27	463,57	76.952,62	0,24%	1,00	463,57	1,00	463,57
9.7.4	PLAFON LED CIRCULAR DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	365,00	67,77	83,71	30.554,15	0,10%	2,00	167,42	2,00	167,42
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					1.087.133,12	3,44%	11,76%	127.841,65	31,81%	345.793,48

10.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO					872.591,21	2,76%		127.841,65	39,55%	345.093,61
10.1.1	CABO CAT.6 U/UTP LSZH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52.352,00	8,77	10,83	566.972,16	1,79%	11.804,40	127.841,65	31.864,60	345.093,61
14	SERVIÇOS GERAIS					234.157,38	0,01	2,27%	5.321,22	52,10%	122.000,41
14.1	TRANSPORTE DE MATERIAL					51.745,20	0,00		3.648,03	43,99%	22.765,17
14.1.1	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	780,00	53,71	66,34	51.745,20	0,16%	54,99	3.648,03	343,16	22.765,17
14.2	LIMPEZA DA OBRA					96.372,88	0,00		1.673,19	49,51%	47.715,73
14.2.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	325,60	402,21	40.221,00	0,13%	4,16	1.673,19	54,09	21.754,15
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					2.672.342,00	0,08	1,67%	44.611,57	16,55%	442.156,29
15.1	INSUMOS PÚBLICOS					101.200,00	0,00		1.689,41	16,55%	16.744,13
15.1.1	INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	819,24	1.012,00	101.200,00	0,32%	1,67	1.689,41	16,55	16.744,13
15.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.571.142,00	0,08		42.922,16	16,55%	425.412,16
15.2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	16.964,81	20.956,62	2.095.662,00	6,63%	1,67	34.984,59	16,55	346.740,95
15.2.2	VIGILÂNCIA DA OBRA (DIURNA E NOTURNA) 24H	%	100,00	3.849,11	4.754,80	475.480,00	1,51%	1,67	7.937,57	16,55	78.671,21

VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI			R\$	527.456,85	R\$	5.227.325,41
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$) C/ BDI E COM REAJUSTE			R\$	555.939,52	R\$	5.475.965,17

		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,21	R\$ 67,85	R\$ 29,63	R\$ 75,87	R\$ 91,97	R\$ 66,08	R\$ 65,69	R\$ 35,55	R\$ 93,23
SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,26	R\$ 54,37	R\$ 72,43	R\$ 57,18	R\$ 7.209,89	R\$ 71,20	R\$ 71,20	R\$ 86,44	R\$ 86,44
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,46	R\$ 326,33	R\$ 447,15	R\$ -	R\$ -
ESTRUTURAS DE CONCRETO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,79	R\$ 10,88	R\$ 441,13	R\$ 977,61	R\$ 2.006,97	R\$ 522,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,80
ARQUITETURA	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.135,51	R\$ 2.443,01	R\$ 2.790,71	R\$ 8.466,95	R\$ 10.793,07	R\$ 11.790,82	R\$ 8.766,76	R\$ 9.193,34	R\$ 13.513,85
IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.929,18	R\$ 1.798,88	R\$ 1.785,89	R\$ 1.347,76	R\$ 1.503,63	R\$ 1.342,29	R\$ 502,00	R\$ -	R\$ -
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.046,83	R\$ 2.768,67	R\$ 2.805,46	R\$ 2.507,14
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.231,53	R\$ 3.815,84	R\$ 1.885,35	R\$ 4.812,56	R\$ 1.448,15	R\$ 1.171,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 544,12
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.323,68	R\$ 7.761,14	R\$ 6.995,44	R\$ 7.429,71	R\$ 5.435,59	R\$ 3.610,25	R\$ 5.617,56	R\$ 6.062,18	R\$ 1.924,27
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.944,70	R\$ -	R\$ 25,18	R\$ 5.786,91	R\$ 6.903,45
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CLIMATIZAÇÃO	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668,01	R\$ 3.138,60	R\$ 5.534,02	R\$ 9.616,83	R\$ 4.533,56	R\$ 8.462,00	R\$ 3.478,71	R\$ 567,61	R\$ -
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS GERAIS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,88	R\$ 298,01	R\$ 292,26	R\$ 200,44	R\$ 182,83	R\$ 211,51	R\$ 133,98	R\$ 106,33	R\$ 287,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Valor mensal reajustado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.838,49	R\$ 1.806,90	R\$ 1.858,71	R\$ 3.055,81	R\$ 3.068,32	R\$ 2.749,42	R\$ 2.021,28	R\$ 2.276,92	R\$ 2.409,02
Total		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.179,53	R\$ 21.208,09	R\$ 21.685,56	R\$ 36.040,73	R\$ 42.854,14	R\$ 32.370,12	R\$ 23.898,18	R\$ 26.920,73	R\$ 28.482,67

Reajuste 1 =	5,40%
Mês reajuste 1 =	5

13.0 Relatório fotográfico

13.1 Infraestrutura elétrica (CATV, iluminação, cabeamento estruturado, ect.)



































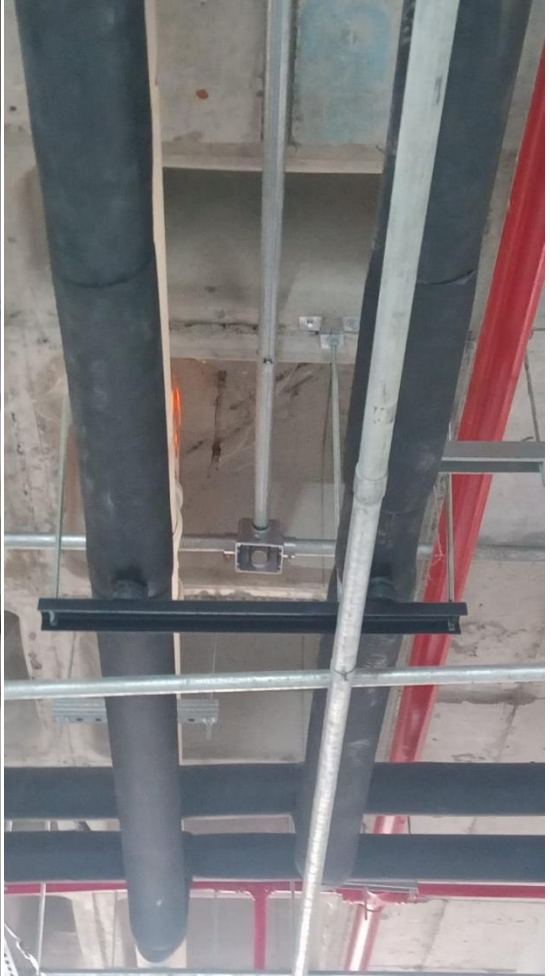



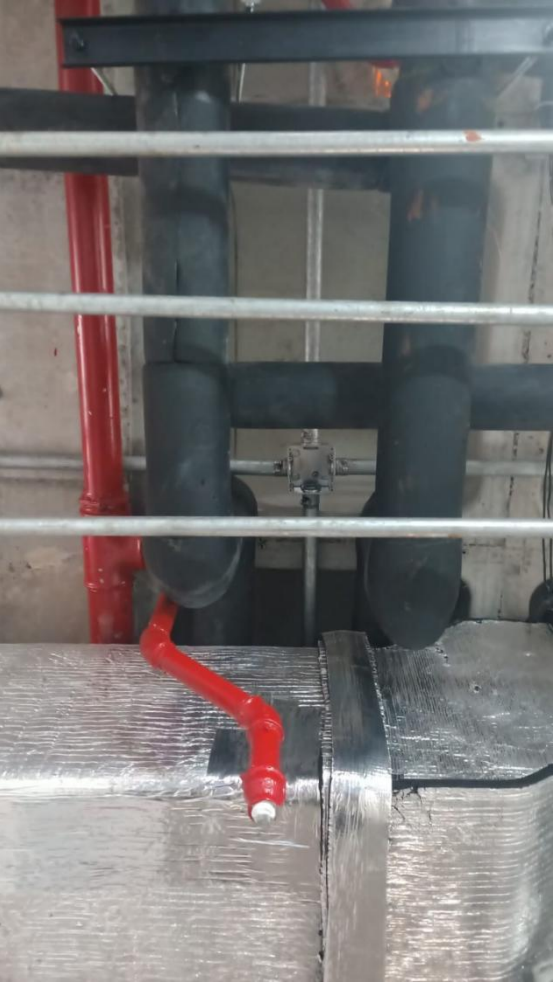



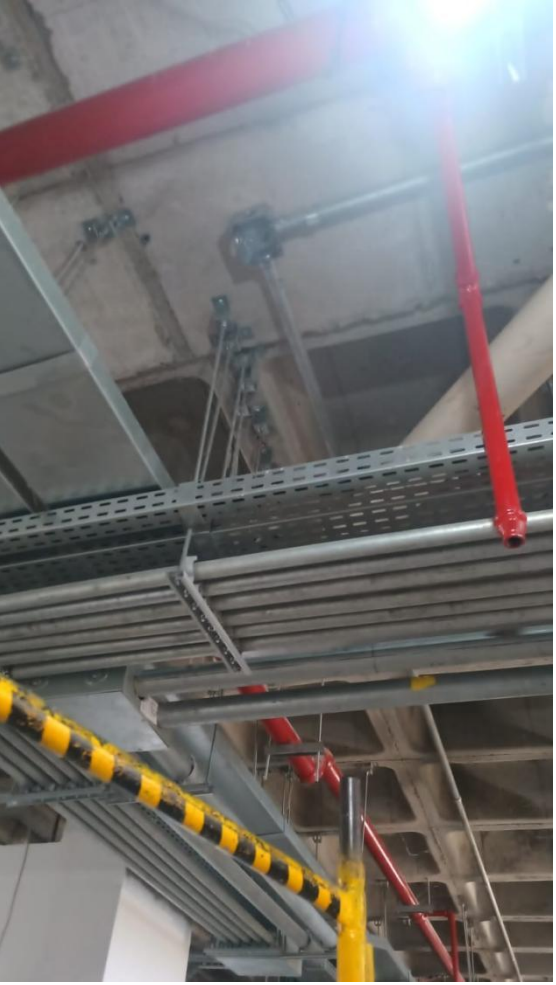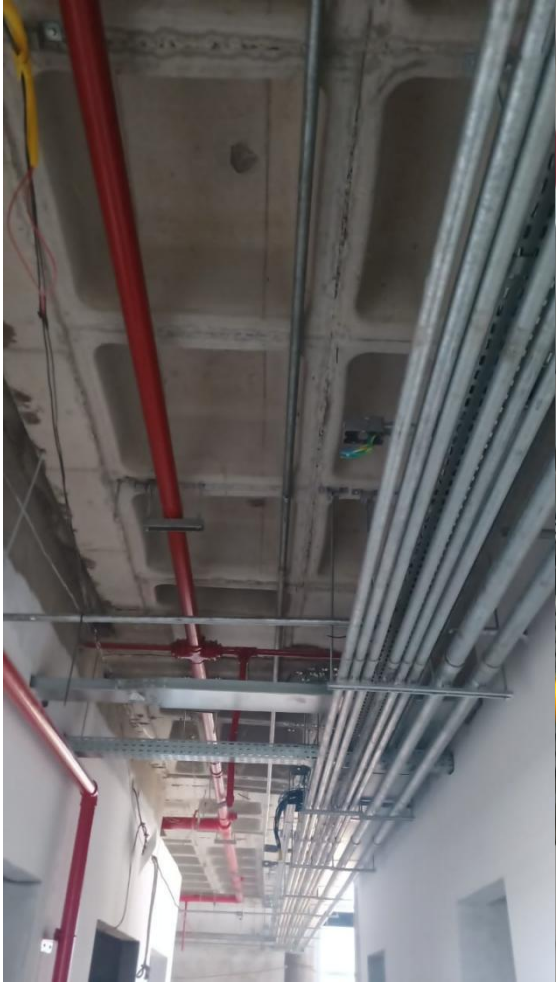












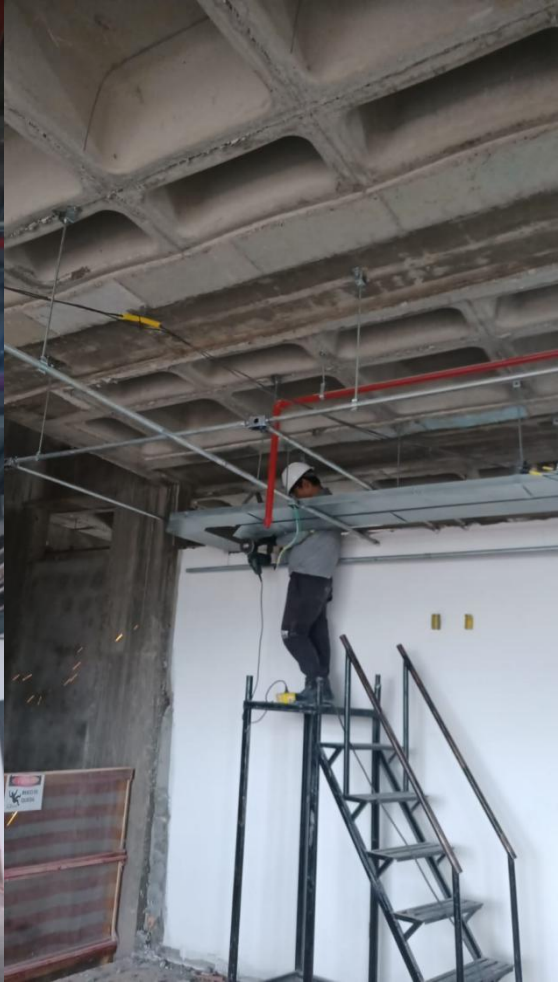

























13.2 Climatização









13.3 Papa-entulho










13.4 Forro/Gesso acartonado



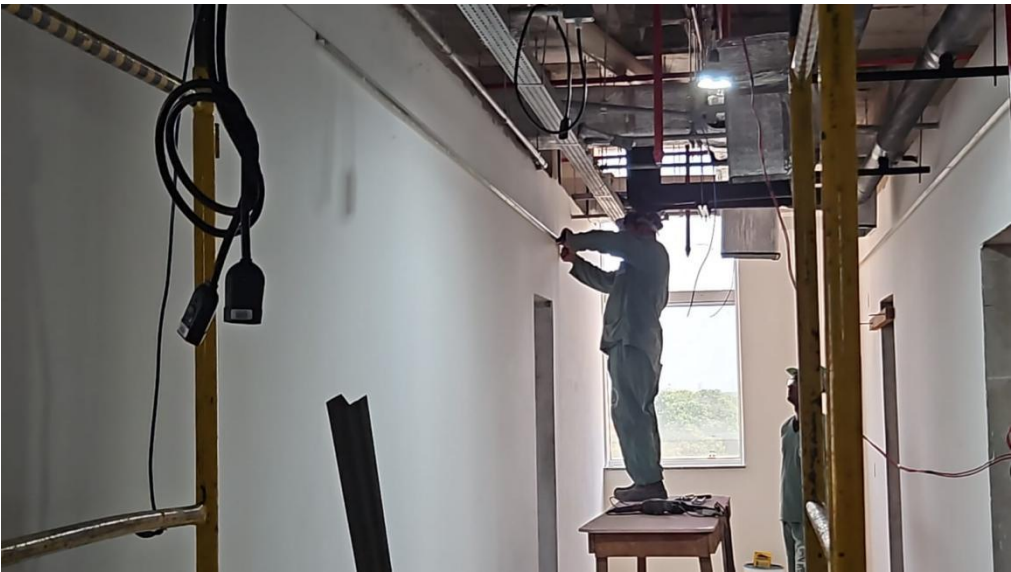









13.5 Acabamento de piso e áreas molhadas

















13.6 Serviços externos (escavação, infra elétrica, caixas de passegm, aterro, pingadeira etc.)




















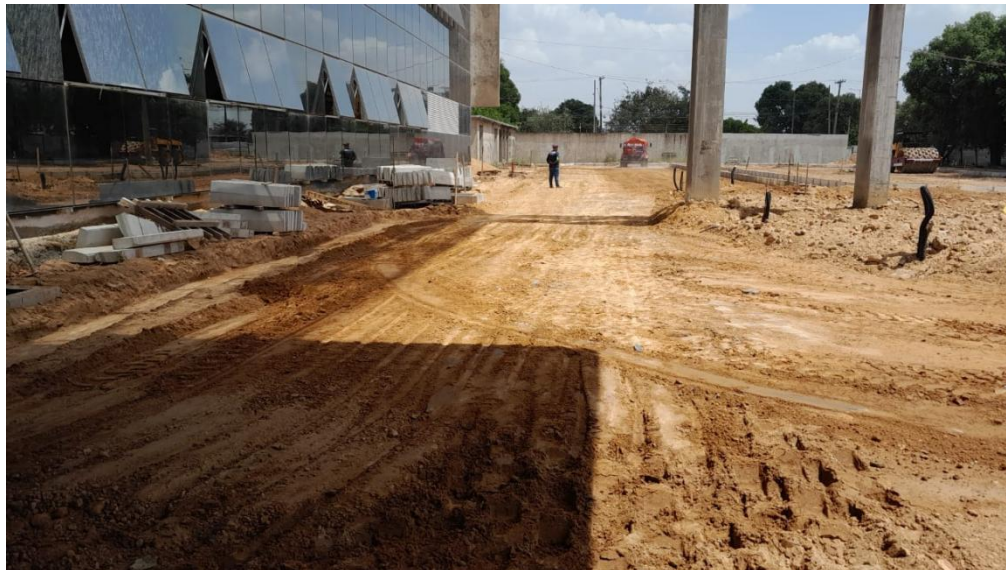


















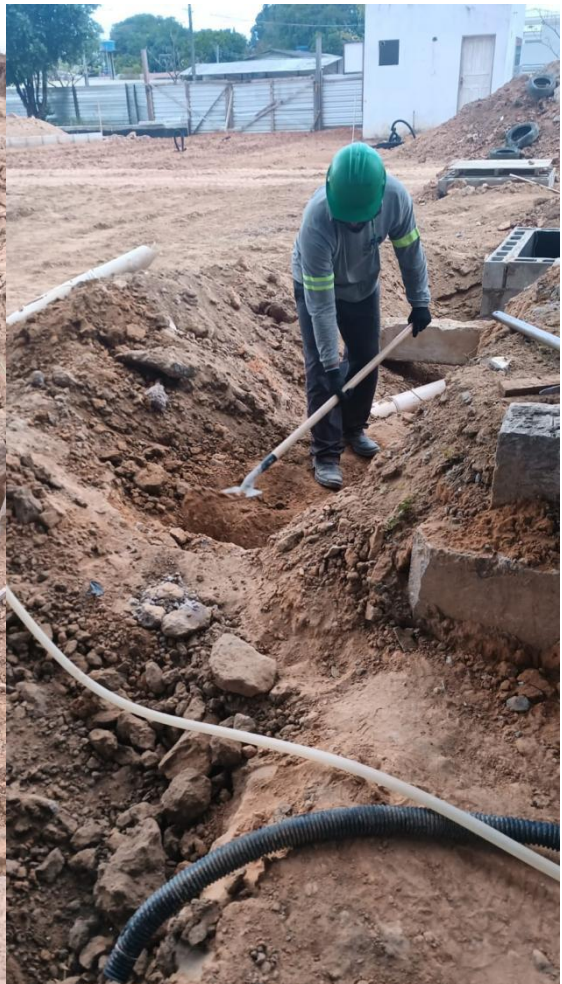










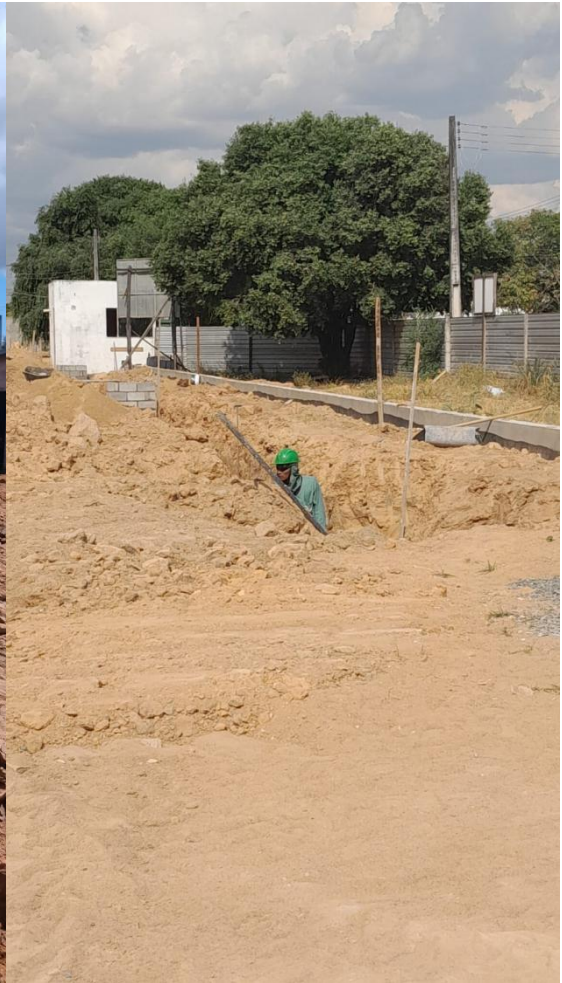











13.7 Acabamentos (granito, lixamento, reboco, etc.)











13.8 Ensaio frasco de areia









14.0 - CONTROLE DE RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA

Descrição do item	Data da retirada do entulhos da obra
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	19/01/2024 - 00980
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	24/01/2024 - 001009
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	25/01/2024 - 001024
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	30/01/2024 - 001055
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³ .	07/02/2024 - 001113

15.0 - RELAÇÃO DOS COLABORADORES COM A FUNÇÃO NA EMPRESA J. NASSER ENGENHARIA LTDA

Nº	Colaborador	Função
1	ANASTÁCIO FERREIRA GOMES	GESSEIRO
2	ALAN JAIME FREITAS CALDEIRA	SERVENTE
3	ANANIAS VIEIRA DA SILVA	SERVENTE
4	ANDREI PAULO GUEDES DO CARMO	PEDREIRO
5	ANTONIES DIEGO DE SOUZA CORDEIRO	SERVENTE
6	ALEXANDRE FREITAS DA SILVA	ELETRICISTA
7	BRUNO SILVA CASTRO	SERVENTE
8	BRUNO GILENO FORTES	SERVENTE
9	CLÁUDIO ROCHA DA SILVA	TÉC. DE EDIFICAÇÕES
10	DARLISON COSMOS PENA	BOMBEIRO HIDRAULICO
11	DAVI JACKSON FERREIRA SOARES	VIGIA
12	DIEGO SIMAO BURUM	SERVENTE
13	ELIEZIO MEIRELE RODRIGUES	PEDREIRO
14	ELIZEU LIMA DA SILVA	SERVENTE
15	ERIVAN LOURENÇO MACHADO	PEDREIRO
16	EUZIELEN DA SILVA MENDONÇA	ENGENHEIRA

17	FELIPE GRALHADA OLIVEIRA	SERVENTE
18	FRANCISCO EMICIO	BOMBEIRO HIDRAULICO
19	GILVAN LEITE RIBEIRO	PEDREIRO
20	IGOR ANTONIO PINO	PINTOR
21	JANILCE	
22	JOSE MARCELO ANDRADE DO NASCIMENTO JUNIOR	MESTRE DE OBRAS
23	JOSE RAIMUNDO BRAGA TRINDADE	PEDREIRO
24	JOSÉ VERAS BARROS	OP. BETONEIRA
25	JORDÃO DA COSTA CASTRO	SERVETE
26	JOÃO BASTISTA BRAGA	CARPINTEIRO
27	JOSE MARIA FROTA CONRADO	PINTOR
28	LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA	ALMOXARIFE
29	MARLON BORGES PEREIRA	TECNICO DE SEGURANÇA
30	MOISES FERREIRA CHAVES	CARPINTEIRO
31	NILDO OLIVEIRA DA SILVA	PEDREIRO
32	OZIEL LIMA DA SILVA	SERVENTE
33	PEDRO PINO MESQUITA	OP. DE RESTROESCAVADEIRA
34	RAIMUNDO ELIAS SANTANA VALENTE	PEDREIRO
35	RAUDI RAFAEL MARTINES	CARPINTEIRO
36	RONNY DE SOUZA ANICETO	SERVENTE
37	SEBASTIÃO ASSIS DE FREITAS	PINTOR
38	SERGIO GOMES DA SILVA	SERVENTE
39	SIVANILSON VIERA DA SILVA	PEDREIRO
40	THIAGO CARVALHO NEGREIROS	VIGIA
41	VICTOR HUGO MAGALHÃES SANTANA	VIGIA
42	YANN PEREIRA NUNES	SERVENTE
43	ZEDEQUIAS DOS SANTOS	IMPERMEABILIZADOR

15.1 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa RR DOMÓTICA – SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E RESIDENCIAL (SUBCONTRATAÇÃO).

Nº	Colaborador	Função
1	DANIEL ASSIS CARNEIRO	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	GERALDO AZEVEDO DE AZEVEDO	ELETRICISTA
3	GERALDO JOSÉ MOLERO PEREZ	ELETRICISTA
4	JORGE LUIZ GOZALEZ LOPEZ	PEDREIRO
5	FÁBIO ROBERTO MESSIAS	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
6	OSWALDO JOSE GONZALEZ CASTILLO	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
7	SIMON ENRIQUE OLIVEROS LINARES	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS
8	FABIO VIEIRA DA SILVA	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

15.2 - Relação dos colaboradores, com a função, na empresa FERREIRA & FERREIRA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (SUBCONTRATAÇÃO)

Nº	Colaborador	Função
1	ALLAN GUIMARÃES FARIAS	AUXILIAR DE FUNILARIA
2	SAMUEL LOBATO	FUNILEIRO
3	LUIZ MIGUEL MAURERA	AUXILIAR DE FUNILARIA
4	MIGUEL ALEXANDER JIMENES RIVAS	AUXILIAR DE FUNILARIA

16.0 - A FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO SERÁ DEFINIDA PELA SOMA DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS ÀS OCORRÊNCIAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE AVALIAÇÃO, CONFORME TABELA ABAIXO:

PONTUAÇÃO	ADEQUAÇÃO NO PAGAMENTO (%)
0-10	Sem desconto
11-20	-0,50% sobre da Parcela Faturada
21-30	-1,00% sobre a Parcela Faturada
31-40	-1,50% sobre a Parcela Faturada
41-50	-2,00% sobre a Parcela Faturada
51-60	-2,50% sobre a Parcela Faturada
61-70	-3,00% sobre a Parcela Faturada
71-80	-3,50% sobre a Parcela Faturada
81-90	-4,00% sobre a Parcela Faturada
A partir de 91	-5,00% sobre a Parcela Faturada

16.1 - Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do

Contrato nº 05/2022, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços após pedido formal da fiscalização.	Por empregado/colaborador e por dia	2
2	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários após constatado e alertado pela fiscalização.	Por dia e por empregado/Colaborador	2
3	Suspender ou interromper os serviços contratuais sem motivação adequada.	Por dia	5
4	Reutilizar na obra de forma intencional, material, peça ou equipamento rejeitado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
5	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado e aceito pela contratante.	Por ocorrência	5
6	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins nocivos e diversos do contrato.	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
7	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada mesmo após requerido pela fiscalização.	Por dia de atraso	3
8	Substituir empregado que esteja colocando a própria vida ou a vida dos demais colaboradores em risco mediante conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
9	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO que enseje má execução de serviços.	Por ocorrência	4

10	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
11	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	6
12	Fornecer EPI, quando exigido pela fiscalização, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
13	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
14	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela até 5% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	6
15	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 5% e até 10% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	12
16	Descumprir os prazos contratuais na execução dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 10% e até 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24

17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando execução da parcela acima de 15% menor à prevista no Cronograma de Execução Físico-financeiro.	Por ocorrência (parcela)	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção
----	--	--------------------------	---

Ocorrência: Sem ocorrências

17.0 - DO PAGAMENTO

17.1 - Pagamento será efetuado à CONTRATADA após apuração da comissão de fiscalização do contrato dos indicadores previstos na 5.1 deste IMR.

17.2 - Cada nota fiscal poderá sofrer glosas no pagamento, considerando a pontuação atribuída e as ocorrências previstas neste anexo.

17.3 - A glosa de pagamento incidirá sobre o valor devido na nota fiscal da parcela concluída, conforme a tabela abaixo a ser juntado ao ateste definitivo das parcelas:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
-				0
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				0
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL:				

18.0 - ANEXO: DIÁRIOS DE OBRA

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	369
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	363	DATA	19/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 19/01/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
07 - Pedreiro;					
11 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
03 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Operador de maquinas Pesadas					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
01 - Gesseiro					
01 - Rejuntador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
03 - Aux de funilaria					
01 - Funileiro					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa.					
- Cabeamento da rede elétrica de iluminação e tomadas do 1º pavimento.					
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em em forro dos Sanitarios dos Gabinetes.					
- Aplicação de selador e massa pva em forro do 3º pavimento.					
- Assentamento de revestimento de piso e parede das áreas molhadas do térreo.					
- Assentamento de revestimento do corredor do 3º pavimento.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede do Térreo.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Tubulação de aguas pluviais do auditório.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral					
- Confecção de forro da Copas do 3º e 2º pavimento.					
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.					
4 - Ocorrências:					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 19/01/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
3 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
2 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
1 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO TÉRREO (REPARO);	
3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DOS SANITÁRIO DO PCD NO TÉRREO;	
3.3. MARCAÇÃO DA PAGINAÇÃO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;	
3.4. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO TÉRREO;	
3.5. CONFECÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;	
3.6. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO E INSTALAÇÕES DE DRENO DO AR COND.;	
3.7. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTOR DO 1º PAVIMENTO;	
3.8. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO;	
3.9. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO;	
3.10. NIVELAMENTO DA TERRAPLANAGEM DO ESTACIONAMENTO FRENTE;	
3.11. CONFECÇÃO DAS FORMAS E CONCRETAGEM DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	370
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	362	DATA	20/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	371
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	361	DATA	21/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	372
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	360	DATA	22/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 22/01/2024 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 5 PEDREIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 CALDEIREIRO 1 OPERADOR DE BETONEIRA 2 VIGIA 3 PINTOR 1 OPERADOR DE CALDEIRA 2.1- SUBCONTRATAÇÃO: 2.1.1-RR DOMÓTICA 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 3 ELETRICISTA 1 PEDREIRO 2 AUX. DE SERVIÇO GERAL 2.1.2- FERREIRA E FERREIRA 1 AUXILIAR DE FUNILARIA 1 FUNILEIRO 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO TÉRREO (REPARO); 3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DOS SANITÁRIO DO CAMARIM NO TÉRREO; 3.3. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO TÉRREO; 3.4. CONFECÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO; 3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO E INSTALAÇÕES DE DRENO DO AR COND.; 3.6. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTOR DO 1º PAVIMENTO; 3.7. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO. 4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	373
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	359	DATA	23/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 22/01/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 03 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Cabeamento da rede elétrica de iluminação e tomadas do 1º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.
- Aplicação de massa PVA em em forro dos Sanitarios dos Gabinetes.
- Acabamento em pintura dos rodapé do 3º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede das áreas molhadas do térreo.
- Assentamento de revestimento do corredor do 3º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 3º pavimento.
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral
- Confecção de forro da Copas do 3º e 2º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.

4 - Ocorrências:

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 23/01/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;

- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 03 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Cabeamento da rede elétrica de iluminação e tomadas do 1º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.
- Aplicação de massa PVA em em forro dos Sanitarios dos Gabinetes.
- Acabamento em pintura dos rodapé do 3º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede das áreas molhadas do térreo.
- Assentamento de revestimento do corredor do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 3º pavimento.
- Confeccção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confeccção de chapim de concreto do muro lateral
- Confeccção de forro da Copas do 3º e 2º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.

4 - Ocorrências:

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 23/01/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

- 1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
- 1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO
- 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
- 1 MESTRE DE OBRA
- 1 ALMOXARIFE
- 5 PEDREIRO
- 12 SERVENTE
- 1 IMPERMEABILIZADOR
- 1 ELETRICISTA
- 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 CALDEIREIRO
- 1 OPERADOR DE BETONEIRA
- 2 VIGIA
- 3 PINTOR
- 1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
- 3 ELETRICISTA
- 1 PEDREIRO
- 2 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

- 1 AUXILIAR DE FUNILARIA
- 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO 3º PAVIMENTO (REPARO);
- 3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DOS SANITÁRIO DO PCD NO TÉRREO;
- 3.3. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO 3º PAVIMENTO;
- 3.4. CONFECCÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;
- 3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO E INSTALAÇÕES DE DRENO DO AR COND.;
- 3.6. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTOR DO 1º PAVIMENTO;
- 3.7. CONFECCÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO SHAFT 1º PAVIMENTO;
- 3.8. PASSAGÊ DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	374
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	358	DATA	24/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

374

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 24/01/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 03 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Cabeamento da rede elétrica de iluminação e tomadas do 1º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.
- Aplicação de massa PVA em em forro dos Sanitarios dos Gabinetes.
- Acabamento em pintura dos rodapé do 3º pavimento.
- Assentamento de revestimento de piso e parede das áreas molhadas do térreo.
- Assentamento de revestimento do corredor do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 3º pavimento.
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral
- Confecção de forro da Copas do 3º e 2º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.

4 - Ocorrências:

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 24/01/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 CALDEIREIRO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
3 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
3 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
2 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
1 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO 1º PAVIMENTO (REPARO);	
3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DOS SANITÁRIO DO PCD NO TÉRREO;	
3.3. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO 3º PAVIMENTO;	
3.4. CONFECÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;	
3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;	
3.6. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTOR DO 1º PAVIMENTO;	
3.7. CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO SHAFT 1º PAVIMENTO;	
3.8. CONFECÇÃO DAS FORMAS E CONCRETAGEM DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;	
3.9. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	375
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	357	DATA	25/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 25/01/2024 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 5 PEDREIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 CALDEIREIRO 1 OPERADOR DE BETONEIRA 2 VIGIA 3 PINTOR 1 OPERADOR DE CALDEIRA 2.1- SUBCONTRATAÇÃO: 2.1.1-RR DOMÓTICA 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 3 ELETRICISTA 1 PEDREIRO 2 AUX. DE SERVIÇO GERAL 2.1.2- FERREIRA E FERREIRA 2 AUXILIAR DE FUNILARIA 1 FUNILEIRO 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO TÉRREO (REPARO); 3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO; 3.3. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO 1º E 2º PAVIMENTO; 3.4. CONFECÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO; 3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO; 3.6. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTOR DO 1º PAVIMENTO; 3.7. CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO SHAFT 1º PAVIMENTO; 3.8. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO. 4.0 - OCORRÊNCIAS: OCORRÊNCIAS 4.1. FOI ENTREGUE O DETALHAMENTO DO FORRO COMO VIA SER O FECHAMENTO COM GESSO ACARTONADO NAS FACHADAS FRONTAL E DOS FUNDOS, E FOI APROVADA PELA SEA E O ARQUITETO CÁSSIO. FOI ENTREGUE A ENGENHEIRA DO J. NASSER ENGENHARIA NO DIA 24/01/2024. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	376
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	356	DATA	26/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 25/01/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 02 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Cabeamento da rede elétrica de iluminação e tomadas do 1º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.
- Acabamento em pintura dos rodapé do 3º pavimento.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.

4 - Ocorrências: Visita dos procuradores de RR na obra.

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 26/01/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;

01 - Impermeabilizador;
01 - Gesso
01 - Rejuntador
02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

01 - Engenheiro Eletricista
02 - Eletricista
01 - Pedreiro
03 - Aux. de serviços gerais
01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

02 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Cabeamento da rede elétrica de iluminação e tomadas do 1º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.
- Acabamento em pintura dos rodapé do 3º pavimento.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.
- Confeção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confeção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Confeção dos dutos de climatização do 2º pavimento.

4 - Ocorrências: Sem ocorrência.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 26/01/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

- 1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
- 1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO
- 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
- 1 MESTRE DE OBRA
- 1 ALMOXARIFE
- 5 PEDREIRO
- 12 SERVENTE
- 1 IMPERMEABILIZADOR
- 1 ELETRICISTA
- 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 OPERADOR DE BETONEIRA
- 2 VIGIA
- 2 PINTOR
- 1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
- 3 ELETRICISTA
- 1 PEDREIRO
- 2 AUX. DE SERVIÇO GERAL

2.1.2- FERREIRA E FERREIRA

- 2 AUXILIAR DE FUNILARIA
- 1 FUNILEIRO

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO TÉRREO (REPARO);
- 3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;
- 3.3. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO 1º E 2º PAVIMENTO;
- 3.4. CONFEÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E ESCAVAÇÃO;
- 3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;
- 3.6. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTOR DO 1º PAVIMENTO;
- 3.7. CONFEÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;
- 3.8. CONFEÇÃO DE EXAUSTOR MECÂNICO NO 1º PAVIMENTO;
- 3.9. FABRICAÇÃO DE DUTO EM CHAPA METÁLICA;
- 3.8. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	377
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	355	DATA	27/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	378
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	354	DATA	28/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	379
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	353	DATA	29/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 29/01/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
10 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Operador de maquinas Pesadas					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
01 - Gesseiro					
01 - Rejuntador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
02 - Aux de funilaria					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Cabeamento da rede elétrica de iluminação e tomadas do 1º pavimento.					
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.					
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.					
- Acabamento em pintura dos rodapé do 3º pavimento.					
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .					
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.					
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.					
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrência.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 29/01/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
3 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
2 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- FERREIRA E FERREIRA	
2 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO TÉRREO (REPARO);	
3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;	
3.3. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO 1º E 2º PAVIMENTO (LIMPEZA);	
3.4. COMPATIBILIZAÇÃO DO SOLO	
3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;	
3.6. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADA E INTERRUPTOR DO 1º PAVIMENTO;	
3.7. RASGO DE PAREDE PARA COLOCAÇÃO INTERRUPTOR E TOMADA	
3.8. CONFEÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.9. CONFEÇÃO DE EXAUSTOR MECÂNICO NO 1º PAVIMENTO;	
3.10. FABRICAÇÃO DE DUTO EM CHAPA METÁLICA;	
3.11. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO;	
3.12. REBOCO DO BATENTE DO PEITORIL DO HALL DO 2º PAVIMENTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	380
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	352	DATA	30/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

380

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 30/01/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 02 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.
- Terraplenagem: Compactação de aterro do estacionamento frente a obra.

4 - Ocorrências: Sem ocorrência.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 29/01/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
3 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- EPIFANIO LOCAÇÃO & ESCAVAÇÕES	
1 OPERADOR DE ROLO DE CARNEIRO	
1 OPERADOR DE CARRO PIPA	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO TÉRREO (REPARO);	
3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;	
3.3. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO 1º E 2º PAVIMENTO (LIMPEZA);	
3.4. COMPATIBILIZAÇÃO DO SOLO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO;	
3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;	
3.6. INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;	
3.7. CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.8. CONFECÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;	
3.9. ACABAMENTO NO FUNDO DA LAJE PARA RECEBER ESTRUTURA DO FORRO DO 3º PAVIMENTO.	
4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	381
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	351	DATA	31/01/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 31/01/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
10 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Operador de maquinas Pesadas					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
01 - Gesseiro					
01 - Rejuntador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
02 - Aux de funilaria					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.					
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .					
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.					
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.					
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Terraplenagem: Compactação de aterro do estacionamento frente a obra.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrência.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 31/01/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
3 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- EPIFANIO LOCAÇÃO & ESCAVAÇÕES	
1 OPERADOR DE ROLO DE CARNEIRO	
1 OPERADOR DE CARRO PIPA	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO TÉRREO (REPARO);	
3.2. APLICAÇÃO DE SELADOR NO FUNDO DA LAJE NO 3º PAVIMENTO;	
3.3. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;	
3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO BANHEIRO DO PCD NO TÉRREO;	
3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO 2º PAVIMENTO (LIMPEZA);	
3.6. COMPATIBILIZAÇÃO DO SOLO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO;	
3.7. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;	
3.8. INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;	
3.9. CONFEÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.10. CONFEÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;	
3.11. ACABAMENTO NO FUNDO DA LAJE PARA RECEBER ESTRUTURA DO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.12. PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEIO FIO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	382
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	350	DATA	01/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 31/01/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
10 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Operador de maquinas Pesadas					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
01 - Gesseiro					
01 - Rejuntador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
02 - Aux de funilaria					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.					
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .					
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.					
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.					
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Terraplenagem: Compactação de aterro do estacionamento frente a obra.					
4 - Ocorrências: Realização de Ensaio de Densidade in situ no solo compactado da área de estacionamento (frente)para determinação do grau de compactação.					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 01/02/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
3 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
2.1.2- EPIFANIO LOCAÇÃO & ESCAVAÇÕES	
1 OPERADOR DE ROLO DE CARNEIRO	
2.1.3- FERREIRA E FERREIRA	
2 AUXILIAR DE FUNILARIA	
1 FUNILEIRO	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO TÉRREO (REPARO);	
3.2. APLICAÇÃO DE SELADOR NO FUNDO DA LAJE NO 3º PAVIMENTO;	
3.3. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;	
3.4. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO BANHEIRO DO PCD NO TÉRREO;	
3.5. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE DO NO 2º PAVIMENTO (LIMPEZA);	
3.6. COMPATIBILIZAÇÃO DO SOLO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO;	
3.7. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;	
3.8. INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;	
3.9. CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.10. CONFECÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;	
3.11. ACABAMENTO NO FUNDO DA LAJE PARA RECEBER ESTRUTURA DO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.12. FABRICAÇÃO DE DUTO EM CHAPA METÁLICA;	
3.13. CONFECÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM;	
3.14. CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: OCORRÊNCIAS	
4.1. FORAM FEITOS ANÁLISE DO SOLO PARA TIRAR AS AMOSTRAS DA RESISTÊNCIA DO SOLO.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	383
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	349	DATA	02/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 02/02/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
10 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Operador de maquinas Pesadas					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
01 - Gesseiro					
01 - Rejuntador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
02 - Aux de funilaria					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.					
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .					
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.					
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.					
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.					
- Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 02/02/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
3 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO 1º, 2º E 3º PAVIMENTOS (REPARO);	
3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;	
3.3. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO BANHEIRO DO PCD NO TÉRREO;	
3.4. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE NO TÉRREO (LIMPEZA);	
3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;	
3.6. INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;	
3.7. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO;	
3.8. CONFEÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.9. CONFEÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;	
3.10. ACABAMENTO NO FUNDO DA LAJE PARA RECEBER ESTRUTURA DO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.11. CONFEÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM;	
4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	384
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	348	DATA	03/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	385
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	347	DATA	04/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	386
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	346	DATA	05/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 03/02/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
10 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Operador de maquinas Pesadas					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
01 - Gesseiro					
01 - Rejuntador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
02 - Aux de funilaria					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.					
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .					
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.					
-Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.					
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.					
- Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrências					
Estamos a disposição para esclarecimentos					
Diário de Obra - Data: 05/02/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
10 - Servente;					

- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 02 - Eletricista
- 01 - Pedreiro
- 03 - Aux. de serviços gerais
- 01 - Técnico em eletrotécnica

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 02 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.
- Confeccção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confeccção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confeccção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Confeccção dos dutos de climatização do 2º pavimento.
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.
- Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa.

4 - Ocorrências: Sem ocorrências

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 05/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

- 1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
- 1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO
- 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
- 1 MESTRE DE OBRA
- 1 ALMOXARIFE
- 5 PEDREIRO
- 12 SERVENTE
- 1 IMPERMEABILIZADOR
- 1 ELETRICISTA
- 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 OPERADOR DE BETONEIRA
- 2 VIGIA
- 2 PINTOR
- 1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

- 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
- 3 ELETRICISTA
- 1 PEDREIRO
- 3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO 1º, 2º E 3º PAVIMENTOS (REPARO);
- 3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO NO CORREDOR DO 2º PAVIMENTO;
- 3.3. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE NO TÉRREO (LIMPEZA);
- 3.4. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;
- 3.5. INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- 3.6. PASSAGEM DE FIAÇÃO DE LÓGICA NO 2º PAVIMENTO;
- 3.7. CONFECCÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;
- 3.8. CONFECCÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;
- 3.9. ACABAMENTO NO FUNDO DA LAJE PARA RECEBER ESTRUTURA DO FORRO DO 3º PAVIMENTO;
- 3.10. CONFECCÃO DE CAIXA DE DRENAGEM E ESGOTO;
- 3.11. CONFECCÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	387
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	345	DATA	06/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 06/02/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
10 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Operador de maquinas Pesadas					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
01 - Gesseiro					
01 - Rejuntador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
02 - Eletricista					
01 - Pedreiro					
03 - Aux. de serviços gerais					
01 - Técnico em eletrotécnica					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
02 - Aux de funilaria					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.					
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.					
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.					
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .					
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.					
-Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.					
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.					
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.					
- Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa.					
4 - Ocorrências: O					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 06/02/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 ELETRICISTA	
2 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO 3º PAVIMENTOS (REPARO);	
3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE NO TÉRREO NAS COPAS (REPARO NOS DRENOS AR COND.);	
3.3. LIMPEZA DO CORREDOR DO 1º PAVIMENTO PARA LOCAÇÃO DA PAGINAÇÃO DE PISO;	
3.4. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE NO TÉRREO (LIMPEZA);	
3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;	
3.6. INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;	
3.7. PASSAGEM DE FIAÇÃO NO 3º PÁVIMENTO;	
3.8. CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.9. CONFECÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO/CONCRETAGEM DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;	
3.10. ACABAMENTO NO FUNDO DA LAJE PARA RECEBER ESTRUTURA DO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.11. CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO;	
3.12. CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL	
4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	388
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	344	DATA	07/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 07/02/2024 2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA: 1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL) 1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO 1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO 1 MESTRE DE OBRA 1 ALMOXARIFE 5 PEDREIRO 12 SERVENTE 1 IMPERMEABILIZADOR 1 ELETRICISTA 3 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 OPERADOR DE BETONEIRA 2 VIGIA 2 PINTOR 1 OPERADOR DE CALDEIRA 2.1- SUBCONTRATAÇÃO: 2.1.1-RR DOMÓTICA 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA 1 ELETRICISTA 2 AUX. DE SERVIÇO GERAL 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS: 3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO 3º PAVIMENTOS (REPARO); 3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE NO TÉRREO NAS COPAS (REPARO NOS DRENOS AR COND.); 3.3. LIMPEZA DO CORREDOR DO 1º PAVIMENTO PARA LOCAÇÃO DA PAGINAÇÃO DE PISO; 3.4. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE NO TÉRREO (LIMPEZA); 3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO; 3.6. INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 3.7. PASSAGEM DE FIAÇÃO NO 3º PÁVIMENTO (RABICHO DE LÂMPADAS); 3.8. CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO; 3.9. CONFECÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO/CONCRETAGEM DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO; 3.10. ESCAVAÇÃO DE VALA PARA CABOS DE CATV; 3.11. CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO; 3.12. CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL; 3.12. ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. 4.0 - OCORRÊNCIAS: 4.1. AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DA LATERAL DIREITA DO PRÉDIO SERÃO PADRONIZADAS EM 200MM, ANTES HAVIA UM TRECHO DE150MM. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	389
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	343	DATA	08/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra - Data: 07/02/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 01 - Eletricista
- 03 - Aux. de serviços gerais

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 1º pavimento.
- Confeção de caixas de esgoto.
- Confeção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Confeção dos dutos de climatização do 2º pavimento.
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa.
- Confeção de chicote das luminárias do 3º pavimento.

4 - Ocorrências: Ficou determinado pela Fiscalização da obra e Sea que a inclinação das tabulação de aguas pluviais será 0,5%, em virtude do reservatório de água de reuso já construído esta acima da cota necessária para a tubulação com inclinação de 1%. Bem como correção do diâmetro da tubulação de 150mm para 200m ao lado auditório. No projeto a tubulação iniciava neste trecho com 200mm e diminuiu para 150mm, a fiscalização determinou continuar com a tubulação de 200mm até a caixa com 02(dois) de 150mm.

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 08/02/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almoxarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 01 - Eletricista
- 02 - Aux. de serviços gerais

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 02 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 2º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.
- Confecção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento.
- Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento.
- Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento.
- Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa.

4 - Ocorrências: Ficou determinado pela Fiscalização da obra e Sea que a inclinação das tabulação de aguas pluviais será 0,5%, em virtude do reservatório de água de reuso já construído esta acima da cota necessária para a tubulação com inclinação de 1%. Bem como correção do diâmetro da tubulação de 150mm para 200mm ao lado auditório. No projeto a tubulação iniciava neste trecho com 200mm e diminuiu para 150mm, a fiscalização determinou continuar com a tubulação de 200mm até a caixa com 02(dois) de 150mm.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 08/02/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
1 ELETRICISTA	
2 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1. APLICAÇÃO DE MASSA/LIXAMENTO PVA EM PAREDE DO 3º PAVIMENTOS (REPARO);	
3.2. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PAREDE NO TÉRREO NAS COPAS (REPARO NOS DRENOS AR COND.);	
3.3. LIMPEZA DO CORREDOR DO 1º PAVIMENTO PARA LOCAÇÃO DA PAGINAÇÃO DE PISO;	
3.4. REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE NO TÉRREO (LIMPEZA);	
3.5. REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO;	
3.6. INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;	
3.7. PASSAGEM DE FIAÇÃO NO 3º PÁVIMENTO (RABICHO DE LÂMPADAS);	
3.8. CONFECÇÃO DE TARUGAMENTO/ESTRUTURA E APLICAÇÃO DE GESSO ACARTONADO NO FORRO DO 3º PAVIMENTO;	
3.9. CONFECÇÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO/CONCRETAGEM DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;	
3.10. ESCAVAÇÃO DE VALA PARA CABOS DE CATV;	
3.11. CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO;	
3.12. CONFECÇÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;	
3.12. ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	
4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	390
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	342	DATA	09/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	391
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	341	DATA	10/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	392
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	340	DATA	11/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	393
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	339	DATA	12/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	394
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	338	DATA	13/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	395
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	337	DATA	14/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	396
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	336	DATA	15/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 09/02/2024 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoхарife; 02 - Carpinteiro; 08 - Pedreiro; 10 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 02 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Operador de maquinas Pesadas 01 - Op. Betoneira; 01 - Impermeabilizador; 01 - Gesseiro 01 - Rejuntador 02 - Vigia. 2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA 01 - Engenheiro Eletricista 01 - Eletricista 02 - Aux. de serviços gerais 2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA 02 - Aux de funilaria 3 - SERVIÇOS EXECUTADOS - Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo. - Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 1º pavimento. - Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento. - Confecção de caixas de drenagem e esgoto. - Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem. - Confecção de chapim de concreto do muro lateral . - Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento. - Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento. - Teste hidrostático da rede de Sprinkler do 3º pavimento. - Confecção dos dutos de climatização do 2º pavimento. - Acabamento em fundo de laje para receber estrutura de forro do 3º pavimento. - Cabeamento da rede de dados do 2º pavimento. - Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa. 4 - Ocorrências: Ficou determinado pela Fiscalização da obra e Sea que a inclinação das tabulação de aguas pluviais será 0,5%, em virtude do reservatório de água de reuso já construído esta acima da cota necessária para a tubulação com inclinação de 1%. Bem como correção do diâmetro da tubulação de 150mm para 200m ao lado auditório. No projeto a tubulação iniciava neste trecho com 200mm e diminuiu para 150mm, a fiscalização determinou continuar com a tubulação de 200mm até a caixa com 02(dois) de 150mm. Estamos a disposição para esclarecimentos Diário de Obra - Data: 14/02/2024 1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO): Manhã e tarde: Tempo Bom com sol 2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE): 01 - Engenheiro Civil; 01 - Técnico em Edificações; 01 - Técnico em Segurança do Trabalho; 01 - Mestre de Obra; 01 - Almoхарife; 02 - Carpinteiro; 08 - Pedreiro; 10 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pintor; 02 - Bombeiro Hidráulico;					

- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 01 - Eletricista
- 02 - Aux. de serviços gerais

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 02 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.
- Confeção de caixas de drenagem e esgoto.
- Assentamento de tubulação de concreto da rede de drenagem.
- Confeção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º pavimento.
- Colocação de soleiras das portas 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.
- Infraestrutura de rede elétrica e dados da área externa.

4 - Ocorrências: Ficou determinado pela Fiscalização da obra e Sea que a inclinação das tabulação de aguas pluviais será 0,5%, em virtude do reservatório de água de reuso já construído esta acima da cota necessária para a tubulação com inclinação de 1%. Bem como correção do diâmetro da tubulação de 150mm para 200m ao lado auditório. No projeto a tubulação iniciava neste trecho com 200mm e diminuiu para 150mm, a fiscalização determinou continuar com a tubulação de 200mm até a caixa com 02(dois) de 150mm.

Estamos a disposição para esclarecimentos

Diário de Obra - Data: 15/02/2024

1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):

Manhã e tarde: Tempo Bom com sol

2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):

- 01 - Engenheiro Civil;
- 01 - Técnico em Edificações;
- 01 - Técnico em Segurança do Trabalho;
- 01 - Mestre de Obra;
- 01 - Almojarife;
- 02 - Carpinteiro;
- 08 - Pedreiro;
- 10 - Servente;
- 01 - Eletricista
- 03 - Pintor;
- 02 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Operador de maquinas Pesadas
- 01 - Op. Betoneira;
- 01 - Impermeabilizador;
- 01 - Gesseiro
- 01 - Rejuntador
- 02 - Vigia.

2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA

- 01 - Engenheiro Eletricista
- 01 - Eletricista
- 02 - Aux. de serviços gerais

2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA

- 02 - Aux de funilaria

3 - SERVIÇOS EXECUTADOS

- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 1º pavimento.
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.
- Confeção de caixas de aguas pluviais.
- Assentamento de tubulação da da rede de aguas pluviais
- Confeção de chapim de concreto do muro lateral .
- Confeção de estrutura de forro do 3º pavimento.
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.
- Confeção dos dutos de climatização do 1º pavimento.
- Colocação de soleiras das portas 3º pavimento.
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.

4 - Ocorrências: Ficou determinado pela Fiscalização da obra e Sea que a inclinação das tabulação de aguas pluviais será 0,5%, em virtude do reservatório de água de reuso já construído esta acima da cota necessária para a tubulação com inclinação de 1%. Bem como correção do diâmetro da tubulação de 150mm para 200m ao lado auditório. No projeto a tubulação iniciava neste trecho com 200mm e diminuiu para 150mm, a fiscalização determinou continuar com a tubulação de 200mm até a caixa com 02(dois) de 150mm.

Estamos a disposição para esclarecimentos

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	397
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	335	DATA	16/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obra - Data: 16/02/2024					
1.0 CONDIÇÃO CLIMÁTICA (TEMPO):					
Manhã e tarde: Tempo Bom com sol					
2.0 RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO LOTADOS NA OBRA (FUNÇÃO E QUANTIDADE):					
01 - Engenheiro Civil;					
01 - Técnico em Edificações;					
01 - Técnico em Segurança do Trabalho;					
01 - Mestre de Obra;					
01 - Almoxarife;					
02 - Carpinteiro;					
08 - Pedreiro;					
10 - Servente;					
01 - Eletricista					
03 - Pintor;					
02 - Bombeiro Hidráulico;					
01 - Operador de maquinas Pesadas					
01 - Op. Betoneira;					
01 - Impermeabilizador;					
01 - Gesseiro					
01 - Rejuntador					
02 - Vigia.					
2.1 - SUBCONTRATADA RR DOMÓTICA					
01 - Engenheiro Eletricista					
01 - Eletricista					
02 - Aux. de serviços gerais					
2.2 SUB CONTRATADA FERREIRA E FERREIRA					
02 - Aux de funilaria					
3 - SERVIÇOS EXECUTADOS					
- Aplicação de massa PVA em paredes do Térreo.					
- Assentamento de revestimento em piso do Hall e corredores do 1º pavimento.					
- Rejuntamento de revestimento de piso e parede dos gabinetes do 2º pavimento.					
- Confecção de caixas de aguas pluviais.					
- Assentamento de tubulação da da rede de aguas pluviais					
- Confecção de chapim de concreto do muro lateral .					
- Confecção de estrutura de forro do 3º pavimento.					
- Forma e concretagem das bases para envelopamento das bases de Pilares do estacionamento.					
- Confecção dos dutos de climatização do 1º pavimento.					
- Colocação de soleiras das portas 3º pavimento.					
- Cabeamento da rede de dados do 1º pavimento.					
4 - Ocorrências: Sem ocorrência					
Estamos a disposição para esclarecimentos					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE.	DATA: 016/02/2024
2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:	
1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)	
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO	
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ALMOXARIFE	
5 PEDREIRO	
12 SERVENTE	
1 IMPERMEABILIZADOR	
1 ELETRICISTA	
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO	
1 OPERADOR DE BETONEIRA	
2 VIGIA	
2 PINTOR	
1 OPERADOR DE CALDEIRA	
2.1- SUBCONTRATAÇÃO:	
2.1.1-RR DOMÓTICA	
1 ENGENHEIRO ELETRICISTA	
3 ELETRICISTA	
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL	
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:	
3.1 CONFECCÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;	
3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO SEGUNDO E PRIMEIRO PAVIMENTO;	
3.3 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CONTRA INCÊNDIO;	
3.4 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;	
3.5 CONFECCAO DA ESTRUTURA DO FORRO DO TERCEIRO PAVIEMENO;	
3.6 CONFECCÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO/CONCRETAGEM DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;	
3.7 CONFECCÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL;	
3.8 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRIMEIRO PAVIMENTO;	
3.9 COLOCAÇÃO DAS SOLEIRAS DO TERCEIRO PAVIMENTO;	
3.10 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO SEGUNDO PAVIMENTO.	
4.0 - Ocorrências: SEM Ocorrências	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	398
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	334	DATA	17/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE				FOLHA	399
EMPRESA	J NASSER ENGENHARIA LTDA				
CONTRATO Nº	05-2022	DIAS FALTANTES	333	DATA	18/02/2024
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada

DIÁRIO DE OBRAS

OBRA	EXECUÇÃO CONSTRUTIVA DA OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA.				
CONTRATANTE	J NASSER ENGENHARIA LTDA			FOLHA	400
EMPRESA					
CONTRATO Nº					
INÍCIO	16/01/2023	PRAZO	15/01/2025	DATA	19/02/2024

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1.0 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO ENSOLARADO PELA MANHÃ/TARDE. DATA: 019/02/2024

2.0 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA J NASSER ENGENHARIA LTDA:

1 GESTORES DA OBRA (ENGENHEIRA CIVIL)
1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO
1 TÉCNICO EM SEGURANÇA. DO TRABALHO
1 MESTRE DE OBRA
1 ALMOXARIFE
5 PEDREIRO
12 SERVENTE
1 IMPERMEABILIZADOR
1 ELETRICISTA
3 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 OPERADOR DE BETONEIRA
2 VIGIA
2 PINTOR
1 OPERADOR DE CALDEIRA

2.1- SUBCONTRATAÇÃO:

2.1.1-RR DOMÓTICA

1 ENGENHEIRO ELETRICISTA
3 ELETRICISTA
3 AUX. DE SERVIÇO GERAL

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS:

- 3.1 CONFECCÃO DE CHAPIM DE CONCRETO DO MURO LATERAL;
- 3.2 COLOCAÇÃO DE PORCELANATO NO PISO DO SEGUNDO E PRIMEIRO PAVIMENTO;
- 3.3 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CONTRA INCÊNDIO;
- 3.4 INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- 3.5 CONFECCAO DA ESTRUTURA DO FORRO DO TERCEIRO PAVIEMENO;
- 3.6 CONFECCÃO DAS FORMAS DO ENVELOPAMENTO/CONCRETAGEM DOS PILARES DO ESTACIONAMENTO;
- 3.7 CONFECCÃO DE CAIXA E TUBULAÇÃO DE ÁGUAPLUVIAL;
- 3.8 INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS/CABEAMENTO ESTRUTURADO DO PRIMEIRO PAVIMENTO;
- 3.9 COLOCAÇÃO DAS SOLEIRAS DO TERCEIRO PAVIMENTO;
- 3.10 REJUNTAMENTO DO PISO E PAREDE DO SEGUNDO PAVIMENTO.

4.0 - OCORRÊNCIAS: SEM OCORRÊNCIAS

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada
