




MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2015

**RELATÓRIO DA DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE**

PORTARIA PR-RR/SE Nº 002/2016 E 8/2016

JUNHO DE 2017

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

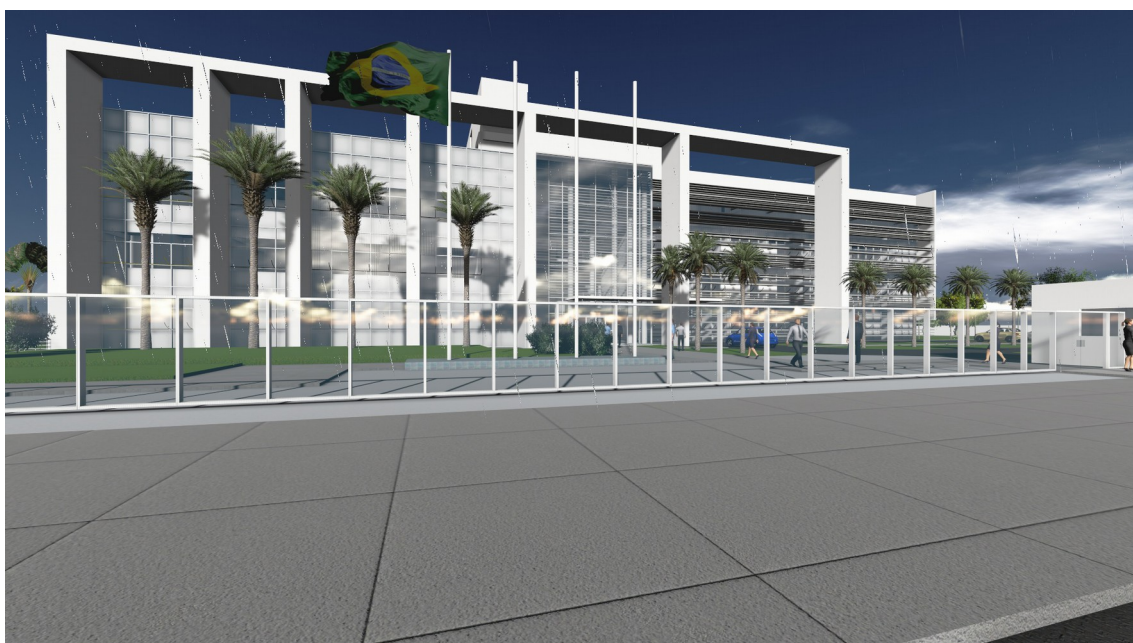

MEMBROS E INFORMAÇÕES DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA 09 de maio de 2016

PERÍODO DO RELATÓRIO: De 07 de junho de 2017 a 06 de julho de 2017

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA – MPF

Nome/ART/Matrícula: Eng. Tammy Nabilla Sousa Cruz / RR20160019635/ 26196

Nome/ART/Matrícula: Eng. Jardel Pereira de Lira / RR20160019649 / 23815

Perita/Matrícula Eng. Kerry Aline da Silva Ferreira / 26108

Telefone: (95) 3198-2026 / 3014-9110

E-mail: jardel@mpf.mp.br / tammyncruz@mpf.mp.br / kerryaline@mpf.mp.br

COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)

Nome: Robson Guimarães Costa / Joel de Oliveira Melo / Francisco das Chagas Alves / Tammy Nabilla Sousa Cruz / Jardel Pereira de Lira

Portaria: SE/PR-RR Nº 002, de 11 de janeiro de 2016 e SE/PR-RR Nº 8, de 09 de junho de 2016

Telefone: (95) 3198-2026 / 2005 / 2000 / 2019

E-mail: prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br

Site da obra: <http://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/nova-sede/nova-sede>

APRESENTAÇÃO

O presente relatório e seus anexos, são a síntese analítica de dados e informações logísticas e físicas coletadas e fiscalizadas pela Comissão de Supervisão e Fiscalização do Contrato nº 15/2015, referente ao período da décima quarta medição de serviços prestados pela empresa OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA na execução da obra de construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima, período esse compreendido entre os dias de execução de atividades construtivas, que foram de 07 de junho a 06 de julho de 2017.

É válido informar que os dados aqui apresentados encontram-se alinhados com o novo cronograma físico-financeiro da obra, alterado por meio de Aditivo nº 01/2016 ao contrato nº 15/2015, publicado no Diário Oficial da União nº 192, Seção 3, folha nº 139, com cópias juntadas as folhas de nº 1061 a 1065 do PA de Fiscalização (1.32.000.000051/2016-48), nas folhas de nº 15 a 18 do Processo de pagamento 2017 e folhas de nº 3328 a 3332 do Processo de Contratação (1.32.000.000601/2015-48).

No presente relatório foram integralmente verificados os dados relativos ao percentual de execução da obra, análise visual e análise técnica de ocorrências e do que fora realizado no período de 07 de junho a 06 de julho de 2017, bem como fora feito a análise administrativas integral das obrigações das subcontratações autorizadas, pagamento de pessoal, obrigações tributárias, sociais, previdenciárias e trabalhistas, com inclusão de constatações diversas, cumprindo assim o rito que vem sendo adotado na fiscalização do contrato nº 15/2015, qual seja, o da estrita análise mês a mês de todos os pontos existentes da relação jurídica pública privada firmada entre o MPF e a empresa OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA.

Neste sentido, conforme exposto acima, fica atestado por definitivo a execução da décima quarta parcela do contrato nº 15/2015, que após analisado administrativa e tecnicamente, fica liberado para juízo de autorização de pagamento, a Nota Fiscal Eletrônica nº 852, no valor de R\$ 465.112,13 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e doze reais e treze centavos), constante da folha de nº 250 do processo de pagamento 2017.

Informa-se, ainda, que fazem parte do presente relatório, Mídia de DVD contendo cópia digital do presente relatório, diário de obras do sistema do MPF, relatório técnico da equipe de engenharia, medição dos serviços executados, planilha eletrônica da medição realizada, cópia da Nota Fiscal de nº 852, cópia digital da relação de funcionários da empresa contratada, acompanhada das documentações comprobatórias relativas a pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias, fiscais e social da empresa, bem como a relação das empresas subcontratadas previamente informadas a esta unidade e autorizadas para execução auxiliar de

atividades-meio e fim do contrato e o relatório da empresa OIKOS detalhando a execução física do período.

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
1.DADOS BÁSICOS DE EXECUÇÃO DA OBRA.....	7
2. DADOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO DO PERÍODO.....	8
3. CONSTATAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PERÍODO.....	9
4. CONSTATAÇÕES TÉCNICAS DO PERÍODO.....	9
5. PRAZOS E CUSTOS.....	10
6. ANÁLISE DAS SUBCONTRATAÇÕES AUTORIZADAS.....	10
7. REGULARIDADE TRABALHISTA DA EMPRESA CONTRATADA.....	12
8. CONCLUSÃO.....	16
9. ANEXOS.....	16

RELATÓRIO DA DÉCIMA QUARTA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2015

1.DADOS BÁSICOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

DADOS ATUALIZADOS DO CONTRATO

Nº Contrato: 15/2015

PPA/LOA: AÇÃO 110E

Empresa Contratada: OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 81.051.666/0001-70

Matrícula CEI da Obra: 51.235.89823/71

Valor original do Contrato: 33.398.124,45 (trinta e três milhões trezentos e noventa e oito mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Valor Atual do Contrato: R\$ 35.205.398,22 (trinta e cinco milhões duzentos e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos).

Saldo de Empenho:

- **2015NE000474** = R\$ 862.896,29 (oitocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)
- **2017NE000245** = R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)
- **Saldo Total:** R\$ 1.522.896,29 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos)

Local/UF: Boa Vista – RR

Responsável Técnico: Gilson Kaminski – ART de Execução: RR20160017356

Corresponsável Técnico: Rodrigo Honório – ART de Corresponsabilidade na Execução: RR20170027040.

João Ricardo Medeiros Filho – ART de Corresponsabilidade na Execução: RR20170031137

Nota Fiscal Eletrônica de Referência: 852 no valor de R\$ 465.112,13 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e doze reais e treze centavos) – Emitida pela Prefeitura de Curitiba – PR (Retenções de ISS a ser feita para o Município de Boa Vista-RR nos termos da Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003 – Demais retenções conforme legislação vigente e Retenção de INSS não aplicável conforme MS nº 5057541-782015.4.04.7000/PR (MS Originário nº 99.00.10941-4/PR) impetrada pela SINDUSCON-PR – Cópia do Ofício nº 700003487948 da 2ª Vara Federal de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, com validade até 16 de julho de 2017, juntado à folha de nº 254 do PA de pagamento 2017.

Do valor acima exposto, R\$ 25.785,48 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) corresponde a valor do percentual de reajuste aplicado sobre o valor de R\$ 439.326,65 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) que foi o valor medido da parcela de nº 14 do contrato nº 15/2015, conforme cronograma físico-financeiro.

DADOS COMPLEMENTARES DE EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% previsto Parcial	% Executado Parcial	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado	% de Atraso na parcela	% Adiantamento na parcela
1	0,61	2,41	0,61	2,41	0,00	1,80
2	1,21	2,69	1,81	5,1	0,00	1,48
3	1,55	0,95	3,36	6,05	0,60	0,00
4	1,61	1,12	4,98	7,16	0,49	0,00
5	2,33	0,59	7,30	7,76	1,74	0,00
6	1,82	1,10	9,12	8,86	0,72	0,00
7	2,57	2,38	11,69	11,24	0,19	0,00
8	2,40	1,65	14,09	12,89	0,75	0,00
9	1,62	2,96	15,71	15,85	0,00	1,34
10	1,44	1,35	17,16	17,20	0,09	0,00

11	1,29	1,17	18,45	18,37	0,12	0,00
12	1,39	0,63	19,84	19,00	0,76	0,00
13	1,46	1,01	21,30	20,00	0,45	0,00
14	1,55	1,32	22,85	21,32	0,23	0,00
TOTAL				21,32%	6,14%	4,62%
ATRASO REAL = (% atraso - % adiantamento nas parcelas)				1,52%		
TOTAL AINDA A EXECUTAR				78,68%		

Identificação do Processo de Pagamento 2016: 1.32.000.000726/2016-59

Identificação do Processo de Pagamento 2017: 1.32.000.000189/2017-28

Identificação do Processo de Fiscalização: 1.32.000.000051/2016-48

Identificação do Processo de Contratação: 1.32.000.000601/2015-48

Tipo de obra: Prédio Público.

Objeto da fiscalização: Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Período Abrangido pela Fiscalização: 07/06/2017 a 06/07/2017 (Documental – Administrativo e Técnico – Definitivo)

2. DADOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO DO PERÍODO

A décima quarta medição foi efetuada pelos fiscais da obra e Engenheiros Civis da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Tammy Nabilla Sousa Cruz, matrícula 26169, Jardel Pereira de Lira, matrícula 23815.


Não foram executados integralmente os serviços programados para a 14ª parcela, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, alterado conforme Aditivo nº 01/2016. Tendo em vista que conforme planilha de medição, o percentual parcial de execução planejada para o período em relato, era de 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento), mas que conforme Relatório Técnico da Comissão Fiscal, foram executados no mês em referência apenas o percentual de 1,32% (um vírgula trinta e dois por cento), do valor total da parcela prevista para o mês de junho de 2017.

Conforme exposto acima, verifica-se que há um percentual de 0,23% (zero vírgula vinte e três por cento) de atraso na execução parcial planejada da parcela de nº 14, face ao efetivamente executado, correspondendo assim a 1,52% (um vírgula cinquenta e dois por cento) de atraso na execução acumulada planejada em relação ao até agora executado do objeto do contrato nº 15/2015.

Desta forma, a empresa OIKOS continua em atraso para com as suas obrigações contratuais, já que, conforme pode ser depreendido do quadro de dados complementares da obra, desde a 11ª medição a obra encontra-se com o executado acumulado abaixo do previsto.

Juntou-se às folhas de nº 3084 a 3087 do PA de Fiscalização que também é anexo deste relatório, o Relatório Técnico nº 14, formalizado pelos engenheiros desta Comissão, contendo planilhas resumos dos serviços realizados no período de 09 de maio a 06 de junho de 2017 pela empresa OIKOS.

Segue abaixo, o gráfico de acompanhamento da execução financeira do Contrato nº 15/2015 no corrente exercício:

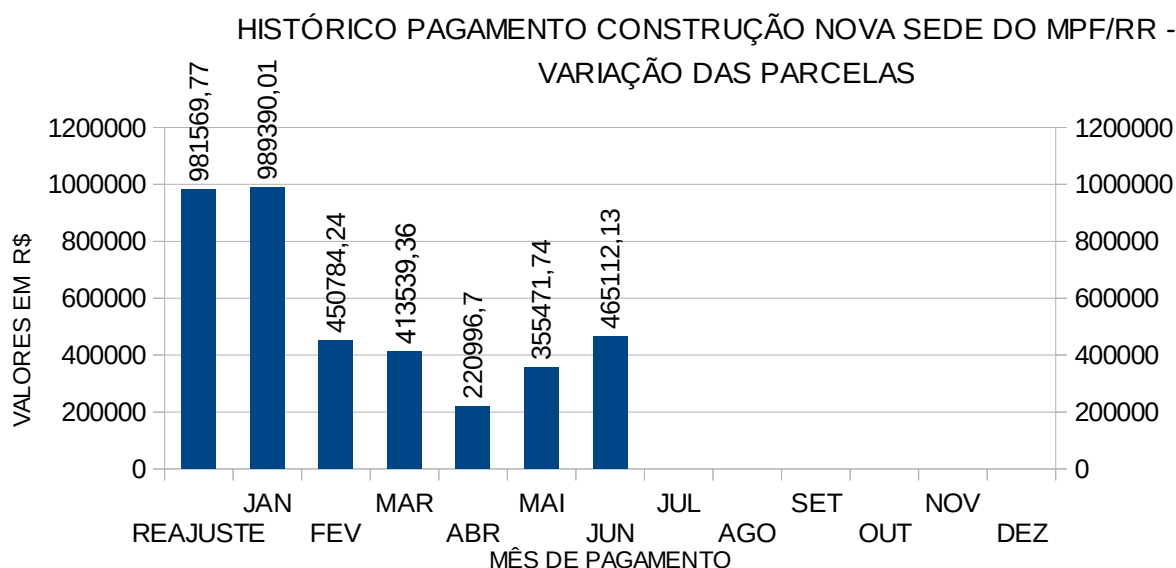

Saldo atualizado já considerando o pagamento da parcela nº 14 da obra.

Saldo Remanescente Para Execução	R\$ 26.049.291,21
Saldo executado 1*	R\$ 7.214.863,13
Saldo executado 2**	R\$ 7.377.103,71****
Saldo Orçamentário***	R\$ 1.743.892,99

* Montante não considerado os valores legais de reajuste.

** Montante considerado os valores legais de reajuste.

*** Dotação orçamentária em caixa para execução da obra no ano de 2017.

**** Percentual de reajuste = 5,8693192% (data base dezembro/2016 – Atentar para a aplicação do novo percentual da parcela de nº 20, que é dezembro de 2017, a fim de evitar dupla aplicação de reajuste sobre a mesma parcela, devendo a empresa escolher qual percentual será aplicado, se o percentual da data base de dezembro de 2016 ou se o percentual da data base de dezembro/2017)

Percentuais De Alíquotas Incidentes Nos Faturamentos Do Contrato N° 15/2015					
COFINS	PIS	CPRB	ISS (Município Boa Vista-RR)		
3,00%	0,65%	2,00%	2,00%		
Percentuais De Alíquotas a Despesas da Empresa no Contrato N° 15/2015					
Riscos	Seguros	Garantias	Despesas Financeiras	Adm. Central	Lucro
1,27%	0,50%	0,30%	1,23%	4%	8%

3. CONSTATAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PERÍODO

Não houve constatações administrativas.

4. CONSTATAÇÕES TÉCNICAS DO PERÍODO

CONSTATAÇÃO 1: A execução da obra encontra-se em atraso desde a 11ª medição, referente ao mês de março de 2017, acumulando um atraso real de 1,52% (um vírgula cinquenta e dois por cento).

PROVIDÊNCIAS: Já foi solicitada instauração de processo de apuração de infração para verificar eventuais descumprimentos contratuais da empresa com relação ao atraso na execução da obra.

Houve necessidade de alterações no cronograma físico-financeiro?	() Sim	(X) Não	() N.A
Houve encaminhamento ou autorização da necessidade de alterações do cronograma físico-financeiro?	(X) Sim	() Não	() N.A
Houve alterações do cronograma físico-financeiro com necessidade de aditivo?	() Sim	(X) Não	() N.A
Houve necessidade de alterações de projeto?	(X) Sim	() Não	() N.A
Houve encaminhamento da necessidade de alterações de projeto à SEA?	(X) Sim	() Não	(X) N.A
Quais Projetos foram ou precisam ser alterados?	() Estrutural (X) Elétrica (X) Hidráulica () Combate a incêndio () Outro/Especificar: Acessibilidade / Piso Tátil		
Houve solicitação de aditivos ao contrato?	(X) Sim	() Não	() N.A
Houve impacto financeiro no contrato?	() Sim	(X) Não	() N.A

5. PRAZOS E CUSTOS

PRAZOS LEGAIS		
Data de início do Contrato:	21 de dezembro de 2015	
Data da Ordem de Serviço:	18 de abril de 2016 com autorização para os serviços de engenharia a partir de 09 de maio de 2016.	
Comunicação de início da obra a SMOU	Ofício nº 13/2016/CA de 15/4/2016 (Único PRRR00007371/2016 e Ofício nº 17/2016/CA de 03 de junho de 2016.	
Data prevista para conclusão da Obra:	30 de setembro de 2019	
Vigência de Execução Contrato:	42 meses	Prazo restante: 28 Meses
Vigência do Contrato:	48 Meses	Prazo restante: 30 Meses
Vigência da licença ambiental:	24 Meses	Vigente até 12 de abril de 2018
Vigência do Alvará de Construção:	12 Meses	Vigente até 12 de novembro de 2018
Garantia Contratual:	1551 dias	Vigência de 21/12/2015 até 20/3/2020.
Ciclo de Medição:	Mês	Todo dia 1º de cada mês

6. ANÁLISE DAS SUBCONTRATAÇÕES AUTORIZADAS

Consoante previsão estabelecida na Cláusula Sétima do Contrato nº 15/2015, foi verificada nesse relatório, de forma cumulativa, o detalhamento dos objetos, contratos e questões relativas a regularidade fiscal e previdenciária de cada um dos serviços subcontratados pela OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA no mês de junho de 2017 com as seguintes empresas:

Empresa	Nome	Nº Funcionários	CNPJ/CPF	Objeto	UF	ART
1	Geo Strauss Engenharia de Fundações da Amazônia LTDA	4	09140647000193	Escavação e Estaca	AM	RR20160018323
2	R.E. Castro Ávila e Cia Ltda	2	09543926000106	Topografia	RR	N.A
3	Mix Construções Eireli-EPP	21	23530933000196	Retro com Operad.	RR	RR20160019137
4	Mix Construções Eireli-EPP		23530933000196	Mão de obra civil Tapume	RR	N.A
5	Mix Construções Eireli-EPP		23530933000196	Mão de Obras e Serviços	RR	RR20160019134
6	Construtec Engenharia	2	17481655000121	Análise de Amostra	RR	N.A
7	Amazônia Concreto Ltda	N.A	08938592000107	Concreto	RR	N.D
8	Vigiar Serv. de Vigia e Port. Ltda	3	19890139000186	Vigilância Desarmada 12x36	RR	N.A
9	Geonort Fundações Ltda	N.A	22903246000106	Prova de Carga	PA	PA20160163397
10	SM Construção Ltda ME	N. A	26633296000171	Acabamento em Concreto	N. D	N.D

N. D – Não Declarado / N. A – Não se Aplica

Empresa	Situação Regular (marque apenas um X)					Nº do contrato	Vigência do contrato até	Valor contratado (R\$)
	Regularidade fiscal	Regularidade FGTS	Regularidade INSS	Regularidade CNDT	Salários pagos*			
1	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	0201-04/2016	N.A – Encerrado	166.961,50
2	X	X	X	X	N.A	0200-02/16	N. A	24.000,00
3	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	0201-06/2016	N. A – Encerrado	17.000,00
4	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	0201-01/2016	N. A – Encerrado	50.026,80
5	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	0201-07/2016	N. A – Encerrado	1.018.951,33
6	X	X	X	X	N.A	021 008/2016	N. A	9.600,00
7	X	X	X	X	N.A	N. A - **	N. A	760.230,80
8	X	X	X	X	X	0201-14/2016	31/01/2017	38.940,00
9	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	N. D	N. A	N. D
10	X	X	X	X	N.A	N. D	N. D	85.000,00
Total de Subcontratação								R\$ 2.170.710,43

*Verificação por amostragem dos salários e benefícios pagos conforme legislação trabalhista e ACT/CCT vigente / N. A – Não se Aplica / N. D – Não Declarado / N.V – Não Verificado.

CONSTATAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS SUBCONTRATAÇÕES

CONSTATAÇÃO 2: Não foram, até o momento, apresentadas as ART's das empresas Amazônia Concreto e SM Construção para as atividades exercidas por elas, mesmo tendo sido Notificada pela Notificação 04/2017, datada de 02 de junho de 2017, acerca da necessidade da emissão desta documentação.

PROVIDÊNCIAS: Será REITERADA a Notificação, com prazo de 05 dias úteis para atendimento da demanda. Caso não seja apresentada tal documentação, será solicitada instauração de processo de apuração de infração por descumprimento contratual por parte da empresa CONTRATADA.

7. REGULARIDADE TRABALHISTA DA EMPRESA CONTRATADA

CHECK LIST DE FUNCIONÁRIOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS							
Ord.	Funcionário	Cargo	CTPS	Exame Admis.	CBO	Acordo Coletivo	EPI
1	Ademar Bertoldo da Silva	Mestre de Obras	4887234/00030	OK	710205	OK	OK
2	Adriano Pinto Vieira	Servente	10182230020	OK	717020	OK	OK
3	Adeilson Moura Silva	Servente	32194-00001	OK	717020	OK	OK
4	Aldeir Rodrigues da Silva	Servente	2954766/0040	OK	717020	OK	OK
5	Alessandro de Souza Vieira	Servente	97685310040	OK	717020	OK	OK
6	Alex Marques da Silva	Técnico Seg. Trabalho	1794931/0040	OK	351605	OK	OK
7	Antônio de Sousa dos Santos	Servente	2956266-0040	OK	717020	OK	OK
8	Antônio Eritan de Souza Ferreira	Pedreiro	2647505/0010	OK	715210	OK	OK
9	Antônio Francisco Paires	Carpinteiro	2480085-0040	OK	715505	OK	OK
10	Antônio Gírlle Nascimento	Carpinteiro	2499493/001-0	OK	715505	OK	OK
11	Antônio Pereira de Souza	Carpinteiro	3907099/004	OK	715505	OK	OK
12	Antônio Sandro da Conceição Silva	Carpinteiro	78677/00040	OK	715505	OK	OK
13	Antônio Silvestre Alves Souza	Carpinteiro	442888-002-R	OK	715505	OK	OK
14	Antônio Wagner Lopes da Silva	Porteiro	73721130030	OK	517405	OK	OK
15	Benedito Costa da Silva Júnior	Almoxarife	2634575-0001	OK	414105	OK	OK
16	Clayton Carlos da Silva Souza	Bombeiro hidráulico	3201350/0030	OK	724110	OK	OK
17	Clenilson Marques Muniz	Armador	42904650030	OK	715305	OK	OK
18	Daniel de Sousa da Silva	Servente	1893147/0050	OK	717020	OK	OK
19	Dayse Nayara Gonçalves Dias	Tec. Segurança	26541170001	OK	351605	OK	OK
20	Decy Silva de Sousa	Pedreiro	2166798/004-0	OK	715210	OK	OK
21	Diego Martins Tenório do Amaral	Assistente Adm. Obra	32712/00059	OK	411010	OK	OK
22	Domicio Dantas Barbosa	Pedreiro	125880405	OK	715210	OK	OK
23	Domingos Pereira de Souza	Pedreiro	1520341003-0-RR	OK	715210	OK	OK
24	Edmilson de Souza Ferreira	Servente	4887801-003		717020	OK	OK
25	Emerson Pinho de Assís	Eletricista	2166591/0040	OK	715605	OK	OK
26	Evangelista Silva Pinto	Carpinteiro	1794817/004-0	OK	715505	OK	OK
27	Everton Lopes dos Santos	Carpinteiro	2308316-003	OK	715505	OK	OK
28	Fabiano Bruno Silveira da Silva	Servente	3907971-0040	OK	717020	OK	OK
29	Francisco Cirilo Dantas	Pedreiro	8947000/0040	OK	715210	OK	OK
30	Francisco das Chagas da Silva	Servente	90360-0015-M	OK	717020	OK	OK
31	Francisco do Monte Alexandre	Pedreiro	3082200001-RR	OK	715210	OK	OK
32	Francisco Ferreira Gomes Filho	Eletricista	260939400100	OK	715605	OK	OK
33	Francisco Wagner Araújo Santos	Servente	9196739-001	OK	717020	OK	OK
34	Geraldo Gonçalves Santos da Silva	Carpinteiro	2483128-0040	OK	715505	OK	OK
35	Gerson Conceição da Costa	Armador	0270372003-0-RR	OK	715305	OK	OK
36	Gilmario Rodrigues Medeiros	Encarregado de Obra	1538293/0050	OK	710220	OK	OK
37	Honorato Ribeiro Paz	Carpinteiro	065999/013-0	OK	715505	OK	OK
38	Ivanilson de Sousa Santos	Carpinteiro	1799361/0040	OK	715505	OK	OK
39	Izan Fernandes de Souza Silva	Servente	62589340030	OK	717020	OK	OK
40	Janiomar Mariano de Freitas Silva	Servente	5752470/003	OK	717020	OK	OK
41	João Gonçalves da Silva	Mestre de Obras	26830615	OK	710205	OK	OK
42	João Ricardo Medeiros Filho	Assistente de Engenharia	867796600030	OK	312105	OK	OK
43	Joel Pereira de Matos	Servente	8156410030-PI	OK	717020	OK	OK
44	Jorge Luis Silva Pereira	Servente	7833800001-MA	OK	717020	OK	OK
45	José Dilson Rodrigues de Souza	Armador	2178000002	OK	715305	OK	OK
46	José Valter da Silva Ribeiro	Porteiro	3080770/0030	OK	517405	OK	OK
47	José Wilson Alves	Pedreiro	2642714/001	OK	715210	OK	OK
48	Leonardo Pinheiro de Araújo	Servente	2480073/0040	OK	717020	OK	OK
49	Leonardo Willian Soares Pinheiro	Pedreiro	1006715/005-0	OK	715210	OK	OK
50	Lucas Abreu de Lima	Carpinteiro	200830001	OK	715505	OK	OK

51	Luiz Gonzaga da Silva	Servente	73707560030	OK	717020	OK	OK
52	Manoel Donaldo Brito	Carpinteiro	93513020030	OK	715505	OK	OK
53	Manoel Gomes da Silva	Servente	034354/011	OK	717020	OK	OK
54	Manoel Rodrigues de Souza	Carpinteiro	24818450040	OK	715505	OK	OK
55	Marcelo Alves Magalhães	Servente	26066980010	OK	717020	OK	OK
56	Maria Moraes Costa	Ass. Adm. Obras	2178144002	OK	411010	OK	OK
57	Marlon Ferreira Mesquita	Carpinteiro	06013300001	OK	715505	OK	OK
58	Raimundo da Cruz Silva	Pedreiro	3477/0009	OK	715210	OK	OK
59	Raimundo Lima Guimarães	Carpinteiro			715505	OK	OK
60	Regivan da Silva Reis	Pedreiro	3447064-002	OK	715210	OK	OK
61	Roberto Carlos Moreira de Lima	Carpinteiro	30813100030	OK	715505	OK	OK
62	Rodrigo Honório	Eng. Civil	PR-55638/D	OK	214215	OK	OK
63	Ronny de Souza Aniceto	Servente	4424017/0040	OK	717020	OK	OK
64	Sanderson Pereira de Andrade	Carpinteiro	1006802/005-0	OK	715505	OK	OK
65	Sebastião Patrocínio da Silva Carmo	Servente	1422393/0020	OK	717020	OK	OK
66	Sivaldo da Costa Pereira	Servente	05513220050	OK	717020	OK	OK
67	Sócrates da Silva Peixoto	Armador	18918800050	OK	715305	OK	OK
68	Solivando Ferreira da Conceição	Carpinteiro	35328080040	OK	715505	OK	OK
69	Timóteo de Souza Figueiredo	Servente	2956106-0040	OK	717020	OK	OK
70	Valdenir Mota dos Santos	Servente	4901406-002	OK	717020	OK	OK
71	Vanderlei Alves da Silva	Servente	09188/0001	OK	717020	OK	OK
72	Willian Peniche Martins	Tec. Eng. Civil	06542600255	OK	214280	OK	OK

N.A – Não Aplicável / N.D – Não Declarado

SALÁRIOS – VALE ALIMENTAÇÃO – VALE TRANSPORTE						
Ord	Nome	Salário pago até o 5º dia útil	Vale-alimentação	Vale transp.	INSS	FGTS
1	Ademar Bertoldo da Silva	-	-	N.O	-	-
2	Adriano Pinto Vieira	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.O	-	-
3	Adeilson Moura Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
4	Aldeir Rodrigues da Silva	-	-	N.O	-	-
5	Alessandro de Souza Vieira	OK	OK	N.O	OK	OK
6	Alex Marques da Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
7	Antônio de Sousa dos Santos	OK	OK	N.D	OK	OK
8	Antônio Eritan de Souza Ferreira	OK	OK	N.O	OK	OK
9	Antônio Francisco Paiares	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
10	Antônio Girle Nascimento	OK	OK	N.O	-	-
11	Antônio Pereira de Souza	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
12	Antônio Sandro da Conceição Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
13	Antônio Silvestre Alves Souza	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
14	Antônio Wagner Lopes da Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
15	Benedito Costa da Silva Júnior	OK	OK	N.O	OK	OK
16	Clayton Carlos da Silva Souza	-	-	N.O	-	-
17	Clenilson Marques Muniz	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.O	-	-
18	Daniel de Sousa da Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
19	Dayse Nayara Gonçalves Dias	OK	Licença Mat.	N.O	OK	OK
20	Decy Silva de Sousa	OK	OK	N.O	OK	OK
21	Diego Martins Tenório do Amaral	OK	OK	N.O	OK	OK
22	Domicio Dantas Barbosa	OK	OK	N.O	OK	OK
23	Domingos Pereira de Souza	OK	OK	N.O	OK	OK
24	Edmilson de Souza Ferreira	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.O	-	-
25	Emerson Pinho de Assis	OK	OK	N.O	OK	OK
26	Evangelista Silva Pinto	OK	OK	N.O	OK	OK
27	Everton Lopes dos Santos	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
28	Fabiano Bruno Silveira da Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
29	Francisco Cirilo Dantas	OK	OK	N.O	OK	OK
30	Francisco das Chagas da Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
31	Francisco do Monte Alexandre	OK	OK	N.O	OK	OK
32	Francisco Ferreira Gomes Filho	OK	OK	N.O	OK	OK
33	Francisco Wagner Araújo Santos	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-

34	Geraldo Gonçalves Santos da Silva	OK	OK	N.D	OK	OK
35	Gerson Conceição da Costa	OK	OK	N.O	OK	OK
36	Gilmario Rodrigues Medeiros	OK	N.D	N.O	OK	OK
37	Honorato Ribeiro Paz	OK	OK	N.O	OK	OK
38	Ivanilson de Sousa Santos	OK	OK	N.O	OK	OK
39	Izan Fernandes de Souza Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
40	Janiomar Mariano de Freitas Silva	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
41	João Gonçalves da Silva	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.O	-	-
42	João Ricardo Medeiros Filho	OK	OK	N.O	OK	OK
43	Joel Pereira de Matos	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
44	Jorge Luis Silva Pereira	OK	OK	N.O	OK	OK
45	José Dilson Rodrigues de Souza	OK	OK	N.O	OK	OK
46	José Valter da Silva Ribeiro	OK	OK	N.O	OK	OK
47	José Wilson Alves	OK	OK	N.O	OK	OK
48	Leonardo Pinheiro de Araújo	OK	OK	N.O	OK	OK
49	Leonardo William Soares Pinheiro	OK	OK	N.O	OK	OK
50	Lucas Abreu de Lima	OK	OK	N.O	OK	OK
51	Luiz Gonzaga da Silva	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
52	Manoel Donaldo Brito	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
53	Manoel Gomes da Silva	OK	OK	OK	OK	OK
54	Manoel Rodrigues de Souza	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
55	Marcelo Alves Magalhães	OK	OK	N.O	OK	OK
56	Maria Moraes Costa	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.O	-	-
57	Marlon Ferreira Mesquita	OK	OK	N.O	OK	OK
58	Raimundo da Cruz Silva	OK	OK	N.O	OK	OK
59	Raimundo Lima Guimarães	OK	OK	N.O	OK	OK
60	Regivan da Silva Reis	OK	OK	N.D	OK	OK
61	Roberto Carlos Moreira de Lima	OK	OK	N.O	OK	OK
62	Rodrigo Honório	OK	OK	N.O	OK	OK
63	Ronny de Souza Aniceto	OK	OK	N.O	OK	OK
64	Sanderson Pereira de Andrade	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	OK	-	-
65	Sebastião Patrocínio da Silva Carmo	-	-	N.O	OK	OK
66	Sivaldo da Costa Pereira	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.O	-	-
67	Sócrates da Silva Peixoto	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
68	Solivando Ferreira da Conceição	OK	OK	N.O	OK	OK
69	Timóteo de Souza Figueiredo	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
70	Waldenir Mota dos Santos	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
71	Vanderlei Alves da Silva	Vinculo Enc.	Vinculo Enc.	N.D	-	-
72	Willian Peniche Martins	-	Transferido de UF	OK	-	-

N.O – Não Optante / N.D – Não Declarado / * Alimentação paga em pecúnia com constatação e verificação de recibo assinado pelo empregado e conferido por amostragem em entrevista in loco/ ** Alimentação Fornecida no Local comprovante de entrega assinado pelos trabalhadores (1º e 2º Quinzena de abril/2017).

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA GPS MÊS MAIO/2017 – GFIP/SEFIP				
Nº Ident.	Valor R\$ Pago	Multa Atraso R\$	Nº Analítico GPS	Autenticação Bancária
00512358982371	33.536,33	0,00	05062017-113653	69CB8E48928FF55FC78E357261C302010D8F662D
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS MÊS MAIO/2017 – GFIP/SEFIP				
ID Recolhimento	Valor R\$ Depositado	Multa Atraso R\$	GRF Gerada em	Autenticação Bancária
018080-1	14.542,66	0,00	05.06.2017	264B3958AC4FC63F560AFEC57EF499722D7817E0

DATA DE ADMISSÃO E DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTROLE TRABALHISTA					
Ord	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Com ou Sem Justa Causa	Rescisão*
1	Ademar Bertoldo da Silva	19/06/2017	-		
2	Adriano Pinto Vieira	08/11/2016	05/01/2017	Sem Justa Causa	Pendente
3	Adeilson Moura Silva	06/12/2016	-		
4	Aldair Rodrigues da Silva	03/07/2017	-		
5	Alessandro de Souza Vieira	08/11/2016	-	Licença Saúde	
6	Alex Marques da Silva	16/01/2016	-		
7	Antônio de Sousa dos Santos	01/12/2016	-		
8	Antônio Eritan de Souza Ferreira	23/05/2017	-		
9	Antônio Francisco Paires	12/12/ 2016	20/03/2017	Sem Justa Causa	OK

10	Antônio Girle Nascimento	08/05/2017	-		
11	Antônio Pereira de Souza	04/01/2017	10/02/2017	Sem Justa causa	OK
12	Antônio Sandro da Conceição Silva	24/01/2017	-		
13	Antônio Silvestre Alves Souza	01/12/2016	17/03/2017	Sem Justa Causa	OK
14	Antônio Wagner Lopes da Silva	01/06/2016	-		
15	Benedito Costa da Silva Júnior	19/12/2016	-		
16	Clayton Carlos da Silva Souza	12/06/2017	-		
17	Clenilson Marques Muniz	10/11/2016	22/03/2017	Sem Justa Causa	OK
18	Daniel de Sousa da Silva	22/05/2017	-		
19	Dayse Nayara Gonçalves Dias	09/05/2016	-	Licença Maternidade	
20	Decy Silva de Sousa	08/05/2017	-		
21	Diego Martins Tenório do Amaral	23/01/2016			
22	Domicio Dantas Barbosa	11/11/2016	-		
23	Domingos Pereira de Souza	26/10/2016	-		
24	Edmilson de Souza Ferreira	05/01/2017	06/03/2017	Extinção de Contrato PD	OK
25	Emerson Pinho de Assís	10/04/2017			
26	Evangelista Silva Pinto	08/05/2017	-		
27	Everton Lopes dos Santos	07/12/2016	06/04/2017	Sem Justa Causa	OK
28	Fabiano Bruno Silveira da Silva	02/12/2016	-		
29	Francisco Cirilo Dantas	20/04/2017	-		
30	Francisco das Chagas da Silva	24/11/2016	05/12/2016	Sem Justa Causa	OK
31	Francisco do Monte Alexandre	29/10/2016	-		
32	Francisco Ferreira Gomes Filho	10/10/2016	-		
33	Francisco Wagner Araújo	05/01/2017	06/03/2017	Extinção de Contrato PD	OK
34	Geraldo Gonçalves Santos da Silva	12/12/2016	-		
35	Gerson Conceição da Costa	21/10/2016	-		
36	Gilmario Rodrigues Medeiros	23/03/2017	-		
37	Honorato Ribeiro Paz	08/05/2017	-		
38	Ivanilson de Sousa Santos	20/04/2017	-		
39	Izan Fernandes de Souza Silva	07/11/2016	-		
40	Janiomar Mariano de Freitas Silva	05/01/2016	10/02/2017	Sem Justa Causa	OK
41	João Gonçalves da Silva	16/05/2016	17/03/2017	Sem Justa Causa	OK
42	João Ricardo Medeiros Filho	01/06/2016	-		
43	Joel Pereira de Matos	21/10/2016	03/04/2017	Sem Justa Causa	OK
44	Jorge Luis Silva Pereira	19/10/2016	-		
45	José Dilson Rodrigues de Souza	10/10/2016	-		
46	José Valter da Silva Ribeiro	25/05/2017	-		
47	José Wilson Alves	20/04/2017	-		
48	Leonardo Pinheiro de Araújo	22/05/2017			
49	Leonardo William Soares Pinheiro	08/05/2017			
50	Lucas Abreu de Lima	10/10/2016	-		
51	Luiz Gonzaga da Silva	03/11/2016	08/04/2017	Sem Justa Causa	OK
52	Manoel Donaldo Brito	10/10/2016	12/04/2017	Sem Justa Causa	OK
53	Manoel Gomes da Silva	20/04/2017			
54	Manoel Rodrigues de Souza	10/10/2016	12/04/2017	Sem Justa Causa	OK
55	Marcelo Alves Magalhães	07/11/2016	-		
56	Maria Moraes Costa	18/04/2016	01/02/2017	Sem Justa Causa	OK
57	Marlon Ferreira Mesquita	04/11/2016	-		
58	Raimundo da Cruz Silva	23/05/2017			
59	Raimundo Lima Guimarães	04/01/2017	-		
60	Regivan da Silva Reis	09/12/2016	-		
61	Roberto Carlos Moreira de Lima	04/11/2016	-		
62	Rodrigo Honório	01/12/2016	-		
63	Ronny de Souza Aniceto	22/05/2017			
64	Sanderson Pereira de Andrade	08/05/2017	30/05/2017	Sem Justa Causa	OK
65	Sebastião Patrocínio da Silva Carmo	12/06/2017			
66	Sivaldo da Costa Pereira	10/10/2016	22/03/2017	Sem Justa Causa	OK
67	Sócrates da Silva Peixoto	10/10/2016	27/04/2017	Sem Justa Causa	OK
68	Solivando Ferreira da Conceição	10/10/2016	-		
69	Timóteo de Souza Figueiredo	15/12/2016	23/04/2017	A Pedido do Empregado	OK
70	Waldenir Mota dos Santos	09/12/2016	13/02/2017	Sem Justa Causa	OK
71	Vanderlei Alves da Silva	05/01/2017	06/03/2017	Extinção de Contrato PD	OK
72	Willian Peniche Martins	02/01/2016	-	Transferido para outra U.F	

N. D – Não Declarado / PD – Prazo Determinado / *Verificação de Aviso Prévio + Verbas Rescisórias + Multa FGTS + Entrega

REGULARIDADE FISCAL – INSS – FGTS – CNDT			
Certidão	Regular	Irregular	Validade
Municipal	X		11/10/2017
Estadual	X		05/10/2017
Federal	X		03/10/2017
FGTS	X*		21/07/2017
INSS	X		03/10/2017
CNDT	X		03/12/2017

*Regular para o período compreendido da parcela de nº 14 do contrato nº 15/2015.

As Verificações realizadas foram feitas de acordo com o Roteiro Simplificado para Acompanhamento de Contratos Administrativos – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Revisada e Atualizada – MPF/PR-RR/Ano 2016 e de acordo com o Manual de Fiscalização e Acompanhamento Contratual do MPF.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA OBRA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CREA E SEA/MPF	
Nome	Faltas durante o Período – 4 semanas
Gilson Kaminski	0
CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO CORRESPONSÁVEL TÉCNICO NA OBRA	
Nome	Faltas durante o Período – 4 semanas
Rodrigo Honório	0

CONSTATAÇÕES DE CUNHO TRABALHISTA

CONSTATAÇÃO 3: Não consta na relação de funcionários que receberam o vale-alimentação o nome do senhor Gilmaro Rodrigues Medeiros, não sendo apresentada nenhuma justificativa para tanto.

PROVIDÊNCIAS: Será solicitada à empresa que seja informado se o senhor Gilmaro Rodrigues Medeiros recebeu o vale-alimentação no período correspondente à medição com a apresentação da comprovação ou se há alguma justificativa para o não pagamento do benefício.

8. CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente no Diário de Obras Eletrônico, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto, não há nenhuma situação impeditiva de pagamento da obrigação do mês de junho de 2017.

Toda documentação aqui descrita encontra-se disponível no site da transparência do contrato nº 15/2015 no link <http://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/nova-sede/nova-sede> e no site da transparência do MPF, podendo a documentação iniciada em “PR-RR-0000XXXX” ser acessada através do link <http://www.transparencia.mpf.br/validacaodocumento>.

9. ANEXOS

Estão anexos ao presente relatório:

- Mídia digital contendo toda a documentação descrita neste relatório.
- Relatório de Execução nº 14 da empresa OIKOS;

- c) Relatório Técnico nº 14 dos engenheiros do MPF;
- d) Fotografia do período.

LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 26 de julho de 2017

Declaramos assim, que as metas estabelecidas na 14ª (décima quarta) etapa do contrato nº 15/2015, definida no Cronograma Físico-Financeiro, foram atendidas parcialmente e como consequência **ATESTAMOS** por definitivo a obrigação em tela, **COM RESSALVAS**, mas sem nenhum fato impeditivo para pagamento da nota fiscal de nº 852.

Jardel Pereira de Lira
Engenheiro Civil/Presidente Substituto
da Comissão

Tammy Nabilla Sousa Cruz
Engenheira Civil/Membro da Comissão

Robson Guimarães Costa
Presidente da Comissão

Joel de Oliveira Melo
Membro da Comissão

Francisco das Chagas Alves
Membro da Comissão

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.

PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL

() Não foram identificados vícios.

() Ver Nota Técnica ou Despacho constante da folha de nº. _____

Igor José Barbosa Duarte lopes
Secretário Estadual Substituto

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.

ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OIKOS – 14º MEDIÇÃO



Projeto: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MP/RR
Data: 01/07/2017
Elaboração: Oikos Construções Ltda

INTRODUÇÃO

Este relatório se refere ao trabalho de **CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**.

A empresa **OIKOS construções Ltda-EPP**, vem por meio deste apresentar o **Relatório de Atividades N° 05** referente aos trabalhos desenvolvidos de **01 a 30 de Junho de 2017, 17º medição**.

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONSTRUTORA

1	CANTEIRO DE OBRAS	
01.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	
01.02.01	ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE DE CARGAS	%
01.02.02	MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA	UN
01.03	ALOJAMENTOS, TAPUMES E PROTEÇÕES	
01.03.02	PROTEÇÃO PERIMETRAL COM GUARDA CORPO EM MADEIRA E CABO DE AÇO (2 REAPROVEITAMENTOS)	M
01.03.04	ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2
2	EDIFÍCIO SEDE	
02.07	SUPERESTRUTURA	
02.07.01	FORMAS	
02.07.01.002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2
02.07.02	ARMADURAS	
02.07.02.001	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG

02.07.02.002	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
02.07.02.003	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
02.07.03	CONCRETO	
02.07.03.001	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN
02.07.03.002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3
02.08	PAREDES E PAINEIS	
02.08.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	
02.08.01.004	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 9CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA, JUNTAS 12MM	M2
02.11	IMPERMEABILIZAÇÕES	
02.11.04	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE INTEGRADA AO CONTRAPISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM EMULSÃO ADESIVA VIAFIX , ESPESSURA MÉDIA 2 CM	M²
02.11.08	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO MODIFICADO COM POLIMEROS (ARG. POLIMÉRICA) VIAPLUS 1000 COM VÉU DE POLIESTER NOS RODAPÉS E MONOPOL POLIURETANO 25 PARA CALAFETAÇÃO DE TUBULAÇÕES	M²
02.13	REVESTIMENTOS	
02.13.01	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2
02.13.02	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2
02.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	
02.15.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
02.15.01.022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P, INCLUINDO CONEXÕES	M
02.15.01.024	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P, INCLUINDO CONEXÕES	M
02.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M
02.16.01	ELÉTRICO	
02.16.01.002	CANAleta PERfurada ALTA(PERFILADOS),CHAPA #16, MEDINDO 38X38 MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M
02.16.01.022	ELETRODUTO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE “PEAD” DN 50MM (2”), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M
02.16.01.023	ELETRODUTO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE “PEAD” DN 75MM (3”), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M
02.16.01.024	ELETRODUTO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE “PEAD” DN 100MM (4”), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M

02.16.03	S.P.D.A. / ATERRAMENTO	
02.16.03.001	REBAR - BARRA DE AÇO REDONDA GALVANIZADA LISA, DIÂMETRO 3/8" (10MM) COM CLIPS PARA TRESPASSE DE 20CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
02.16.03.002	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS, SEÇÃO 35 MM², INCLUINDO FIXADORES	M
3	CASA DE MÁQUINAS	
03.06	PAREDES E PAINÉIS	
03.06.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²
6	RESERVATÓRIO DE REUSO	
06.04	INFRAESTRUTURA	
06.04.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²
06.04.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
06.04.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³
06.04.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
06.08	IMPERMEABILIZAÇÕES	
06.08.01	LASTRO DE BRITA GRADUADA ESP. 10CM	
06.08.03	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS (ARG. POLIMÉRICA) VIAPLUS 1000 SOBRE ESTRUTURAS ENTERRADAS: FUNDAÇÕES E BALDRAMES	
08	COBERTURA DE VEICULOS E PASSARELAS	
08.01	INFRAESTRUTURA	
08.01.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	
08.01.02	ESCAVAÇÃO MANUAL	
08.01.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	
08.01.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	
08.01.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	

2. PRINCIPAIS ITÊNS MEDIDOS

- **PILARES.**

Total: 16 pilares

PILARES EXECUTADOS NO MÊS DE JUNHO


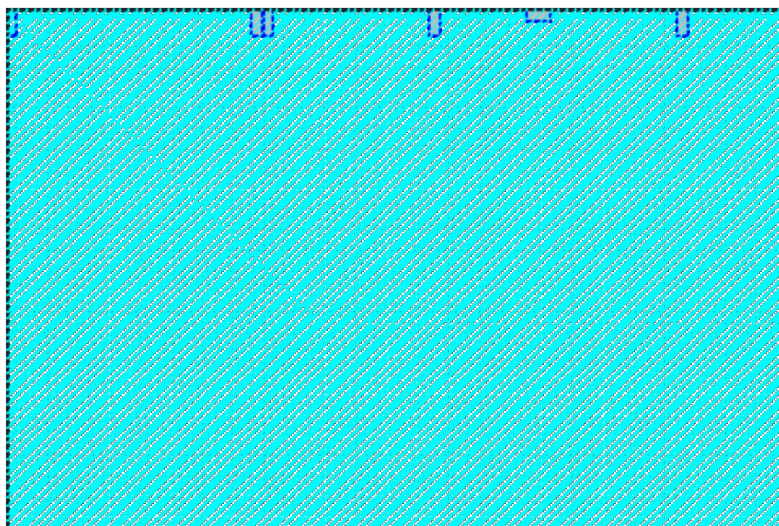


Foto 01: Pilares e pavimento do reservatório:

- **LAJE PAVIMENTO COROAMENTO E PILARES**

Área: 190,09 m² , incluindo a tampa do reservatório

PILARES E LAJE DO PAVIMENTO COROAMENTO

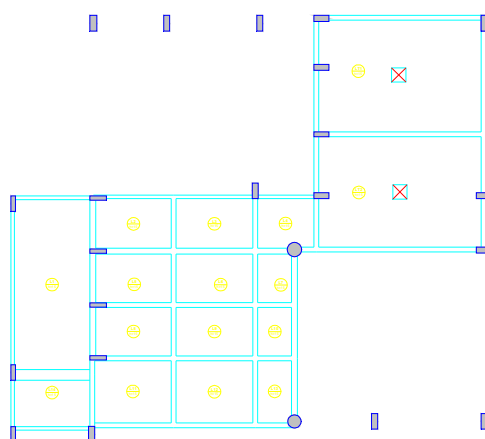

FORMA PAV. COROAMENTO

ESCALA 1:75

Foto 02: Área total de laje.

- **REVESTIMENTO PAREDES DO ED. SEDE:**

Total: 2161 m²

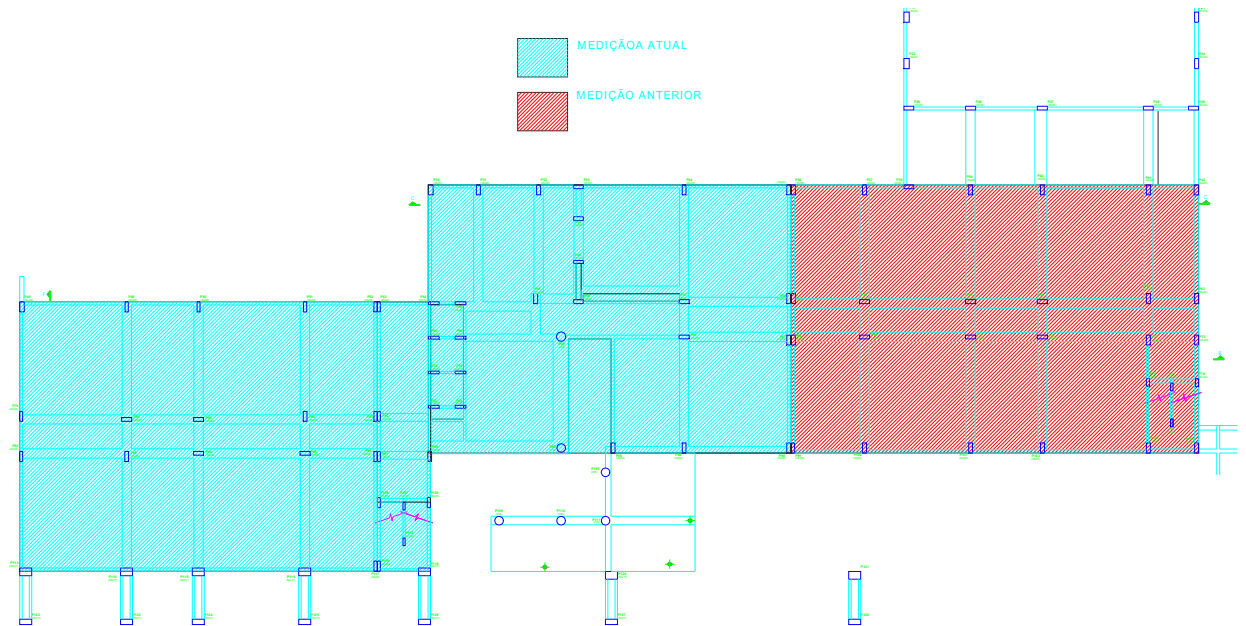


Foto 03: Revestimento das paredes do ED. SEDE, pavimento 1 , SETOR A e B.

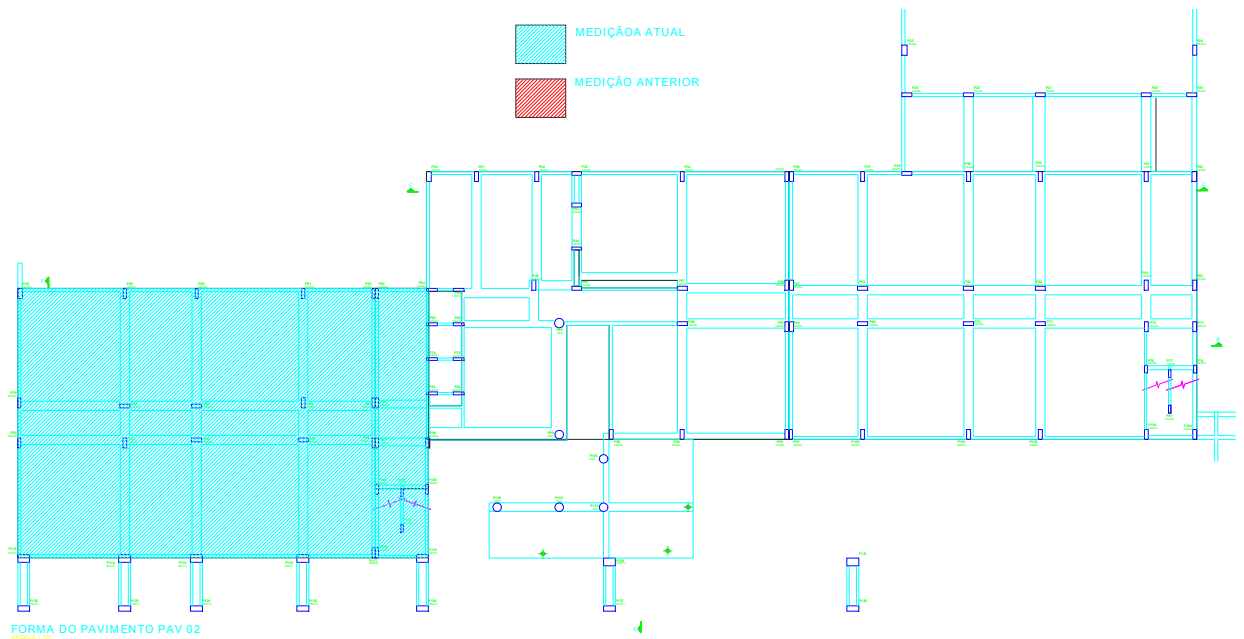


Foto 04: Revestimento das paredes do ED. SEDE, pavimento 2, setor A.

- **ALVENARIA DO ED. SEDE, SETOR C**

Área total: 410 m²

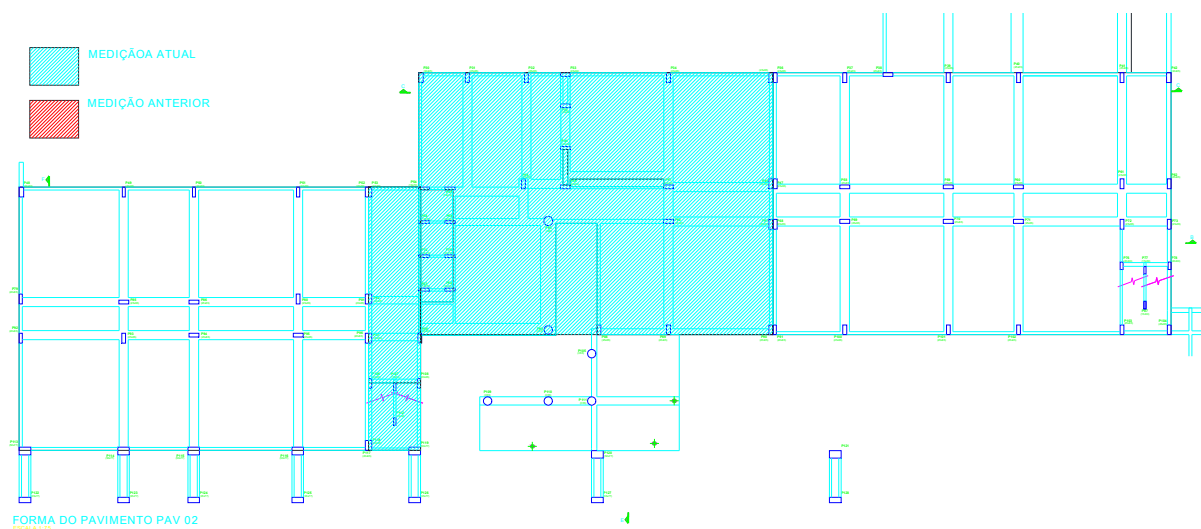


Foto 05: Alvenaria ED. SEDE, setor B, pavimento 3.

- **ALVENARIA CASA DE MÁQUINA**

Total: 162 m² de alvenaria

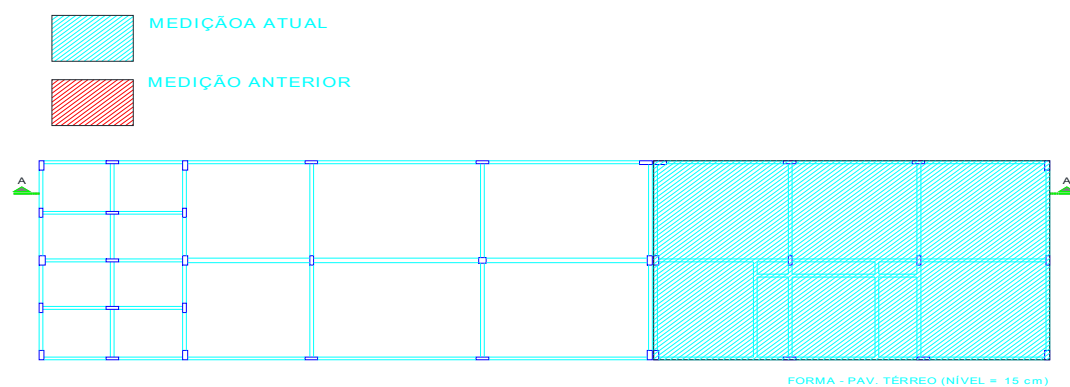


Foto 06: Lajes do Depósito de lixo e Guarita 2.

- **IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS DO ED. SEDE**

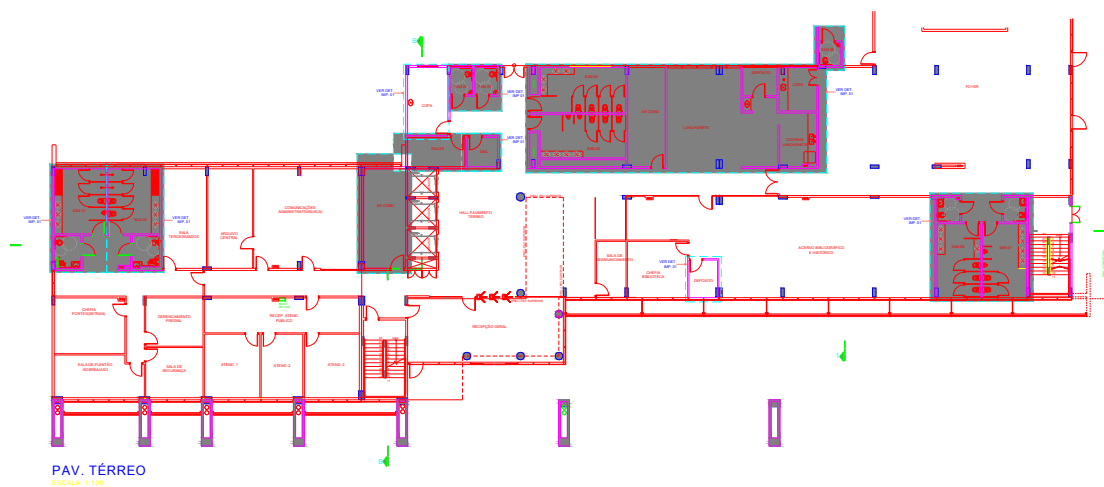


Foto 07: Impermeabilização de áreas molhadas.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA – PR/RR

ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

RELATÓRIO TÉCNICO
MEDIÇÃO 14

1. A décima quarta medição foi efetuada pelos fiscais da obra, engenheiros civis da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Jardel Pereira de Lira, matrícula 23815 e Tammy Nabilla Sousa Cruz, matrícula 26196, no dia 07/07/2017. Os serviços referentes a esta medição foram executados entre o período de 07 de junho a 06 de julho de 2017.
2. Foram executados serviços tais como previsto no cronograma físico-financeiro. Conforme consta na planilha de medição, a quantidade de serviços planejados para o décimo quarto mês de obra foi de 1,55% do valor total da obra, sendo executado no mês o percentual de 1,32% do valor total da obra. Nota-se, ainda, um atraso na porcentagem referente aos serviços acumulados, que tinha uma previsão de 22,85%, sendo efetivamente executados até o momento 21,32%.
3. Em relação ao caminho crítico da obra, pode-se analisar os serviços executados até o momento e os serviços projetados para os quatorze primeiros meses de obra com auxílio da tabela abaixo. É possível constatar que a execução física de alguns serviços, como a superestrutura, está abaixo do volume planejado.

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado <i>in loco</i>	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
---------	---	---	--	---

Limpeza do terreno, alojamento, tapumes, proteções equipamentos, andaimes e desmobilização da obra.	60,75%	66,65%		X
Superestrutura	77,64%	66,63%	X	
Paredes e painéis	16,00%	19,00%		X
Impermeabilizações	20,02%	25,82%		X
Revestimentos	5,00%	9,91%		X
Pisos	7,21%	7,89%		X
Instalações Hidrossanitárias	4,08%	3,39%	X	
Instalações Elétricas	5,41%	2,68%	X	
Administração	22,85%	21,32%	X	

4. Segue abaixo a planilha contendo o resumo dos serviços efetivamente realizados no mês de Junho de 2017 pela empresa e medidos pela fiscalização no mês de julho de 2017.

Item	Descrição	Unid.	MEDIDA ACUMULADA				QUANTITATIVOS	EXECUÇÃO SERVIÇOS CONTRATADOS		
			%	Quantidade	Valor sem BDI	Valor com BDI		Mês 14		
							Finalis para avaliação	Medição Unitária	% executado	Valor com BD
1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.01	LIMPEZA DO TERRENO									0,00
01.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES			0,00						6.130,16
01.02.01	ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA DE PINHAO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE DE CARGAS	%	37,52%	37,52	52.233,09	52.233,09	100,00	4	4,17%	5.805,22
01.02.02	MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA	UN	37,09%	0,37	2.933,49	2.933,49	1,00	0	4,11%	324,94
01.03	ALOJAMENTOS, TAPUMES E PROTEÇÕES			0,00						1.102,46
01.03.04	ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	45,83%	916,64	12.127,10	12.127,10	2000,00	83		1.102,46
	Subtotais									7.232,62
2	EDIFICIO SEDE									
02.07	SUPERESTRUTURA			0,00	0,00	0,00				99.509,76
02.07.01	FORMAS			0,00	0,00	0,00				0,00
02.07.01.001	PONTALETES 7,5 X 7,5 CM	M2	92,28%	5.158,39	186.888,47	186.888,47	5.590,00	60		2.173,80
02.07.01.002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	82,21%	7.818,08	246.816,79	246.816,79	9.510,00	526		16.620,97
02.07.02	ARMADURAS			0,00	0,00	0,00				0,00
02.07.02.001	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	88,43%	20.689,06	161.167,78	161.167,78	23.395,00	454		3.539,31
02.07.02.002	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	88,24%	62.593,92	416.875,51	416.875,51	70.935,00	45		301,43
02.07.02.003	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	86,79%	59.838,43	486.486,44	486.486,44	68.950,00	3.184		25.886,08
02.07.03	CONCRETO			0,00	0,00	0,00				0,00
02.07.03.001	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	UN	81,08%	180,00	16.579,80	16.579,80	222,00	20		1.842,20
02.07.03.002	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	48,51%	887,66	718.578,52	718.578,52	1.830,00	61		49.145,96
02.08	PAREDES E PAINÉIS			0,00	0,00	0,00				53.738,70
02.08.01.003	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 19CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA, JUNTAS 12MM	M2	356,47%	427,76	56.066,50	56.066,50	120,00	410		53.738,70
02.11	IMPERMEABILIZAÇÕES			0,00	0,00	0,00				40.826,80
02.11.04	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE INTEGRADA AO CONTRAPISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM EMULSAO ADESIVA VIAFIX, ESPESSURA MEDIA 2 CM	M2	25,61%	490,00	14.376,60	14.376,60	1.913,00	490		14.376,60
02.11.08	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO MODIFICADO COM POLIMEROS (ARG. POLIMERICA) VIAPLUS 1000 COM VEU DE POLIESTER NOS RODAPES E MONOPOL POLIURETANO 25 PARA CALAFETACAO DE TUBULACOES	M2	30,21%	490,00	26.450,20	26.450,20	1.622,00	490		26.450,20
02.13	REVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00				88.092,14
02.13.01	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E 9MM	M2	28,57%	4.627,95	116.531,78	116.531,78	16.200,00	2.161		54.420,02
02.13.02	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	28,57%	4.627,95	72.103,46	72.103,46	16.200,00	2.161		33.672,12
02.15	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS			0,00	0,00	0,00				313,20
02.15.01	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			0,00	0,00	0,00				0,00
02.15.01.022	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2014 P. INCLUINDO CONEXOES	M	17,95%	72,00	197,28	197,28	401,20	72		197,28
02.15.01.024	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2014 P. INCLUINDO CONEXOES	M	2,99%	12,00	115,92	115,92	401,00	12		115,92
02.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00	0,00	0,00				59.572,07
02.16.01	ELÉTRICO			0,00	0,00	0,00				0,00
02.16.01.002	CANAleta PERFORADA ALTA(PERFILADOS), CHAPA #16, MEDINDO 38X38 MM PRE-GALVANIZADA INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	30,54%	494,73	13.629,81	13.629,81	1.620,00	230		6.336,50
02.16.01.022	ELETRODUTO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE "PEAD" DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	39,56%	1.258,00	27.801,80	27.801,80	3.180,00	1.000		22.100,00
02.16.01.023	ELETRODUTO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE "PEAD" DN 75MM (3") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	354,33%	531,50	21.228,11	21.228,11	150,00	510		20.369,40
02.16.01.024	ELETRODUTO DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE "PEAD" DN 100MM (4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,14%	105,00	5.407,50	5.407,50	435,00	105		5.407,50
02.16.03	S.P.D.A. / ATERRAMENTO			0,00	0,00	0,00				0,00
02.16.03.001	REBAR - BARRA DE ACO REDONDA GALVANIZADA LISA, DIAMETRO 3/8" (10MM) COM CLIPS PARA TRESPASSE DE 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	41,15%	1.893,00	31.821,33	31.821,33	4.600,00	117		1.966,77
02.16.03.002	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PARA-RAIOS, SECAO 35 MM², INCLUINDO FIXADORES	M	82,15%	739,37	23.438,03	23.438,03	900,00	107		3.391,90
	Subtotais									342.052,67
3	CASA DE MAQUINAS									
03.06	PAREDES E PAINÉIS			0,00	0,00	0,00				15.833,75
03.06.03	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2014	M2	21,86%	161,80	15.833,75	15.833,75	740,00	162		15.833,75
	Subtotais									15.833,75
6	RESERVATÓRIO DE REUSO									
06.04	INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	0,00				23.152,07
06.04.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	100,00%	60,00	1.673,40	1.673,40	60,00	60		1.673,40
06.04.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	100,00%	215,00	1.674,85	1.674,85	215,00	164		1.277,56
06.04.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	100,00%	65,00	49.077,60	49.077,60	65,00	24		18.347,47
06.04.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	100,00%	600,00	4.878,00	4.878,00	600,00	228		1.853,64
06.08	IMPERMEABILIZAÇÕES			0,00	0,00	0,00				3.553,36
06.08.01	LASTRO DE BRITA GRADUADA ESP. 10CM	M3	26,60%	2,70	405,11	405,11	10,15	3		405,11
06.08.03	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO MODIFICADO COM POLIMEROS (ARG. POLIMERICA) VIAPLUS 1000 SOBRE ESTRUTURAS ENTERRADAS: FUNDACOES E BALDRAMES	M2	107,36%	87,50	3.148,25	3.148,25	81,50	88		3.148,25
	Subtotais									26.705,43
8	COBERTURADA VEICULOS E PASSARELAS									
8.01	INFRAESTRUTURA									19.655,36
8.01.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	55,56%	486,14	13.558,44	13.558,44	875,00	149	17,06%	4.163,14
8.01.02	ESCAVACAO MANUAL	M3	98,55%	93,62	2.104,58	2.104,58	95,00	10	10,79%	230,42
8.01.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	68,95%	1.023,98	7.976,80	7.976,80	1485,00	228	15,35%	1.776,12
8.01.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	83,73%	180,01	135.914,75	135.914,75	215,00	13	5,99%	9.717,36
8.01.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG	63,45%	2.614,28	21.254,10	21.254,10	4120,00	464	11,25%	3.768,26
	Subtotais									0,00
	Subtotais									0,00
	TOTAL GERAL sem BDI e sem ADMINISTRAÇÃO				6.661.138,23	6.661.138,23				411.479,77

	% Realizado	TOTAL R\$
TOTAL R\$	1,32%	439.326,65
REAJUSTE R\$	5,8693192%	25.785,48

5. Diante do percentual executado na 14ª medição, o valor total a ser pago no mês de julho de 2017 é de **R\$ 439.326,65** (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).
6. No que se refere ao reajuste, após aplicação do índice previsto no 3º termo aditivo ao contrato (5,8693192%), o valor total a ser pago no mês de julho de 2017 é de **R\$ 25.785,48** (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Boa Vista, 11 de julho de 2017.

Tammy Nabilla Sousa Cruz
Assessora em Engenharia Civil
Matrícula – 26196
Fiscal de Obra

ANEXO 01
SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017















ANEXO III
FOTOGRAFIAS DO PERÍODO

