



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2015

**RELATÓRIO DA NONA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA
SEDE**

PORTARIA PR-RR/SE Nº 002/2016 E 8/2016

JANEIRO DE 2017

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA



MEMBROS E INFORMAÇÕES DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA 09 de maio de 2016

PERÍODO DO RELATÓRIO: De 23 de dezembro de 2016 a 03 de fevereiro de 2017

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA – MPF

Nome/ART/Matrícula: Eng. Tammy Nabilla Sousa Cruz / RR20160019635/ 26196

Nome/ART/Matrícula: Eng. Jardel Pereira de Lira / RR20160019649 / 23815

Perita: Matrícula Eng. Kerry Aline da Silva Ferreira / 26108

Telefone: (95) 3198-2026 / 3014-9110

E-mail: jardel@mpf.mp.br / tammyncruz@mpf.mp.br / kerryaline@mpf.mp.br

COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)

Nome: Robson Guimarães Costa / Joel de Oliveira Melo / Francisco das Chagas Alves / Tammy Nabilla Sousa Cruz / Jardel Pereira de Lira

Portaria: SE/PR-RR Nº 002, de 11 de janeiro de 2016 e SE/PR-RR Nº 8, de 09 de junho de 2016

Telefone: (95) 3198-2026 / 2005 / 2000 / 2019

E-mail: prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br

Site da obra: <http://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/nova-sede/nova-sede>

APRESENTAÇÃO

O presente relatório e seus anexos, são a síntese analítica de dados e informações logísticas e físicas coletadas e fiscalizadas pela Comissão de Supervisão e Fiscalização do Contrato nº 15/2015, referente ao período compreendido da nona medição dos serviços realizados na obra da nova sede da procuradoria da República no Estado de Roraima, executadas entre os dias 23 de dezembro de 2016 a 03 de fevereiro de 2017, de acordo com as especificações e o novo cronograma físico-financeiro previsto no referido contrato e seu aditivo de nº 1/2016.

É importante deixar claro que o período de execução da obra hora relatado, encontrou-se em particular e excepcional exceção de medição em período diferente do estabelecido como ciclo mensal de medição, por força da possibilidade dada pelo Parecer SEORI/AUDIN-MPU nº 1.867/2016, colimado no item 6 do Despacho CA nº 121/2016 (Único PR-RR-00024961/2016), constante da folha de nº 432 do PA de pagamento 2016 do objeto aqui em registro (PA nº 1.32.000000726/2016-59), razão da nona medição de execução do contrato nº 15/2015 conter parcela da oitava parcela somado com a nona parcela integralmente executada.

É válido informar que os dados aqui apresentados encontram-se alinhados com o novo cronograma físico-financeiro da obra, alterado por meio de Aditivo nº 01/2016 ao contrato nº 15/2015, publicado no Diário Oficial da União nº 192, Seção 3, folha nº 139, com cópias juntadas as folhas de nº 1061 a 1065 do PA de Fiscalização (1.32.000.000051/2016-48), nas folhas de nº 239 a 143 do PA de pagamento 2016 e folhas de nº 3328 a 3332 do Pa de Contratação (1.32.000.000601/2015-48).

Foram atendidas pela empresa OIKOS, as Notificações nº 08 e 09/2016 (folhas de nº 1406 e 1402 do volume VI do PA de fiscalização nº 1.32.000.000051/2016-48 (Únicos nº pr-rr-00023598/2016 e pr-rr00024951/2016), conforme Documentos PE 0321 (Único nº pr-rr-00000105/2017), constante da folha de nº 1408 a 1412, e PE 231 (Único nº pr-rr-00024469/2016), constante da folha de nº 1413 a 1424 do PA de Fiscalização.

Entre os dias 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, a equipe da Secretária de Engenharia e Arquitetura da Procuradoria-Geral da República, composta pelos engenheiros Diego Popov e Oberdan Machado, estiveram acompanhando o período da medição hora em registro, onde conforme e-mails institucionais juntados às folhas de nº 1543 e 1544, os mesmos, juntamente com os engenheiros da PR-RR, Jardel Lira, Tammy Nabilla e a Perita em Engenharia Kerry Silva, estiveram revisando os pontos relacionados a:

- a) verificação dos serviços realizados;
- b) acompanhamento da 9ª medição;
- c) programação orçamentária 2017;
- d) esclarecimentos de dúvidas do projeto, soluções e execução de etapas do contrato;
- e) verificação detalhada do andamento físico da obra comparado ao planejamento do período;
- f) questões de infraestrutura da elétrica do projeto e sua execução com as devidas correções;
- g) questões relacionadas a acessibilidade;
- h) aditamentos e supressões de itens da planilha orçamentária do projeto;
- i) análise da solução da OIKOS para as questões de alvenaria das paredes internas da obra que não estão alinhadas com as vigas das lajes;
- j) verificação e solução para aterramento e laje do piso da subestação;
- k) análise das tubulações de aterradas;
- l) análise e solução das saídas do reservatório de água potável e varredura no projeto de hidráulica;
- m) questões da regularização e concretagem das lajes.

No dia 01 de fevereiro de 2017, as 14 horas e 35 minutos, foi realizada reunião com toda a equipe da OIKOS e do MPF, onde foram tratadas questões de alta relevância para ajuste de tarefas a serem executadas no Contrato nº 15/2015, com exposições de questões que dificultam o andamento da obra, que até o presente momento não causou atraso ou paralisação do pleito, mas, que de modo preventivo, devem imediatamente serem postas em execução para saneamento de problemas relacionados ao projeto entregue pela empresa R7.

Estiveram presentes nesta reunião:

→ Do MPF: Engenheiros Oberdan Machado, Diego Popov, Jardel Lira, Tammy Nabilla e Kerry Silva; o Secretário Estadual da PR-RR, senhor Igor José Lopes e o Coordenador de Administração, senhor Robson Guimarães.

→ Da empresa OIKOS: O engenheiro e representante legal da empresa OIKOS, senhor Gilson Kaminski; o engenheiro Rodrigo Honório; o Técnico em Engenharia, senhor Willian Peniche Martins; o colaborador em arquitetura, senhor Pablo Diogo; o engenheiro e sócio da empresa, senhor Carlos e o Advogado e Controle Interno da OIKOS, senhor Rodrigo Vissotto Junkes (OAB/PR 33.453), este último participou via skype de Curitiba – PR.

O engenheiro da SEA/PGR e parceiro orientador da comissão de fiscalização do contrato nº 15/2015, senhor Oberdan Machado, formalizou relatório circunstanciado da visita da SEA no período em descrição aqui, do qual fora juntado a folha de nº 1618 e 1619 do PA de Fiscalização, com registro das atividades acima elencadas e outras informações acertadas para saneamento junto a empresa OIKOS.

Na reunião o senhor Gilson Kaminski exteriorizou sua preocupação com a falta de

detalhamento do projeto por parte da empresa R7, o que dificulta o trabalho de execução da empresa, pois necessita corriqueiramente dirimir dúvidas com a Fiscalização para só então avançar nas etapas de execução da obra, algo que a SEA/PGR, na pessoa dos engenheiros Diego Popov e Oberdan Machado deixaram claro que estarão sempre a postos a sanar tais dúvidas, não gerando risco de inexecução de etapa ou erro na execução.

Foi acordado que a empresa faria um relatório sintético com todos os problemas ainda não solucionados, para elaboração conjunta de uma matriz de risco capaz de iluminar a trilha de execução do cronograma físico e financeiro do contrato nº 15/2015, de forma a impedir em tempo hábil qualquer problema que possa ocasionar eventual paralisação da obra ou mesmo ocasionar um prejuízo, tanto para a empresa OIKOS, quanto para o MPF. O prazo convencionado pela OIKOS para entrega do relatório ficou marcado para o dia 06 de fevereiro de 2017, mas que por questões que requereram maior detalhamento para evitar ruído de informações futuras, ficou acertado com o engenheiro Rodrigo Honório e pelo Controle Interno da OIKOS na pessoa do Advogado Rodrigo, nova data para apresentação do referido relatório, qual seja, dia 17 de fevereiro de 2017, para assim delinear a matriz de risco proposta por todos, relatório este que foi entregue através do Documento PE 006/2017, juntado a folha de nº 1620 a 1647.

Verificou-se ainda que em função do exposto no Memorando nº 08/2016/ENG/MPF/PR-RR, datado de 22 de novembro de 2016, constante da folha de nº 1215 (PR-RR-00022738/2016) do PA de Fiscalização, referente ao atraso na parte física da obra no percentual de 0,25%, do qual culminou com a abertura do Processo de Apuração de Infração registrado sob o nº 1.32.000.001369/2016, a empresa OIKOS apresentou as devidas justificativas aos fatos apontados, bem como apresentou plano de correção do atraso na execução da obra com prazo para parametrizar a execução com o cronograma físico-financeiro até o mês de março de 2017 (PR 231 de Único nº pr-rr-00024469/2016, constante da folha de nº 1414), o que foi antecipadamente constatado como atendido já no fechamento da nona parcela, referente a parcial de dezembro de 2016 e ao mês de janeiro de 2017, conforme Relatório Técnico nº 09, constante das folhas de nº 1593 a 1609, que comprova o percentual acumulado do total de execução da obra em 15,81% (quinze vírgula oitenta e um por cento), sendo que conforme cronograma físico-financeiro, o percentual acumulado para o período deveria ser 15,71% (quinze vírgula setenta e um por cento). Sendo assim esvaziasse o objeto do Processo de Apuração de Infração contra a empresa OIKOS, onde será fundamentadamente solicitado o seu arquivamento com emissão de notificação para que a empresa proceda com plano de providências permanente para evitar que haja atraso na execução do contrato, bem como mantenha-se no trilho do plano de execução das parcelas previstas no cronograma físico-financeiro e ao Cronograma de Trabalho por ela elaborado (folhas de nº 1142 a 1160 do PA de

fiscalização).

A empresa R7, na pessoa do senhor Waglisthon Rocha Baltazar, apresentou resposta ao Ofício nº 10/2016/Comissão/Fiscalização/Port. PR-RR 008/2016, datado de 02 de dezembro de 2016, constante da folha de nº 1240 deste PA de Fiscalização, conforme Ofício nº 001/2017, constante das folhas de nº 1523 a 1539, que mesmo assim não atende todas as questões levantadas pela Fiscalização do Contrato nº 15/2015, mas que conforme acertado pela SEA/PGR, adotaremos de ofício as soluções cabíveis nos casos onde a resposta da empresa R7 foi insuficiente ou inexistente.

Igualmente verificados, encontram-se os dados relativos ao percentual de execução da obra, análise visual, técnica e administrativa do realizado no período de 23 de dezembro de 2016 e de 01 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017, englobando o cumprimento de obrigações contratuais vinculantes, tais como obrigações das subcontratas autorizadas (por amostragem), pagamento de pessoal, obrigações tributárias, sociais, previdenciárias e trabalhistas,

Conforme já expresso no Relatório de Fiscalização nº 6, a empresa OIKOS apresentou, através do Documento de nº PE 045/2016, constante das folhas de nº 1613 a 1616 do PA de fiscalização, o pedido de reajuste anual de valores contratuais nos termos da Cláusula 14 – item 14.6.1 do Contrato nº 15/2015, com o devido demonstrativo do impacto do índice INCC-Col.35, referente ao mês de novembro de 2016 e seus efeitos sobre o Cronograma Físico-Financeiro do contrato em hora em execução, que após ciência do Secretário Estadual, o mesmo em régio despacho, constante da folha de nº 1612, remeteu o fundamentado pedido para a Comissão de Fiscalização para análise e confirmação dos valores e índices aplicados, para fins de aprovação técnica e fundamentada para então ser elaborado o devido apostilamento com indicação clara do impacto no contrato nº 15/2015, a ter valores retroativos a ser pago conforme dotação orçamentária existente na Nota de Empenho nº 2015NE000474.

A empresa OIKOS em reunião com esta comissão no dia 01 de fevereiro de 2017, as 14 horas e trinta e cinco minutos, indagou entre outras questões (áudio constante da mídia em anexo), os prazos e datas em que os pagamentos a empresa são realizados pelo MPF, gerando incertezas no planejamento orçamentário e financeiro da mesma, motivo que para não restar dúvidas quanto aos prazos avençados no Edital da Licitação e no Contrato nº 15/2015, foi elaborado um calendário de pagamento com o detalhamento de todo o processo que culminará com o efetivo crédito bancário à empresa no exercício 2017, que fora aceito de bom grado pela mesma. O modelo fora juntado a folha de nº 1546 e encontra-se publicado no site da transparência no endereço <http://www.mpf.mp.br/rr/transparencia/nova-sede/documentos-1/pagamentos/calendario-de-pagamento/view>.

Neste sentido, conforme exposto acima, fica atestado por definitivo a execução da

nona parcela do contrato nº 15/2015, compreendido entre os dias 23 de dezembro de 2016 a 03 de fevereiro de 2017, que após analisado técnica e administrativamente, fica liberado para autorização de pagamento, a Nota Fiscal Eletrônica nº 817, no valor de R\$ 989.390,01 (novecentos e oitenta e nove reais trezentos e noventa reais e um centavo), constante da folha de nº 27 do processo de pagamento 2017 do contrato nº 15/2015.

Por fim fazem parte do presente relatório, Mídia de DVD contendo registros de 226 fotografias digitais da obra referente ao período de execução da obra entre 23 de dezembro de 2016 a 03 de fevereiro de 2017, áudio da reunião do dia 01 de fevereiro de 2017, cópia digital do presente relatório, diário de obras do sistema do MPF, relatório técnico da equipe de engenharia, medição dos serviços executados, planilha eletrônica da medição realizada, cópia da Nota Fiscal nº 817, cópia digital da relação de funcionários da empresa contratada, acompanhada das documentações comprobatórias relativas a obrigações trabalhistas, previdenciária, fiscal e social da empresa, bem como relação das empresas subcontratadas previamente informadas a esta unidade e autorizadas para execução auxiliar de atividades-meio e fim do contrato e relatório da empresa OIKOS detalhando a execução física do período.

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
1.DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA.....	10
2. DADOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO DO PERÍODO.....	11
3. CONSTATAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PERÍODO.....	12
4. CONSTATAÇÕES TÉCNICAS DO PERÍODO.....	12
5. PRAZOS E CUSTOS.....	13
6. ANÁLISE DAS SUBCONTRATAÇÕES AUTORIZADAS.....	13
7. REGULARIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.....	14
8. CONCLUSÃO.....	17
9. ANEXOS.....	18
ANEXO I.....	19
RELATÓRIO DA EMPRESA OIKOS.....	19
EXECUÇÃO FÍSICA DO PERÍODO.....	19
ANEXO II.....	28
DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA.....	28

RELATÓRIO DA NONA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2015

1.DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

DADOS ATUALIZADOS DO CONTRATO

Nº Contrato: 15/2015

PPA/LOA: AÇÃO 110E

Empresa Contratada: OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 81.051.666/0001-70

Matrícula CEI da Obra: 51.235.89823/71

Valor original do Contrato: 33.398.124,45 (trinta e três milhões trezentos e noventa e oito mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Valor Atual do Contrato: R\$ 33.500.806,35 (trinta e três milhões quinhentos mil, oitocentos e seis reais e setenta e um centavos).

Saldo de Empenho: 2015NE000474 = R\$ 3.839.760,24 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).

Local/UF: Boa Vista – RR

Responsável Técnico: Gilson Kaminski – ART de Execução: RR20160017356

Corresponsáveis Técnicos: Rodrigo Honório – ART de Corresponsabilidade na Execução: RR20160025495 e Willian Peniche Martins – ART de Corresponsabilidade na Execução: RR20160025821.

Nota Fiscal Eletrônica de Referência: 817 no valor de R\$ 989.390,01 (novecentos e oitenta e nove mil trezentos e noventa reais e um centavos) – Emitida pela Prefeitura de Curitiba – PR (Retenções de ISS a ser feita para o Município de Boa Vista-RR nos termos da Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003 – Demais retenções conforme legislação vigente e Retenção de INSS não aplicável conforme MS nº 5057541-782015.4.04.7000/PR (MS Originário nº 99.00.10941-4/PR) impetrada pela SINDUSCON-PR – Cópia do Ofício nº 700002858009 da 2ª Vara Federal de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, co validade até 16 de janeiro de 2017, com validade até 16 de fevereiro de 2017, juntado à folha de nº 32 do PA de pagamento 2017.

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,61	2,41	0,61	2,41
2	1,21	2,69	1,81	5,1
3	1,55	0,95	3,36	6,05
4	1,61	1,12	4,98	7,17
5	2,33	0,59	7,30	7,76
6	1,82	1,10	9,12	8,86
7	2,57	2,38	11,69	11,22
8	2,40	1,63	14,09	12,87
9	1,66	2,96	15,71	15,81
TOTAL EXECUTADO				15,81%
TOTAL A EXECUTAR				84,19%

Identificação do Processo de Pagamento 2016: 1.32.000.000726/2016-59

Identificação do Processo de Pagamento 2017: 1.32.000.000189/2017-28

Identificação do Processo de Fiscalização: 1.32.000.000051/2016-48

Identificação do Processo de Contratação: 1.32.000.000601/2015-48

Tipo de obra: Prédio Público.

Objeto da fiscalização: Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.


2. DADOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO DO PERÍODO

A nona medição foi efetuada pelos fiscais da obra e Engenheiros Civis da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Tammy Nabilla Sousa Cruz, matrícula 26169, Jardel Pereira de Lira, matrícula 23815, acompanhada pela perita Kerry Aline da Silva Ferreira, matrícula 26108, acompanhados dos engenheiros da SEA/PGR, senhores Diego Popov e Oberdan Machado no dia 03/02/2017.

Não foram executados os serviços além do previsto no cronograma físico-financeiro alterado conforme Aditivo nº 01/2016. Tendo em vista que conforme planilha de medição a quantidade de serviços planejados no projeto já com aditivo de seu cronograma, para o nono mês de obra, era de 1,66% (um vírgula sessenta e seis por cento), mas que conforme medição, verificou-se o percentual de 2,96% (dois vírgula noventa e seis por cento) para o período, algo bom, que inclusive sana o objeto do Processo de Apuração de Penalidade nº 1.32.000.001369/2016, mas absolutamente preocupante, tendo em vista que hoje temos em caixa o montante de R\$ 3.839.760,24 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) e a execução prevista para 2017 corresponde a R\$ 5.820.153,80 (cinco milhões oitocentos e vinte mil cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos), isso sem contar o percentual de reajuste INCC de 5,84% sobre o saldo remanescente do contrato e sem o valor a ser pago de retroativo dos meses de novembro (parcial) e dezembro de 2016 e janeiro e fevereiro de 2017 (parcial), que juntos ensejarão uma redução significativa do empenho 2015NE000474, que apesar de termos volume de recursos incluídos na LOA/2017 com previsão de Créditos de Emenda parlamentar de aproximadamente R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), ainda assim é necessário nesse momento não haver mais concessão de adiantamento de qualquer etapa do projeto.

Juntou-se às folhas de nº 1593 a 1609 do PA de Fiscalização e anexo a este relatório, o Relatório Técnico nº 9, contendo planilha resumos dos serviços realizados no período de 23 de dezembro de 2016 a 03 de fevereiro de 2017 pela empresa OIKOS.

Segue abaixo, o gráfico de acompanhamento da execução financeira do Contrato nº 15/2015 no corrente exercício:

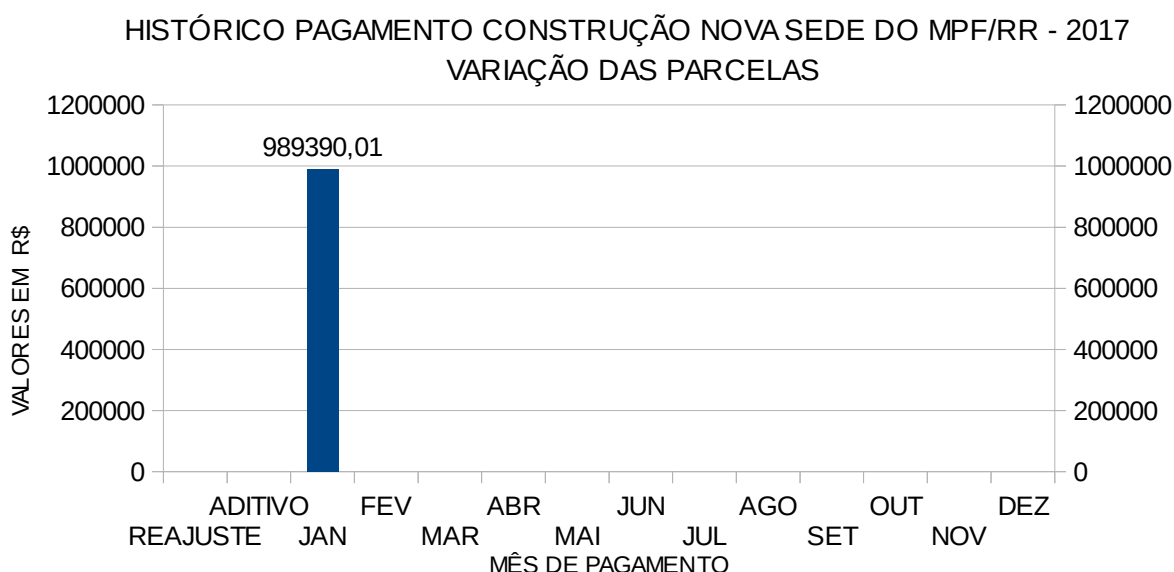

Saldo atualizado já considerando o pagamento da parcela nº 9 da obra.

Saldo Remanescente Para Execução	R\$ 28.213.858,48
Saldo executado	R\$ 5.286.947,87
Saldo Orçamentário*	R\$ 3.839.760,24

*Saldo orçamentário para pagar o reajuste retroativo de novembro (parcial) e dezembro de 2016 + parcelas remanescentes de 2017.

3. CONSTATAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: Em fiscalização no canteiro de obra, após a resposta a Notificação de nº 09/2016, a fiscalização em conferência a resposta da empresa, feita através do Documento PE 231/2016 (Único PR-RR-00024469/2016), constante da folha de nº 1413 do PA de Fiscalização, constatou a existência de escada utilizada para acesso de materiais e pessoas aos pisos 2 e 3, estando esta totalmente em desacordo com a Norma Regulamentadora nº 18 (NR 18), pondo em risco a vida dos trabalhadores da obra e a vida dos engenheiros do MPF, motivo que ensejou a Notificação nº 01/2017 (Único PR-RR-00000027/2017), constante da folha de nº 1425, onde a empresa com celeridade atendimento realizou a adequação e apresentou resposta através do Documento PE-327 de 10 de janeiro de 2017 (Único nº PR-RR-00000157/2017), constante da folha de nº 1429 e 1430, que fora conferida *in loco* pela fiscalização e dada por sanado o problema.

Constatação do Período nº 2: As constatações levantadas nas medições 7 e 8 que ensejaram a Notificação de nº 2/2017 (PR-RR-00000037/2017), constante das folhas de nº 1426 e 1427, foram respondidas integralmente através do Documento PE-328 de 13 de janeiro de 2017, constante das folhas de nº 1431 a 1522 (Único PR-RR-00000156/2017).

4. CONSTATAÇÕES TÉCNICAS DO PERÍODO

Constatações descritas e resumidas na apresentação do presente relatório.

Houve necessidade de alterações no cronograma físico-financeiro?	() Sim	(X) Não	() N.A
Houve encaminhamento ou autorização da necessidade de alterações do cronograma físico-financeiro?	() Sim	() Não	(X) N.A
Houve alterações do cronograma físico-financeiro com necessidade de aditivo?	() Sim	() Não	(X) N.A
Houve alterações do cronograma físico-financeiro sem necessidade de aditivos?	() Sim	() Não	(X) N.A
Houve necessidade de alterações de projeto?	() Sim	(X) Não	() N.A

Houve encaminhamento da necessidade de alterações de projeto à SEA? () Sim () Não (X) N.A

Quais Projetos foram ou precisam ser alterados? () Estrutural () Elétrica () Hidráulica () Combate a incêndio () Outro/Especificar

Houve solicitação de aditivos ao contrato? () Sim (X) Não () N.A

Houve impacto financeiro no contrato? () Sim () Não (X) N.A

5. PRAZOS E CUSTOS

PRAZOS LEGAIS		
Data de início do Contrato:	21 de dezembro de 2015	
Data da Ordem de Serviço:	18 de abril de 2016 com autorização para os serviços de engenharia a partir de 09 de maio de 2016.	
Comunicação de início da obra a SMOU	Ofício nº 13/2016/CA de 15/4/2016 (Único PRRR00007371/2016 e Ofício nº 17/2016/CA de 03 de junho de 2016.	
Data prevista para conclusão da Obra:	30 de setembro de 2019	
Vigência de Execução Contrato:	42 meses	Prazo restante: 33 Meses
Vigência do Contrato:	48 Meses	Prazo restante: 35 Meses
Vigência da licença ambiental:	24 Meses	Vigente até 12 de abril de 2018
Vigência do Alvará de Construção:	12 Meses	Vigente até 02 de junho de 2017
Garantia Contratual:	1551 dias	Vigência de 21/12/2015 até 20/3/2020.
Ciclo de Medição:	Mês	Todo dia 1º de cada mês – Excepcionalmente a nona parcela foi realizada dia 03/2/2017.

6. ANÁLISE DAS SUBCONTRATAÇÕES AUTORIZADAS

De acordo com o estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato nº 15/2015, verificou-se detalhadamente os objetos, contratos e questões relativas a regularidade fiscal e previdenciária de cada um dos serviços subcontratados pela OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA, sendo estas empresas as seguintes:

Empresa	Nome	Nº Funcionários	CNPJ/CPF	Objeto	UF	ART
1	Geo Strauss Engenharia de Fundações da Amazônia LTDA	4	09140647000193	Escavação e Estaca	AM	RR20160018323
2	R.E. Castro Ávila e Cia Ltda	2	09543926000106	Topografia	RR	N.A
3	Mix Construções Eireli-EPP	21	23530933000196	Retro com Operad.	RR	RR20160019137
4	Mix Construções Eireli-EPP		23530933000196	Mão de obra civil Tapume	RR	N.A
5	Mix Construções Eireli-EPP		23530933000196	Mão de Obras e Serviços	RR	RR20160019134
6	Construtec Engenharia	2	17481655000121	Análise de Amostra	RR	N.A
7	Amazônia Concreto Ltda	N.A	08938592000107	Concreto	RR	N.A
8	Vigiar Serv. de Vigia e Port. Ltda	3	19890139000186	Vigilância Desarmada 12x36	RR	N.A
9	Geonort Fundações Ltda	N.A	22903246000106	Prova de Carga	PA	PA20160163397

N. D – Não Declarado / N. A – Não se Aplica

Empresa	Situação Regular (marque apenas um X)					Nº do contrato	Vigência do contrato até	Valor contratado (R\$)
	Regularidade fiscal	Regularidade FGTS	Regularidade INSS	Regularidade CNDT	Salários pagos*			
1	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	0201-04/2016	N.A - Encerrado	166.961,50
2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.A	0200-02/16	N. A	24.000,00
3	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	0201-06/2016	N. A – Encerrado	17.000,00
4	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	0201-01/2016	N. A – Encerrado	50.026,80
5	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	0201-07/2016	N. A – Encerrado	1.018.951,33
6	X	X	N.D	X	N.A	021 008/2016	N. A	9.600,00
7	X	X	X	X	N.A	N. A - **	N. A	760.230,80
8	N.D	N.D	N.D	N.D	X	0201-14/2016	31/01/2017	38.940,00
9	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	Encerrado	N. D	N. A	N. D
Total de Subcontratação								R\$ 2.085.710,43

*Verificação por amostragem dos salários e benefícios pagos conforme legislação trabalhista e ACT/CCT vigente / N. A – Não se Aplica / N. D – Não Declarado / N.V – Não Verificado.

**Ordem de Compra: 00332. (Não foi apresentado pela Fiscalização Técnica, o registro de Corpo de Provas do Concreto entregue na obra dos dias 17 a 31 do mês de dezembro de 2016 e 01 a 31 de janeiro e 01 a 02 de fevereiro de 2017, que será solicitado aos engenheiros fiscais e incluso no relatório do mês de março de 2017).

CONSTATAÇÕES

Não houve nenhuma constatação no período.

7. REGULARIDADE DA EMPRESA CONTRATADA

CHECK LIST DE FUNCIONÁRIOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS							
Ord.	Funcionário	Cargo	CTPS	Exame Admis.	CBO	Acordo Coletivo	EPI
1	Adriano Pinto Vieira	Servente	10182230020	OK	717020	OK	N.D
2	Adeilson Moura Silva	Servente	32194-00001		717020	OK	N.D
3	Alessandro de Souza Vieira	Servente	97685310040	OK	717020	OK	N.D
4	Alex Marques da Silva	Técnico Seg. Trabalho	1794931/0040	OK	351605	OK	OK
-	Antônio Campelo	Servente	31976000041	OK	717020	OK	OK
5	Antônio Francisco Paiares	Carpinteiro			715505	OK	
-	Antônio Leones Cardosos da Silva	Carpinteiro	07714400040	OK	715505	OK	OK
6	Antônio Pereira de Souza	Carpinteiro			715505	OK	
7	Antônio Sandro da Conceição Silva	Carpinteiro	78677/00040	OK	715505	OK	OK
8	Antônio Silvestre Alves Souza	Carpinteiro	442888-002-R	N.D	715505	OK	N.D
9	Antônio de Sousa dos Santos	Servente	2956266-0040	N.D	717020	OK	N.D
10	Antônio Wagner Lopes da Silva	Porteiro	73721130030	OK	517405	OK	OK
11	Benedito Costa da Silva Júnior	Almoxarife	2634575-0001	N.D	414105	OK	N.D
12	Clenilson Marques Muniz	Armador	42904650030	OK	715305	OK	N.D
13	Dayse Nayara Gonçalves Dias	Tec. Segurança	26541170001	OK	351605	OK	OK
14	Diego Martins Tenório do Amaral	Assistente Adm. Obra	32712/00059	OK	411010	OK	OK
15	Domicio Dantas Barbosa	Pedreiro	125880405	OK	715210	OK	N.D
16	Domingos Pereira de Souza	Pedreiro	1520341003-0-RR	OK	715210	OK	OK
17	Edmilson de Souza Ferreira	Servente			717020	OK	
18	Everton Lopes dos Santos	Carpinteiro	2308316-003	N.D	715505	OK	N.D
19	Fabiano Bruno Silveira da Silva	Servente	3907971-0040	N.D	717020	OK	N.D
-	Flávio de Lima Dias	Servente	93473430030	OK	717020	OK	OK
20	Francisco das Chagas da Silva	Servente	N.D	N.D	717020	OK	N.D
-	Francisco das Chagas Silva	Carpinteiro	0180340001	OK	715505	OK	OK
21	Francisco do Monte Alexandre	Pedreiro	3082200001-RR	OK	715210	OK	OK
22	Francisco Ferreira Gomes Filho	Eletricista	260939400100	OK	715605	OK	N.D
23	Francisco Wagner Araújo Santos	Servente			717020	OK	N.D
-	Francisco Otávio da S. Velho	Eng. Civil	93751111	OK	214215	OK	OK
24	Geraldo Gonçalves Santos da Silva	Carpinteiro	2483128-0040	N.D	715505	OK	N.D
25	Gerson Conceição da Costa	Armador	0270372003-0-RR	OK	715305	OK	OK

26	Gildean Alves Gonçalves	Servente	26397690010	OK	717020	OK	OK
27	Izan Fernandes de Souza Silva	Servente	62589340030	OK	717020	OK	N.D
28	Janiomar Wagner Araujo	Servente			717020		
-	Jeová Nunes Moraes	Servente	48871360030	OK	717020	OK	N.D
29	João Gonçalves da Silva	Mestre de Obras	26830615	OK	710205	OK	OK
30	João Ricardo Medeiros Filho	Assistente de Engenharia	867796600030	OK	312105	OK	OK
31	Joel Pereira de Matos	Servente	8156410030-PI	OK	717020	OK	OK
32	Jorge Luis Silva Pereira	Servente	7833800001-MA	OK	717020	OK	OK
33	José Dilson Rodrigues de Souza	Armador	2178000002	OK	715305	OK	OK
34	Lucas Abreu de Lima	Carpinteiro	200830001	OK	715505	OK	OK
35	Luiz Gonzaga da Silva	Servente	73707560030	OK	717020	OK	N.D
36	Manoel Donald Brito	Carpinteiro	93513020030	OK	715505	OK	OK
37	Manoel Rodrigues de Souza	Carpinteiro	24818450040	OK	715505	OK	OK
38	Marcelo Alves Magalhães	Servente	26066980010	OK	717020	OK	N.D
-	Marcelo dos Santos Cardoso	Servente	2499377001	OK	717020	OK	OK
-	Márcio Raposo	Servente	2654460001	OK	717020	OK	OK
39	Maria Moraes Costa	Ass. Adm. Obras	2178144002	OK	411010	OK	OK
40	Marlon Ferreira Mesquita	Carpinteiro	06013300001	OK	715505	OK	N.D
-	Paulo Roberto da Silva	Carpinteiro	0813849002	OK	715505	OK	OK
-	Paulo Roberto da Silva Freitas	Almoxarife	97676850040	OK	414105	OK	OK
41	Raimundo Lima Guimarães	Carpinteiro			715505	OK	N.D
42	Regivan da Silva Reis	Pedreiro	3447064-002	OK	715210	OK	N.D
43	Roberto Carlos Moreira de Lima	Carpinteiro	30813100030	OK	715505	OK	N.D
44	Rodrigo Honório	Eng. Civil	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
45	Sivaldo da Costa Pereira	Servente	05513220050	OK	717020	OK	OK
46	Sócrates da Silva Peixoto	Armador	18918800050	OK	715305	OK	OK
47	Solivando Ferreira da Conceição	Carpinteiro	35328080040	OK	715505	OK	OK
48	Timóteo de Souza Figueiredo	Servente	2956106-0040	N.D	717020	OK	N.D
49	Willian Peniche Martins	Tec. Eng. Civil	06542600255	OK	214280	OK	OK
50	Valdenir Mota dos Santos	Servente	4901406-002	N.D	717020	OK	N.D

N.A – Não Aplicável / N.D – Não Declarado

SALÁRIOS – VALE ALIMENTAÇÃO – VALE TRANSPORTE				
Ord	Nome	Salário pago até o 5º dia útil	Vale-alimentação	Vale transp.
1	Adriano Pinto Vieira ☺	OK	OK	N.O
2	Adeilson Moura Silva ☺	OK	OK	N.D
3	Alessandro de Souza Vieira ☺	OK	OK	N.O
4	Alex Marques da Silva	OK	OK	N.O
-	Antônio Campelo			
5	Antônio Francisco Paiares	OK	OK	N.D
-	Antônio Leones Cardosos da Silva			
6	Antônio Pereira de Souza	OK	OK	N.D
7	Antônio Sandro da Conceição Silva	OK	OK	N.O
8	Antônio Silvestre Alves Souza	OK	OK	N.D
9	Antônio de Sousa dos Santos	OK	OK	N.D
10	Antônio Wagner Lopes da Silva	OK	OK	N.O
11	Benedito Costa da Silva Júnior	OK	OK	N.O
12	Clenilson Marques Muniz	OK	OK	N.O
13	Dayse Nayara Gonçalves Dias	OK	OK	N.O
14	Diego Martins Tenório do Amaral	OK	OK	N.O
15	Domicio Dantas Barbosa	OK	OK	N.O
16	Domingos Pereira de Souza	OK	OK	N.O
17	Edmilson de Souza Ferreira	OK	OK	N.O
18	Everton Lopes dos Santos	OK	OK	N.O
19	Fabiano Bruno Silveira da Silva	OK	OK	N.O
-	Flávio de Lima Dias			
20	Francisco das Chagas da Silva	OK	OK	N.D
-	Francisco das Chagas Silva			

21	Francisco do Monte Alexandre	OK	OK	N.O
22	Francisco Ferreira Gomes Filho	OK	OK	N.O
23	Francisco Wagner Araújo Santos	OK	OK	N.D
-	Francisco Otávio da S. Velho			
24	Geraldo Gonçalves Santos da Silva	OK	OK	N.D
25	Gerson Conceição da Costa	OK	OK	N.O
26	Gildean Alves Gonçalves	OK	OK	N.O
27	Izan Fernandes de Souza Silva	OK	OK	N.O
28	Janiomar Wagner Araujo	OK	OK	N.D
-	Jeová Nunes Moraes			
29	João Gonçalves da Silva	OK	OK	N.O
30	João Ricardo Medeiros Filho	OK	OK	N.O
31	Joel Pereira de Matos	OK	OK	N.O
32	Jorge Luis Silva Pereira	OK	OK	N.O
33	José Dilson Rodrigues de Souza	OK	OK	N.O
34	Lucas Abreu de Lima	OK	OK	N.O
35	Luiz Gonzaga da Silva	OK	OK	N.D
36	Manoel Donald Brito	OK	OK	N.O
37	Manoel Rodrigues de Souza	OK	OK	N.O
38	Marcelo Alves Magalhães	OK	OK	N.O
-	Marcelo dos Santos Cardoso			
-	Márcio Raposo			
39	Maria Moraes Costa	OK	OK	N.O
40	Marlon Ferreira Mesquita	OK	OK	N.D
-	Paulo Roberto da Silva			
-	Paulo Roberto da Silva Freitas			
41	Raimundo Lima Guimarães	OK	OK	N.D
42	Regivan da Silva Reis	OK	OK	N.D
43	Roberto Carlos Moreira de Lima	OK	OK	N.O
44	Rodrigo Honório	OK	OK	N.O
45	Sivaldo da Costa Pereira	OK	OK	N.O
46	Sócrates da Silva Peixoto	OK	OK	N.O
47	Solivando Ferreira da Conceição	OK	OK	N.O
48	Timóteo de Souza Figueiredo	OK	OK	N.D
49	Willian Peniche Martins	OK	OK	OK
50	Valdenir Mota dos Santos	OK	OK	N.D

N.O – Não Optante / N.D – Não Declarado

DATA DE ADMISSÃO E DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTROLE TRABALHISTA			
Ord	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão
1	Adriano Pinto Vieira ☺	08 de novembro de 2016	-
2	Adeilson Moura Silva ☺	06 de dezembro de 2016	-
3	Alessandro de Souza Vieira ☺	08 de novembro de 2016	-
4	Alex Marques da Silva ☺	16 de janeiro de 2016	-
-	Antônio Campele	26 de outubro de 2016	23 de novembro de 2016
5	Antônio Francisco Paires ☺	12 de dezembro de 2016	-
-	Antônio Leones Cardosos da Silva	10 de outubro de 2016	15 de dezembro de 2016
6	Antônio Pereira de Souza ☺	04 de janeiro de 2017	
7	Antônio Sandro da Conceição Silva ☺	24 de janeiro de 2017	-
8	Antônio Silvestre Alves Souza ☺	01 de dezembro de 2016	-
9	Antônio de Sousa dos Santos ☺	01 de dezembro de 2016	-
10	Antônio Wagner Lopes da Silva ☺	01 de junho de 2016	-
11	Benedito Costa da Silva Júnior ☺	19 de dezembro de 2016	-
12	Clenilson Marques Muniz ☺	10 de novembro de 2016	-
13	Dayse Nayara Gonçalves Dias ☺	09 de maio de 2016	-
14	Diego Martins Tenório do Amaral ☺	23 de janeiro de 2016	
15	Domicio Dantas Barbosa ☺	11 de novembro de 2016	-
16	Domingos Pereira de Souza ☺	26 de outubro de 2016	-
17	Edmilson de Souza Ferreira ☺	05 de janeiro de 2017	-
18	Everton Lopes dos Santos ☺	07 de dezembro de 2016	-
19	Fabiano Bruno Silveira da Silva ☺	02 de dezembro de 2016	-
-	Flávio de Lima Dias	10 de outubro de 2016	16 de dezembro de 2016
20	Francisco das Chagas da Silva ☺	24 de novembro de 2016	
-	Francisco das Chagas Silva	10 de outubro de 2016	15 de dezembro de 2016

21	Francisco do Monte Alexandre ☺	29 de outubro de 2016	-
22	Francisco Ferreira Gomes Filho ☺	10 de outubro de 2016	-
23	Francisco Wagner Araújo ☺	05 de janeiro de 2017	-
-	Francisco Otávio da S. Velho	05 de dezembro de 2014	Novembro de 2016
24	Geraldo Gonçalves Santos da Silva ☺	12 de dezembro de 2016	-
25	Gerson Conceição da Costa ☺	21 de outubro de 2016	-
26	Gildean Alves Gonçalves ☺	25 de outubro de 2016	28 de outubro de 2016
27	Izan Fernandes de Souza Silva ☺	07 de novembro de 2016	-
28	Janiomar Wagner Araújo ☺	05 de janeiro de 2016	-
-	Jeová Nunes Moraes	03 de novembro de 2016	09 de janeiro de 2017
29	João Gonçalves da Silva ☺	16 de maio de 2016	-
30	João Ricardo Medeiros Filho ☺	01 de junho de 2016	-
31	Joel Pereira de Matos ☺	21 de outubro de 2016	-
32	Jorge Luis Silva Pereira ☺	19 de outubro de 2016	-
33	José Dilson Rodrigues de Souza ☺	10 de outubro de 2016	-
34	Lucas Abreu de Lima ☺	10 de outubro de 2016	-
35	Luiz Gonzaga da Silva ☺	03 de novembro de 2016	-
36	Manoel Donaldto Brito ☺	10 de outubro de 2016	-
37	Manoel Rodrigues de Souza ☺	10 de outubro de 2016	-
38	Marcelo Alves Magalhães ☺	07 de novembro de 2016	-
39	Marcelo dos Santos Cardoso	09 de maio de 2016	30 de novembro de 2016
-	Márcio Raposo	09 de maio de 2016	30 de novembro de 2016
-	Maria Moraes Costa ☺	18 de abril de 2016	-
40	Marlon Ferreira Mesquita	04 de novembro de 2016	-
41	Paulo Roberto da Silva	10 de outubro de 2016	05 de dezembro de 2016
-	Paulo Roberto da Silva Freitas	23 de maio de 2016	17 de janeiro de 2017
-	Raimundo Lima Guimarães ☺	04 de janeiro de 2017	-
42	Regivan da Silva Reis ☺	09 de dezembro de 2016	-
43	Roberto Carlos Moreira de Lima ☺	04 de novembro de 2016	-
44	Rodrigo Honório ☺	01 de dezembro de 2016	-
45	Sivaldo da Costa Pereira ☺	10 de outubro de 2016	-
46	Sócrates da Silva Peixoto ☺	10 de outubro de 2016	-
47	Solivando Ferreira da Conceição ☺	10 de outubro de 2016	-
48	Timóteo de Souza Figueiredo ☺	15 de dezembro de 2016	-
49	Willian Peniche Martins ☺	02 de janeiro de 2016	-
50	Valdenir Mota dos Santos ☺	09 de dezembro de 2016	-

N. D – Não Declarado

REGULARIDADE FISCAL – INSS – FGTS – CNDT			
Certidão	Regular	Irregular	Validade
Municipal	X		16/03/2017
Estadual	X		16/03/2017
Federal	X		23/04/2017
FGTS	X		19/02/2017
INSS	X		23/04/2017
CNDT	X		24/07/2017

Verificações realizadas de acordo com o Roteiro Simplificado para Acompanhamento de Contratos Administrativos – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Revisada e Atualizada – MPF/PR-RR/Ano 2016.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA OBRA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CREA E SEA/MPF	
Nome	Faltas durante o Período – 4 semanas
Gilson Kaminski	1

CONSTATAÇÕES

Constatação nº 1: Foi constatado divergência no número de empregados da empresa, da qual em sua lista, consta 45 trabalhadores, sendo que fora apresentado documentação para 50, o que será verificado em razão de eventual rescisão contratual não repassada ao MPF.

8. CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente no Diário de Obras Eletrônico, nas fiscalizações de campo, análise documental, não há nenhuma situação impeditiva de pagamento.

9. ANEXOS

Estão anexos ao presente relatório:

- a) Mídia digital contendo toda a documentação descrita neste relatório.
- b) Relatório Técnico da Assessoria de Engenharia da PR-RR – Membros permanentes da Comissão de Supervisão e Fiscalização do Contrato nº 15/2015.

LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 17 de fevereiro de 2017

Declaramos que as metas estabelecidas na 9º (nona) etapa do contrato definida no Cronograma Físico-Financeiro foram atendidas com ressalva, mas sem nenhum fato impeditivo para pagamento da NF nº 817.

Jardel Pereira de Lira
Engenheiro Civil/Presidente Substituto
da Comissão

Tammy Nabilla Sousa Cruz
Engenheira Civil/Membro da Comissão

Robson Guimarães Costa
Presidente da Comissão

Joel de Oliveira Melo
Membro da Comissão

Francisco das Chagas Alves
Membro da Comissão

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.

PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL

() Não foram identificados vícios.

() Ver Nota Técnica ou Despacho constante da folha de nº. _____

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.

Assinado com login e senha por ROBSON GUIMARAES COSTA, em 20/02/2017 11:24. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento> - CHAVE: B34ADDE8.765703C8.BDEA0FFC.E350C182

ANEXO I

RELATÓRIO DA EMPRESA OIKOS EXECUÇÃO FÍSICA DO PERÍODO

RELATÓRIO 9º MEDIÇÃO

Projeto: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MP/RR

Data: 31/01/2017

Elaboração: Oikos Construções

INTRODUÇÃO

Este relatório se refere ao trabalho de **CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**.

A empresa **OIKOS construções Ltda-EPP**, vem por meio deste apresentar o **Relatório de Atividades Nº 01** referente aos trabalhos desenvolvidos de **01 a 31 de Janeiro de 2017, 9º medição**.

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONSTRUTORA

1	CANTEIRO DE OBRAS	U.M
01.02	EQUIPAMENTOS E ANDAIMES	
01.02.01	ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE DE CARGAS	%
01.02.02	MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA	UN
01.03	ALOJAMENTOS, TAPUMES E PROTEÇÕES	
01.03.04	ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2
2	EDIFÍCIO SEDE	
02.06	INFRAESTRUTURA	
02.06.03	CONCRETO	
02.06.03.001	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN
02.07	SUPERESTRUTURA	
02.07.01	FORMAS	
02.07.01.001	ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO, COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM	M2
02.07.01.002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2
02.07.02	ARMADURAS	
02.07.02.001	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
02.07.02.002	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
02.07.02.003	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
02.07.03	CONCRETO	
02.07.03.001	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN
02.07.03.002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3
02.07.03.003	LAJE NERVURADA COM FORMA DE POLIPROPILENO COM CAPA DE CONCRETO COM 30 MPA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, ESPESSURA DA LAJE 40 CM, DIMENSÕES DA FORMA DE POLIPROPILENO 32,5 X 112,5 X 52,5 CM, CAPEAMENTO 7,5 CM	M2
02.08	PAREDES E PAINÉIS	
02.08.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	
02.08.01.004	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 9CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA, JUNTAS 12MM	M2
02.08.02	JUNTAS DE DILATAÇÃO	
02.08.02.001	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2
02.08.04	VERGAS	
02.08.04.001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M
02.14	PISOS	


02.14.05	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M2
02.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
02.16.03	S.P.D.A. / ATERRAMENTO	
02.16.03.001	REBAR - BARRA DE AÇO REDONDA GALVANIZADA LISA, DIÂMETRO 3/8" (10MM) COM CLIPS PARA TRESPASSE DE 20CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
3	CASA DE MÁQUINAS	
03.03	REATERRO Blocos/Baldrame	
03.03.01	REATERRO MANUAL	M3
03.04	INFRAESTRUTURA	
03.04.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2
03.04.02	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 500 MM	M
03.04.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
03.04.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3
03.04.06	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
03.04.07	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
03.06	PAREDES E PAINÉIS	
03.06.01	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2
03.09	IMPERMEABILIZAÇÕES	
03.09.01	LASTRO DE BRITA GRADUADA ESP. 10CM	M3
8	COBERTURADE VEÍCULOS E PASSARELAS	
8.01	INFRAESTRUTURA	
08.01.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2
08.01.02	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3
08.01.03	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
08.01.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3
08.01.05	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG
21 – Fixo	ADMINISTRAÇÃO	
21.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
01.04.01	INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	%
01.04.02	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%
01.04.03	PROJETOS AS BUILT (TODAS AS DISCIPLINAS)	M2

01.04.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%
01.04.05	TAXAS E EMOLUMENTOS	CJ
01.04.06	CÓPIAS REPROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN
01.04.07	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M3

2. PRINCIPAIS ITENS MEDIDOS

- **PILARES EDIFÍCIO SEDE.**
- **PAVIMENTO 3.**

Total de pilares executados: 82 pilares

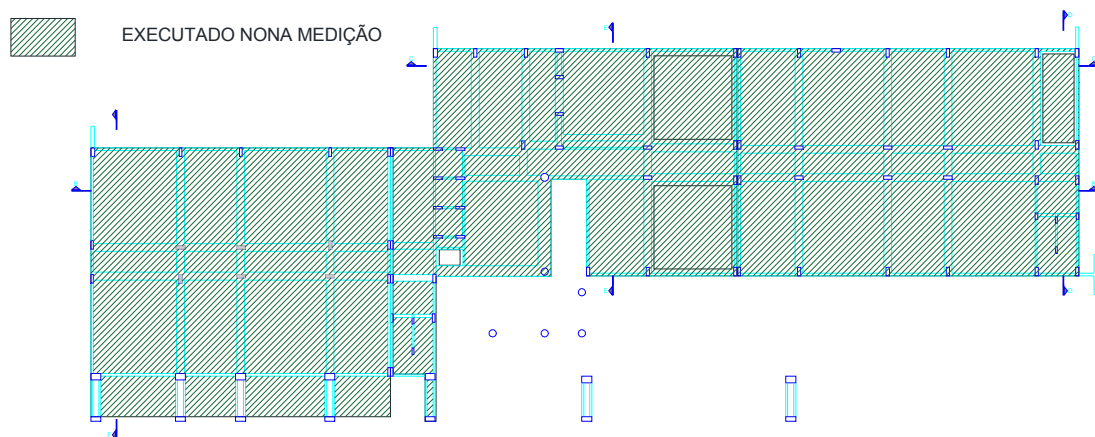

FORMA PAV. 3

Figura 01: Pilares executados no mês de Janeiro.

- **PILARES EDIFÍCIO SEDE PAVIMENTO 1 SETOR B.**

Total de pilares executados: 01 pilares

- **LAJES EDIFÍCIO SEDE**
- **LAJE PAVIMENTO 3 SETOR A.**

Área: 401 m²

- **LAJE PAVIMENTO 3 SETOR B.**

Área: 428,27 m²

- **LAJE PAVIMENTO 3 SETOR C.**

Área: 441 m²

- **LAJE EM BALANÇO PAVIMENTO 1 SETOR B.**

Área: 60 m²

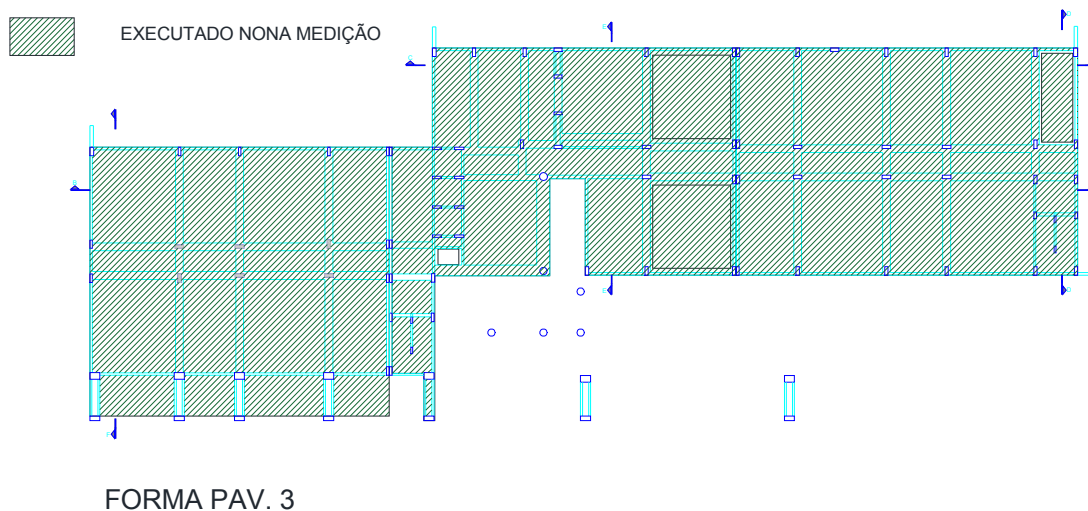


Figura 02: Lajes tipo cubeta executados no mês de Janeiro.

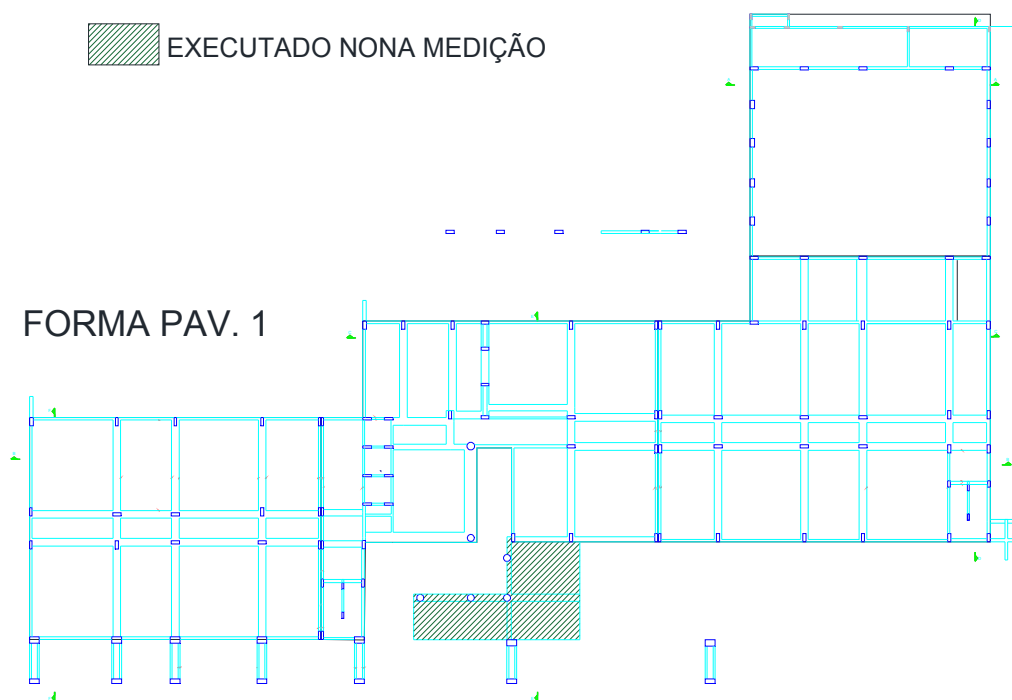


Figura 03: Laje maciça executada no mês de Janeiro.

- **VIGAS BALDRAME CASA DE MÁQUINAS**

A figura abaixo mostra as vigas executadas no mês de janeiro.

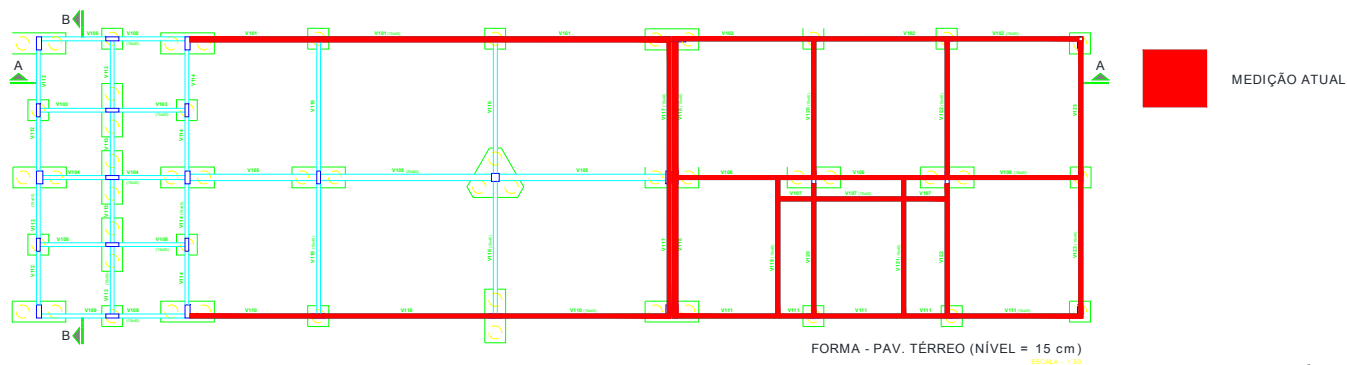


Figura 04: Vigas baldrame executadas no mês de Janeiro.

- **ALVENARIA EDIFÍCIO SEDE**
- **ALVENARIA PAVIMENTO TÉRREO SETOR B:**

Total executado: 256,16 m²

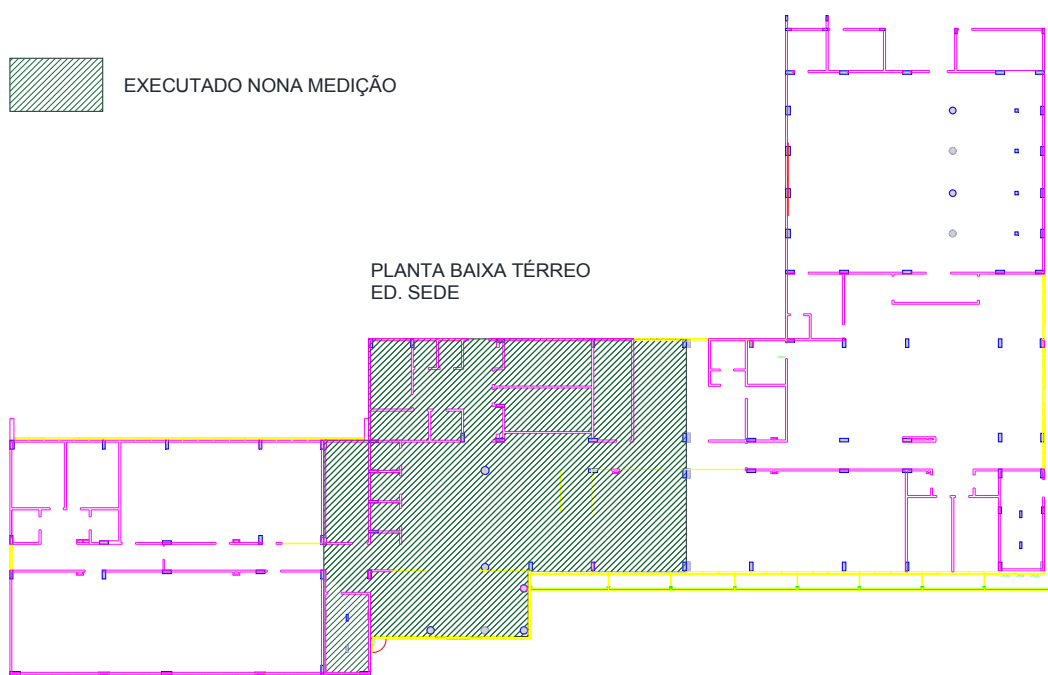


Figura 05: Alvenaria executada pavimento térreo setor B.

- **ALVENARIA EDIFÍCIO PAVIMENTO 1 SETOR A.**

Total executado: 467,86 m²

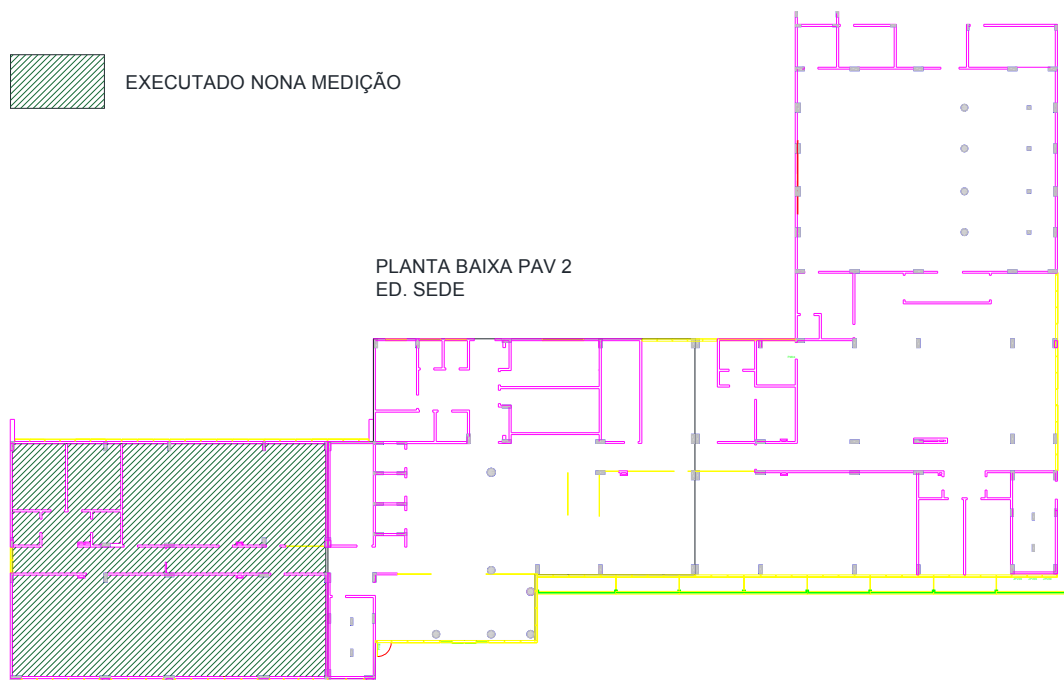


Figura 06: Alvenaria executada do pavimento 1 setor A.

- **BLOCOS COBERTURA DOS ESTACIONAMENTOS**

- **COBERTURA E2:**

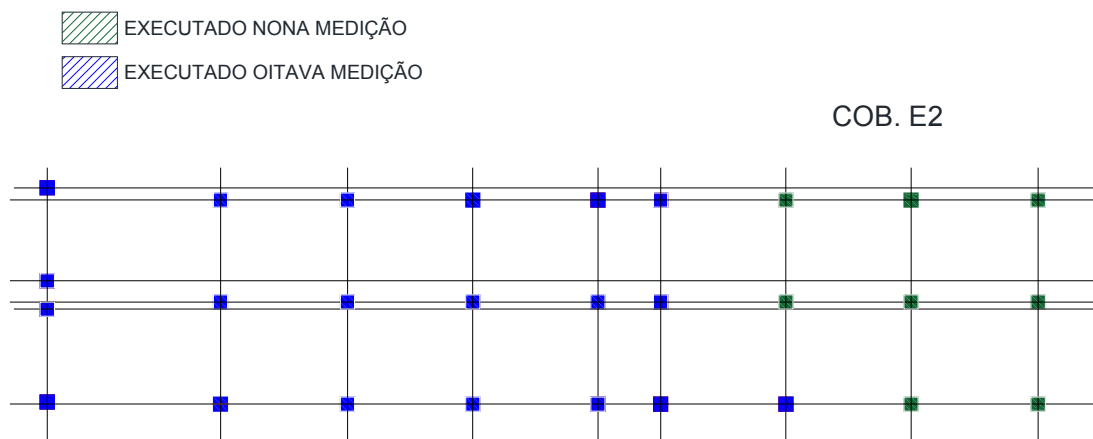


Figura 07: Blocos da Cobertura do Estacionamento E2.

- **COBERTURA E4-E6:**

 EXECUTADO NONA MEDIÇÃO

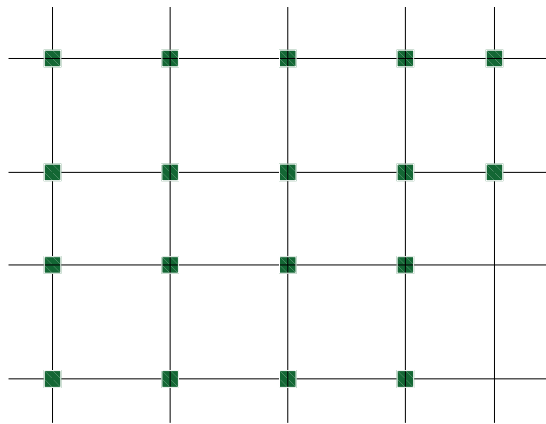


Figura 08: Blocos da Cobertura do Estacionamento E4-E6.

- **COBERTURA E3:**

 EXECUTADO NONA MEDIÇÃO

COB E3

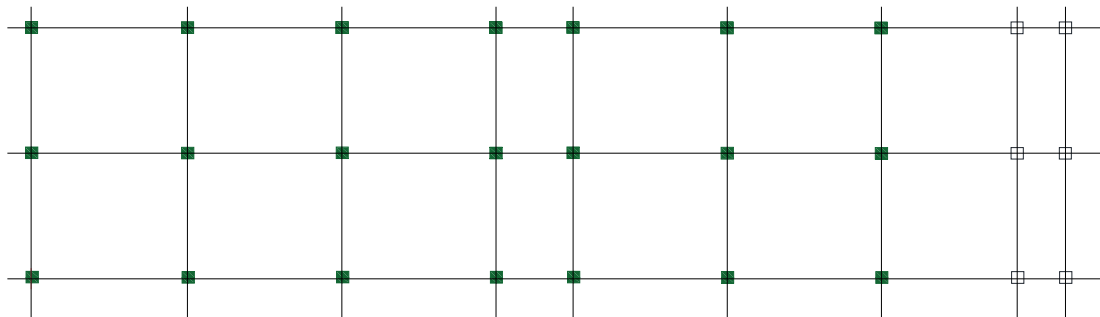


Figura 09: Blocos da Cobertura do Estacionamento E3.

- **COBERTURA E5:**

 EXECUTADO NONA MEDIÇÃO

COB E5

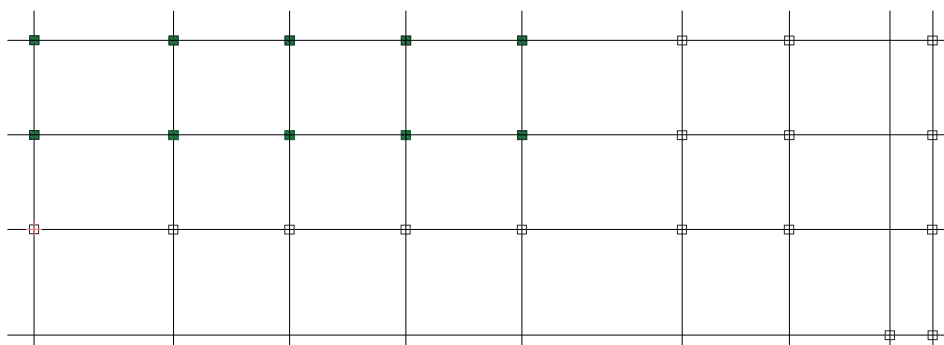


Figura 10: Blocos da Cobertura do Estacionamento E5.

ANEXO II DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA



FIM DOS ANEXOS FOTOGRÁFICOS
