



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO 1º MEDIÇÃO



RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2020
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01/2021

INICIO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 22 de Fevereiro de 2021

PERÍODO DO RELATÓRIO: De 22 de Fevereiro até 22 de Junho de 2021 (Taxas da obra, placa da obra, serviços de limpeza da obra, canteiro de obra e tapume com telha metálica).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF

Nome: Eng. Marcos Eduardo Silva Madureira

ART: Cargo-Função nº RR20200078632 / Obra-Serviço nº RR20200078641.

Telefone: (95) 3198-2026

E-mail: marcoseduardo@mpf.mp.br

COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)

Nome: Robson Guimarães Costa / Joel de Oliveira Melo / Nazareno Nunes Rodrigues / Igor José Barbosa Duarte Lopes/Hugo Habib Vieira Mendes/Marcos Eduardo Silva Madureira

Portaria: GABPC/PRRR nº62/2020

Telefone: (95) 3198-2026 / 2005 / 2000 / 2019

E-mail: prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br

1. ESCOPO E LOCAL

DADOS DO CONTRATO

Nº Contrato: 10/2020

PPA/LOA: AÇÃO 110E

Empresa Contratada: BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – CNPJ 08.811.661/0001-09

Matrícula CEI da Obra: 51.235.89823/71

Valor Atual do Contrato: R\$ 19.776.031,50 (dezenove milhões setecentos setenta e seis mil, trinta e um reais e cinquenta centavos)

Valor com 1º Reajuste: R\$ 21.964.945,08 (vinte um milhões novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

Percentual de Reajuste: 11.0685%

Saldo de Empenho: 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) – 2020NE000243

Local/UF: Boa Vista – RR

Responsável Técnico: Mauricio Gonçalves – ART de Execução: RR20210079913

Corresponsável Técnico: Walter Borges – Co-Responsavel RR20210079913 / Obra-Serviço nº RR20210083208

Nota Fiscal Eletrônica de Referência: no valor de R\$ 89.421,06 (Oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e um real e seis centavos)

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,41	0,41	0,41	0,41
TOTAL EXECUTADO				0,41%
TOTAL A EXECUTAR				99,59%

Identificação processo de fiscalização: 1.32.000.000611/2020-41

Tipo de obra: Prédio Público.

Objeto da fiscalização: Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Período abrangido pela fiscalização: 22/02/2021 a 22/06/2021 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)

2. ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI desde a placa da obra, tapume com telha metálica, limpeza do terreno até a construção do canteiro de obra, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma todas as atividades foram concluídas 100%.

3.CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: A situação do engenheiro da empresa BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, senhor Walter Borges, corresponsável pela execução da obra objeto do contrato nº 10/2020, já foi devidamente regularizada junto ao CREA/RR.

Constatação do Período nº 2: Na presente data 21/06/2021 o alvará de construção já foi liberado pela a Prefeitura. Alvará de construção Nº 00384/2021

Constatação do Período nº 3: A BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI contratou o senhor Orinei Leal dos Santos na função de técnico de segurança do trabalho, o mesmo está desenvolvendo suas atividades desde do dia 10/06/2021. É importante ressaltar que apesar da presença do senhor Orinei os funcionários ainda desenvolvem atividades sem a proteção necessária, o uso de EPI.

4. OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

I) A empresa contratada ainda não solicitou a devida autorização de retirada da vegetação existente no canteiro de obra junto ao órgão competente.

II) Os serviços realizados de acordo com a planilha até o momento, não necessitavam de alvará para sua execução.

III) Mudança dos itens: 01.03, 01.03.01, 01.03.02 e 01.03.03 incluídos no cronograma de demolição retirada, a princípio seria feita a demolição da caixa d' água existente no prédio mas ficou decidido pela a engenharia da PGR que a caixa d' água vai permanecer e no decorrer das atividades passará por uma reforma.

IV) O item 01.03, 03.01.01 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras, ficou acordado com o engenheiro Walter Borges que caso seja preciso fazer novamente o serviço a empresa fara sem cobrar em planilha.

V) O item 01.04, 01.04.02 tapume com telha metálica consta em planilha 160m², mais apenas o uso de 60m² in loco de tapume com telha metálica foi o suficiente para a execução de todo o serviço.

5. CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada conseguiram executar os serviços listados de acordo com o novo cronograma entregue pela a empresa.

6 ANEXOS

a) **Relatório fotográfico do período**

7 LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 22 de junho de 2021

8 FÉ DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2021

Declaramos que as metas estabelecidas na 1º etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro foram atendidas.

Marcos Eduardo Silva Madureira
Engenheiro Civil/Membro da Comissão

Robson Guimarães Costa
Presidente da Comissão

Nazareno Nunes Rodrigues
Membro da Comissão

Joel de Oliveira Melo
Membro da Comissão

Hugo Habib Vieira Mendes
Membro da Comissão

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.

9 PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL

() Não foram identificados vícios.

() Ver Nota Técnica ou Despacho constan
folha de nº. _____

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas**.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

**RELATÓRIO TÉCNICO
MEDIÇÃO 1**

1. A primeira medição foi efetuada pelo fiscal da obra, engenheiro civil da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Marcos Eduardo Silva Madureira, matrícula 31.143, no dia 22/06/2021.
2. . Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente de acordo com a planilha abaixo.

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado <i>in loco</i>	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	73,61%	73,61%		X
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,18%	0,18%		X
SERVIÇOS GERAIS	11,45%	11.45%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,41%	0,41%		X

1. Segue abaixo a planilha contendo o resumo dos serviços efetivamente realizados e pactuados para finalização do contrato nº 10/2020.

 Ministério Público Federal PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA						M04		
Obra Edificação da Sede da Procuradoria de Roraima - rev 00						1ª MEDIÇÃO		
CIDADE: BOA VISTA - RR						0,41% R\$ 80.509,82		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	TOTAL COM BDI	Qtde	%	R\$	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					73,6051979498750%	47.926,01	
01.01	PLACA DE OBRA							
01.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,60	438,39	3,60	100,0%	R\$ 1.578,20	
01.02	CANTEIRO DE OBRA							
01.02.01	ADEQUAÇÃO / REFORMA DO CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE	M²	200,00	183,12	200,00	100,0%	R\$ 36.624,85	
01.04	PROTEÇÃO							
01.04.02	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M²	160,00	60,77	160,00	100,0%	R\$ 9.722,96	
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					0,1827288372913%	804,98	
03.01	LIMPEZA DO TERRENO						804,98	
03.01.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M²	12.921,00	0,12	6.460,50	50,0%	R\$ 804,98	
14	SERVIÇOS GERAIS					11,44644854002450%	23.726,85	
14.02	LIMPEZA DA OBRA						1.339,06	
14.02.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	334,22	0,41	0,41%	R\$ 136,06	
14.02.02	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	280,00	85,93	14,00	5,0%	R\$ 1.203,00	
14.05	TAXAS DE CONSTRUÇÃO						22.387,79	
14.05.01	TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, HABITE-SE E DEMAIS TAXAS)	UN	1,00	44.216,66	0,50	50,0%	R\$ 22.108,33	
14.05.02	CÓPIAS REPROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	500,00	11,18	25,00	5,0%	R\$ 279,46	
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					0,41%	8.051,98	
15.01	INSUMOS PÚBLICOS						257,21	
15.01.01	INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	631,80	0,41	0,41%	R\$ 257,21	
15.02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						7.794,77	
15.02.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	19.146,68	0,41	0,41%	R\$ 7.794,77	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	mês 4
	PARCIAL		80.509,82
			0,41%
	ACUMULADO	R\$ 19.776.031,50	80.509,82
			0,41%
	PARCIAL COM REAJUSTE		89.421,06
			0,41%
	ACUMULADO COM REAJUSTE	R\$ 21.964.945,08	89.421,06
			0,41%

PERCENTUAL DE REAJUSTE: **11,0685%**

R\$ 89.421,06 (Oitenta e nove mil quatrocentos e vinte e um real e seis centavos)

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

1 - PLANCA DE OBRA



2 - DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS EXISTENTES



3 - EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA











4 - CONTRAPISO DO CANTEIRO DE OBRA (VESTIÁRIO, BANHEIRO MASCULINO, BANHEIRO FEMININO E BANHEIRO DA FISCALIZAÇÃO)





5 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA PROVISÓRIAS DA OBRA






6 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO PROVISÓRIAS DA OBRA







7 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DA OBRA (LOUÇAS E METAIS)

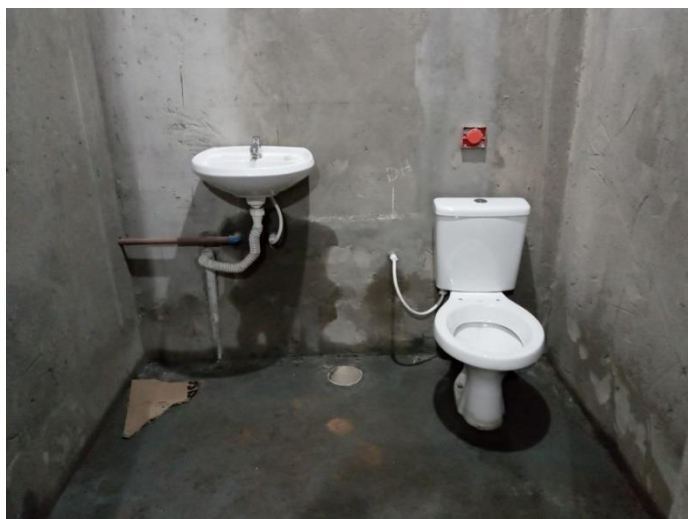



8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA COMO ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTOR E QUADRO (PROVISÓRIAS DA OBRA).

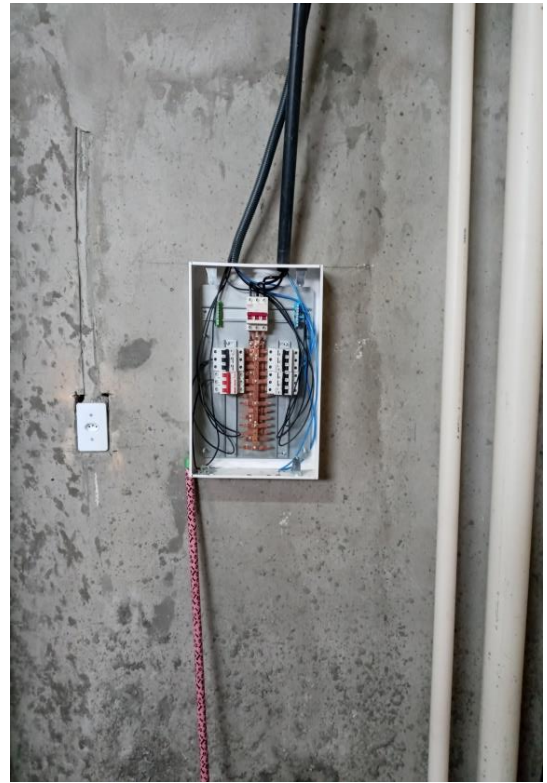

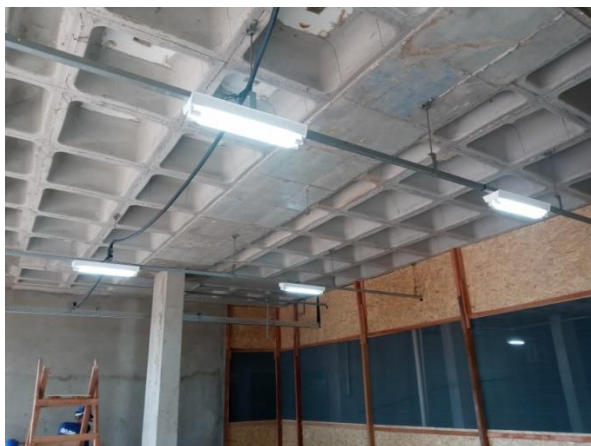

9- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA







10- SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DOS TAPUMES NO LIMITE DO TERRENO NA PARTE DA FRENTE (COM CALÇADA).








11- LIMPEZA DO TERRENO MANUAL E MACANIZADA





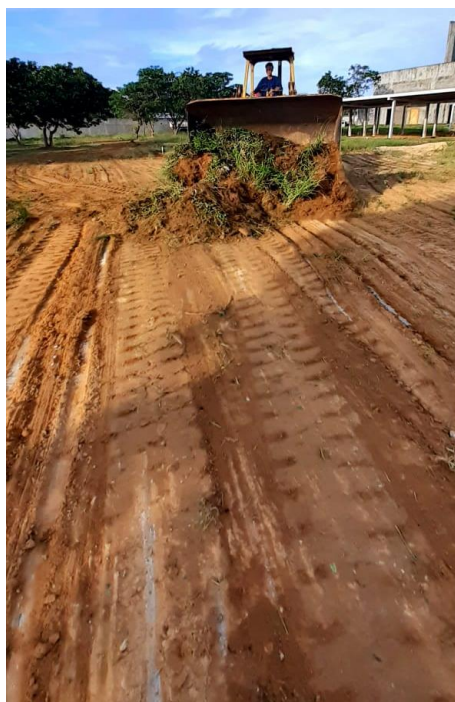











ANEXOS DIÁRIOS DE OBRA

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL				MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR											
CONDIÇÃO DO TEMPO								DIAS DAS SEMANAS						DATA	
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	19/02/2021		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020. EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI															
DIÁRIO DE OBRAS															
MÃO DE OBRA										EQUIPAMENTOS					
INDIRETA					DIRETA										
GESTOR DE OBRA					1	ALMOXARIFE					RETROESCAVADEIRA				
ENGENHEIRO CIVIL						MESTRE DE OBRA					1	PÁ-CARREGADEIRA			
ENGENHEIRO ELETRICISTA						ENCARREGADO DE OBRA					1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.			
ENGENHEIRO MECÂNICO						ELETRICISTA					PATROL				
ADMINISTRATIVO DE OBRA					1	AUXILIAR ELETRICISTA					PÉ-DE-CARNEIRO				
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE						ENCANADOR					ROLO LISO				
GESTOR DE QUALIDADE						AUXILIAR ENCANADOR					TRATOR ESTEIRA				
SUPRIMENTOS						CARPINTEIRO					ROLO PNEUMÁTICO				
TÉCNICO DE SEGURANÇA						AUXILIAR CARPINTEIRO					PLATAFORMA ELEV.				
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES						PEDREIRO					CAMINHÃO BASC.				
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO						AUXILIAR PEDREIRO					CAMINHÃO MUNCK				
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO						AZULEGISTA/CERÂMISTA					CAMINHÃO PIPA				
TÉCNICO MECÂNICO						PINTOR					CAMIN. PAPA ENT.				
ASSIST. DE ENGENHARIA						AUXILIAR PINTOR									
ESTAGIÁRIOS						SERVENTE									
						AJUDANTES									
						APONTADOR									
						SOLDADOR									
						GESSEIRO									
						VIDRACEIRO									
						MOTORISTA									
						OPERADOR DE MÁQUINA									
						VIGIA									
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS										QUANTIDADE TOTAL					
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA										04					
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS										00					
SERVIÇOS		ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA								OBS. DA FISCALIZAÇÃO					
1		PASSAGEM DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MPF PARA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.													
OCORRÊNCIAS															
1- FOI VERIFICADO EM IN LOCO QUE NÃO SE ENCONTRAR A PLANCA DE OBRA.															
2- DE ACORDO COM A ENGENHARIA DA BASE FORAM FEITOS A LOCAÇÃO DOS PIQUETES DA OBRA, NOS DIAS 11,12 e 15/02/2021.															

LOCAÇÃO DOS PIQUETES NA OBRA





(Assinado Eletronicamente)
MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
FABIANO CHAVES
Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL				MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR											
CONDIÇÃO DO TEMPO						DIAS DAS SEMANAS						DATA			
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	22/02/2021		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020. EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI															
DIÁRIO DE OBRAS															
MÃO DE OBRA										EQUIPAMENTOS					
INDIRETA					DIRETA										
GESTOR DE OBRA					1	ALMOXARIFE					RETROESCAVADEIRA				
ENGENHEIRO CIVIL						MESTRE DE OBRA					1	PÁ-CARREGADEIRA			
ENGENHEIRO ELETRICISTA						ENCARREGADO DE OBRA					1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.			
ENGENHEIRO MECÂNICO						ELETRICISTA					PATROL				
ADMINISTRATIVO DE OBRA					1	AUXILIAR ELETRICISTA					PÉ-DE-CARNEIRO				
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE					1	ENCANADOR					ROLO LISO				
GESTOR DE QUALIDADE						AUXILIAR ENCANADOR					TRATOR ESTEIRA				
SUPRIMENTOS						CARPINTEIRO					ROLO PNEUMÁTICO				
TÉCNICO DE SEGURANÇA						AUXILIAR CARPINTEIRO					PLATAFORMA ELEV.				
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES						PEDREIRO					CAMINHÃO BASC.				
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO						AUXILIAR PEDREIRO					CAMINHÃO MUNCK				
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO						AZULEGISTA/CERÂMISTA					CAMINHÃO PIPA				
TÉCNICO MECÂNICO						PINTOR					CAMIN. PAPA ENT.				
ASSIST. DE ENGENHARIA						AUXILIAR PINTOR									
ESTAGIÁRIOS						SERVENTE									
						AJUDANTES									
						APONTADOR									
						SOLDADOR									
						GESSEIRO									
						VIDRACEIRO									
						MOTORISTA									
						OPERADOR DE MÁQUINA									
						VIGIA									
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS										QUANTIDADE TOTAL					
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA										05					
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS										00					
SERVIÇOS		ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA								OBS. DA FISCALIZAÇÃO					
1		CONFERIR AS COTAS DE NÍVEL IN LOCO COM A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO.													
OCORRÊNCIAS															
1- DE ACORDO COM O LIVRO DE OCORRÊNCIA DA VIGILÂNCIA DO MPF A EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EXECUTOU O SERVIÇO DA COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA NO DIA 20/02/2021, AS 09h															
2- FOI VERIFICADOR IN LOCO AS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL FALTANDO AS ART DE SERVIÇO.															
3- NÃO FOI COLOCADO NO LIVRO DE OCORRÊNCIAS A ENTREGA DAS MÁQUINAS NO DIA 21/02/2021															

COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA E AS MÁQUINAS NA OBRA



(Assinado Eletronicamente)
MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
FABIANO CHAVES
Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL				MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR											
CONDIÇÃO DO TEMPO								DIAS DAS SEMANAS						DATA	
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	23/02/2021		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020. EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI															
DIÁRIO DE OBRAS															
MÃO DE OBRA										EQUIPAMENTOS					
INDIRETA					DIRETA										
GESTOR DE OBRA					1	ALMOXARIFE					RETROESCAVADEIRA				
ENGENHEIRO CIVIL						MESTRE DE OBRA					1	PÁ-CARREGADEIRA			
ENGENHEIRO ELETRICISTA						ENCARREGADO DE OBRA					1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.			
ENGENHEIRO MECÂNICO						ELETRICISTA						PATROL			
ADMINISTRATIVO DE OBRA					1	AUXILIAR ELETRICISTA					1	PÉ-DE-CARNEIRO			
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE					1	ENCANADOR						ROLO LISO			
GESTOR DE QUALIDADE						AUXILIAR ENCANADOR						TRATOR ESTEIRA			
SUPRIMENTOS						CARPINTEIRO						ROLO PNEUMÁTICO			
TÉCNICO DE SEGURANÇA						AUXILIAR CARPINTEIRO					1	PLATAFORMA ELEV.			
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES						PEDREIRO						CAMINHÃO BASC.			
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO						AUXILIAR PEDREIRO					1	CAMINHÃO MUNCK			
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO						AZULEGISTA/CERÂMISTA						CAMINHÃO PIPA			
TÉCNICO MECÂNICO						PINTOR						CAMIN. PAPA ENT.			
ASSIST. DE ENGENHARIA						AUXILIAR PINTOR									
ESTAGIÁRIOS						SERVENTE									
						AJUDANTES									
						APONTADOR									
						SOLDADOR									
						GESSEIRO									
						VIDRACEIRO									
						MOTORISTA									
						OPERADOR DE MÁQUINA									
						VIGIA									
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS										QUANTIDADE TOTAL					
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA										08					
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS										00					
SERVIÇOS		ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA								OBS. DA FISCALIZAÇÃO					
1		ESCAVAÇÃO MANUAL NO ESTACIONAMENTO													
OCORRÊNCIAS															
1- FOI INICIADO O SERVIÇO 13:30h, DE ESCAVAÇÃO MANUAL NO ESATACIONAMENTO COM TRÊS FUNCIONÁRIOS. .															

ESCAVAÇÃO MANUAL NO ESTACIONAMENTO



(Assinado Eletronicamente)
MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
FABIANO CHAVES
Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL				MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR											
CONDIÇÃO DO TEMPO								DIAS DAS SEMANAS						DATA	
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	24/02/2021		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020. EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI															
DIÁRIO DE OBRAS															
MÃO DE OBRA										EQUIPAMENTOS					
INDIRETA					DIRETA										
GESTOR DE OBRA					1	ALMOXARIFE					RETROESCAVADEIRA				
ENGENHEIRO CIVIL						MESTRE DE OBRA					1	PÁ-CARREGADEIRA			
ENGENHEIRO ELETRICISTA						ENCARREGADO DE OBRA					1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.			
ENGENHEIRO MECÂNICO						ELETRICISTA						PATROL			
ADMINISTRATIVO DE OBRA					1	AUXILIAR ELETRICISTA					1	PÉ-DE-CARNEIRO			
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE					1	ENCANADOR						ROLO LISO			
GESTOR DE QUALIDADE						AUXILIAR ENCANADOR						TRATOR ESTEIRA			
SUPRIMENTOS						CARPINTEIRO						ROLO PNEUMÁTICO			
TÉCNICO DE SEGURANÇA						AUXILIAR CARPINTEIRO					1	PLATAFORMA ELEV.			
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES						PEDREIRO						CAMINHÃO BASC.			
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO						AUXILIAR PEDREIRO					1	CAMINHÃO MUNCK			
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO						AZULEGISTA/CERÂMISTA						CAMINHÃO PIPA			
TÉCNICO MECÂNICO						PINTOR						CAMIN. PAPA ENT.			
ASSIST. DE ENGENHARIA						AUXILIAR PINTOR									
ESTAGIÁRIOS						SERVENTE									
						AJUDANTES									
						APONTADOR									
						SOLDADOR									
						GESSEIRO									
						VIDRACEIRO									
						MOTORISTA									
						OPERADOR DE MÁQUINA					1				
						VIGIA									
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS										QUANTIDADE TOTAL					
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA										09					
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS										01					
SERVIÇOS		ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA								OBS. DA FISCALIZAÇÃO					
1		ESCAVAÇÃO MANUAL NO ESTACIONAMEMTO													
2		LIMPEZA DO TERRENO COM PÁ-CARREGADEIRA													
OCORRÊNCIAS															

ESCAVAÇÃO MANUAL NO ESTACIONAMENTO



LIMPEZA DO TERRENO COM PÁ-CARREGADEIRA







(Assinado Eletronicamente)
 MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
 Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
 FABIANO CHAVES
 Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
 BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
 FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
 Ministério Público Federal da República
 em Roraima

CONDIÇÃO DO TEMPO						DIAS DAS SEMANAS							DATA
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	25/02/2021

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020.
EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI


DIÁRIO DE OBRAS

MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS	
INDIRETA		DIRETA			
GESTOR DE OBRA	1	ALMOXARIFE		RETROESCAVADEIRA	
ENGENHEIRO CIVIL		MESTRE DE OBRA	1	PÁ-CARREGADEIRA	1
ENGENHEIRO ELETRICISTA		ENCARREGADO DE OBRA	1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.	
ENGENHEIRO MECÂNICO		ELETRICISTA		PATROL	1
ADMINISTRATIVO DE OBRA	1	AUXILIAR ELETRICISTA	1	PÉ-DE-CARNEIRO	
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE	1	ENCANADOR		ROLO LISO	
GESTOR DE QUALIDADE		AUXILIAR ENCANADOR		TRATOR ESTEIRA	
SUPRIMENTOS		CARPINTEIRO		ROLO PNEUMÁTICO	
TÉCNICO DE SEGURANÇA		AUXILIAR CARPINTEIRO	1	PLATAFORMA ELEV.	
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES		PEDREIRO		CAMINHÃO BASC.	
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO		AUXILIAR PEDREIRO	1	CAMINHÃO MUNCK	
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO		AZULEGISTA/CERÂMISTA		CAMINHÃO PIPA	
TÉCNICO MECÂNICO		PINTOR		CAMIN. PAPA ENT.	
ASSIST. DE ENGENHARIA		AUXILIAR PINTOR			
ESTAGIÁRIOS		SERVENTE			
		AJUDANTES			
		APONTADOR			
		SOLDADOR			
		GESSEIRO			
		VIDRACEIRO			
		MOTORISTA			
		OPERADOR DE MÁQUINA	1		
		VIGIA			
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS				QUANTIDADE TOTAL	
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA				09	
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS				02	

SERVIÇOS	ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA	OBS. DA FISCALIZAÇÃO
1	LIMPEZA DO TERRENO MANUAL	
2	LIMPEZA DO TERRENO COM PÁ-CARREGADEIRA E PADROL.	
	.	

OCORRÊNCIAS

LIMPEZA DO TERRENO MANUAL

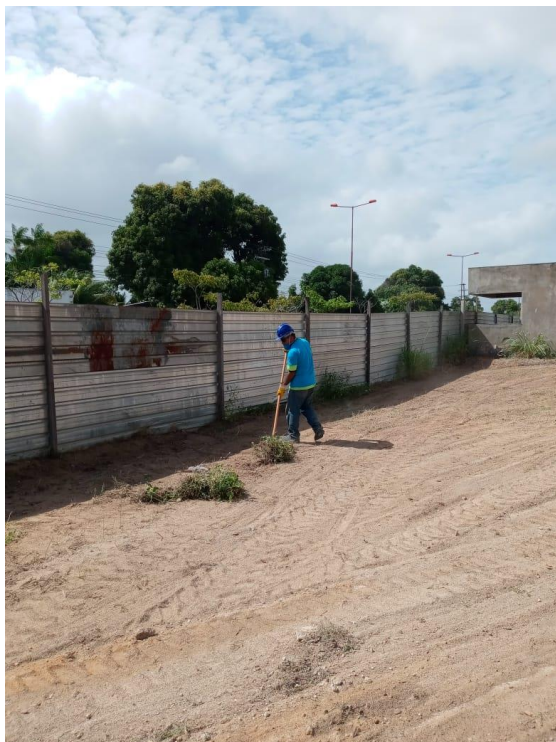

LIMPEZA DO TERRENO COM PÁ-CARREGADEIRA E PADROL









(Assinado Eletronicamente)
MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
 Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
FABIANO CHAVES
 Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
 BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
 FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
 Ministério Público Federal da República
 em Roraima

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL				MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR											
CONDIÇÃO DO TEMPO								DIAS DAS SEMANAS						DATA	
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	26/02/2021		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020. EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI															
DIÁRIO DE OBRAS															
MÃO DE OBRA										EQUIPAMENTOS					
INDIRETA					DIRETA										
GESTOR DE OBRA					1	ALMOXARIFE					RETROESCAVADEIRA				
ENGENHEIRO CIVIL						MESTRE DE OBRA					1	PÁ-CARREGADEIRA			
ENGENHEIRO ELETRICISTA						ENCARREGADO DE OBRA					1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.			
ENGENHEIRO MECÂNICO						ELETRICISTA						PATROL			
ADMINISTRATIVO DE OBRA					1	AUXILIAR ELETRICISTA					1	PÉ-DE-CARNEIRO			
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE					1	ENCANADOR						ROLO LISO			
GESTOR DE QUALIDADE						AUXILIAR ENCANADOR						TRATOR ESTEIRA			
SUPRIMENTOS						CARPINTEIRO						ROLO PNEUMÁTICO			
TÉCNICO DE SEGURANÇA						AUXILIAR CARPINTEIRO					1	PLATAFORMA ELEV.			
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES						PEDREIRO						CAMINHÃO BASC.			
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO						AUXILIAR PEDREIRO					1	CAMINHÃO MUNCK			
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO						AZULEGISTA/CERÂMISTA						CAMINHÃO PIPA			
TÉCNICO MECÂNICO						PINTOR						CAMIN. PAPA ENT.			
ASSIST. DE ENGENHARIA						AUXILIAR PINTOR									
ESTAGIÁRIOS						SERVENTE									
						AJUDANTES									
						APONTADOR									
						SOLDADOR									
						GESSEIRO									
						VIDRACEIRO									
						MOTORISTA									
						OPERADOR DE MÁQUINA					1				
						VIGIA									
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS										QUANTIDADE TOTAL					
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA										09					
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS										02					
SERVIÇOS		ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA								OBS. DA FISCALIZAÇÃO					
1		LIMPEZA DO TERRENO MANUAL													
2		LIMPEZA DO TERRENO COM PÁ-CARREGADEIRA E PADROL													
OCORRÊNCIAS															

LIMPEZA DO TERRENO MANUAL











(Assinado Eletronicamente)
MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
FABIANO CHAVES
Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000



MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL				MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR											
CONDIÇÃO DO TEMPO						DIAS DAS SEMANAS						DATA			
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	01/03/2021		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020. EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI															
DIÁRIO DE OBRAS															
MÃO DE OBRA										EQUIPAMENTOS					
INDIRETA					DIRETA										
GESTOR DE OBRA					1	ALMOXARIFE					RETROESCAVADEIRA				
ENGENHEIRO CIVIL						MESTRE DE OBRA					1	PÁ-CARREGADEIRA			
ENGENHEIRO ELETRICISTA						ENCARREGADO DE OBRA					1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.			
ENGENHEIRO MECÂNICO						ELETRICISTA						PATROL			
ADMINISTRATIVO DE OBRA					1	AUXILIAR ELETRICISTA					1	PÉ-DE-CARNEIRO			
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE					1	ENCANADOR						ROLO LISO			
GESTOR DE QUALIDADE						AUXILIAR ENCANADOR						TRATOR ESTEIRA			
SUPRIMENTOS						CARPINTEIRO						ROLO PNEUMÁTICO			
TÉCNICO DE SEGURANÇA						AUXILIAR CARPINTEIRO					1	PLATAFORMA ELEV.			
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES						PEDREIRO						CAMINHÃO BASC.			
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO						AUXILIAR PEDREIRO					1	CAMINHÃO MUNCK			
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO						AZULEGISTA/CERÂMISTA						CAMINHÃO PIPA			
TÉCNICO MECÂNICO						PINTOR						CAMIN. PAPA ENT.			
ASSIST. DE ENGENHARIA						AUXILIAR PINTOR									
ESTAGIÁRIOS						SERVENTE									
						AJUDANTES									
						APONTADOR									
						SOLDADOR									
						GESSEIRO									
						VIDRACEIRO									
						MOTORISTA									
						OPERADOR DE MÁQUINA									
						VIGIA									
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS										QUANTIDADE TOTAL					
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA										08					
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS										00					
SERVIÇOS		ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA								OBS. DA FISCALIZAÇÃO					
1		LIMPEZA DO TERRENO MANUAL													
2		EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA													
3		EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA													
OCORRÊNCIAS															
1- FOI VERIFICADO EM IN LOCO A RETIRADA DE ENTULHO NA OBRA NOS DIAS 28 E 29/02/21, COM AS MAQUINAS.															
2- INICIADO O CANTEIRO DE OBRA DE ACORDO COM LAYOUT, NOS DIAS 28 E 29/02/21															
3- O SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO FEITO COM AS MÁQUINAS FOI FEITO COM UMA ART DO ESTADO DE MANAUS O QUE NÃO É PERMITIDO, TODOS OS SERVIÇOS PRECISAM TER UMA ART GERADA PELO CREA DE RORAIMA.															

LIMPEZA DO TERRENO MANUAL



EXECUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

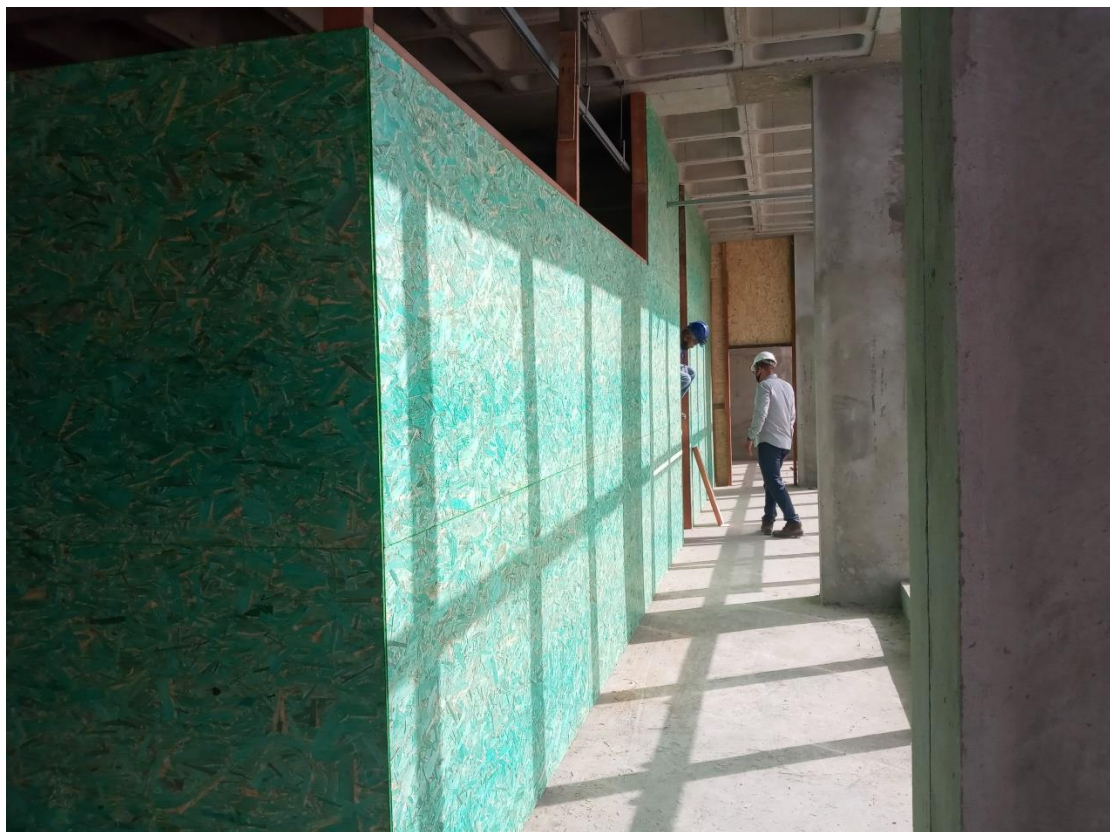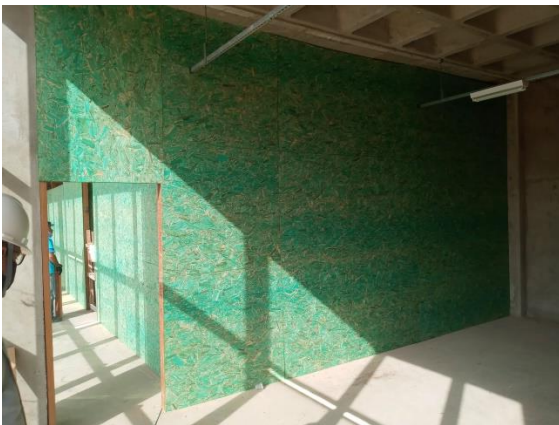

EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA



LIMPEZA DE ENTULHO NA OBRA





(Assinado Eletronicamente)
MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
FABIANO CHAVES
Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL				MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR											
CONDIÇÃO DO TEMPO								DIAS DAS SEMANAS						DATA	
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	02/03/2021		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020. EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI															
DIÁRIO DE OBRAS															
MÃO DE OBRA										EQUIPAMENTOS					
INDIRETA					DIRETA										
GESTOR DE OBRA					1	ALMOXARIFE					RETROESCAVADEIRA				
ENGENHEIRO CIVIL						MESTRE DE OBRA					1	PÁ-CARREGADEIRA			
ENGENHEIRO ELETRICISTA						ENCARREGADO DE OBRA					1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.			
ENGENHEIRO MECÂNICO						ELETRICISTA						PATROL			
ADMINISTRATIVO DE OBRA					1	AUXILIAR ELETRICISTA					1	PÉ-DE-CARNEIRO			
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE					1	ENCANADOR						ROLO LISO			
GESTOR DE QUALIDADE						AUXILIAR ENCANADOR						TRATOR ESTEIRA			
SUPRIMENTOS						CARPINTEIRO						ROLO PNEUMÁTICO			
TÉCNICO DE SEGURANÇA						AUXILIAR CARPINTEIRO					1	PLATAFORMA ELEV.			
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES						PEDREIRO						CAMINHÃO BASC.			
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO						AUXILIAR PEDREIRO					1	CAMINHÃO MUNCK			
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO						AZULEGISTA/CERÂMISTA						CAMINHÃO PIPA			
TÉCNICO MECÂNICO						PINTOR						CAMIN. PAPA ENT.			
ASSIST. DE ENGENHARIA						AUXILIAR PINTOR									
ESTAGIÁRIOS						SERVENTE									
						AJUDANTES									
						APONTADOR									
						SOLDADOR									
						GESSEIRO									
						VIDRACEIRO									
						MOTORISTA									
						OPERADOR DE MÁQUINA									
						VIGIA									
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS										QUANTIDADE TOTAL					
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA										08					
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS										00					
SERVIÇOS		ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA								OBS. DA FISCALIZAÇÃO					
1		LIMPEZA DO TERRENO MANUAL													
2		EXECUÇÃO DOS BANHEIROS DA OBRA													
3		EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA													
OCORRÊNCIAS															

LIMPEZA DO TERRENO MANUAL



EXECUÇÃO DOS BANHEIROS PROVISÓRIA DA OBRA



EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA



(Assinado Eletronicamente)
MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
FABIANO CHAVES
Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL				MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR											
CONDICÃO DO TEMPO								DIAS DAS SEMANAS						DATA	
X	BOM		INSTÁVEL		CHUVOSO	S	T	Q	Q	S	S	D	03/03/2021		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA-RR, CONTRATO Nº 01/2020. EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI															
DIÁRIO DE OBRAS															
MÃO DE OBRA										EQUIPAMENTOS					
INDIRETA					DIRETA										
GESTOR DE OBRA					1	ALMOXARIFE					RETROESCAVADEIRA				
ENGENHEIRO CIVIL						MESTRE DE OBRA					1	PÁ-CARREGADEIRA			
ENGENHEIRO ELETRICISTA						ENCARREGADO DE OBRA					1	ESCAVADEIRA HIDRÁ.			
ENGENHEIRO MECÂNICO						ELETRICISTA						PATROL			
ADMINISTRATIVO DE OBRA					1	AUXILIAR ELETRICISTA					1	PÉ-DE-CARNEIRO			
ADMINISTRATIVO ASSISTENTE					1	ENCANADOR						ROLO LISO			
GESTOR DE QUALIDADE						AUXILIAR ENCANADOR						TRATOR ESTEIRA			
SUPRIMENTOS						CARPINTEIRO						ROLO PNEUMÁTICO			
TÉCNICO DE SEGURANÇA						AUXILIAR CARPINTEIRO					1	PLATAFORMA ELEV.			
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES						PEDREIRO						CAMINHÃO BASC.			
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICO						AUXILIAR PEDREIRO					1	CAMINHÃO MUNCK			
TÉCNICO EM CLIMATIZAÇÃO						AZULEGISTA/CERÂMISTA						CAMINHÃO PIPA			
TÉCNICO MECÂNICO						PINTOR						CAMIN. PAPA ENT.			
ASSIST. DE ENGENHARIA						AUXILIAR PINTOR									
ESTAGIÁRIOS						SERVENTE									
						AJUDANTES									
						APONTADOR									
						SOLDADOR									
						GESSEIRO									
						VIDRACEIRO									
						MOTORISTA									
						OPERADOR DE MÁQUINA									
						VIGIA									
						TOPOGRAFO					1				
MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS										QUANTIDADE TOTAL					
TOTAL GERAL DE MÃO DE OBRA										09					
TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS										00					
SERVIÇOS		ATIVIDADES EXECUTADAS NA OBRA								OBS. DA FISCALIZAÇÃO					
1		LIMPEZA NO CARTEIRO DE OBRA MANUAL													
2		ESCAVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BANHEIROS PROVISÓRIA DA OBRA (CAIXA DE ESGOTO).													
3		INICIOU O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO													
OCORRÊNCIAS															
1- FOI CONTATADO A PRESENÇA DE UM DOS FUNCIONÁRIOS DA CONSTRUTORA BASE NO CASO, O GESTOR DE OBRA, CIRCULANDO NA OBRA SEM A DEVIDA EPI (CAPACETE)															
2- CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE ESPERANDO A RESPOSTA DA COMISSÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-SEA, SE VAI DEMOLIR OU PERMANECER. VERIFICAR OS ITEM DA PLANILHA 01.03, 01.03.01, 01.03.02 E 01.03.03															

LIMPEZA NO CARTEIRO DE OBRA MANUAL



ESCAVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BANHEIROS (CAIXA DE ESGOTO).





LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO



FUNCIONÁRIOS DA CONSTRUTORA BASE CIRCULANDO NA OBRA SEM A DEVIDA EPI (CAPACETE).



CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE.



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO
01			SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
01.01			PLACA DE OBRA
01.01.01	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
01.02			CANTEIRO DE OBRA
01.02.01	S-SEP-CANT-PRRR-01	PRÓPRIO	ADEQUAÇÃO / REFORMA DO CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE
01.03			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
01.03.01	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
01.03.02	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
01.03.03	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

(Assinado Eletronicamente)
MARCOS EDUARDO SILVA MADUREIRA
Assessor Especial de Engenharia/MPF/PR-RR

(Assinado Eletronicamente)
FABIANO CHAVES
Membro da Base Construções e Incorporações Eireli

RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	12
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	4/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

DURANTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 04/02/2021 DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA FOI CONSTATADO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E ESCAVAÇÃO NAS CAIXAS DO SISTEMA DE ESGOTO E DO SISTEMA DE ELÉTRICA.

OBS: FOI VERIFICADO IN LOCO TUBULAÇÃO DE ESGOTO ESTRANGULADA

LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA

LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR DE CARPINTEIR
1 AUXILIAR DE PEDREIRO
1 DIRETOR
1 ENCARREGADO DE OBRA
1 OPERADOR DE MÁQUINA

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	13 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	5/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1.Condições Climática:
Manhã: Tempo Claro - Praticável
Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra:
Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras
01 - Administrativo de Obras

S Engenharia (Sub contratada):
01 - Diretor Técnico
01 - Encarregado de Obras
01 - Auxiliar Administrativo
01 - Topógrafo
01 - Auxiliar de Pedreiro
01 - Auxiliar de Carpinteiro

3. Atividades realizadas:
Execução de deslocamento de placa de obra para a fachada principal da edificação, afixada conforme escopo de trabalho em planilha do contrato;
Serviço de Levantamento Altimétrico/Topográfico;
Execução de escavação das caixas de passagens elétricas e hidráulicas, com a finalidade de observar possíveis obstruções, no perímetro do prédio;
Serviço de execução de Canteiro de Obras.

4. Ocorrências:
Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos Madureira;
Continuamos esperando o parecer dos serviços de demolição, no caso da estrutura/torre de caixa de água onde se encontra a antiga ponteira de extração de água utilizada pela empreiteira anterior, solicitado pelo fiscal de obras
Aguardando definição por parte da fiscalização sobre serviços de terraplanagem:
-Pela discrepância das cotas em projeto original onde nos levou a colocar um topógrafo para levantamento altimétrico, conferindo as cotas de nível:
-Árvores no área de manobra e estacionamento, que não constavam no projeto paisagístico, que impactam diretamente nas frentes trabalhos;
-Foram atestadas obstruções nas infras de tubulações existentes.

Assim aguardamos definição do cliente, pois impacta diretamente no cronograma de obra já encaminhado a PGR/RR

5. Comentários:
Todos os tópicos foram formalizados via protocolo na plataforma da PGR/RR.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	13 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	5/3/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

DURANTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 05/03/2021 DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA FOI CONSTATADO A CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, EXECUÇÃO DO BARRACÃO DE OBRA, REFEITÓRIO E ALMOXARIFADO.
OBS: RELOCAÇÃO DA PLACA DA OBRA NO LOCAL DEFINITIVO.

LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA

LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR DE CARPINTEIR
1 AUXILIAR DE PEDREIRO
1 DIRETOR
1 ENCARREGADO DE OBRA
1 TOPÓGRAFO

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	16 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		
				DATA	8/3/2021
RELATÓRIO DA CONTRATADA					

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	16 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	8/3/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA

2.1 LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):

1 DIRETOR
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR DE CARPINTEIRO
1 AUXILIAR DE PEDREIRO
1 AUXILIAR DE ELETRICISTA
1 ENCARGADO DE OBRA

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA. (COLOCAÇÃO DAS PORTAS DAS SALA DE FISCALIZAÇÃO, SALA DE ENGENHARIA DA BASE, BANHEIRO FEMININO E ALMOXARIFADO.

4- OCORRÊNCIAS (EM ATENÇÃO A ENGENHARIA DA CONSTRUTORA BASE A SEGUIR AS RESPOSTAS SOBRE OS QUESTIONAMENTOS FEITOS).

4.1- CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE: FOI DECIDIDO PELA COMISSÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-MPF QUE A CAIXA D'ÁGUA VAI PERMANECER E PASSARÁ POR UMA REFORMA NO DECORRER DA OBRA;

4.2- TERRAPLANAGEM: PRECISA VER O RESULTADO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS CURVAS DE NÍVEL PARA DECIDIR SE VAI ELEVAR O ESTACIONAMENTO OU SE VAI FAZER CORTE NO SOLO. NO PROJETO DE DETALHAMENTO DE ARQUITETURA MOSTRA O PILAR METÁLICO COM O SEU CONJUNTO INTERRADO, DESSA MANEIRA AO DECORRER DO TEMPO A ESTRUTURA METÁLICA VAI SOFRER CORRUSÃO. GOSTARIA DE SUGERIR QUE A PLACA DA BASE DO PILAR E O PARAFUSO DE ANCORAGEM FICASSEM APARENTES PARA DEVIDA MANUTENÇÃO. (PRANCHA 02PR RR-SEDE-ARQ-02-44 DETALHAMENTO DO ESTACIONAMENTO. SEÇÃO-AA / SEÇÃO-BB);

4.3- VEGETAÇÃO / ARVORES: SEGUIR O PROJETO E SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO DA RETIRADA DA VEGETAÇÃO EXISTENTE NO ÓRGÃO COMPETENTE;

4.4- TUBULAÇÃO DE ESGOTO OBSTRUÍDA: VAMOS FAZER O TESTE PARA SABER SE O SISTEMA DE ESGOTO ESTÁ REALMENTE OBSTRUÍDO.

OBS 1: LEMBRADO QUE FICOU ACERTADO NA PRIMEIRA REUNIÃO A CONTINUIDADE AO DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA DE SERVIÇO DETALHADO DO SUB ITEM DE CADA MÊS.

OBS 2: CONTRATA URGENTE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA OBRA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	17
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	9/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA 1 MESTRE DE OBRA
2.1 LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):
1 DIRETOR 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR DE CARPINTEIRO 1 AUXILIAR DE PEDREIRO 1 AUXILIAR DE ELETRICISTA 1 ENCARREGADO DE OBRA
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA. (REFEITÓRIO, ALMOXARIFADO, VESTUÁRIO, BANHEIRO FEMININO E BANHEIRO MASCULINO).
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	18 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	10/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1.Condições Climática:
Manhã: Tempo Claro - Praticável
Tarde: Tempo Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra:
Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras
01 - Administrativo de Obras

S Engenharia (Sub contratada):
01 - Diretor Técnico
01 - Encarregado de Obras
01 - Auxiliar Administrativo
01 - Auxiliar de Pedreiro
01 - Auxiliar de Carpinteiro

3. Atividades realizadas:
Serviço de execução de Canteiro de Obras

4. Ocorrências:
Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos Madureira;
Aguardando definição por parte da fiscalização sobre serviços de terraplanagem:
-Pela discrepância das cotas em projeto original onde nos levou a colocar um topógrafo para levantamento altimétrico, conferindo as cotas de nível:
-Árvores no área de manobra e estacionamento, que não constavam no projeto paisagístico, que impactam diretamente nas frentes trabalhos;
-Foram atestadas obstruções nas infras de tubulações existentes.

Assim aguardamos definição do cliente, pois impacta diretamente no cronograma de obra já encaminhado a PGR/RR

5. Comentários:
Todos os tópicos foram formalizados via protocolo na plataforma da PGR/RR.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	18 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	10/3/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA

2.1 LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):

1 DIRETOR
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR DE CARPINTEIRO
1 AUXILIAR DE PEDREIRO
1 AUXILIAR DE ELETRICISTA
1 ENCARREGADO DE OBRA

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA. (REFEITÓRIO, ALMOXARIFADO, VESTUÁRIO, BANHEIRO FEMININO E BANHEIRO MASCULINO).

4- Ocorrências

4.1- AGUARDANDO A ART DAS MÁQUINAS PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, TODOS OS SERVIÇOS PRECISAM TER UMA ART GERADA PELO CREA DE RORAIMA;
4.2- AGUARDANDO O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM AS COTAS DE NÍVEL DA EMPRESA BASE;
4.3- VEGETAÇÃO / ARVORES: SEGUIR O PROJETO E SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO DA RETIRADA DA VEGETAÇÃO EXISTENTE NO ÓRGÃO COMPETENTE.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	19 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	11/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1.Condições Climática:
Manhã: Tempo Claro - Praticável
Tarde: Tempo Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra:
Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras
01 - Administrativo de Obras (home office, veio a obra para entregar e pegar documentos)

S Engenharia (Sub contratada):
01 - Diretor Técnico de Campo
01 - Encarregado de Obras
01 - Auxiliar Administrativo (home office, veio a obra para entregar e pegar documentos)
01 - Auxiliar de Pedreiro
01 - Auxiliar de Carpinteiro
01 - Auxiliar de Eletricista

3. Atividades realizadas:
Serviço de execução de Canteiro de Obras

4. Ocorrências:
Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos Madureira;

5. Comentários:
Foi informado verbalmente, que será mantido as cotas originais de projeto, no caso da área do estacionamento, aguardamos formalização.
Foi sinalizado pelo fiscal a revisão e adequação da documentação da Sub Contratada.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	19 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	11/3/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA

2.1 LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):

1 DIRETOR
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR DE CARPINTEIRO
1 AUXILIAR DE PEDREIRO
1 AUXILIAR DE ELETRICISTA
1 ENCARREGADO DE OBRA

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA. (ALMOXARIFADO, REFEITÓRIO, VESTUÁRIO, BANHEIROS E SALA DA FISCALIZAÇÃO).

4- OCORRÊNCIAS

4.1 - A COMISSÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (SEA) DECIDIU SEGUIR O PROJETO, DESSA MANEIRA SERÁ FEITO O ATERRO NO PÉ DOS PILARES, FAZENDO UM PEQUENO BLOCO QUADRANGULAR PREENCHIDO COM CONCRETO PARA A PROTEÇÃO DOS MESMOS;

4.2 - HÁ UMA SEMANA ESTOU AGUARDANDO A EMPRESA BASE FAZER A SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA A RETIRADA DA VEGETAÇÃO EXISTENTE NO ÓRGÃO COMPETENTE.

4.3 - AGUARDANDO O ALVARÁ DA OBRA

4.4- AGUARDANDO A ART DAS MÁQUINAS PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, POIS AS MÁQUINAS ESTÃO PARADAS DESDE DO DIA 01/03/2021.

4.5 - ATÉ O MOMENTO NÃO EXISTE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO NA OBRA.

4.6 - O DIRETOR DA EMPRESA S ENGENHARIA APRESENTOU UMA NR10 NO INRREGULAR, A MESMA TINHA UMA CARGA HORÁRIA INSUFICIENTE POIS SÓ CERTIFICAVA 06 HORAS DE CURSO E NA REALIDADE ESSE CURSO PRECISA TER NÓ MÍNIMO 40 HORAS. HOJE ELE ME APRESENTOU UMA OUTRA DOCUMENTAÇÃO COM INRREGULARIDADE NOVAMENTE SOBRE O CURSO DE NR10, UM CERTIFICADO EMITIDO PELA EMPRESA AUDIOFONO SAÚDE OCUPACIONAL ONDE CONSTA 40 HORAS DO CURSO FEITOS EM APENAS DOIS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021 CURSADO NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA.

4.7- NO DECORRER DAS ATIVIDADES NA OBRA CONSTATEI QUE O AUXILIAR DE ELETRICISTA REALIZOU SOZINHO SERVIÇOS ELÉTRICOS QUE PRECISAM SER FEITOS COM O ACOMPANHAMENTO DE UM ELETRICISTA E O MESMO NEM AO MENOS POSSUI O CURSO NR10, OBRIGATÓRIO PARA ESSA FUNÇÃO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	20 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	12/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1. Condições Climática:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra:

Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras

01 - Eletricista

01 - Pedreiro

01 - Servente

01 - Administrativo de Obras (home office, para integração da nova)

S Engenharia (Sub contratada):

01 - Diretor Técnico de Campo

01 - Encarregado de Obras

01 - Auxiliar Administrativo (home office, veio a obra para entregar e pegar documentos)

01 - Auxiliar de Pedreiro

01 - Auxiliar de Carpinteiro

01 - Auxiliar de Eletricista

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras

Limpeza Geral da Obra

Organização dos insumos (provisórias).

Escavações das infra no perímetro da edificação

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Maadureira;

Reunião com a equipe do MPF, alinhado questões do empreendimento bem como escopo de trabalho e sub contratações.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	20 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	12/3/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
2 SERVENTE

2.1 LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):

1 DIRETOR TÉCNICO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR DE CARPINTEIRO
1 AUXILIAR DE PEDREIRO
1 AUXILIAR DE ELETRICISTA
1 ENCARREGADO DE OBRA

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA. (ALMOXARIFADO, VESTUÁRIO E BANHEIRO);
- LIMPEZA MANUAL DA OBRA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	24 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	16/3/2021
RELATÓRIO DA CONTRATADA					

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	24 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	16/3/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO. (DIA 15/03/2021 O SISTEMA ESTAVA INDISPONÍVEL PARA FAZER O DIÁRIO DE OBRA).

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
2 SERVENTE

2.1 LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):

1 ENCARREGADO DE OBRA

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
- LIMPEZA MANUAL DA OBRA;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIA DA OBRA
- ESCAVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PROVISÓRIO DA OBRA

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ / TEMPO BOM COM SOL A TARDE (DIA 16/03/2021)

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

2.1 LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):

1 DIRETOR TÉCNICO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR DE CARPINTEIRO
1 AUXILIAR DE PEDREIRO
1 AUXILIAR DE ELETRICISTA
1 ENCARREGADO DE OBRA

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA;
- LIMPEZA MANUAL DA OBRA;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIA DA OBRA
- ESCAVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PROVISÓRIO DA OBRA
- SERVIÇO DE CARPINTARIA

4- OCORRÊNCIAS

FOI VERIFICADO QUE ALGUNS FUNCIONÁRIOS ESTÃO PENDENTE COM DOCUMENTAÇÃO, COM FOI SUSPENSO TODOS SERVIÇOS PELO OS MESMOS . SÃO ELES DIRETOR TÉCNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE CARPINTEIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, AUXILIAR DE ELETRICISTA E ENCARREGADO DE OBRA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	25
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	17/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
2 SERVENTE
2.1 LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA S. ENGENHARIA (SUBCONTRATO):
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1- EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PROVISÓRIO DA OBRA.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	26 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	18/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de obras Ref ao dia 15/03/2021

1. Condições Climática:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra:

Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras

01 - Eletricista

01 - Pedreiro

02 - Servente

01 - Administrativo de Obras (home office, para integração nova)

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras

Instalações hidráulicas e elétricas provisórias.

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Maadureira;

Diário de obras Ref ao dia 16/03/2021

1. Condições Climática:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra:

Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras

01 - Eletricista

01 - Pedreiro

02 - Servente

01 - Administrativo de Obras (home office, para integração nova)

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras

Instalações hidráulicas e elétricas provisórias.

Limpeza Geral da Obra

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Maadureira;

Diário de obras Ref ao dia 17/03/2021

1. Condições Climática:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra:

Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras

01 - Eletricista

01 - Pedreiro

02 - Servente

01 - Administrativo de Obras (home office, para integração nova)

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras

Limpeza Geral da Obra

Instalações hidráulicas provisórias.

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Maadureira;

Diário de obras Ref ao dia 18/03/2021

1. Condições Climática:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra:
Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras
01 - Eletricista
01 - Pedreiro
02 - Servente
01 - Administrativo de Obras (home office, para integração)



3. Atividades realizadas:
Serviço de execução de Canteiro de Obras:
Instalações hidráulicas provisórias.
Limpeza Geral da Obra

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Corrências:	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA				26 página 2/2
EMPRESA	EMPRESA acompanhando os serviços e as funções de trabalho pelo fiscal de obras, Eng.º Mado				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	18/3/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.	Fiscalização
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:	
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 PEDREIRO 2 SERVENTE	
3- ATIVIDADES REALIZADAS	
3.1- EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PROVISÓRIO DA OBRA. - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DA OBRA - LIMPEZA GERAL DA OBRA - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PROVISÓRIO DA OBRA.	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	27
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	19/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1. Condições Climáticas:
Manhã: Tempo Claro - Praticável
Tarde: Tempo Claro - Praticável
2. Equipes presentes na obra:
Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras
01 - Eletricista
01 - Pedreiro
02 - Servente
01 - Administrativo de Obras (período da tarde para integração de novos funcionários) - Home office.
3. Atividades realizadas:
Serviço de execução de Canteiro de Obras:
- Instalações elétricas e hidráulicas;
- Instalações das louças sanitárias;
Limpeza e organização do canteiro de obras;
Colocação das placas indicativas setoriais e do plano de prevenção da Covid 19
4. Ocorrências:
Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira;

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

- 1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.
- 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
- 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
2 SERVENTE
- 3- ATIVIDADES REALIZADAS
- 3.1- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DA OBRA (LOUÇAS E METAIS)
- EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PROVISÓRIO DA OBRA.
- PLACA DE ORIENTAÇÕES DA OBRA (SINTOMAS DA COVID - 19).
- ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	30
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	22/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1. Condições Climáticas:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras

01 - Eletricista

03 - Servente

01 - Bombeiro Hidráulico

03 - Pedreiros

01 - Administrativo de Obras (período da manhã para integração de novos funcionários) - Home office.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Instalações elétricas e hidráulicas;

- Instalações das louças sanitárias;

Limpeza e organização do canteiro de obras;

Demolição das instalações provisórias existentes;

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

3 PEDREIRO

3 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DA OBRA (LOUÇAS E METAIS);

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA;

- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRAS;

- DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS EXISTENTES.

4- OCORRÊNCIAS

4.1- FUNCIONÁRIOS NA OBRA SEM A PROTEÇÃO NECESSÁRIA, O USO DE EPI

4.1.1 - FUNCIONÁRIO SEM CAPACETE

4.1.2 - FUNCIONÁRIO EXECUTANDO SERVIÇO COM MARTELETE SEM O PROTETOR AURICULAR APROPRIADO, (CONCHA).

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	31
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	23/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ / TEMPO BOM COM SOL A TARDE

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
3 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DA OBRA (LOUÇAS E METAIS);
- INSTALAÇÕES DE ÁGUA PROVISÓRIAS DA OBRA
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA;
- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRAS;
- DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS EXISTENTES.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	32
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	24/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ / TEMPO CHUVOSO PELA TARDE
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
3 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DA OBRA (LOUÇAS E METAIS);
- INSTALAÇÕES DE ÁGUA PROVISÓRIAS DA OBRA
- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA;
- CONTRAPISO DO CANTEIRO DE OBRA (VESTIÁRIO, BANHEIRO MASCULINO E BANHEIRO DA FISCALIZAÇÃO).
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	33 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	25/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

DIÁRIO DE OBRAS REF: 23/03/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras

01 - Eletricista

03 - Servente

01 - Bombeiro Hidráulico

03 - Pedreiros

01 - Administrativo de Obras (período da manhã para integração de novos funcionários) - Home office.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

-Instalações elétricas e hidráulicas;

-Instalações das louças sanitárias;

Limpeza e organização do canteiro de obras;

Demolição das instalações provisórias existentes;

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

DIÁRIO DE OBRAS REF: 24/03/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras

01 - Eletricista

03 - Servente

01 - Bombeiro Hidráulico

03 - Pedreiros

01 - Administrativo de Obras (período da manhã para integração de novos funcionários) - Home office.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

-Instalações elétricas e hidráulicas;

-Instalações das louças sanitárias;

-Serviço de execução de contrapiso BWC e vestiários.

Limpeza e organização do canteiro de obras;

Demolição das instalações provisórias existentes;

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

DIÁRIO DE OBRAS REF: 25/03/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras

01 - Eletricista

03 - Servente

01 - Bombeiro Hidráulico

03 - Pedreiros

01 - Administrativo de Obras (período da manhã para integração de novos funcionários) - Home office.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

-Instalações elétricas e hidráulicas;

-Instalações das louças sanitárias;

-Serviço de execução de contrapiso BWC e vestiários.
-Início dos serviços de amestramento do contrapiso
Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:
Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de tra



obras, Engº Marcos S Madureira.

Fiscalização

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Contratada

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	33 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	25/3/2021
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
3 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PROVISÓRIAS DA OBRA (LOUÇAS E METAIS);
- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA;
- CONTRAPISO DO CANTEIRO DE OBRA (VESTIÁRIO, BANHEIRO MASCULINO);
- INÍCIO DO SERVIÇO DE AMESTRAMENTO DO CONTRAPISO DO PAVIMENTO.

4- OCORRÊNCIAS

4.1 SAIU O RESULTADO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO COM PENDÊNCIAS

4.1.1 - SEGUNDO A PREFEITURA ESTÁ FALTADO A ART/RRT DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA AUTORIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO;

4.1.2 - APRESENTAR PROJETO DE ESTACIONAMENTO, PARA POSTERIOR ANÁLISE E PARECER DO TRÂNSITO CONFORME ART.26 DA LEI 926/2006;

4.1.3 - ARQUIVOS ANEXADOS AO NUP 9.026487/2021, NÃO POSSUEM ASSINATURA ELETRÔNICA DO REQUERENTE, BEM COMO DOS PRIFSSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA AUTORIA E EXECUÇÃO;

4.1.4 - APRESENTAR OS PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES;

4.1.5 - ARQUIVOE ANEXADOS AO NUP 9.025952/2021, POSSUEM ASSINATURA ELETRÔNICA APENAS DO REQUERENTE EO SR. MAURICIO GONÇALVES DA BASE CONSTRUÇÕES, SENDO NECESSÁRIO A ASSINATURA DOS DEMAIS PROFISSIONAIS;

4.1.6 - APRESETAR PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO NA PREFEITURA DE BOA VISTA.

4.1.7 - AS ART'S DE AUTORIA DOS DOS PROJETOS REFERENTE AS INSTALAÇÕES, DIFEREM DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	34
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	26/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1. Condições Climáticas:
Manhã: Tempo Claro - Praticável
Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
01 - Eletricista;
03 - Servente;
01 - Bombeiro Hidráulico;
03 - Pedreiros;
01 - Encarregado de Obras;
01 - Administrativo de Obras.

3. Atividades realizadas:
Serviço de execução de Canteiro de Obras:
- Instalações elétricas e hidráulicas;
- Instalações das louças sanitárias;
Serviço de execução de amestramento do contrapiso:
- Térreo
- 1º pavimento
Demolições do canteiro de obras existente;
Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:
Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
3 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS COM TAPUMES NOS CHUVEIROS DO VESTIÁRIO;
- SERVIÇO DE AMESTRAMENTO DO CONTRAPISO DOS 1 E 2 PAVIMENTO;
- DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS EXISTENTES

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	37
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	29/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
3 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO CHUVEIROS DO VESTIÁRIO;
- SERVIÇO DE AMESTRAMENTO DO CONTRAPISO DOS 2 E 3 PAVIMENTOS;
- DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS EXISTENTES
- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA (ARMARIO).

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	38 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	30/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras referente ao dia 29/03/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Tempo Claro - Praticável

Tarde: Tempo Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Eletricista;

03 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

03 - Pedreiros;

01 - Encarregado de Obras;

01 - Administrativo de Obras.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Instalações elétricas e hidráulicas;

- Instalações das louças sanitárias;

Serviço de execução de amestramento do contrapiso:

- 1º pavimento

- 2º pavimento

Demolições do canteiro de obras existente;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Diário de Obras referente ao dia 29/03/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Praticável

Tarde: Chuvoso - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Eletricista;

03 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

03 - Pedreiros;

01 - Encarregado de Obras;

01 - Administrativo de Obras.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Instalações elétricas e hidráulicas;

- Instalações das louças sanitárias;

Serviço de execução de amestramento do contrapiso:

- 2º pavimento

- 3º pavimento

Demolições do canteiro de obras existente;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	38 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	30/3/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
3 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA E PINTURA DAS ÁREAS DO CHUVEIROS DO VESTIÁRIO;
- SERVIÇO DE AMESTRAMENTO DO CONTRAPISO DOS 2 E 3 PAVIMENTOS;
- DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS EXISTENTES;
- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA;
- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA (ARMARIO E GERAL).

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	39
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	31/3/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil.

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável

Tarde: Ensolarada - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Eletricista;

03 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

03 - Pedreiros;

01 - Administrativo de Obras.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Serviço de execução de tapumes;

- Isolamento das áreas de acesso a obra;

- Demolições do canteiro de obras existente;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO BOM COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

3 PEDREIRO

3 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA;

- DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS EXISTENTES;

- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA;

- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TAPUMES PARA ISOLAMENTO DO PRÉDIO PELOS FUNDOS (CIRCULAÇÃO).

- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA (ARMARIO E GERAL).

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	44
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	5/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

- 1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO.
- 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
- 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
 - 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
 - 1 MESTRE DE OBRA
 - 1 ELETRICISTA
 - 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 - 3 PEDREIRO
 - 3 SERVENTE
- 3- ATIVIDADES REALIZADAS
- 3.1- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA;
- ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS DO SISTEMA DE ESGOTO.
- 4- Ocorrências
- 4.1 - REVER SOLUÇÃO PARA PISO DE EPS DOS PAVIMENTOS DA NOVA SEDE DO MPF. (NÍVEL E ESPESSURA DIFERENTES).
- ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	45
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	6/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

- 1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO.
- 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
- 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
 - 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
 - 1 MESTRE DE OBRA
 - 1 ELETRICISTA
 - 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 - 3 PEDREIRO
 - 3 SERVENTE
- 3- ATIVIDADES REALIZADAS
- 3.1- MARCAÇÃO DAS COTAS DE NÍVEL DO TÉRREO, 1º, 2º E 3º PAVIMENTOS;
- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA.
- ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	46
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	7/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

- 1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO.
- 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
- 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
 - 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
 - 1 MESTRE DE OBRA
 - 1 ELETRICISTA
 - 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
 - 3 PEDREIRO
 - 3 SERVENTE
- 3- ATIVIDADES REALIZADAS
- 3.1- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA; ;
- SERVIÇO DO CANTEIRO DA OBRA (LOCAL DA BETONEIRA E DA SERRA CIRCULAR;
 - ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS DO SISTEMA DE ELÉTRICA.
- ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	47 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	8/4/2021
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (05/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável

Tarde: Ensolarada - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Eletricista;

03 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

03 - Pedreiros;

01 - Administrativo de Obras.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Isolamento das áreas de acesso a obra;

- Demolições do canteiro de obras existente;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Diário de Obras Basis Brasil (06/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Praticável

Tarde: Ensolarada - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Eletricista;

03 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

03 - Pedreiros;

01 - Administrativo de Obras.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Isolamento das áreas de acesso a obra;

- Demolições do canteiro de obras existente;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

Levantamento dos níveis dos ambientes: Térreo e 1º Pavimento.

4. Ocorrências:

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Diário de Obras Basis Brasil (07/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Eletricista;

03 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

03 - Pedreiros;

01 - Administrativo de Obras.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Isolamento das áreas de acesso a obra;

- Demolições do canteiro de obras existente;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

Levantamento dos níveis dos ambientes: 2º Pavimento e 3º Pavimento;

Serviço de execução das caixas de passagens Elétricas e Hidráulicas.

4. Ocorrências:

Diário de Obras Basis Brasil (08/04/2021)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Limpeza e organização do canteiro de obras.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

2- LÍSTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ELETRICISTA

3 PEDREIRO

Contratada

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	48
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	9/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (05/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável (para serviços externos);

Tarde: Chuvoso - Impraticável (para serviços externos).

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Eletricista;

03 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

03 - Pedreiros;

01 - Administrativo de Obras.

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Demolições do canteiro de obras existente;

- Execução das baias de carpintaria e betoneira;

- Adequando alimentação elétrica da obra;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF.

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO NUBLADO NA PARTE DA TARDE .

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

3 PEDREIRO

3 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA;

- SERVIÇO DO CANTEIRO DA OBRA;

- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRAS;

- ADEQUANDO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA OBRA.

4- OCORRÊNCIAS

4.1- ESPERANDO A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DA OBRA, A RESPOSTA DA PREFEITURA PARA O MPF .

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	51
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	12/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (05/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Execução das baias de carpintaria e betoneira;

Serviço de execução das caixas externas de Infra;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF.

Continuamos no aguardo do retorno ao escritório de resposta sob etiqueta PR-RR- 00004940/21, com relação as divergências de alturas do contrapiso e piso elevado.

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

2 PEDREIRO

1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA;

- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRAS;

- COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA OBRA (PLACAS);

- ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS DO SISTEMA DE HIDRÁULICO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	53 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	14/4/2021
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (13/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Execução das baias de carpintaria e betoneira;

Serviço de execução das caixas externas de Infra;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF.

Continuamos no aguardo do retorno ao escritório de resposta sob etiqueta PR-RR- 00004940/21, com relação as divergências de alturas do contrapiso e piso elevado.

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Diário de Obras Basis Brasil (14/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Execução das baias de carpintaria e betoneira;

Serviço de execução das caixas externas de Infra;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF.

Continuamos no aguardo do retorno ao escritório de resposta sob etiqueta PR-RR- 00004940/21, com relação as divergências de alturas do contrapiso e piso elevado.

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	53 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	14/4/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO. DIA 13/04

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
2 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA;
- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRAS;
- COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA OBRA (PLACAS);
- ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS DO SISTEMA DE HIDRÁULICO.

4. Ocorrências:

4.1- AGUARDADO O RETORNO DO ALVARÁ DA OBRA PELA PREFEITURA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O PELA MANHÃ E TEMPO BOM COM SOL NA PARTE DA TARDE . DIA 14/04

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
2 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA;
- LIMPEZA MANUAL DO TERRENO;
- DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS EXISTENTES.;
- PROTEÇÃO DAS CAIXAS DO SISTEMA DE HIDRÁULICO (SINALIZAÇÃO) .

4. Ocorrências:

4.1- RESPOSTA DO ALVARÁ PELA PREFEITURA, PARA COMPARECER A PREFEITURA A EMPRESA BASE E O MPF.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	55 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	16/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (15/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Chuvoso

Tarde: Claro - Nublado

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Revisão e execução das proteções, guarda-corpos dos shafts e poço do elevador;

Serviço de execução da limpeza do terreno (camada vegetal)

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF.

Continuamos no aguardo do retorno ao escritório de resposta sob etiqueta PR-RR- 00004940/21, com relação as divergências de alturas do contrapiso e piso elevado.

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Diário de Obras Basis Brasil (16/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Chuvoso

Tarde: Claro - Nublado

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução de Canteiro de Obras:

- Revisão e execução das proteções, guarda-corpos dos shafts e poço do elevador;

Serviço de execução da limpeza do terreno (camada vegetal)

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF.

Continuamos no aguardo do retorno ao escritório de resposta sob etiqueta PR-RR- 00004940/21, com relação as divergências de alturas do contrapiso e piso elevado.

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	55 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	16/4/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO NA PARTE DA MANHÃ / TEMPO NUBLADO NA PARTE DA TARDE. DIA:15/04/2021.					
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:					
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA					
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)					
1 MESTRE DE OBRA					
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO					
2 PEDREIRO					
1 SERVENTE					
3- ATIVIDADES REALIZADAS					
3.1- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA;					
- LIMPEZA MANUAL DO TERRENO;					
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.					
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO. DIA:16/04/2021.					
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:					
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA					
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)					
1 MESTRE DE OBRA					
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO					
2 PEDREIRO					
1 SERVENTE					
3- ATIVIDADES REALIZADAS					
3.1 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO;					
- LIMPEZA DO TERRENO COM ROÇADEIRA.					
4. OCORRÊNCIAS:					
4.1- AGUARDADO O RETORNO DO ALVARÁ DA OBRA PELA PREFETURA, VALE RESSALTAR QUE AS DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA FOI ENTREGUE A PREFEITURA.					
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.					

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	59 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	20/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (19/04/2021)

- 1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Nublado
Tarde: Claro - Nublado
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Bombeiro Hidráulico;
02 - Pedreiros;
3. Atividades realizadas:
Serviço de execução da limpeza do terreno (camada vegetal)
Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Ocorrências:
Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF.
Continuamos no aguardo do retorno ao escritório de resposta sob etiqueta PR-RR- 00004940/21, com relação as divergências de alturas do contrapiso e piso elevado.
Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Diário de Obras Basis Brasil 20/04/2021)

- 1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Nublado
Tarde: Claro - Nublado
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Bombeiro Hidráulico;
02 - Pedreiros;
3. Atividades realizadas:
Serviço de execução da limpeza do terreno (camada vegetal)
Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Ocorrências:
Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF.
Continuamos no aguardo do retorno ao escritório de resposta sob etiqueta PR-RR- 00004940/21, com relação as divergências de alturas do contrapiso e piso elevado.
Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	59 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	20/4/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. DIA 19/04/2021.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 ELETRICISTA
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO;
- LIMPEZA DO TERRENO COM ROÇADEIRA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. DIA 20/04/2021.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 ELETRICISTA
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO;
- RECOLHIMENTO DE VEGETAÇÃO PARA PAPA METRALHA.

4- OCORRÊNCIAS

4.1- ESPERANDO A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DA OBRA PELA PREFEITURA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	61
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	22/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Serviço de execução da limpeza do terreno (camada vegetal)

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF, assim desmobilizamos parte da equipe de mão-de-obra;

Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 ELETRICISTA

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO:

- RECOLHIMENTO DE VEGETAÇÃO PARA PAPA METRALHA;

- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA.

4- OCORRÊNCIAS

4.1- ESPERANDO A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DA OBRA PELA PREFEITURA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	65
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	26/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
Diário de Obras Basis Brasil (23/04/2021) 1.Condições Climáticas: Manhã: Claro - Praticável Tarde: Claro - Praticável 2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli: 01 - Administrativo de Obras 01 - Engenheiro Gestor de Contrato 01 - Mestre de Obras; 01 - Servente; 01 - Eletricista 01 - Pedreiros; 3. Atividades realizadas: Serviço de execução da limpeza do terreno (camada vegetal) Limpeza e organização do canteiro de obras. 4. Ocorrências: Serviços paralisados ainda na eminência de liberação do alvará da obra. No aguardo das adequações das documentações (ART e Projetos) por parte do MPF, assim desmobilizamos parte da equipe de mão-de-obra; Tivemos o acompanhamento dos serviços nas frentes de trabalho pelo fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira. Diário de Obras Basis Brasil (26/04/2021) 1.Condições Climáticas: Manhã: Chuvoso - Impraticável Externo. Tarde: Chuvoso - Impraticável Externo. 2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli: 01 - Administrativo de Obras 01 - Engenheiro Gestor de Contrato 01 - Mestre de Obras; 01 - Servente; 01 - Eletricista 01 - Pedreiros; 3. Atividades realizadas: Levantamento das descidas elétricas; Limpeza e organização do canteiro de obras. 4. Ocorrências: Tivemos no dia de hoje a liberação da taxa de pagamento de Alvará de Execução de Obra pela prefeitura; Acompanhando pela manhã os serviços nas frentes de trabalho o fiscal de obras, Engº Marcos S Madureira.					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	66 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	27/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (26/04/2021)

1.Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável Externo.

Tarde: Chuvoso - Impraticável Externo.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Nivelamento manual das áreas de calçada no perímetro do prédio (locais que não entram maquinas);

Limpeza e organização do canteiro de obras;

Descarte de material vegetal.

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	66 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	27/4/2021
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO DIA 23/04/2021

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO;
- RECOLHIMENTO DE VEGETAÇÃO PARA PAPA METRALHA;
- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA.

4- OCORRÊNCIAS

4.1- ESPERANDO A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DA OBRA PELA PREFEITURA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO DIA 26/04/2021

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO;
- RECOLHIMENTO DE VEGETAÇÃO PARA PAPA METRALHA;
- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA.

4- OCORRÊNCIAS

4.1- A PREFEITURA ENCAMINHOU O BOLETO PARA QUE A EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI FAÇA O PAGAMENTO E ASSIM POSSA SER LIBERADO O ALVARÁ DA OBRA, O BOLETO FOI LIBERADO NO DIA 26/04/2021 PELA MANHÃ AS 11H.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ / TEMPO NUBLADO PELA TARDE DIA 27/04/2021

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO;
- RECOLHIMENTO DE VEGETAÇÃO PARA PAPA METRALHA;
- LEVANTAMENTO DAS DESCIDAS ELÉTRICAS.

4- OCORRÊNCIAS

4.1- ESPERANDO O PAGAMENTO DO BOLETO PELA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, PARA LIBERAR O ALVARÁ DA OBRA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	67
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	28/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA	

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO	
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:	
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA	
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)	
1 MESTRE DE OBRA	
1 ELETRICISTA	
1 PEDREIRO	
1 SERVENTE	
3- ATIVIDADES REALIZADAS	
3.1 -NIVELAMENTO MANUAL NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO E ÁREA VERDE.	
4- Ocorrências	
4.1- ATÉ O MOMENTO ESPERANDO O PAGAMENTO DO BOLETO .	
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.	
Nivelamento manual	

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	68
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	29/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 PEDREIRO
1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1- SERVIÇO DE CARPINTARIA NA OBRA (PRATELEIRA DE MADEIRA E PINTURA DA MESMA)
4- OCORRÊNCIAS
4.1- ATÉ O MOMENTO ESPERANDO O PAGAMENTO DO BOLETO PARA A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ .
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	69 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	30/4/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (27/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável Externo.

Tarde: Chuvoso - Impraticável Externo.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Nivelamento manual das áreas de calçada no perímetro do prédio (locais que não entram maquinas);

Limpeza e organização do canteiro de obras;

Descarte de material vegetal.

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obras Basis Brasil (28/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável Externo.

Tarde: Chuvoso - Impraticável Externo.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Nivelamento manual das áreas de calçada no perímetro do prédio (locais que não entram maquinas);

Limpeza e organização do canteiro de obras;

Descarte de material vegetal.

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obras Basis Brasil (29/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável Externo.

Tarde: Chuvoso - Impraticável Externo.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Nivelamento manual das áreas de calçada no perímetro do prédio (locais que não entram maquinas);

Organização e execução de prateleiras nas áreas de estocagem;

Limpeza e organização do canteiro de obras;

Descarte de material vegetal.

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obras Basis Brasil (30/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável Externo.

Tarde: Chuvoso - Impraticável Externo.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
- 01 - Administrativo de Obras
 - 01 - Engenheiro Gestor de Contrato
 - 01 - Mestre de Obras;
 - 01 - Servente;
 - 01 - Eletricista
 - 01 - Pedreiros;



3. Atividades realizadas:
- Deslocamento e execução de tapumes na fachada da obra;
 - Limpeza e organização do canteiro de obras;
 - Descarte de material vegetal.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	69
OBRA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
EMPRESA					página 2/2
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	30/4/2021

Fiscalização	RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	Contratada
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO NA PARTE DA MANHÃ / TEMPO NUBLADO NA PARTE DA TARDE. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 PEDREIRO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1- SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DOS TAPUMES NO LIMITE DO TERRENO NA PARTE DA FRENTE. 4- OCORRÊNCIAS 4.1- SEGUNDO A EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI, VERIFICOU-SE QUE O BOLETO FOI GERADOR COM VALOR SUPERIOR. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.		

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	72
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	3/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (30/04/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Deslocamento e execução de tapumes na fachada da obra;

Limpeza e organização do canteiro de obras;

Acondicionamento dos materiais de limpeza e descartáveis no almoxarifado (orientações com planilha de controle de estoque).

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 ELETRICISTA

2 PEDREIRO

2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DOS TAPUMES NO LIMITE DO TERRENO NA PARTE DA FRENTE.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	73
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	4/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
2 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DOS TAPUMES NO LIMITE DO TERRENO NA PARTE DA FRENTE.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	74
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	5/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DOS TAPUMES NO LIMITE DO TERRENO NA PARTE DA FRENTE;
- SERVIÇO DE LIMPEZA DA OBRA NA ÁREA INTERNA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	75 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	6/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil (04/05/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Deslocamento e execução de tapumes na fachada da obra;

Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obras Basis Brasil (05/05/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Deslocamento e execução de tapumes na fachada da obra;

Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.

Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obras Basis Brasil (06/05/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

02 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Deslocamento e execução de tapumes na fachada da obra;

Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.

Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	75 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	6/5/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1- SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DOS TAPUMES NO LIMITE DO TERRENO NA PARTE DA FRENTE;
- SERVIÇO DE LIMPEZA DA OBRA NA ÁREA INTERNA
- NIVELAMENTO MANUAL DAS ÁREA DO ESTACIONAMENTO E JARDIM.

4- OCORRÊNCIAS

4.1- FOI VERIFICADOR QUE O ESGOTO PROVISÓRIO ESTAVA ESCORRENDO A CÉU ABERTO;
- DE ACORDO COM O PROJETO UMA ÁREA DE JARDIM ESTAVA SENDO ATERRADA COM RESTO DE METRALHA. FOI COMUNICADO AS RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO;
-ATÉ O MOMENTO ESPERANDO O PAGAMENTO DO BOLETO PARA A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ .

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	76
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	7/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil

1.Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável
Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
02 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:
Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.
Rompimento, retirada e descarte de argamassa.
Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:
Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	79
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	10/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável
Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
02 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:
Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.
Rompimento, retirada e descarte do acúmulo de argamassa ao redor do prédio.
Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:
Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO. DIA 07/05/21

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA OBRA NA ÁREA INTERNA
- NIVELAMENTO MANUAL DAS ÁREA DO ESTACIONAMENTO E JARDIM.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO. DIA 10/05/21

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - NIVELAMENTO MANUAL DAS ÁREA DO ESTACIONAMENTO E JARDIM;
- ROMPIMENTO, RETIRADA E DESCARTE DE ACÚMULO DE ARGAMASSA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	80
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	11/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL PELA TARDE. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 PEDREIRO 2 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - NIVELAMENTO MANUAL DAS ÁREA DO ESTACIONAMENTO E JARDIM; - ROMPIMENTO, RETIRADA E DESCARTE DE ACÚMULO DE ARGAMASSA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	81
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	12/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL PELA TARDE.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - NIVELAMENTO MANUAL DAS ÁREA DO ESTACIONAMENTO E JARDIM;
- LIMPEZA DA OBRA NA ÁREA INTERNA
- ROMPIMENTO, RETIRADA E DESCARTE DE ACÚMULO DE ARGAMASSA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	82
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	13/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL PELA TARDE. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 PEDREIRO 2 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL DA OBRA NA ÁREA EXTERNA; - LIMPEZA MANUAL COM DESCARTE DE ACÚMULO DE ARGAMASSA NA ÁREA INTERNA NO POÇO DO ELEVADO. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	83 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	14/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil - 11/05/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.

Rompimento, retirada e descarte do acúmulo de argamassa ao redor do prédio.

Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obras Basis Brasil - 12/05/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.

Rompimento, retirada e descarte do acúmulo de argamassa ao redor do prédio.

Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obras Basis Brasil - 13/05/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.

Rompimento, retirada e descarte do acúmulo de argamassa ao redor do prédio.

Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obras Basis Brasil - 14/05/2021

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
02 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pedreiros;



3. Atividades realizadas:
Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da o
Rompimento, retirada e descarte do acúmulo de argamassa ;
Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:
Sem ocorrências.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	83
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	Fiscalização	UNIDADE	PRRR	Contratada
INÍCIO	22/02/2021		PRAZO	22/02/2023	
					página 2/2
					14/5/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL PELA TARDE.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- NIVELAMENTO MANUAL DAS ÁREA DO ESTACIONAMENTO;
- LIMPEZA MANUAL COM DESCARTE DE ACÚMULO DE ARGAMASSA NA ÁREA EXTERNA.

4- OCORRÊNCIAS

4.1 - ATÉ O MOMENTO ESPERANDO O PAGAMENTO DO BOLETO PARA A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	86
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	17/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Revisão das cotas de nível de passeio (calçadas)

Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.

Rompimento, retirada e descarte do acúmulo de argamassa ao redor do prédio.

Levantamento da hidráulica (esgoto) em todo empreendimento.

Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

3 PEDREIRO

2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;

- NIVELAMENTO MANUAL DAS ÁREA DO ESTACIONAMENTO;

- LIMPEZA MANUAL COM DESCARTE DE ACÚMULO DE ARGAMASSA NA ÁREA EXTERNA.

- LEVANTAMENTO DA HIDRÁULICA

- REVISÃO DAS COTAS DE NÍVEL DO PASSEIO DA CALÇADA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	87
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	18/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obras Basis Brasil

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável

Tarde: Nublado - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Revisão das cotas de nível de passeio (calçadas)

Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra.

Rompimento, retirada e descarte do acúmulo de argamassa ao redor do prédio.

Levantamento da hidráulica (esgoto) em todo empreendimento.

Limpeza e organização do canteiro de obras;

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

3 PEDREIRO

2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;

- LIMPEZA MANUAL DA ÁREA EXTERNA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	88
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	19/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável
Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
02 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:
Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra;
Levantamento das instalações hidráulicas em todo empreendimento;
Retirada manual da camada vegetal;
Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:
Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
3 PEDREIRO
2 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- LIMPEZA MANUAL DA ÁREA EXTERNA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	89
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	20/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 PEDREIRO 2 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - LIMPEZA MANUAL DA ÁREA EXTERNA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	90 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	21/5/2021
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra referente ao dia 20/05/2021:

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras

- 1.Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável
Tarde: Claro - Praticável
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
02 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pedreiros;
3. Atividades realizadas:
Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra;
Levantamento das instalações hidráulicas em todo empreendimento;
Retirada manual da camada vegetal;
Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Ocorrências:
Sem ocorrências.

Diário de Obra referente ao dia 21/05/2021:

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras

- 1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável
Tarde: Claro - Praticável
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
02 - Pedreiros;
3. Atividades realizadas:
Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra;
Levantamento das instalações hidráulicas em todo empreendimento;
Retirada manual da camada vegetal;
Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Ocorrências:
Sem ocorrências.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	90 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	21/5/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
2 PEDREIRO
1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- LIMPEZA MANUAL DA ÁREA EXTERNA.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	93
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	24/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ / TEMPO CHUVOSO NA PARTE DA TARDE. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 PEDREIRO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL DA ÁREA EXTERNA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	94 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	25/5/2021
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra referente ao dia 24/05/2021:

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras

- 1.Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável
Tarde: Nublado - Praticável
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
02 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pedreiros;
3. Atividades realizadas:
Nivelamento manual das áreas de passeio no perímetro da obra;
Levantamento das instalações hidráulicas em todo empreendimento;
Retirada manual da camada vegetal;
Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Ocorrências:
Sem ocorrências.

Diário de Obra referente ao dia 24/05/2021:

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras

- 1.Condições Climáticas:
Manhã: Chuvoso - Praticável (Serviçosbinterno)
Tarde: Nublado - Praticável
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Administrativo de Obras
01 - Engenheiro Gestor de Contrato
01 - Mestre de Obras;
02 - Servente;
01 - Eletricista
03 - Pedreiros;
3. Atividades realizadas:
Levantamento das cotas de níveis da escada;
Retirada manual da camada vegetal;
Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Ocorrências:
Sem ocorrências.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	94 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	25/5/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ / TEMPO NUBLADO NA PARTE DA TARDE.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 PEDREIRO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - LEVANTAMENTO DAS COTAS DE NÍVEIS DA ESCADA.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	96 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	27/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

Diário de Obra referente ao dia 26/05/2021:

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável externo.

Tarde: Chuvoso - Impraticável externo.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Levantamento das instalações hidráulicas (pluviais) em todo empreendimento;

Levantamento das cotas de níveis das escadas;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Diário de Obra referente ao dia 27/05/2021:

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável externo.

Tarde: Chuvoso - Impraticável externo.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Administrativo de Obras

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Levantamento das instalações hidráulicas (pluviais) em todo empreendimento;

Levantamento das cotas de níveis das escadas;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	96 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	27/5/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO. DIA 26/05/2021

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
2 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- LEVANTAMENTO DAS COTAS DE NÍVEIS DA ESCADA;
- LEVANTAMENTO HIDRÁULICO DA OBRA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO NUBLADO PELA TARDE. DIA 27/05/2021

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRA
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
2 PEDREIRO
1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- LEVANTAMENTO DAS COTAS DE NÍVEIS DA ESCADA;
- LEVANTAMENTO DE HIDRÁULICA DA OBRA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	97
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	28/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI Diário de Obras 1.Condições Climáticas: Manhã: Nublado - Praticável. Tarde: Nublado - Praticável. 2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli: 01 - Engenheiro Gestor de Contrato 01 - Mestre de Obras; 02 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pedreiros; 3. Atividades realizadas: Levantamento das instalações hidráulicas em todo empreendimento: Água fria, Esgoto e Pluviais. Levantamento das cotas de níveis das escadas; Limpeza e organização do canteiro de obras. 4. Ocorrências: Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 PEDREIRO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO COM VALA PARA ESCOAR ÁGUA DA OBRA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	100
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	31/5/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI Diário de Obras 1.Condições Climáticas: Manhã: Claro - Praticável. Tarde: Claro - Praticável. 2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli: 01 - Engenheiro Gestor de Contrato 01 - Mestre de Obras; 02 - Servente; 01 - Eletricista 03 - Pedreiros; 3. Atividades realizadas: Levantamento das instalações hidráulicas em todo empreendimento: Água fria, Esgoto e Pluviais. Levantamento das cotas de níveis das escadas; Limpeza e organização do canteiro de obras. 4. Ocorrências: Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRA 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 PEDREIRO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA MANUAL DA OBRA NA ÁREA EXTERNA; - LEVANTAMENTO DAS COTAS DE NÍVEIS DA ESCADA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	101
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	1/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável (Interno)

Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Levantamento das instalações elétricas em todo empreendimento;

Levantamento das cotas de níveis das escadas;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO NUBLADO NA PARTE DA TARDE.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRA

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

2 PEDREIRO

1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - ESCAVAÇÕES MANUAL;

- LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA;

- LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	102
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	2/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - ESCAVAÇÕES MANUAL.
4. Ocorrências:
4.1 - FOI APRESENTADO O BOLETO PAGO DO ALVARÁ PELA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	107
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	7/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 PEDREIRO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - DESOBSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ELÉTRICO DA ÁREA INTERNA (TUBULAÇÃO RIGIDA PVC ENTERRADO NA ÁREA INTERNA DO PRÉDIO).
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	108 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	8/6/2021
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras (07/06/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Levantamento das instalações elétricas em todo empreendimento;

Desobstrução das infras Elétricas existentes;

Retirada manual da camada vegetal;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Sem ocorrências.

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras (08/06/2021)

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável

Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

03 - Pedreiros;

3. Atividades realizadas:

Levantamento das instalações elétricas em todo empreendimento;

Desobstrução das infras Elétricas existentes;

Desobstrução das infras Hidráulicas (Esgoto) existentes;

Retirada manual da camada vegetal;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências:

Entregue ao fiscal de obras, Engº Marcos Eduardo Madureira o "As Built" das canaletas que liga o Edifício sede a casa de máquinas, onde foi executado diferente do projetado.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	108 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	8/6/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL PELA MANHÃ E TEMPO CHUVOSO NA PARTE DA TARDE.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
2 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS:

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO (ÁREA INTERNA DO PRÉDIO);
- LIMPEZA MANUAL DA ÁREA EXTERNA;

4. OCORRÊNCIAS:

ENTREGA DO CROQUI DA CANALETAS `` EXECUTADO DIFERENTE DO PROJETOS``.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	109
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	9/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

02 - Serventes;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiros

3. Atividades realizadas:

Desobstrução das infras Elétricas existentes;

Desobstrução das infras Hidráulicas (Esgoto) existentes;

Escavação das Infras pluviais;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências: Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

2 PEDREIRO

1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;

- DESOBSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ELÉTRICO DA ÁREA INTERNA (TUBULAÇÃO RÍGIDA PVC ENTERRADO NA ÁREA INTERNA DO PRÉDIO).

- ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAIS;

- DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	110
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	10/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Claro - Praticável

Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

01 - Serventes;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiros;

01 - Almoxarife;

01 - Técnico de Segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:

Desobstrução das infras Elétricas existentes;

Desobstrução das infras Hidráulicas (Esgoto) existentes;

Escavação das Infras pluviais;

Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências: Sem ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRAS

1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 ALMOXARIFE

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

2 PEDREIRO

1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;

- ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAIS.

4. OCORRÊNCIAS:

4.1 - FOI ENVIADO PARA EMAIL DA BASE O ALVARÁ DA OBRA, MAIS FOI VERIFICADO PELA EMPRESA QUE O ENDEREÇO ESTAVA ERRADO.

ENVIADO PELA PREFEITURA NO DIA 10/06/2021.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	111
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	11/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL NA PARTE DA TARDE.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 PEDREIRO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAIS; - FAZENDO FECHAMENTO NOS SHAFT COM TAPUME NOS PAVIMENTOS DO PRÉDIO; - FAZENDO INSTALAÇÕES ELÉTRICA PROVISORIA DA ESCADA.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	114
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	14/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI					
Diário de Obras referente ao dia 11/06/2021					
1.Condições Climáticas: Manhã: Nublado - Praticável Tarde: Claro - Praticável.					
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli: 01 - Engenheiro Gestor de Contrato; 01 - Administrativo de Obras; 01 - Mestre de Obras; 01 - Serventes; 01 - Eletricista 01 - Bombeiro Hidráulico; 02 - Pedreiros; 01 - Almoxarife; 01 - Técnico de Segurança no trabalho.					
3. Atividades realizadas: Serviço de execução de guarda-corpo nos shafts Desobstrução das infras Hidráulicas (Esgoto) existentes; Escavação das Infras pluviais; Limpeza e organização do canteiro de obras.					
4. Ocorrências: Sem ocorrências.					
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI					
Diário de Obras referente ao dia 14/06/2021					
1.Condições Climáticas: Manhã: Nublado - Praticável Tarde: Nublado - Praticável.					
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli: 01 - Engenheiro Gestor de Contrato; 01 - Administrativo de Obras; 01 - Mestre de Obras; 01 - Serventes; 01 - Eletricista 01 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Pedreiro; 01 - Almoxarife; 01 - Técnico de Segurança no trabalho.					
3. Atividades realizadas: Serviço de execução de guarda-corpo nos shafts Desobstrução das infras Hidráulicas (Esgoto) existentes; Escavação das Infras pluviais; Levantamento das instalações de Incêndio: Foi atestado que a tubulação existente no térreo que leva ao reservatório, diverge do projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. Limpeza e organização do canteiro de obras.					
4. Ocorrências: Sem ocorrências.					

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	115 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	15/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Chuvoso - Praticável Interno.
Tarde: Nublado - Praticável.
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Serventes;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
3. Atividades realizadas:
Desobstrução das infras Hidráulicas (Esgoto) existentes;
Levantamento das instalações de Incêndio;
Foi atestado que a tubulação existente no térreo que leva ao reservatório, diverge do projeto aprovado no Corpo de Bombeiros;
Serviço de execução de furação e demolição para passagem de tubulação de incêndio e Água Pluvial na área do Auditório.
Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Ocorrências: Sem ocorrências.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	115 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	15/6/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. DIA 14/06/2021

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRAS
1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
1 ALMOXARIFE
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAIS;
- FAZENDO FECHAMENTO NOS SHAFT COM TÁPUME NOS PAVIMENTOS DO PRÉDIO;
- LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO;

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO. DIA 15/06/2021

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRAS
1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
1 ALMOXARIFE
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 PEDREIRO
1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FURAÇÃO E DEMOLIÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO E ÁGUA PLUVIAL NA ÁREA DO AUDITÓRIO;
- LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	116
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	16/6/2021
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Praticável Interno.

Tarde: Nublado - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

01 - Serventes;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

01 - Pedreiro;

01 - Almoxarife;

3. Atividades realizadas:

- Retirada manual da camada vegetal manual nas áreas onde as máquinas não acessam.

- Rompimento, furação e demolição de alvenaria para passagem de tubulações de incêndio e pluvial ;

- Serviço de execução de furação e demolição para passagem de tubulação de incêndio e Água Pluvial na área do Auditório.

- Execução de tapumes;

- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências: Técnico de Segurança afastado com suspeita de COVID 19.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL NA PARTE DA TARDE.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRAS

1 ALMOXARIFE

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 PEDREIRO

1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;

- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FURAÇÃO E DEMOLIÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO E ÁGUA PLUVIAL NA ÁREA DO AUDITÓRIO;

- LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO.

- EXECUÇÃO DOS TAPUMES NO LIMITE DO LOTE;

- RETIRADA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO.

4.0 - OCORRÊNCIAS

- TÉCNICO SEGURANÇA AFASTADO COM SUSPEITA COM COVID -19, E A ADMINISTRATIVA DA OBRA JÁ TEVE E SE RECUPEROU DO COVID-19.

- VERIFIQUEI TAMBÉM FALTA DE EPIs PELO OS FUNCIONARIOS.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	117
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	17/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

- 01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
- 01 - Administrativo de Obras;
- 01 - Mestre de Obras;
- 01 - Serventes;
- 01 - Eletricista
- 01 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Pedreiro;
- 01 - Almoxarife;

3. Atividades realizadas:

- Retirada manual da camada vegetal do terreno.
- Execução de tapumes:
- Substituição das placas de madeira por placas metálicas.
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Ocorrências: Sem Ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL NA PARTE DA TARDE.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

- 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
- 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
- 1 MESTRE DE OBRAS
- 1 ALMOXARIFE
- 1 ELETRICISTA
- 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 PEDREIRO
- 1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

- 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- EXECUÇÃO DOS TAPUMES NO LIMITE DO LOTE;
- LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO.

4.0 - OCORRÊNCIAS

- COBREI AO ENGENHEIRO WALTER, A PLANILHA PARA CONFERIR OS SERVIÇO E PODER FAZER O RELATÓRIO DE MEDIÇÃO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	118
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	18/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Praticável.

Tarde: Nublado - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

01 - Serventes;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

01 - Pedreiro;

01 - Almoxarife;

3. Atividades realizadas:

- Retirada manual da camada vegetal do terreno;

- Furação, Rompimento e Demolição para a passagem de tubulações de incêndio e pluvial;

- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Formaliza por e-mail ao Fiscal de Obras, Engº Marcos Eduardo Madureira os projetos faltantes:

Projetos de SPDA;

Projetos Fotovoltaico.

4. Ocorrências: Sem Ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL NA PARTE DA TARDE.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA

1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)

1 MESTRE DE OBRAS

1 ALMOXARIFE

1 ELETRICISTA

1 BOMBEIRO HIDRÁULICO

1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;

- LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO.

4.0 - OCORRÊNCIAS

- PEDREIRO AFASTADO COM SUSPEITA COM COVID -19;

- COBREI AO ENGENHEIRO WALTER, A PLANILHA PARA CONFERIR OS SERVIÇO E PODER FAZER O RELATÓRIO DE MEDIÇÃO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	121
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	22/02/2021	PRAZO	22/02/2023	DATA	21/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

- 01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
- 01 - Administrativo de Obras;
- 01 - Mestre de Obras;
- 01 - Serventes;
- 01 - Eletricista
- 01 - Bombeiro Hidráulico;
- 01 - Pedreiro;
- 01 - Almoxarife;
- 01 - Encarregado;
- 01 - Apontador;
- 01 - Operador de Máquinas;

3. Atividades realizadas:

- Retirada manual da camada vegetal do terreno em áreas cobertas sem acesso mecânico;
- Retirada mecânica da camada vegetal do terreno, conforme cronograma apontado;
- Adequações de hidráulica (esgoto), no canteiro de obras,
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

4. Ocorrências: Sem Ocorrências.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

- 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
- 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
- 1 ENGº CIVIL(CAMPO)
- 1 MESTRE DE OBRAS
- 1 ENCARREGADO DE OBRA
- 1 OPERADOR DE MÁQUINAS
- 1 APONTADOR
- 1 ALMOXARIFE
- 1 ELETRICISTA
- 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
- 1 SERVENTE

3- ATIVIDADES REALIZADAS

- 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
 - LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO;
 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO
 - LIMPEZA DO TERRENO COM A MÁQUINA.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada
