



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

RELATÓRIO TÉCNICO 2º MEDIÇÃO



RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2020
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 01/2021

INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 22 de Fevereiro de 2021

PERÍODO DO RELATÓRIO: De 23 de Junho até 22 de Julho de 2021 (Serviço previsto para a segunda medição: movimentação de terra com terraplanagem). Porém os serviços foram concluídos somente no dia 20 de agosto com 21 dias de atraso.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OBRA - MPF

Nome: Eng. Marcos Eduardo Silva Madureira

ART: Cargo-Função nº RR20200078632 / Obra-Serviço nº RR20200078641.

Telefone: (95) 3198-2026

E-mail: marcoseduardo@mpf.mp.br

COMISSÃO FISCAL DO CONTRATO (ART. 67 DA LEI 8.666/93)

Nome: Nazareno Nunes Rodrigues / Hugo Habib Vieira Mendes / Marcos Eduardo Silva Madureira

Portaria: GABPC/PRRR nº62/2020

Telefone: (95) 3198-2026 / 2005 / 2000 / 2019

E-mail: prrr-fiscalizacao@mpf.mp.br

1. ESCOPO E LOCAL

DADOS DO CONTRATO

Nº Contrato: 10/2020

PPA/LOA: AÇÃO 110E

Empresa Contratada: BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – CNPJ 08.811.661/0001-09

Matrícula CEI da Obra: 51.235.89823/71

Valor Atual do Contrato: R\$ 19.776.031,50 (dezenove milhões setecentos setenta e seis mil, trinta e um reais e cinquenta centavos)

Valor com 1º Reajuste: R\$ 21.964.945,08 (vinte um milhões novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

Percentual de Reajuste: 11.0685%

Saldo de Empenho: 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) – 2020NE000243

Local/UF: Boa Vista – RR

Responsável Técnico: Mauricio Gonçalves – ART de Execução: RR20210079913

Corresponsável Técnico: Walter Borges – Co-Responsavel RR20210079913 / Obra-Serviço nº RR20210083208

Nota Fiscal Eletrônica de Referência: no valor de R\$ 138.502,62(Cento e trinta e oito mil quinhentos e dois reais e sessenta e dois centavos)

DADOS DA EXECUÇÃO DA OBRA

Medição nº	% previsto	% Executado	% Previsto Acumulado	% Executado Acumulado
1	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
2	0,63%	0,63%	1,04%	1,04%
TOTAL EXECUTADO				1,04%
TOTAL A EXECUTAR				98,96%

Identificação processo de fiscalização: 1.32.000.000611/2020-41

Tipo de obra: Prédio Público.

Objeto da fiscalização: Construção da nova sede da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

Período abrangido pela fiscalização: 22/06/2021 a 22/07/2021 (Documental – preliminar e Técnico - Definitivo)

2. ATIVIDADES DO PERÍODO

Foi fiscalizado e acompanhado as atividades da empresa BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI que nesse período começou a trabalhar a movimentação de terra, conforme Relatório Técnico, sendo acompanhadas as etapas não abrangidas por serviços de engenharia propriamente dita, tais como: pagamentos de taxas, limpeza, consignando com o início dos serviços de engenharia (alocação de máquinas e equipamentos, contratações de serviços devidamente subcontratados).

Todas as atividades de engenharia do período encontram-se lançadas no Diário de Obras do MPF, bem como todos os registros fotográficos dos serviços realizados encontram-se em anexo em mídia digital. De acordo com o cronograma as atividades foram concluídas com atraso.

3.CONSTATAÇÕES NEGATIVAS NA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO

Constatação do Período nº 1: A BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI está tendo muitos problemas para cumprir o cronograma devido a falta de recursos financeiros em alguns momento, por exemplo, as vezes é preciso para o serviço por falta de óleo diesel usados nas máquinas.

Constatação do Período nº 2: Até o momento foi observado que não chegou nenhuma remessa de material na obra.

4. OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

I) A empresa contratada solicitou a devida autorização de retirada da vegetação existente no canteiro de obra junto ao órgão competente mais até o momento não compareceu ao local da obra.

II) O item 01.03, 03.01.01 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator de esteiras, ficou acordado com o engenheiro Walter Borges que caso seja preciso fazer novamente o serviço a empresa fara sem cobrar em planilha.

III) Foi constatado algumas situações irregulares por parte de funcionário na obra, a execução de serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), a empresa não mantém no almoxarifado material de EPIs de reserva.

IV) Constatou-se a existência de funcionário em desvio de função. Após a advertência e aplicação de multa a empresa solucionou o problema.

V) Adequação nas cotas de nível na área da calçada de passeio, entre o prédio principal e a Subestação, devido a discrepância nas cotas existentes no projeto original.

VI) Depois da limpeza da camada vegetal, retirar todo o entulho do terreno, antes de iniciar a terraplanagem.

5. CONCLUSÃO

Conforme dados coletados diariamente do Diário de Obras, nas fiscalizações de campo, análise documental e em todo mais aqui exposto conclui-se que a empresa contratada executou os serviços listados no cronograma, mas com 21 dias de atraso e com dificuldades financeiras.

6 ANEXOS

a) Relatório fotográfico do período

7 LOCAL E DATA DO RELATÓRIO

Boa Vista – Roraima, 20 de Agosto de 2021

8 FÉ DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2021

Declaramos que as metas estabelecidas na 2º etapa do contrato definida no Cronograma Físico Financeiro não foram atendidas.

Marcos Eduardo Silva Madureira
Engenheiro Civil/Membro da Comissão

Nazareno Nunes Rodrigues
Membro da Comissão

Hugo Habib Vieira Mendes
Membro da Comissão

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas.**

9 PARA USO DO SECRETÁRIO ESTADUAL

() Não foram identificados vícios.

() Ver Nota Técnica ou Despacho constante da
de nº. _____

Igor José Barbosa Duarte Lopes
Secretário Estadual

Os relatórios devem estar devidamente datados, assinados pelo técnico responsável e pelo Fiscal do contrato, e com **rubricas em todas as suas folhas.**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA-PR/RR**

**RELATÓRIO TÉCNICO
MEDIÇÃO 2º**

10.0 A segunda medição foi efetuada pelo fiscal da obra, engenheiro civil da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Marcos Eduardo Silva Madureira, matrícula 31.143, no dia 09/08/2021.

10.1 Conforme previsto em cronograma os serviços foram executados totalmente, mas com 21 dias de atraso e com dificuldades financeiras.

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado <i>in loco</i>	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / LIMPEZA DO TERRENO				
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS.	50,00%	50,00%	X	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ESCAVAÇÕES				
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE.	25,00%	25,00%	X	
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ATERRO E REATERRO				
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	25,00%	25,00%	X	
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	25,00%	25,00%	X	
SERVIÇOS GERAIS /LIMPEZA DA OBRA				


LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA.	0,63%	0,63%		X
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³.	5,00%	5,00%		X
SERVIÇOS GERAIS / TAXAS DE CONSTRUÇÃO				
CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES.	5,00%	5,00%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / INSUMOS PÚBLICOS				
INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA.	0,63%	0,63%		X
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.	0,63%	0,63%		X


11.0 Segue abaixo a planilha contendo o resumo dos serviços efetivamente realizados e pactuados para finalização do contrato nº 10/2020.

					M05			
OBRA: Obra Edificação da Sede da Procuradoria de Roraima - rev 00					2ª MEDIÇÃO			
CIDADE: BOA VISTA - RR					0,63% R\$ 124.700,16			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNC	QUANT.	TOTAL COM BDI	Qtde	%	R\$	% Acumuladq
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					25,0913644186456%	110.535,39	
03.01	LIMPEZA DO TERRENO						804,98	
03.01.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M²	12.921,00	0,12	6.460,50	50,0%	804,98	100,0%
03.02	ESCAVAÇÕES						277,00	
03.02.01	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M³	500,00	2,22	125,00	25,0%	277,00	25,0%
03.03	ATERRO E REATERRO						109.453,41	
03.03.01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M³	7.127,20	45,34	1.781,80	25,0%	80.795,50	25,0%
03.03.02	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M³	3.209,60	35,72	802,40	25,0%	28.657,92	25,0%
14	SERVIÇOS GERAIS					0,816843859868167%	1.693,20	
14.01	TRANSPORTE DE MATERIAL						0,00	
14.01.01	TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS	M³	780,00	55,13		0,0%	R\$ -	0,0%
14.02	LIMPEZA DA OBRA						1.413,74	
14.02.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	334,22	0,63	0,6%	R\$ 210,75	1,0%
14.02.02	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M³	280,00	85,93	14,00	5,0%	R\$ 1.203,00	10,0%
14.05	TAXAS DE CONSTRUÇÃO						279,46	
14.05.02	CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	500,00	11,18	25,00	5,0%	R\$ 279,46	10,0%
15	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					0,6306%	12.471,56	
15.01	INSUMOS PÚBLICOS						398,39	
15.01.01	INSUMOS PÚBLICOS - CANTEIRO DE OBRA	%	100,00	631,80	0,63	0,6%	R\$ 398,39	1,0%
15.02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						12.073,17	
15.02.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	19.146,68	0,63	0,6%	R\$ 12.073,17	1,0%
TOTAL GERAL (c/ BDI):					2ª MEDIÇÃO			
					R\$ 124.700,16			
PARCIAL COM REAJUSTE					R\$ 138.502,62			
ACUMULADO COM REAJUSTE					R\$ 227.923,68			

12.0 - ANEXOS FOTOGRÁFICOS

12.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA

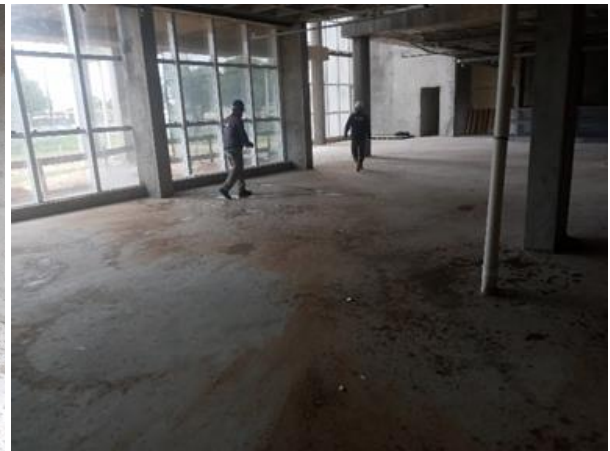

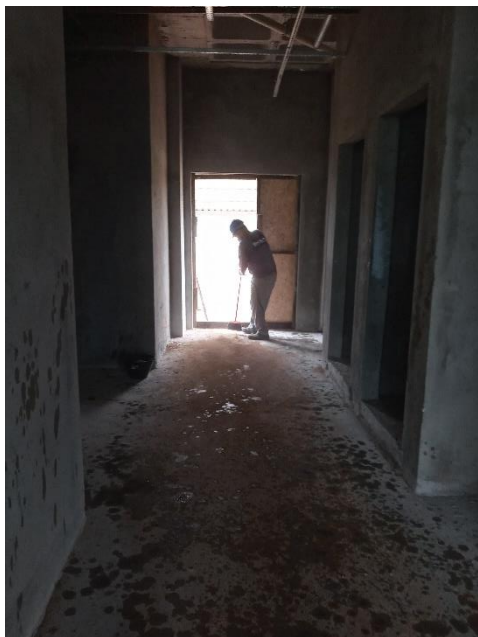

12.2 – DESCARTE DE MATERIAL EM CONTAINER DE PAPA-ENTULHO





12.3 – MARCAÇÃO DE COTA DE NÍVEL







12.4 – MATERIAL PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ATERRO)				
CAÇAMBA	COR	QUANTIDADE BARRO	UNIDADE m³	TOTAL VOLUME m3
PLACA: NOM - 9677	BRANCA	3	15,60m³	46,80m³
PLACA: NAO - 5803	AZUL	3	15,42m³	46,26m³
PLACA: JWO – 1C71	BRANCA	8	17,64m³	141,12m³
PLACA: IKK - 2457	BRANCA	6	13,80m³	82,80m³
PLACA: NUL - 4140	BRANCA	6	15,00m³	90,00m³
PLACA: JXE - 2784	BRANCA	5	15,50m³	77,50m²
PLACA: FJA - 2781	BRANCA	3	17,46m³	52,38m³
PLACA: JXK - 9067	PRATA	1	14,17m³	14,17m³
PLACA: NAH - 3582	VINHO	2	13,84m³	27,68m³
PLACA: LRQ – 8B98	BRANCA	2	17,24m³	34,48m³
PLACA: JXG - 3192	AMARELO	2	15,16m³	30,32m³
PLACA: NAR - 5946	BRANCA	1	14,73m³	14,73m³
		QUANTIDADE TOTAL		
		42		
TOTAL DO VOLUME DE ATERRO EM m³				658,24m³

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ATERRO)				
CAÇAMBA	COR	QUANTIDADE PIÇARRA	UNIDADE m³	TOTAL VOLUME m3
PLACA: IKK - 2457	BRANCA	2	13,80m³	27,60m³
PLACA: NUL - 4140	BRANCA	2	15,00m³	30,00m³
*PLACA: NUL - 4140	BRANCA	1	12,49m³	12,49m³
PLACA: JXE - 2784	BRANCA	2	15,50m³	31,00m³
PLACA: FJA - 2781	AZUL	7	17,46m³	122,22m³
PLACA: JXK - 9067	PRATA	4	14,17m³	56,68m³
PLACA: NAH - 3582	VINHO	5	13,84m³	69,20m³
PLACA: LRQ – 8B98	BRANCA	6	17,24m³	103,44m³
*PLACA: LRQ – 8B98	BRANCA	1	14,74m³	14,74m³
PLACA: JXG - 3192	AMARELO	5	15,16m³	75,80m³
*PLACA: JXG - 3192	AMARELO	1	13,26m³	13,26m²
PLACA: NOL – 2A88	VERMELHO	4	14,46m³	57,84m³
PLACA: JXI – 2034	VERMELHO	4	15,43m³	61,72m³
PLACA: JWZ – 1658	BRANCA	3	12,92m³	38,76m³
PLACA: 8E50 – 1658	VINHO	2	16,81m³	33,62m³
PLACA: NAR - 5946	PRATA	5	14,73m³	73,65m³
PLACA: NAM - 3895	BRANCA	3	15,81m³	47,43m³
PLACA: PHK – 2D05	BRANCA	1	17,80m³	17,80m³
		QUANTIDADE TOTAL		
		58		
TOTAL DO VOLUME DE ATERRO EM m³				887,25m³


* Cubagem de Aterro abaixo do Volume da Caçamba.

12.5 - COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR SAPINHO







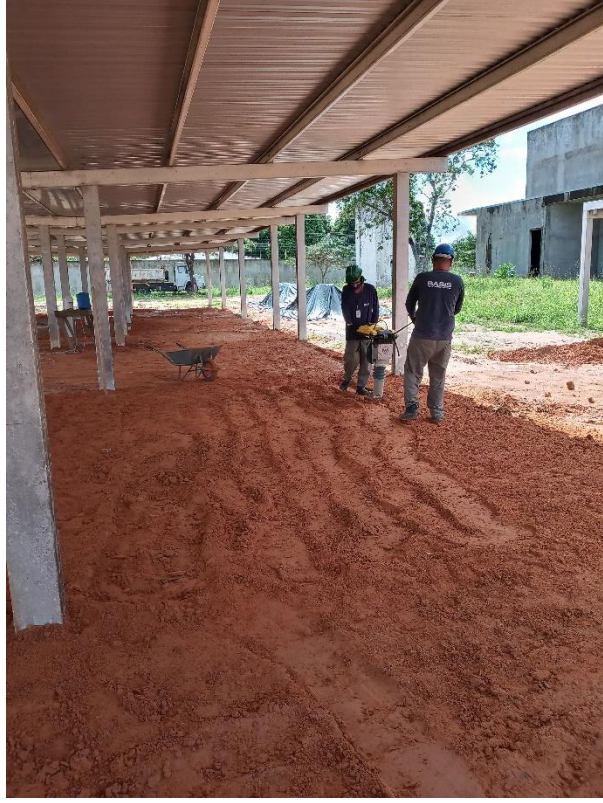



12.6 - TERRAPLANAGEM















12.7 - PLANTA DE LOCAÇÃO DAS AMOSTRAS DO SOLO



12.8 - RESULTADO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO

Conpav Consultoria Ltda		Densidade "In Situ" Método Frasco de Areia DNER ME-092/94					
Obra: MPE		Trecho:		Procedência: <u>BASE</u>		Estacas Liberada:	
Subtrecho:							
Segmento							
Furo	Nº						
Profundidade (m)	de a	0,18 0,14 0,18		0,20			
Data	-	20/08/21					
Estaca	-						
Posição	E - X - D	D D E E					
Peso do frasco com areia	A	7000 7000 7000 7000					
Depois (g)	B	4510 5064 4651 4400					
Diferença (g)	A - B	2490 1936 2349 2600					
Funil	Nº						
Peso da areia no funil (g)	C	516 516 516 516					
Peso da areia no furo (g)	A - B - C = P	1975 1440 1833 2084					
Densidade da areia (g/dm³)	d	1362 1362 1362 1362					
VOLUME do furo (dm³)	$V = \frac{P}{d}$	1449 1057 1346 1530					
Umidade	h %	10,2 10,4 10,8 11,2					
Peso do solo úmido (g)	Ph	3288 2435 3040 3500					
Peso do solo seco (g/dm³)	$P_s = \frac{P_h}{100 + h}$	2981 2206 2741 3147					
Densidade do solo seco (g/dm³)	$D_s = \frac{P_s}{V}$	2097 2087 2037 2057					
Ensaio, laboratório	Registro	Nº					
	Densid. Máxima (g/m³)	Dm		2095 2095 2095 2095			
	Umidade ótima	H %		12,4 12,4 12,4 12,4			
Grau de compactação	% = $\frac{D_s}{D_m}$	100% 99,6% 97,2% 98,2%					
UMIDADE							
Cápsula	Nº						
Peso do solo úmido (g)	Ph₁						
Peso do solo seco (g)	Ps₁						
Peso da água (g)	Pa = Ph₁ - Ps₁						
Umidade	h% = $\frac{Pa}{Ps_1}$						
Obs:							
Fiscal de Campo							

1 AMOSTRA DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO (100%)



2 AMOSTRA DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO (99,6%)



3 AMOSTRA DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO (97,2%)



4 AMOSTRA DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO (98,2%)



13.0 Os indicadores, considerados para apuração da pontuação, terão como referência as obrigações contratuais da empresa contratada, a qualidade e as quantidades definidas nos cadernos técnicos do empreendimento e o cronograma físico-financeiro da obra objeto do Contrato nº 10/2020, acordado na prestação dos serviços, conforme indicadores de qualidade tabelados abaixo:

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	PONTUAÇÃO
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA FAZER			
1	Permitir a presença de empregado(s) sem usar uniforme ou identificação.	Por dia	1
2	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços.	Por empregado e por dia	2
3	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários.	Por dia	5
4	Suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo autorizado, ou motivo de força maior ou caso fortuito.	Por dia	2
5	Reutilizar de forma intencional, material, peça ou equipamento descartado previamente pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	5
6	Recusar-se a executar serviço determinado pela	Por ocorrência	5
	FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.		
7	Utilizar as dependências da obra do MPF para fins diversos do contrato	Por ocorrência.	10
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE			
8	Apresentar a ART dos serviços subcontratados que forem executados conforme declaração entregue à CONTRATANTE e parcela faturada.	Por dia de atraso	3
9	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	Por empregado e por dia	3
10	Cumprir determinação ou instrução formal da FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência	4
11	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	Por ocorrência e por dia.	4
12	Indicar e manter durante a execução do contrato os responsáveis técnicos pelos serviços executados na respectiva parcela ou profissional de segurança do trabalho, nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas Especificações Técnicas do Edital.	Por técnico/ profissional e por dia	8
13	Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ou entregar EPI fora das normas regulamentares e de impor sua utilização pelos empregados.	Por ocorrência	8
14	Realizar treinamento de seus empregados e colaboradores relacionados a NR de segurança no trabalho e em especial quanto a normas de segurança de trabalho em alturas com risco.	Por ocorrência	11
APLICÁVEIS QUANDO A CONTRATADA DESCUMPRIR PRAZOS			
15	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando atraso de 1 a 5 dias na execução da parcela (Cronograma de Execução Físico-financeiro).	Por ocorrência	6
16	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando atraso de 6 a 10 dias na execução da parcela (Cronograma de Execução Físico-financeiro).	Por ocorrência	12
17	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando atraso de 11 a 15 dias na execução da parcela (Cronograma de Execução Físico-financeiro).	Por ocorrência	24
18	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando atraso superior a 15 dias na execução da parcela (Cronograma de Execução Físico-financeiro).	Por ocorrência	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção

13.1 - Ocorrência 1: Encanador fazendo serviços hidráulicos da cobertura do estacionamento utilizando a escada de madeira em uma altura de mais ou menor 2 metros e 70 sem o EPI. (Cinto de segurança – NBR-35 a altura máxima permitida é de 2 metros). Foi no dia 01/07/2021 a ocorrência.



13.2 - Ocorrência 2: Bombeiro hidráulico fazendo serviço de dedetização sem o uso de EPIs adequado para o serviço, o que pode acabar ocasionando possíveis danos à saúde (Fornecer EPIs apropriado como luva de vaqueta e respirador semi facial). Foi no dia 06/07/2021 a ocorrência.



13.3 - Ocorrência 3: Apontador fazendo serviços sem luva colocando aterro no carro de mão com a pá. Além de estar fazendo o serviço sem o EPI, estava em desvio de função, pois esse não é o serviço de apontador. Foi no dia 06/07/2021 a ocorrência.



13.4 - Ocorrência 4: Eletricista fazendo serviços de nivelamento da área do estacionamento com a pá. além de estar fazendo o serviço, estava em desvio de função pois esse não é o serviço do eletricista. Ocorrência no dia 12/07/2021.



14.0 – Tabela de acordo com o Contrato nº 10/2020 para fazer a apuração das pontuações das ocorrências.

ITEM	INDICADOR	INCIDÊNCIA	QUANTIDADE	PONTUAÇÃO
2	Manter funcionário(s) sem qualificação técnica para a execução dos serviços.	Por empregado e Por dia	1	2
3	Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários.	Por dia	2	10
18	Descumprir os prazos contratuais na prestação dos serviços, acarretando atraso superior a 15 dias na execução da parcela (Cronograma de Execução Físico-financeiro).	Por ocorrência	24+	24 + Abertura de processo de apuração de infração para aplicação de sanção
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO				36
PERCENTUAL DE DESCONTO A APLICADO NA NOTA FISCAL: 1,50%				

15.0 - ANEXOS DIÁRIOS DE OBRA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	122
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	22/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 ENGº CIVIL(CAMPO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 OPERADOR DE MÁQUINAS 1 APONTADOR 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO; - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO - LIMPEZA DO TERRENO COM A MÁQUINA.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	123 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	23/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras ref.: 22/06/2021

1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Serventes;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Operador de Máquinas;

3. Atividades realizadas:
- Retirada manual da camada vegetal do terreno em áreas cobertas sem acesso mecânico;
- Retirada mecânica da camada vegetal do terreno, conforme cronograma apontado;
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras ref.: 23/06/2021

1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Serventes;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Operador de Máquinas;

3. Atividades realizadas:
- Retirada manual da camada vegetal do terreno em áreas cobertas sem acesso mecânico;
- Retirada mecânica da camada vegetal do terreno, conforme cronograma apontado;
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	123 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	23/6/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 APONTADOR 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO; - CONFERIR COTA DE NÍVEL NAS ÁREAS EXTERNA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	124 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	24/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

rio de Obras ref.: 22/06/2021

1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Serventes;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Operador de Máquinas;

3. Atividades realizadas:
- Retirada manual da camada vegetal do terreno em áreas cobertas sem acesso mecânico;
- Retirada mecânica da camada vegetal do terreno, conforme cronograma apontado;
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Diário de Obras ref.: 23/06/2021

1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Serventes;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Operador de Máquinas;

3. Atividades realizadas:
- Retirada manual da camada vegetal do terreno em áreas cobertas sem acesso mecânico;
- Retirada mecânica da camada vegetal do terreno, conforme cronograma apontado;
- Levantamentodasinstalaçõesdeincêndio
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	124 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	24/6/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 APONTADOR 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO; - CONFERIR COTA DE NÍVEL NAS ÁREAS EXTERNA E PIQUETAGEM NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO; - LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO. 4. OCORRÊNCIAS: 4.1 - SOBRE A RESPOSTA DOS PROJETOS DE SPDA E FOTOVOLTAICO ENTREI EM CONTATO COM O ENGENHEIRO ELETRICISTA GABRIEL ELE DISSE QUE IA PROVIDENCIAR ESSAS PRANCHAS; 4.2 - TÉCNICO SEGURANÇA AFASTADO COM SUSPEITA COM COVID -19, ATÉ O MOMENTO NÃO FUI COMUNICADOR SOBRE O RESULTADOR DO EXAME (AFASTADO DEZ DO DIA 15/06/21 ATÉ A PRESENTE DATA); 4.3 - VERIFIQUEI TAMBÉM FALTA DE EPIs PELO OS FUNCIONARIOS. (COMPRAR EPIs); 4.4 - FAZER ARREIMATE DE HIDRÁLICA COMO FECHAMENTO DE CONEXÕES DE ESGOTO SANITÁRIO, RALO, TAMPA SANITÁRIA E ACESSÓRIOS; 4.5 - ELÉTRICA FAZER A ILUMINAÇÃO DA ESCADA. DEVIDO A FALTA DE ILUMINAÇÃO O SENHOR FABIANO AO DESCER A ESCADA SE DESEQUILIBROU E TORCEU O TORNOZELO (ATÉ FIZEREM A ILUMINAÇÃO DA ESCADA A MESMA FICARÁ INTERDITADA); 4.6 - FAZER UMA PORTA DE ACESSO NO FUNDOS NO MOMENTO EXISTE APENAS UM TAPUME E O ACESSO ENCONTRA-SE COM ALGUNS PROBLEMAS PARA QUEM VAI ENTRAR NO PRÉDIO, TEM ALGUNS PREGOS COM A PONTA EXPOSTA O QUE É UM PERIGO POIS PODE ACABAR CAUSANDO UM ACIDENTE; 4.7 - FICOU ACERTADO COM O SENHORES FABIANO E WALTER QUE TODAS ESSAS OCORRÊNCIAS ACIMA CITADAS ITENS 4.4, 4.5 E 4.6 SERÃO RESOLVIDAS ATÉ O DIA 30 DE JUNHO. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	125 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	25/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Serventes;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Operador de Máquinas;

3. Atividades realizadas:
- Retirada manual da camada vegetal do terreno em áreas cobertas sem acesso mecânico;
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
- Levantamento das instalações de incêndio;
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Ocorrências:
Tivemos a presença do Sindicato na obra, para apresentações;
Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	125 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	25/6/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 APONTADOR 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO; - PIQUETAGEM NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO. 4. OCORRÊNCIAS: 4.1 - TIVEMOS A PRESENÇA DOS REPRESENTANTE DO SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE BOA VISTA-RR;

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	128 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	28/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho;

3. Atividades realizadas:
- Retirada manual da camada vegetal do terreno em áreas cobertas sem acesso mecânico;
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
- Finalização das instalações provisórias:
Instalações hidráulicas (esgoto) e acessórios dos vestiários.
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Ocorrências:
Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	128 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	28/6/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESGOTO) E ACESSÓRIOS DOS BANHEIROS E VESTIÁRIO; - LIMPEZA MANUAL DA CAMADA VEGETAL NO ESTACIONAMENTO; - NIVELAMENTO DAS ÁRES COBERTAS DO ESTACIONAMENTO; - PIQUETAGEM NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	130 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	30/6/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- 1.Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
- 01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
 - 01 - Administrativo de Obras;
 - 01 - Mestre de Obras;
 - 01 - Servente;
 - 01 - Eletricista
 - 01 - Bombeiro Hidráulico;
 - 01 - Pedreiro;
 - 01 - Almoxarife;
 - 01 - Encarregado;
 - 01 - Apontador;
 - 01 - Técnico de segurança no trabalho.
3. Atividades realizadas:
- Instalação da monitoração eletrônica:
 - Câmeras e sensores de presença.
 - Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
 - Finalização das instalações provisórias:
 - Instalações de acessórios dos vestiários.
 - Instalações elétricas provisórias:
 - Iluminação da escada de acesso a outros pavimentos.
 - Limpeza e organização do canteiro de obras;
- Ocorrências:
- Continuamos aguardando os projetos faltantes:
- Projetos de SPDA;
- Projetos Fotovoltaico.
- Dúvidas, estamos a disposição.
- Cordialmente,
- BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI .

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	130 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	30/6/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - INSTALAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA: CÂMERAS E SENSORES DE PRESENÇA; - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESGOTO) E ACESSÓRIOS DOS BANHEIROS E VESTIÁRIO; - FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS HIDRÁULICA E ELÉTRICAS; - NIVELAMENTO DAS ÁRES COBERTAS DO ESTACIONAMENTO; - ILUMINAÇÃO DA ESCADA PROVISÓRIA. 4. OCORRÊNCIAS: 4.1 - SOBRE A RESPOSTA DOS PROJETOS DE SPDA E FOTOVOLTAICO ENTREI EM CONTATO COM O ENGENHEIRO ELETRICISTA GABRIEL ELE DISSE QUE IA PROVIDENCIAR ESSAS PRANCHAS; ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	131 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	1/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1.Condições Climáticas:
Manhã: Chuvoso - Praticável Interno.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Instalação da monitoração eletrônica:
Câmeras e sensores de presença.
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
- Finalização das instalações provisórias:
Tapumes e porta de acesso provisório fundos.
- Instalações elétricas provisórias:
Iluminação da escada de acesso a outros pavimentos.
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Ocorrências:
Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

Dúvidas, estamos a disposição.
Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI .

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	131 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	1/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - INSTALAÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA: CÂMERAS E SENSORES DE PRESENÇA; - FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (TAPUMES E PORTA DE ACESSO PROVISÓRIO DOS FUNDOS); - NIVELAMENTO DAS ÁRES COBERTAS DO ESTACIONAMENTO; - ILUMINAÇÃO DA ESCADA PROVISÓRIA. 4. OCORRÊNCIAS: 4.1 - VESTIÁRIO SUJO, SEM A DEVIDA LIMPEZA NECESSÁRIA; 4.2 - ENCANADOR FAZENDO SERVIÇOS HIDRÁULICOS DA COBERTA DO ESTACIONAMENTO UTILIZANDO A ESCADA DE MADEIRA EM UMA ALTURA DE MAIS OU MENOS 2 METROS E 70 SEM O EPI. (CINTO DE SEGURANÇA - NBR 35 A ALTURA MÁXIMA PERMITIDA É DE 2 METROS). ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	132 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	2/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1.Condições Climáticas:
Manhã: Nublado/Chuvoso - Praticável Interno.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
- Finalização das instalações provisórias:
Tapumes e proteções nas caixas elétricas e hidráulicas externas.
Execução de guarda corpo.
- Instalações pluviais provisórias nas áreas cobertas externas:
Desvio de descidas pluviais para proteção de material compactado.
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Ocorrências:
Continuamos aguardando os projetos faltantes:
Projetos de SPDA;
Projetos Fotovoltaico.

Dúvidas, estamos a disposição.
Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	132 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	2/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.					
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:					
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE					
3- ATIVIDADES REALIZADAS					
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - SERVIÇO DE CARPITARIA; - FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS; - NIVELAMENTO DAS ÁRES COBERTAS DO ESTACIONAMENTO. - EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO E SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO PROVISÓRIO.					
4. OCORRÊNCIAS:					
4.1 ATÉ O MOMENTO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O INÍCIO DA SEGUNDA MEDIÇÃO AINDA NÃO CHEGARAM NA OBRA, HOJE PELA A MANHÃ COMPARECEU NA OBRA O REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE IRÁ FORNECER O ATERRO. SEGUNO O ENGENHEIRO DA BASE IRAM INICIAR O SERVIÇO NA SEGUNDA FEIRA DIA 05 DE JULHO PELA MANHÃ. OS ITENS ABAIXO CITADOS SÃO OS SERVIÇOS LISTADOS PELA A EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA SEGUNDA MEDIÇÃO.					
03.01.01 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS;					
03.02.01 - ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE;					
03.03.01 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE;					
03.03.02 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - INCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE;					
14.02.02 - CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³.					
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.					

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	135 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	5/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado/Chuvoso - Praticável Interno.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
- Retirada do material orgânico:
Descarte de material em container de papa-entulho.
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Dúvidas, estamos a disposição.
Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	135 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	5/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - NIVELAMENTO DAS ÁRES COBERTAS DO ESTACIONAMENTO; - RETIRADA DE MATERIAL ORGÂNICO / DESCARTE DE MATERIAL EM PAPA ENTULHO.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	136 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	6/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado/Chuvoso - Praticável Interno.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Material de aterro:
Material para aterro para compactação nas áreas cobertas (estacionamento).
- Retirada do material orgânico:
Descarte de material em container de papa-entulho.
- Limpeza e organização do canteiro de obras;

Dúvidas, estamos a disposição.
Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	136 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	6/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - MATERIAL PARA ATERRO COMPACTAÇÃO NAS ÁRES COBERTAS DO ESTACIONAMENTO; - DESCARTE DE MATERIAL EM CONTAINER DE PAPA-ENTULHO. 4. OCORRÊNCIAS: 4.1 APONTADOR FAZENDO SERVIÇOS SEM LUYA COLOCANDO ATERRO NO CARRO DE MÃO COM A PÁ . ALÉM DE ESTAR FAZENDO O SERVIÇO SEM O EPI, ESTAVA EM DESVIO DE FUNÇÃO POIS ESSE NÃO É O SERVIÇO DE APONTADOR. 4.2 BOMBEIRO HIDRÁULICO FAZENDO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO SEM O USO DE EPIs ADEQUADO PARA O SERVIÇO, O QUE PODE ACABAR OCASIONANDO POSSÍVEIS DANOS À SAÚDE (FORNECER EPIs APROPRIADO: LUYA DE VÁQUETA E RESPIRADOR SEMI FACIAL). ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	137 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	7/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado/Chuvoso - Praticável Interno.

Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

01 - Pedreiro;

01 - Almoxarife;

01 - Encarregado;

01 - Apontador;

01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:

- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;

Nivelamento do material de aterro para posterior compactação.

- Limpeza e organização do canteiro de obras.

Vedação das descidas pluviais:

- Vedação das descidas pluviais da cobertura do estacionamento, visado a proteção do aterro, em caso de chuvas.

Ocorrências:

- Continuamos aguardando os projetos faltantes, para darmos continuidade aos orçamentos com os fornecedores:

Projetos de SPDA;

Projetos Fotovoltaico.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	137 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	7/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - NIVELAMENTO DAS ÁREAS COBERTAS DO ESTACIONAMENTO / PARA DEPOIS DO ATERRO FAZER COMPACTAÇÃO DO SOLO; - VEDAÇÃO DAS DESCIDAS ÁGUA PLUVIAIS. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	138 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	8/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Claro - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
Nivelamento do material de aterro para posterior compactação.
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	138 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	8/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - NIVELAMENTO DAS ÁREAS COBERTAS DO ESTACIONAMENTO / PARA DEPOIS DO ATERRO FAZER COMPACTAÇÃO DO SOLO.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	142 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	12/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Chuvoso - Praticável.
Tarde: Nublado - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
Nivelamento do material de aterro para posterior compactação.
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	142 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	12/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO PELA MANHÃ CHUVOSO E PELA TARDE NUBLADO.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - MATERIAL PARA ATERRO COMPACTAÇÃO NAS ÁRES COBERTAS DO ESTACIONAMENTO; - NIVELAMENTO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO.
4. OCORRÊNCIAS: 4.1 ELETRICISTA FAZENDO SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO COM A PÁ . ALÉM DE ESTAR FAZENDO O SERVIÇO, ESTAVA EM DESVIO DE FUNÇÃO POIS ESSE NÃO É O SERVIÇO DE ELETRICISTA.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	143 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	13/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Nublado - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
Nivelamento do material de aterro para posterior compactação.
- Desentupimento da hidráulica (esgoto):
Desobstrução da tubulação de drenos, cheios de concreto, nas áreas técnicas;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	143 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	13/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO PELA MANHÃ CHUVOSO E PELA TARDE NUBLADO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - DESENTUPIMENTO DA HIDRÁULICA ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS; - NIVELAMENTO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	144 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	14/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Chuvoso - Praticável Interno.
Tarde: Nublado - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
Nivelamento do material de aterro para posterior compactação.
- Desentupimento da hidráulica (esgoto):
Desobstrução da tubulação de drenos, cheios de concreto, nas áreas técnicas;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	144 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	14/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO PELA MANHÃ CHUVOSO E PELA TARDE NUBLADO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - DESENTUPIMENTO DA HIDRÁULICA ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS COM ROMPIMENTO DO PISO DE CONCRETO; - DESCARTE DE MATERIAL EM CONTAINER DE PAPA-ENTULHO COMO PÁ. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	145 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	15/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1.Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Chuvoso - Praticável Interno.
Tarde: Nublado - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
Nivelamento do material de aterro para posterior compactação.
- Desentupimento da hidráulica (esgoto):
Desobstrução da tubulação de drenos, cheios de concreto, nas áreas técnicas;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	145 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	15/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO PELA MANHÃ CHUVOSO E PELA TARDE NUBLADO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - DESENTUPIMENTO DA HIDRÁULICA ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS COM ROMPIMENTO DO PISO DE CONCRETO; - DESCARTE DE MATERIAL EM CONTAINER DE PAPA-ENTULHO COMO PÁ; - MARCAÇÃO DE COTA DE NÍVEL. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS					

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	146 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	16/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA					
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI 1. Condições Climáticas: Manhã: Nublado - Chuvoso - Praticável Interno. Tarde: Nublado - Praticável. 2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli: 01 - Engenheiro Gestor de Contrato; 01 - Administrativo de Obras; 01 - Mestre de Obras; 01 - Servente; 01 - Eletricista 01 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Almoxarife; 01 - Encarregado; 01 - Apontador; 01 - Técnico de segurança no trabalho. 3. Atividades realizadas: - Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento; Nivelamento do material de aterro para posterior compactação. - Desentupimento da hidráulica (esgoto): Desobstrução da tubulação de drenos, cheios de concreto, nas áreas técnicas; - Revisão das cotas topográficas: Revisão de todas as cotas de níveis do terreno. - Limpeza e organização do canteiro de obras. 4. Solicitação do fiscal: - Solicitado pelo fiscal a adequação nas cotas de nível na área da calçada de passeio, entre o prédio principal e a Subestação, devido a discrepância nas cotas existentes no projeto original. Dúvidas, estamos a disposição. Cordialmente, BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.					

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	146 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	16/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO PELA MANHÃ CHUVOSO E PELA TARDE NUBLADO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - DESENTUPIMENTO DA HIDRÁULICA ESGOTO E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENOS COM ROMPIMENTO DO PISO DE CONCRETO; - MARCAÇÃO DE COTA DE NÍVEL; - NIVELAMENTO DAS ÁREAS COBERTAS DO ESTACIONAMENTO E DO MATERIAL DE ATERRO PARA POSTERIOR COMPACTAÇÃO. 4- ALTERAÇÃO DE PROJETO 4.1 - ADEQUAÇÃO DAS COTAS DE NÍVEL DA ÁREA DA CALÇADA DE PASSEIO, ENTRE O PRÉDIO PRINCIPAL E A SUBESTAÇÃO, DEVIDO A DISCREPÂNCIA NAS COTAS EXISTENTES NO PROJETO ORIGINAL. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS					

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	149 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	19/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável.
Tarde: Nublado - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Almoxarife;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento das áreas cobertas do estacionamento;
Nivelamento do material de aterro para posterior compactação.
- Revisão das cotas topográficas:
Revisão de todas as cotas de níveis do terreno;
Identificação das áreas de acesso das máquinas dentro do canteiro de obras.
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Solicitação do fiscal:
- Solicitado pelo fiscal a adequação nas cotas de nível na área da calçada de passeio, entre o prédio principal e a Subestação, devido a discrepância nas cotas existentes no projeto original.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	149 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	19/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO PELA MANHÃ NUBLADO E PELA TARDE NUBLADO. 2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ALMOXARIFE 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - MARCAÇÃO DE COTA DE NÍVEL; - NIVELAMENTO DAS ÁREAS COBERTAS DO ESTACIONAMENTO E DO MATERIAL DE ATERRO PARA POSTERIOR COMPACTAÇÃO. 4- ALTERAÇÃO DE PROJETO 4.1 - ADEQUAÇÃO DAS COTAS DE NÍVEL DA ÁREA DA CALÇADA DE PASSEIO, ENTRE O PRÉDIO PRINCIPAL E A SUBESTAÇÃO, DEVIDO A DISCREPÂNCIA NAS COTAS EXISTENTES NO PROJETO ORIGINAL. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	150 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	20/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável.
Tarde: Chuvoso - Praticável Interno.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento e compactação do terreno nas áreas cobertas do estacionamento:
Nivelamento do material de aterro com compactador mecânico: "Compactador de Solo tipo sapo a Gasolina 6.5 HP Mt Motor de 2 tempos"
- Revisão das cotas topográficas:
Revisão de todas as cotas de níveis do terreno.
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Solicitação do fiscal:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	150 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	20/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO TODO COM SOL.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE
3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - MARCAÇÃO DE COTA DE NÍVEL; - DESCARTE DE MATERIAL EM CONTAINER DE PAPA-ENTULHO; - COMPACTAÇÃO DO ATERRO DO ESTACIONAMENTO.
4- OCORRÊNCIAS 4.1 - NÃO FOI ENTREGUE A PLANILHA DE MEDIÇÃO, PARA A FISCALIZAÇÃO CONFERIR OS SERVIÇOS.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	151 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	21/7/2021
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável.
Tarde: Chuvoso - Praticável Interno.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento e compactação do terreno nas áreas cobertas do estacionamento:
Nivelamento do material de aterro com compactador mecânico: "Compactador de Solo tipo sapo a Gasolina 6.5 HP Mt Motor de 2 tempos"
- Revisão das cotas topográficas:
Revisão de todas as cotas de níveis do terreno.
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	151 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	21/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO TODO COM SOL.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 1 PEDREIRO
3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - MARCAÇÃO DE COTA DE NÍVEL; - DESCARTE DE MATERIAL EM CONTAINER DE PAPA-ENTULHO; - COMPACTAÇÃO DO ATERRO DO ESTACIONAMENTO.
4- OCORRÊNCIAS 4.1 - NÃO FOI ENTREGUE A PLANILHA DE MEDIÇÃO, PARA A FISCALIZAÇÃO CONFERIR OS SERVIÇOS.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	152
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	22/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

1.Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável.
Tarde: Chuvoso - Praticável.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento e compactação do terreno nas áreas cobertas do estacionamento:
Nivelamento do material de aterro com compactador mecânico: "Compactador de Solo tipo sapo a Gasolina 6.5 HP Mt Motor de 2 tempos"
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO TODO COM SOL.

2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:

1 ADMINISTRATIVO DE OBRA
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)
1 MESTRE DE OBRAS
1 ENCARREGADO DE OBRA
1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
1 APONTADOR
1 ELETRICISTA
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO
1 SERVENTE
1 PEDREIRO

3- ATIVIDADES REALIZADAS

3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;
- COMPACTAÇÃO DO ATERRO DO ESTACIONAMENTO.

ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	153 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	23/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1.Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável.
Tarde: Nublado - Praticável Interno.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento e compactação do terreno nas áreas cobertas do estacionamento:
Nivelamento do material de aterro com compactador mecânico: "Compactador de Solo tipo sapo a Gasolina 6.5 HP Mt Motor de 2 tempos"
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	153 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	23/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO TODO COM SOL.
2- LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 1 PEDREIRO 3- ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA; - COMPACTAÇÃO DO ATERRO DO ESTACIONAMENTO. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	156 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	26/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado (Período de chuvas das 11:00 as 14:00 horas)

Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

01 - Pedreiro;

01 - Encarregado;

01 - Apontador;

01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:

- Retirada da camada orgânica do terreno:

Retirada mecânica da camada orgânica do terreno (serviço executado até as 11:00, devido as chuvas)

- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:

- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;

- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIREL

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	156 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	26/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO TODO NUBLADO E PARTE COM CHUVA.
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFADO
3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - RETIRADA MECÂNICA DA CAMADA ORGÂNICA DO TERRENO; 3.2 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	157 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	27/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI 1.Condições Climáticas: Manhã: Claro - Praticável Tarde: Claro - Praticável 2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli: 01 - Engenheiro Gestor de Contrato; 01 - Administrativo de Obras; 01 - Mestre de Obras; 01 - Servente; 01 - Eletricista 01 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Pedreiro; 01 - Encarregado; 01 - Apontador; 01 - Técnico de segurança no trabalho. 3. Atividades realizadas: - Retirada da camada orgânica do terreno: Retirada mecânica da camada orgânica do terreno Compactação das áreas limpas (Equipamento " Rolo Compactador") - Limpeza e organização do canteiro de obras. 4. Comentários: - Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira; - Alinhado com o Engº Fiscal Responsável a diminuição das medidas das tampas das canaletas externas, ficando acordado em: 0.50x1.30. - Sem ocorrências. Dúvidas, estamos a disposição. Cordialmente, BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIREL

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	157 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	27/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO TODO COM SOL. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - RETIRADA MECÂNICA DA CAMADA ORGÂNICA DO TERRENO; 3.2 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO. 4- OCORRÊNCIAS 4.1 - FICOU COMBINADOR PARA FAZER AS TAPAS DA CANALETA COM AS MEDIDAS 0.50x1.30, PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO DA MESMA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	158 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	28/7/2021
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Chuvoso - Impraticável - Serviços de terraplanagem paralisado.
Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.

3. Atividades realizadas:
- Execução das formas das tampas das canaletas:
Serviço de execução das formas das canaletas para posterior concretagem.
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	158 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	28/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL A TARDE. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - MARCAÇÃO DE COTA DE NÍVEL, 3.2 - FABRICAÇÃO DAS FORMAS DAS TAMPAS DA CANALETA COM AS MEDIDAS 0.50x1.30, 3.3 - SERVIÇO DE ABERTURA DE VALA PARA ÁGUA ESCOAR. 4- OCORRÊNCIAS 4.1 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARALISADO DEVIDO FORTE CHUVA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	159 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	29/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Chuvoso - Impraticável - Serviços de terraplanagem paralisado.
Tarde: Claro - Impraticável - Serviços de terraplanagem paralisado.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.
01 - Operador de moto niveladora.
01 - Operador de rolo compactador.

3. Atividades realizadas:
- Execução das formas das tampas das canaletas:
Serviço de execução das formas das canaletas para posterior concretagem.
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	159 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	29/7/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL A TARDE. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, 3.2 - SERVIÇO DE ABERTURA DE VALA PARA ÁGUA ESCOAR. 4- OCORRÊNCIAS 4.1 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARALISADO DEVIDO FORTE CHUVA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	160
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	30/7/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL NA PARTE DA TARDE. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO ESGOTAMENTO DO TERRENO; 3.3 - RETIRADA MECÂNICA DA CAMADA ORGÂNICA DO TERRENO; 3.4 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO; 3.5 - ATERRO COM 11 CAÇAMBA DE BARRO. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	163
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	2/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO NUBLADO PELA MANHÃ E TEMPO COM SOL NA PARTE DA TARDE. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 ENGENHEIRO CIVIL (CAMPO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 SERVENTE 1 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO ESGOTAMENTO DO TERRENO; 3.3 - RETIRADA MECÂNICA DA CAMADA ORGÂNICA DO TERRENO; 3.4 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO; 3.5 - ATERRO COM 8 CAÇAMBA DE BARRO. 3.6 - RETIRADA DAS ÁRVORES DO FUNDOS COM AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PARA DA CONTINUIDADE NA TERRAPLANAGEM ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	164
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	3/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO; 3.3 - REGULARIZAÇÃO COM 17 CAÇAMBA DE BARRO; 3.4 - ATERRO COM 4 CAÇAMBA DE PIÇARRA. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	165 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	4/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

DIÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO DIA 30/07/2021

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável - Serviços de terraplanagem paralisado.

Tarde: Claro - Impraticável - Serviços de terraplanagem paralisado.

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiro;

01 - Encarregado;

01 - Apontador;

01 - Técnico de segurança no trabalho.

01 - Operador de moto niveladora.

01 - Operador de rolo compactador.

3. Atividades realizadas:

- Instalação de bomba de recalque para drenagem das águas das chuvas.

- Execução das formas das tampas das canaletas:

Serviço de execução das formas das canaletas para posterior concretagem.

- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:

- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;

- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

DIÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO DIA 02/07/2021

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Chuvoso - Impraticável - Serviços de terraplanagem paralisado.

Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

02 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

02 - Pedreiro;

01 - Encarregado;

01 - Apontador;

01 - Técnico de segurança no trabalho.

01 - Operador de moto niveladora.

01 - Operador de rolo compactador.

3. Atividades realizadas:

- Instalação de bomba de recalque para drenagem das águas das chuvas.

- Execução das formas das tampas das canaletas:

Serviço de execução das formas das canaletas para posterior concretagem.

- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:

- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;

- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

DIÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO DIA 03/08/2021

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável
Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

01 - Servente; 01 - Eletricista	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	165 página 2/2
01 - Bombeiro Hidráulico; 01 - Pedreiro;	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
01 - Encarregado;	10-2020	UNIDADE	PRRR		
01 - Apontador;	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	4/8/2021

01 - Técnico de segurança no trabalho.

01 - Operador de moto niveladora.

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO

01 - Operador de rolo compactador.
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
3. Atividades realizadas:
2 - Instalação de bomba de recalque para drenagem das águas das chuvas;
- Execução das formas das tampas das canaletas:
- Serviço de execução das formas das canaletas para posterior concretagem.
4 - Nivelamento do terreno com moto-niveladora;
4 - Compactação do terreno com rolo pé-de-carneiro;
4 - Limpeza e organização do canteiro de obras.
1 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4. COMENTÁRIOS
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.
1 - SUMÁRIO
3 - SERVENTE
Dúvidas, estamos a disposição.
1 - ALMOXARIFE
2 - OPERADOR DE MÁQUINAS
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
3 - ATIVIDADES REALIZADAS
DIÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO DIA 04/08/2021
3.1 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO;
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI (FISCALIZACIONAMENTO);
3.2 - ATERRO COM 23 CAÇAMBA DE PIÇARRA.
1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável
Tarde: Claro - Praticável
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.
01 - Operador de moto niveladora.
01 - Operador de rolo compactador.

Fiscalização

Contratada

3. Atividades realizadas:
- Instalação de bomba de recalque para drenagem das águas das chuvas.
- Execução das formas das tampas das canaletas:
Serviço de execução das formas das canaletas para posterior concretagem.
- Nivelamento do terreno com moto-niveladora;
- Compactação do terreno com rolo pé-de-carneiro;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	166 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	5/8/2021
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1.Condições Climáticas:
Manhã: Claro - Praticável
Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.
01 - Operador de moto niveladora.
01 - Operador de rolo compactador.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento do terreno com moto-niveladora;
- Compactação do terreno com rolo pé-de-carneiro;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	166 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	5/8/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS
3 - ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO; 3.3 - NIVELAMENTO MANUAL DO TERRENO (ESTACIONAMENTO); 3.4 - ATERRO COM 14 CAÇAMBA DE PIÇARRA.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	167 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	6/8/2021
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Praticável
Tarde: Claro - Praticável

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.
01 - Operador de moto niveladora.
01 - Operador de rolo compactador.

3. Atividades realizadas:
- Nivelamento do terreno com moto-niveladora;
- Compactação do terreno com rolo pé-de-carneiro;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	167 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	6/8/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO; 3.3 - NIVELAMENTO MANUAL DO TERRENO (ESTACIONAMENTO); 3.4 - REGULARIZAÇÃO COM A PATROL. 4- OCORRÊNCIAS 4.1 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA REFAZER NOVAMENTE EM ALGUM TRECHOS DEVEDO DA BURACHUDO, UMA PATOLOGIA CLÁSSICA EM TERRAPLANAGEM. ELA SURGE QUANDO SE TENTA SUPERCOMPACTAR UM SOLO EM QUE A UMIDADE ESTÁ ACIMA. NO FINAL DA TARDE UMA EMPRESA ESPECIALISTA EM SOLO FAZ TESTE DE ANALISER DO SOLO. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	170 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	9/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

1. Condições Climáticas:

Manhã: Nublado - Chuvoso (Serviço de terraplanagem paralisado)

Tarde: Nublado - Chuvoso (Serviço de terraplanagem paralisado)

2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:

01 - Engenheiro Gestor de Contrato;

01 - Administrativo de Obras;

01 - Mestre de Obras;

01 - Servente;

01 - Eletricista

01 - Bombeiro Hidráulico;

01 - Pedreiro;

01 - Encarregado;

01 - Apontador;

01 - Técnico de segurança no trabalho.

01 - Operador de moto niveladora.

01 - Operador de rolo compactador.

3. Atividades realizadas:

- Nivelamento do terreno nas áreas cobertas (estacionamento);

- Instalação de bombas de recalque para drenagem da água;

- Limpeza e organização do canteiro de obras.

4. Comentários:

- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;

- Alinha do com fiscal de obras a adequação do nível externo em frente a casa de maquinas por ter disparidade no projeto:

Foi identificado uma diferença de nível entre a sala da casa de bombas/climatização entre as outras 3 salas: sala de gerador, quadros e hidrante, de 7cm de diferença assim ficará uma diferença total de 17 cm entre nível da sala e o paver .

- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	170 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	9/8/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO TODO NUBLADO E COM CHUVA PELA MANHÃ. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - MARCAÇÃO DE COTAS DE NÍVEL; 3.3 - NIVELAMENTO MANUAL DO TERRENO (ESTACIONAMENTO), 4- OCORRÊNCIAS 4.1 - ALINHADO COM EMPRESA AS COTAS DE NÍVEL NA CASAS DE MAQUINAS NO PROJETO A COTA +0,23, FOI IDENTIFICADO DIFERENÇAS DE NÍVEL ENTRE AS SALAS. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	171
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	10/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO TODO NUBLADO.
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS
3 - ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - NIVELAMENTO MANUAL DO TERRENO (ESTACIONAMENTO),
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	172 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	11/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
DIÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO DIA 10/08/2021

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Chuvoso (Serviço de terraplanagem paralisado)
Tarde: Nublado - Nublado (Serviço de terraplanagem paralisado)
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.
01 - Operador de moto niveladora.
01 - Operador de rolo compactador.
3. Atividades realizadas:
- Nivelamento do terreno nas áreas cobertas (estacionamento);
- Instalação de bombas de recalque para drenagem da água;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Encontrada uma canaleta de concreto dentro da casa de máquinas no momento limpeza daquele ambiente, que não consta em projeto.
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
DIÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO DIA 11/08/2021

1. Condições Climáticas:
Manhã: Claro
Tarde: Claro
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.
01 - Operador de moto niveladora.
01 - Operador de rolo compactador.
3. Atividades realizadas:
- Nivelamento do terreno nas áreas cobertas (estacionamento);
- Instalação de bombas de recalque para drenagem da água;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA		EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	172 página 2/2
EMPRESA		BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº		10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO		21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	11/8/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO	

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	173
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	12/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO PELA MANHÃ E NUBLADO PELA TARDE. 2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 2 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - RETIRADA DE AREIA DA CANALETA MANUAL, 3.3 - BOMBEAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA PARA O ESGOTAMENTO DO TERRENO. 4- OCORRÊNCIAS 4.1 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARALISADO DEVIDO FORTE CHUVA. 4.2 - OS FUNCIONARIOS DA EMPRESA FOI LIBERADO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA ERA 11:45 DA MANHÃ DEVIDO AS FORTE CHUVAS E POR FALTA DE MATERIAL QUE NÃO CHEGAR NA OBRA. 4.3 - ESSE MÊS DE AGOSTO E PARA INICIA A 3º MEDIÇÃO PELO CRONOGRAMA ERA PARA SER EXECUTADO TERRAPLANAGEM 50%, CONTRAPISO 20% E AS TAPAS DA CANALETA 50%. ATÉ O MEMENTO NADA DA 3º MEDIÇÃO. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	174 página 1/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR	DATA	13/8/2021
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023		

RELATÓRIO DA CONTRATADA

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
DIÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO DIA 12/08/2021

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Chuvoso (Serviço de terraplanagem paralisado)
Tarde: Nublado - Chuvoso (Serviço de terraplanagem paralisado)
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.
01 - Operador de moto niveladora.
01 - Operador de rolo compactador.
3. Atividades realizadas:
- Nivelamento do terreno nas áreas cobertas (estacionamento);
- Instalação de bombas de recalque para drenagem da água;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Serviço de terraplanagem paralisado do devido as fortes chuvas na região
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
DIÁRIO DE OBRAS REFERENTE AO DIA 13/08/2021

1. Condições Climáticas:
Manhã: Nublado - Chuvoso (Serviço de terraplanagem paralisado)
Tarde: Nublado - Nublado (Serviço de terraplanagem paralisado)
2. Equipes presentes na obra Base Construção e Incorporações Eireli:
01 - Engenheiro Gestor de Contrato;
01 - Administrativo de Obras;
01 - Mestre de Obras;
01 - Servente;
01 - Eletricista
01 - Bombeiro Hidráulico;
01 - Pedreiro;
01 - Encarregado;
01 - Apontador;
01 - Técnico de segurança no trabalho.
01 - Operador de moto niveladora.
01 - Operador de rolo compactador.
3. Atividades realizadas:
- Nivelamento do terreno nas áreas cobertas (estacionamento);
- Instalação de bombas de recalque para drenagem da água;
- Limpeza e organização do canteiro de obras.
4. Comentários:
- Tivemos o acompanhamento dos serviços pelo fiscal de obras, Eng. Marcos Eduardo Madureira;
- Serviço de terraplanagem paralisado do devido as fortes chuvas na região
- Sem ocorrências.

Dúvidas, estamos a disposição.

Cordialmente,
BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	174 página 2/2
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	13/8/2021

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO					
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO CHUVOSO O DIA TODO.					
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:					
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA					
1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO)					
1 MESTRE DE OBRAS					
1 ENCARREGADO DE OBRA					
1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO					
1 APONTADOR					
1 ELETRICISTA					
1 BOMBEIRO HIDRÁULICO					
3 SERVENTE					
2 PEDREIRO					
1 ALMOXARIFE					
2 OPERADOR DE MÁQUINAS					
3 - ATIVIDADES REALIZADAS					
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS;					
3.2 - RETIRADA DE AREIA DA CANALETA MANUAL,					
3.3 - BOMBEAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA PARA O ESGOTAMENTO DO TERRENO.					
4- OCORRÊNCIAS					
4.1 - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARALISADO DEVIDO FORTE CHUVA.					
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS					

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	177
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	16/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1 - CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 3 OPERADOR DE MÁQUINAS
3 - ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - RETIRADA DE AREIA DA CANALETA MANUAL, 3.3 - BOMBEAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA PARA O ESGOTAMENTO DO TERRENO; 3.4 - SERVIÇO DE GRADAGEM NA ETAPA DE PREPARAÇÃO DO SOLO (GREDEAR COM TRATOR); 3.5 - REGULARIZAÇÃO COM A PATROL; 3.6 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO.
4- OCORRÊNCIAS
4.1 - CONTINUAÇÃO DA TERRAPLANAGEM. 4.2 - RETIRADAS DAS VEGETAÇÃO DAS OBRA NA ÁREA INTERNA DO LOTE NA PARTE DA FRENTE DO LADO ESQUERDO (ÁRVORE ARRANCADA).
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	178
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	17/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 3 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - SERVIÇO DE GRADAGEM NA ETAPA DE PREPARAÇÃO DO SOLO (GREDEAR COM TRATOR); 3.3 - REGULARIZAÇÃO COM A PATROL; 3.4 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO; 3.5 - ESCAVAÇÃO DA AREA DO ESTACIONAMAENTO COM PATROL. ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	179
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	18/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 3 OPERADOR DE MÁQUINAS
3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - RETIRADA DE AREIA DA CANALETA MANUAL, 3.3 - SERVIÇO DE GRADAGEM NA ETAPA DE PREPARAÇÃO DO SOLO (GREDEAR COM TRATOR); 3.4 - REGULARIZAÇÃO COM A PATROL; 3.5 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO; 3.6 - ESCAVAÇÃO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO COM PATROL.
4- OCORRÊNCIAS 4.1 - O MESTRE DE OBRAS O SR. FABIANO SEM A MÁSCARA NO MEIO DA OBRA, O MESMO NO MEIO DOS FUNCIONARIO DANDO MAU EXEMPLO. 4.2 - NA ESCAVAÇÃO DA TERRAPLANAGEM FOI ENCONTRAR A INFRA-ESTRUTURA DA ELÉTRICA, NÃO ERA PARA SER FEITA AGORA. A INFRA-ESTRUTURA AINDA RASA +- 0.50CM. SEGUNDO O ENGENHEIRO DA SEA-MPF, ESSA INFRA NÃO VAI SER REAPROVEITA. O PROJETO FOI ALTERADO PARA UMA NOVA CONCEPÇÃO E FOI PREVISTA UMA NOVA INFRA. 4.3 - AS MÁQUINAS PARADA DEVIDO FALTA DE OLÉO DO MOTO (DEPOIS DO ALMOÇO PARADA AS MÁQUINAS). INÍCIO ÀS 16:00h O SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	180
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	19/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI:
1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 3 OPERADOR DE MÁQUINAS
3 - ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 - SERVIÇO DE GRADAGEM NA ETAPA DE PREPARAÇÃO DO SOLO (GREDEAR COM TRATOR); 3.2 - REGULARIZAÇÃO COM A PATROL; 3.3 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO; 3.4 - ESCAVAÇÃO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO COM PATROL.
ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA	EXECUÇÃO OBRA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA			FOLHA	181
EMPRESA	BASE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI				
CONTRATO Nº	10-2020	UNIDADE	PRRR		
INÍCIO	21/02/2021	PRAZO	21/02/2023	DATA	20/8/2021

RELATÓRIO DA CONTRATADA

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO
1- CONDIÇÃO CLIMÁTICA - TEMPO COM SOL O DIA TODO.
2 - LISTA DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BASE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES EIRELI: 1 ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 GESTOR DE OBRA(ENGENHEIRO) 1 MESTRE DE OBRAS 1 ENCARREGADO DE OBRA 1 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 APONTADOR 1 ELETRICISTA 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 SERVENTE 2 PEDREIRO 1 ALMOXARIFE 3 OPERADOR DE MÁQUINAS 3 - ATIVIDADES REALIZADAS 3.1 - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; 3.2 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO E COM A PATROL. 4- OCORRÊNCIAS 4.1 - FINALIZAÇÃO DA TERRAPLANAGEM NO DIA 20/08/2021 ÀS 13:20 COM OS 25% DE ACORDO COM CRONOGRAMA DA OBRA. O GRAU DE COMPACTAÇÃO: (DE ACORDO COM DNIT O MÍNIMO RECOMENDADO 95%). ESSE FOI O RESULTADOS DAS AMOSTRAS DO SOLO DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DO SOLO. 1 AMOSTRA 100% 2 AMOSTRA 99,6% 3 AMOSTRA 97,2% 4 AMOSTRA 98,2% ESTAMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS

Fiscalização

Contratada
