



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
ASSESSORIA DE ENGENHARIA – PR/RR

RELATÓRIO TÉCNICO
MEDIÇÃO 07

1. A Sétima medição foi efetuada pela fiscal da obra Engenheira Civil da Procuradoria da República no Estado de Roraima, Tammy Nabilla Sousa Cruz, matrícula 26196 no dia 01/12/2016. Com os serviços executados entre o período de 01 de novembro a 01 de dezembro de 2016.
2. Foram executados serviços tais como previsto no cronograma físico-financeiro. Conforme planilha de medição a quantidade de serviços planejados para o sétimo mês de obra foi de 2,54% do valor total da obra, sendo executado no mês o valor de 2,38% do valor total da obra. Mesmo a empresa executando os serviços previstos conforme cronograma inicial constam atraso no acumulado que tinha uma previsão de 11,65%, mas só foram executados até o presente momento 11,22%.
3. Em relação ao caminho crítico da obra podemos analisar os serviços executados até então e os serviços Projetados para os sete primeiros meses de obra com auxílio da tabela abaixo. É possível notar que a execução física de alguns serviços como a superestrutura está abaixo do volume planejado.
4. Neste mês foi feita a medição das lajes (L21, L22, L23, L24, L41, L42, L43, L44, L49, L50, L51, L52) e suas respectivas vigas (V208, V224, V231, V235, V238, V241, V244, V247, V249) conforme citado no relatório referente a 5 medição, as tais lajes e suas vigas aguardariam a desforma e execução do reparo feito pela empresa, após análise da fiscalização foi feito o reparo com argamassa polimérica, sendo assim as lajes e as vigas foram medidas no referido mês, não constava no relatório

5 o item 02.14.05 regularização, sendo incluído nesta medição, o qual acarretou um aumento do valor previsto.

Serviço	Percentual Previsto em Cronograma	Percentual executado in loco	Serviço atrasado em relação ao cronograma	Serviço adiantado em relação ao cronograma
Limpeza do terreno, alojamento, tapumes, proteções equipamentos, andaimes e desmobilização da obra.	43,58%	50,97%		X
Locações da obra, escavações, aterro e fundações.	82,07%	84,48%		X
Superestrutura	32,82%	20,33%	X	
Paredes e painéis	0%	2,12%		X
Impermeabilizações	6,82%	14,76%		X
Pisos	3,66%	6,55%		X
Instalações Hidros sanitárias	1,69%	3,31%		X
Instalações Elétricas	0,79%	0,65%	X	
Administração	11,10%	11,24%		

5. Segue abaixo a planilha contento os resumos dos serviços realizados no mês de novembro de 2016 pela empresa efetivamente realizados e medidos pela fiscalização.

SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO PRÉDIO SEDE									
Nº NA PLANILHA	TIPO DO SERVIÇO	UND	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE MEDIÇÕES ANTERIORES	QUANT REALIZADA EM NOVEMBRO	% REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO	VALOR R\$ EXECUTADO NOVEMBRO	ACUMULADO
01.02.02	ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA TRANSPORTE DE CARGAS	%	100	139214	0	8,33	8,33%	11596,53	8,33%
01.02.02	MOBILIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA	UM	1	7909,96	0	0,0833	8,33%	658,90	8,33%
01.03.04	ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	2000	26460	12,50%	83,333	4,17%	1102,50	16,67%
02.06.01.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	1735	48389,15	94,91%	19,81	1,14%	552,50	96,05%
02.06.02.01	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1830	14255,7	92,43%	55,81	3,05%	434,76	95,48%
02.06.03.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	360	291427,2	94,66%	13,92	3,87%	11268,52	98,53%
02.07.01.01	ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO, COM PONTALETES 7,5 X 7,5CM	M²	5590	202525,7	18,02%	830,68	14,86%	30095,54	32,88%
02.07.01.02	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	9510	300230,7	12,59%	1111,93	11,69%	35103,63	24,28%
02.07.02.01	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	23395	182247,05	11,35%	2908,27	12,43%	22655,42	23,78%
02.07.02.02	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	70935	472427,1	14,17%	14023,37	19,77%	93395,64	33,94%
02.07.02.03	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	68950	560563,5	7,30%	10886,6	15,79%	88508,06	23,09%
02.07.03.01	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UM	222	20448,42	18,02%	20	9,01%	1842,20	27,03%
02.07.03.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	1830	1481421,6	6,80%	135,33	7,40%	109552,34	14,20%
02.07.03.03	LAJE NERVURADA COM FORMA DE POLIPROPILENO COM CAPA DE CONCRETO COM 30 MPA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, ESPESSURA DA LAJE 40 CM, BALDRAMES	M²	4180	819948,8	10,48%	983,29	23,52%	192882,17	34,00%
02.08.01.0	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, ESPESSURA DA PAREDE 9CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA, JUNTAS 12MM	M²	8100	490698	0,00%	382,39	4,72%	23165,19	4,72%
02.08.02.01	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M²	320	793,6	4,34%	13,88	4,34%	34,42	8,68%
02.08.04.01	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M²	345	5244	0,00%	12,2	3,54%	185,44	3,54%
02.11.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS (ARG. POLIMÉRICA) VIAPLUS 1000 SOBRE ESTRUTURAS ENTERRADAS: FUNDAÇÕES E BALDRAMES	M²	2115	76097,7	65,22%	680,32	32,17%	24477,91	97,39%
02.14.05	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3	M²	4470	105536,6	44,30%	1231,45	27,55%	29074,51	71,85%
02.14.12	LASTRO DE BRITA GRADUADA	M³	202	25961,04	69,91%	33	16,34%	4241,16	86,25%
02.16.03.01	REBAR - BARRA DE AÇO REDONDA GALVANIZADA LISA, DIÂMETRO 3/8" (10MM) COM CLIPS PARA TRESPASSE DE 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4600	77326	12,78%	204	4,43%	3429,24	17,21%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOVEMBRO								684256,57	

SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO GUARITA									
Nº NA PLANILHA	TIPO DO SERVIÇO	UND	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE MEDIÇÕES ANTERIORES	QUANT REALIZADA EM NOVEMBRO	% REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO	VALOR R\$ EXECUTADO NOVEMBRO	ACUMULADO
04.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	25	562	50,00%	12,5	50,00%	281,00	100,00%
04.03.01	REATERRO MANUAL	M³	15	259,5	0,00%	15	100,00%	259,50	100,00%
04.04.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	15	418,35	48,53%	7,72	51,47%	215,31	100,00%
04.04.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	45	350,55	72,94%	12,18	27,07%	94,88	100,0%
04.04.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	12	9060,48	86,00%	1,68	14,00%	1268,47	100,00%
04.04.04	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	150	1219,5	84,69%	22,96	15,31%	186,66	100,00%
04.09.03	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS (ARG. POLIMÉRICA) VIAPLUS 1000 SOBRE ESTRUTURAS ENTERRADAS: FUNDAÇÕES E BALDRAMES	M²	95	3418,1	0,00%	95	100,00%	3418,10	100,00%
04.09.01	LASTRO DE BRITA GRADUADA ESP. 10CM	M³	1,5	225,06	13,33%	0,77	51,33%	115,53	64,66%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOVEMBRO								5839,46	

SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO LIXO									
Nº NA PLANILHA	TIPO DO SERVIÇO	UND	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE MEDIÇÕES ANTERIORES	QUANT REALIZADA EM NOVEMBRO	% REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO	VALOR R\$ EXECUTADO NOVEMBRO	ACUMULADO
04.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	10	224,8	0,00%	10	100,00%	224,80	100,00%
04.04.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	6	167,34	0,00%	6	100,00%	167,34	100,00%
04.04.02	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12	93,48	0,00%	12	100,00%	93,48	100,0%
04.04.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	11	8305,44	0,00%	11	100,00%	8305,44	100,00%
04.04.04	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	90	865,2	0,00%	90	100,00%	865,20	100,00%
04.09.03	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS (ARG. POLIMÉRICA) VIAPLUS 1000 SOBRE ESTRUTURAS ENTERRADAS: FUNDAÇÕES E BALDRAMES	M²	30	1079,4	0,00%	30	100,00%	1079,40	100,00%
04.09.01	LASTRO DE BRITA GRADUADA ESP. 10CM	M³	1,15	172,55	0,00%	1,15	100,00%	172,55	100,00%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOVEMBRO								10908,21	

SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO CASA DE MÁQUINAS									
Nº NA PLANILHA	TIPO DO SERVIÇO	UND	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE MEDIÇÕES ANTERIORES	QUANT REALIZADA EM NOVEMBRO	% REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO	VALOR R\$ EXECUTADO NOVEMBRO	ACUMULADO
03.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	250	5620	96,97%	7,58	3,03%	170,40	100,00%
03.03.01	REATERRO MANUAL	M³	150	2595	30,30%	72,73	48,49%	1258,23	78,79%
03.04.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAM ENTO 5X	M²	415	11574,35	25,94%	67,03	16,15%	1869,47	42,09%
03.04.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	480	3739,2	50,88%	65,86	13,72%	513,05	64,60%
03.04.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	135	109285,2	83,50%	6,2	4,59%	5019,02	88,09%
03.04.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3365	27357,45	76,58%	172,13	5,12%	1399,42	81,70%
03.09.01	LASTRO DE BRITA GRADUADA ESP. 10CM	M³	50,4	7562,02	7,24%	1,16	2,30%	174,05	9,54%
03.09.03	IMPERMEABILIZ Acao COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMEROS (ARG. POLIMÉRICA) VIAPLUS 1000 SOBRE ESTRUTURAS ENTERRADAS: FUNDAÇÕES E BALDRAMES	M²	182,5	6566,35	78,98%	9,07	4,97%	326,34	83,95%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOVEMBRO								10729,97	

SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO SUBESTAÇÃO									
Nº NA PLANILHA	TIPO DO SERVIÇO	UND	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE MEDIÇÕES ANTERIORES	QUANT REALIZADA EM NOVEMBRO	% REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO	VALOR R\$ EXECUTADO NOVEMBRO	ACUMULADO
07.03.01	REATERRO MANUAL	M³	30	519	0,00%	30	100,00%	519,00	100,00%
07.04.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	95	2649,55	26,82%	69,52	73,18%	1938,91	100,00%
07.04.02	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	115	895,85	21,30%	90,5	78,70%	705,00	100,00%
07.04.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	20	15100,8	83,85%	3,23	16,15%	2438,78	100,00%
07.04.05	ARMAÇAO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	15	99,9	0,00%	15	100,00%	99,90	100,00%
07.04.06	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	405	3292,65	0,00%	99,92	24,67%	812,35	24,67%
07.08.03	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, TRÊS DEMAOS.	M³	164,09	1901,8	19,71%	131,75	80,29%	1526,98	100,00%
SUPEREST								0	
07.05.02	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	350	2726,5	0,00%	9,05	2,59%	70,50	2,59%
07.05.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	35	28333,2	0,00%	0,27	0,77%	218,57	0,77%
07.05.06	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1870	15203,1	0,00%	16,68	0,89%	135,61	0,89%
07.05.07	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	355	11207,35	0,00%	3,78	1,06%	119,33	1,06%
07.06.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	230,06	22513,67	0,00%	162,71	70,73%	15922,80	70,73%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOVEMBRO								24507,73	

SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO COBERTURA VEÍCULOS									
Nº NA PLANILHA	TIPO DO SERVIÇO	UND	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE MEDIÇÕES ANTERIORES	QUANT REALIZADA EM NOVEMBRO	% REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO	VALOR R\$ EXECUTADO NOVEMBRO	ACUMULADO
08.01.02	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	95	2135,6	0,00%	13,37	14,07%	300,56	14,07%
08.01.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M²	875	24403,75	0,00%	34,58	3,95%	964,44	3,95%
08.01.03	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1485	11568,15	0,00%	60,43	4,07%	470,75	4,1%
08.01.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	215	162333,6	0,00%	6,05	2,81%	4567,99	2,81%
08.01.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4120	33495,6	0,00%	111,83	2,71%	909,18	2,71%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM NOVEMBRO								7212,91	

VALORES PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
Nº DA PLANILHA	TIPO DE SERVIÇO	UN	QUANT TOTAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇOS DA OBRAS SEM ADMIN LOCAL	VALOR SERVIÇO EXECUTADO EM NOVEMBRO	VALOR PAGO ADMIN LOCAL EM NOVEMBRO	% DE ADMIN LOCAL EM NOVEMBRO
01.04.01	INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	%	100,00	186040	31281173,3	743321,33	4420,79	2,38%
01.04.02	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	%	100,00	46151			1096,67	2,38%
01.04.03	PROJETOS AS BUILT (TODAS AS DISCIPLINAS)	M2	6600,00	65934			1566,76	2,38%
01.04.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	1798516			42737,38	2,38%
01.04.05	TAXAS E EMOLUMENTOS	CJ	1,00	4218,84			100,25	2,38%
01.04.06	CÓPIAS REPROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES	UN	500,00	2890			68,67	2,38%
01.04.07	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DECORRENTES DE LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES - CAÇAMBA 5,0 M³	M3	300,00	13203			313,74	2,38%
SUBTOTAL PAGO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS							50304,26	

VALORES TOTAIS PAGOS NO MÊS OUTUBRO

MÊS	OUTUBRO DE 2016
VALOR	793625,59

Boa Vista, 13 de dezembro de 2016.

Tammy Nabilla Sousa Cruz
Assessora em Engenharia Civil
Matrícula – 26196
Fiscal de Obra

ANEXO 01: DETALHE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO





RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima







RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima





RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima





RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima




RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima



RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima

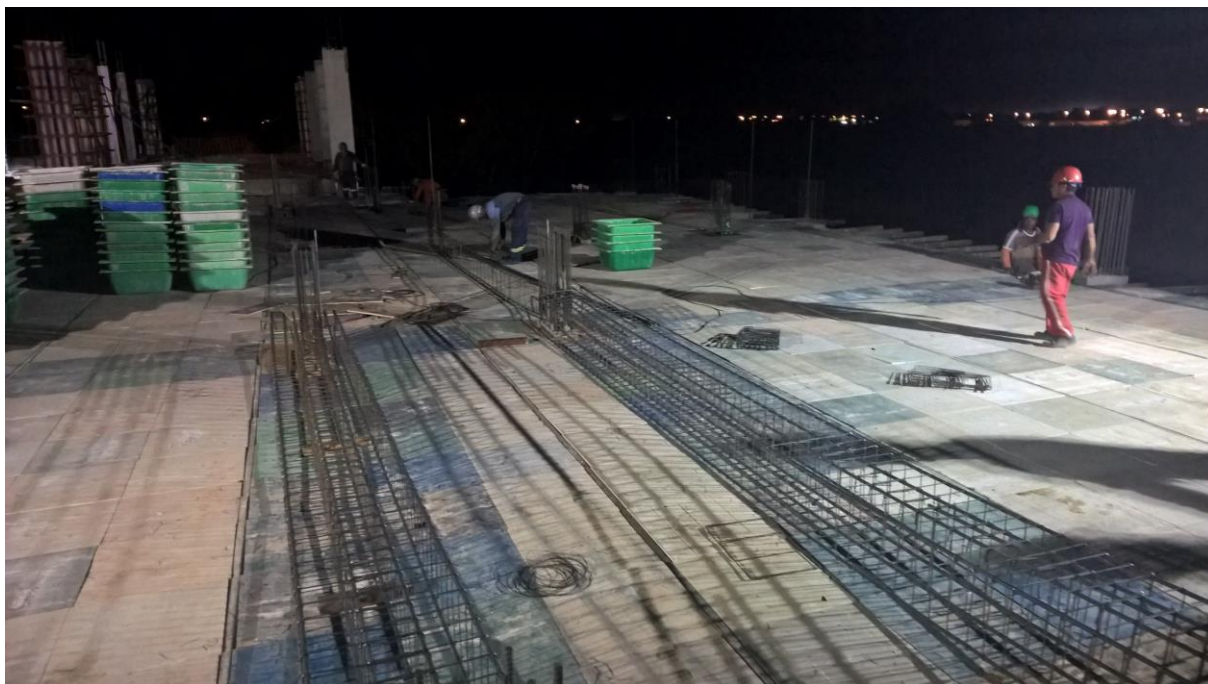





RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima



RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima





RUA GENERAL PENHA BRASIL, Nº 1255 – BAIRRO SÃO FRANCISCO
BOA VISTA – RR/CEP: 69.305-130 – EDIFÍCIO ANEXO, 1º ANDAR
FONES: (95) 3198-2000

MPF | Procuradoria
Ministério Público Federal da República
em Roraima
