



Medição	Data de referência	Valor da obra sem reajuste	Valor de revisões em andamento	Valor da obra com reajuste	Valor empenhado	Valor medido a PI	Valor medido reajustado	Valor liquidado	Valor planejado	Parcela planejada	Parcela liquidada	Índice de performance de prazo (IPS)	Progressão física mensal	% físico medido (global)	% financeiro executado	% obra empenhado (IDR-I)	% obra empenhado liquidado (IDR-II)
1	mai/2016	33.398.124,45		33.398.124,45	8.000.000,00	804.884,22		804.884,22	356.788,58	356.788,58	804.884,22	🟡 2,26	225,59%	2,41%	2,41%	23,95%	10,06%
2	jun/2016	33.398.124,45		33.398.124,45	8.000.000,00	1.703.741,57		1.703.741,57	1.257.833,71	901.045,13	898.857,35	🟡 1,35	99,76%	5,10%	5,10%	23,95%	21,30%
3	jul/2016	33.398.124,45		33.398.124,45	8.000.000,00	2.020.467,16		2.020.467,16	2.017.579,51	759.745,80	316.725,59	🟡 1,00	41,69%	6,05%	6,05%	23,95%	25,26%
4	ago/2016	33.398.124,45		33.398.124,45	8.000.000,00	2.392.882,18		2.392.882,18	2.664.797,71	17.218,20	372.415,02	🔴 0,90	57,54%	7,16%	7,16%	23,95%	29,91%
5	set/2016	33.398.124,45		33.398.124,45	8.000.000,00	2.591.359,32		2.591.359,32	2.439.255,23	-225.542,48	198.477,14	🟡 1,06	-88,00%	7,76%	7,76%	23,95%	32,39%
6	out/2016	33.398.124,45		33.398.124,45	8.000.000,00	2.959.692,96		2.959.692,96	3.045.505,82	606.250,59	368.333,64	🔴 0,97	60,76%	8,86%	8,86%	23,95%	37,00%
7	nov/2016	33.398.124,45	102.681,90	33.398.124,45	8.000.000,00	3.753.318,55		3.753.318,55	3.904.995,25	859.489,43	793.625,59	🔴 0,96	92,34%	11,24%	11,24%	23,95%	46,92%
8	dez/2016	33.500.806,35		33.500.806,35	8.240.000,00	4.297.557,84		4.400.239,74	4.707.104,26	802.109,01	646.921,19	🔴 0,91	67,85%	12,83%	13,13%	24,60%	53,40%
9	jan/2017	33.500.806,35		33.500.806,35	8.240.000,00	5.286.947,85		5.389.629,75	5.247.731,23	540.626,97	989.390,01	🟡 1,01	183,01%	15,78%	16,09%	24,60%	65,41%
10	fev/2017								5.729.838,11	482.106,88							
11	mar/2017								6.161.110,87	431.272,76							
12	abr/2017								6.625.820,53	464.709,66							
13	mai/2017								7.113.982,53	488.162,00							
14	jun/2017								7.630.568,96	516.586,43							
15	jul/2017								8.106.039,16	475.470,20							
16	ago/2017								8.727.704,20	621.665,04							
17	set/2017								9.029.449,87	301.745,67							
18	out/2017								9.331.195,55	301.745,68							
19	nov/2017								9.918.154,43	586.958,88							
20	dez/2017								10.527.258,17	609.103,74							
21	jan/2018								11.421.883,38	894.625,21							
22	fev/2018								12.163.898,85	742.015,47							
23	mar/2018								12.819.581,71	655.682,86							
24	abr/2018								13.944.450,26	1.124.868,55							
25	mai/2018								15.069.219,76	1.124.769,50							
26	jun/2018								16.133.788,84	1.064.569,08							
27	jul/2018								17.947.601,05	1.813.812,21							
28	ago/2018								18.865.538,72	917.937,67							
29	set/2018								19.889.593,86	1.024.055,14							
30	out/2018								20.782.483,66	892.889,80							
31	nov/2018								21.941.223,87	1.158.740,21							
32	dez/2018								22.985.119,59	1.043.895,72							
33	jan/2019								24.676.484,39	1.691.364,80							
34	fev/2019								26.653.177,62	1.976.693,23							
35	mar/2019								29.804.206,52	3.151.028,90							
36	abr/2019								31.063.444,92	1.259.238,40							
37	mai/2019								32.043.599,74	980.154,82							


Medição	Data de referência	Valor da obra sem reajuste	Valor de revisões em andamento	Valor da obra com reajuste	Valor empenhado	Valor medido a PI	Valor medido reajustado	Valor liquidado	Valor planejado	Parcela planejada	Parcela liquidada	Índice de performance de prazo (IPS)	Progressão física mensal	% físico medido (global)	% financeiro executado	% obra empenhado (IDR-I)	% obra empenhado liquidado (IDR-II)
38	jun/2019								32.776.895,15	733.295,41							
39	jul/2019								33.004.640,13	227.744,98							
40	ago/2019								33.322.390,61	317.750,48							
41	set/2019								33.354.363,96	31.973,35							
42	out/2019								33.398.124,45	43.760,49							

Execução física

Obra da nova sede da PR-RR

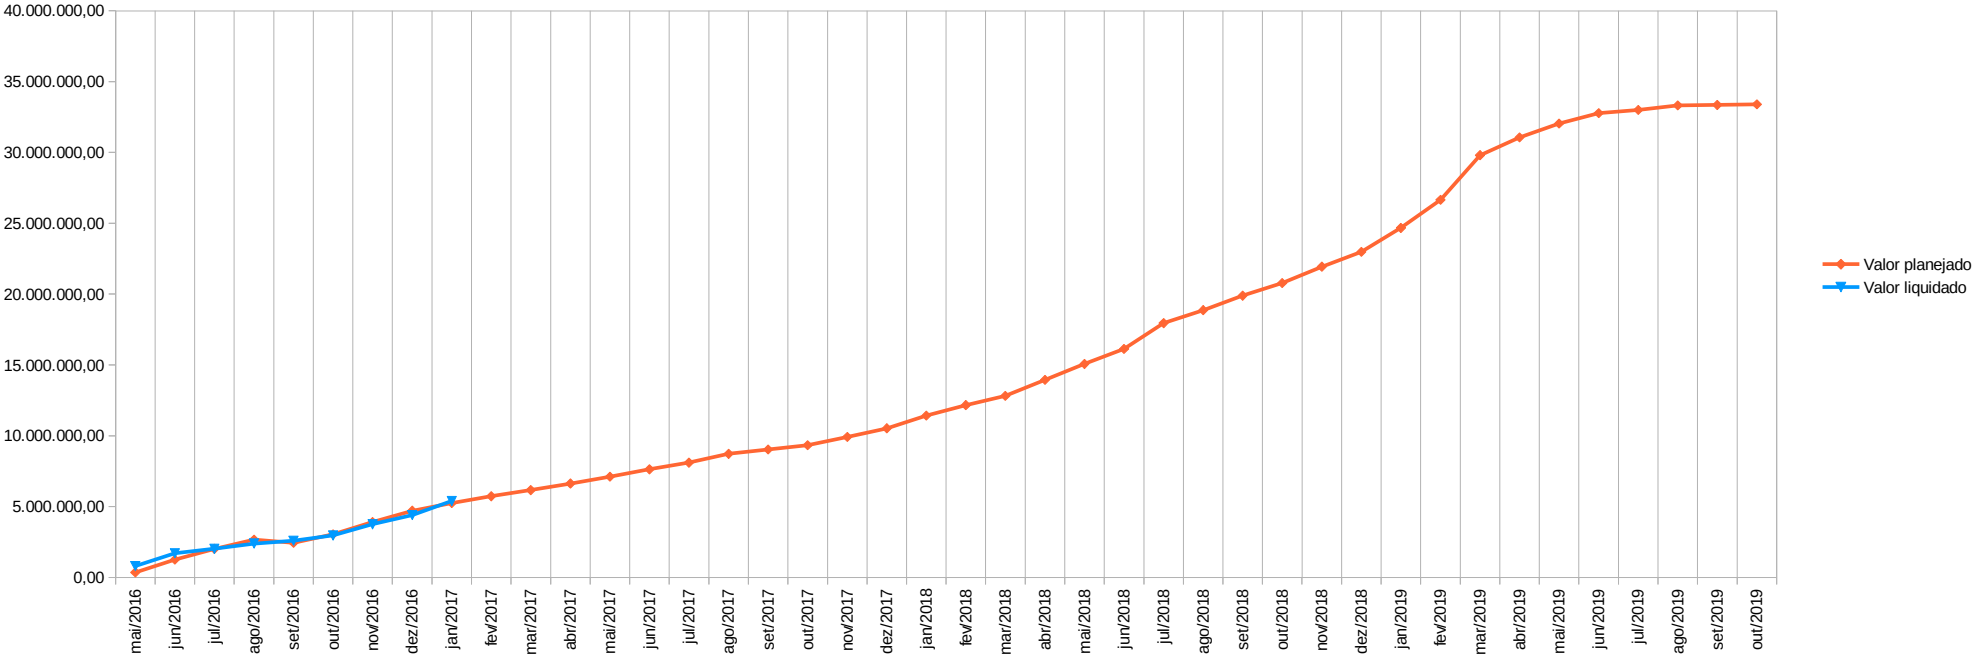

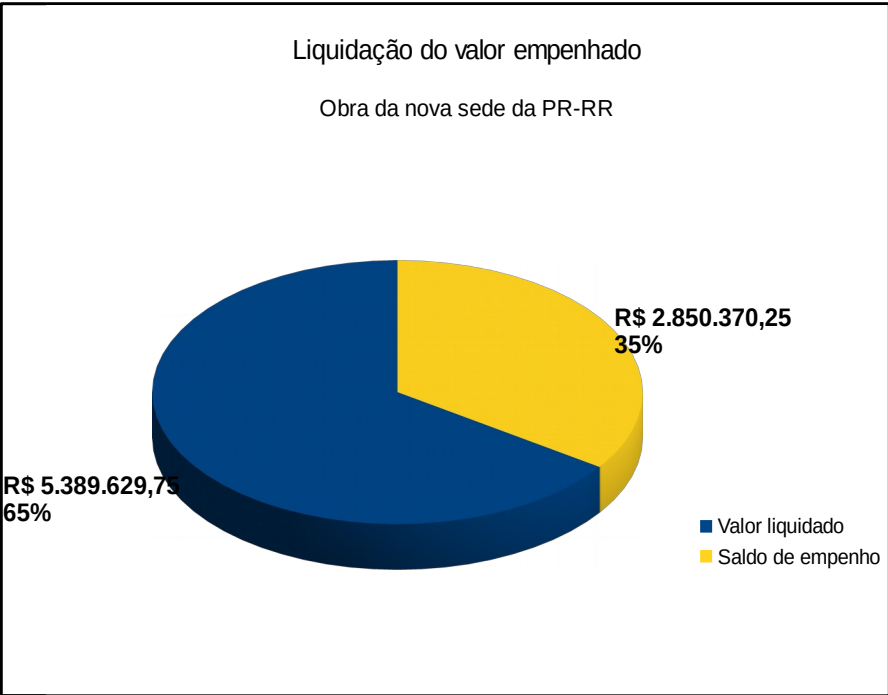

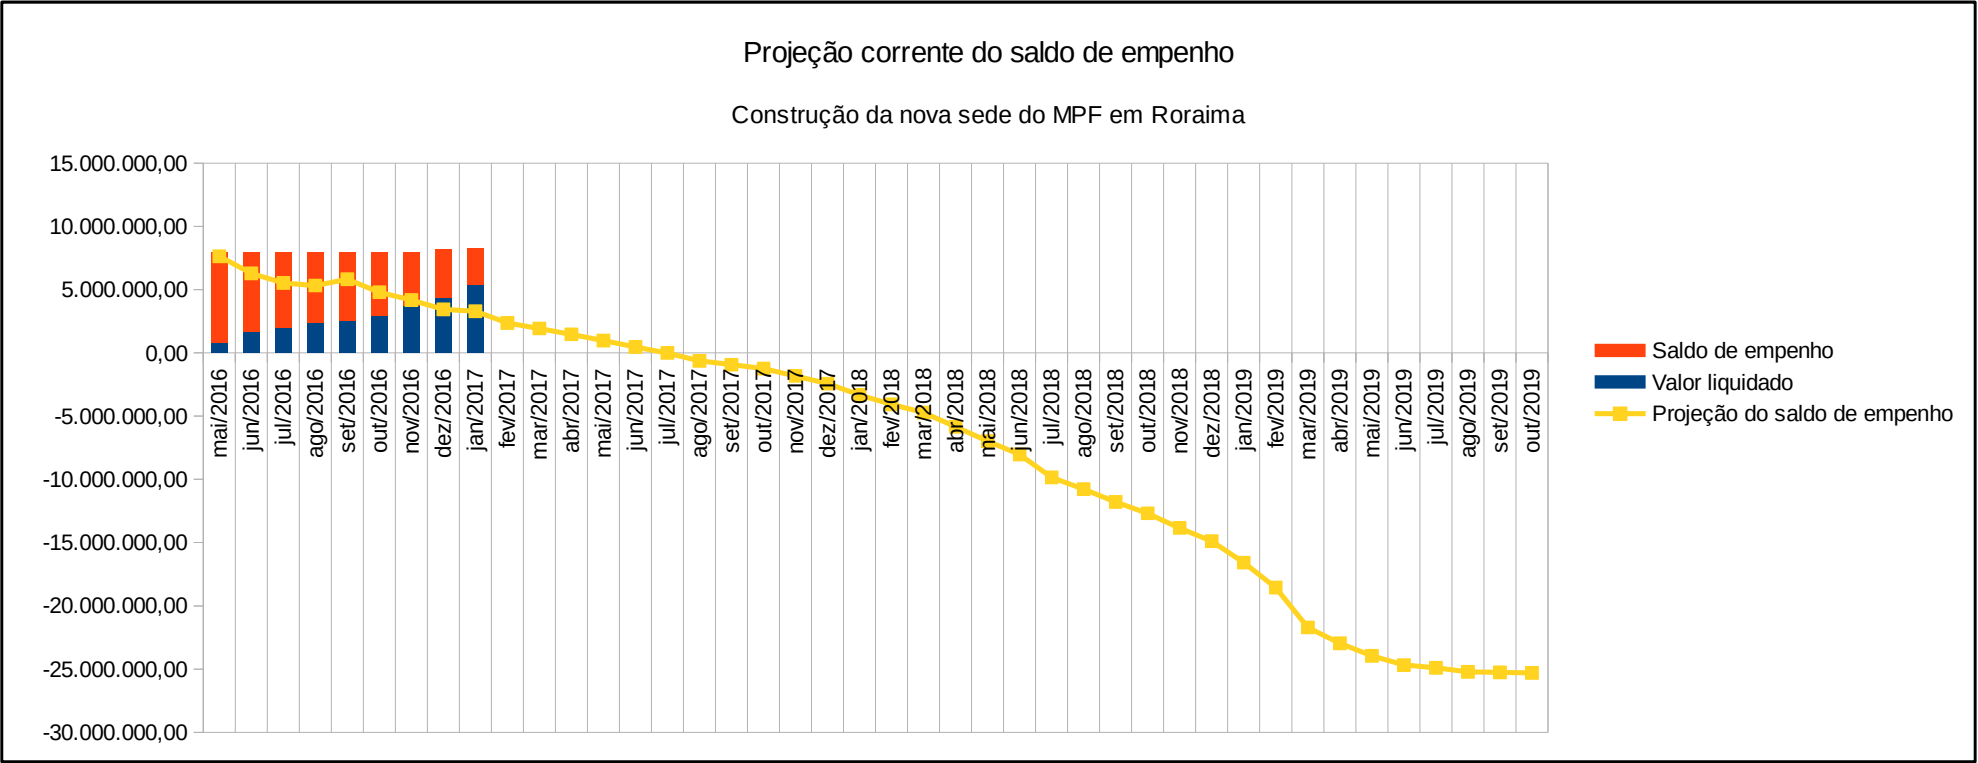

Indicador de Disponibilidade de Recursos (IDR)

Obra da nova sede da PR-RR

