



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE DE PAGAMENTO DA OBRA SEDE 2017

PROCESSO Nº 1.32.000.000189/2017-28 – CONTRATO Nº 15/2015 – OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA

Mês	% previsto no cronograma	% Medido	Parcela nº	NF	Valor Parcela R\$	Vlr. Reajuste R\$	Total Pago R\$	OB 2017	Glosa/Multa (Valor) - Motivo	Pago em
Execução 2016	14,05	12,89	1 a 8	-	4.400.239,76			-	0,00	2016
Reajuste Dez/2016-Jan/Fev/2017	N/A	N/A	8, 9 e 10	827	0,00	81.569,77	81.569,77	173	0,00	04/5/17
4º Aditivo	N/A	N/A	Junto a 16	880	0,00	0,00	0,00	407	Acréscimo de 3,05% = + R\$ 1.079.392,28 Supressão de 4,03% = - R\$ 1.424.675,55	28/9/17
Janeiro	1,66	2,96	9	817	989.390,01	0,00	989.390,01	057	0,00	21/2/17
Fevereiro	1,48	1,35	10	822	450.784,24	0,00	450.784,24	105	0,00	29/3/17
Março	1,29	1,17	11	826	390.613,03	22.926,33	413.539,36	173	0,00	04/5/17
Abril	1,39	0,63	12	837	208.744,80	12.251,90	220.996,70	225	0,00	02/6/17
Maio	1,46	1,01	13	847	335.764,64	19.707,10	335.764,64	255	0,00	30/6/17
Junho	1,55	1,32	14	852	439.326,65	25.785,48	465.112,13	309	0,00	28/7/17
Julho	1,42	0,83	15	859	277.922,45	16.312,16	294.234,61	375	0,00	08/9/17
Agosto	1,22	2,31	16	870	765.302,99	44.918,07	810.221,06	407	0,00	28/9/17
Setembro	3,97	1,29	17	880	425.644,41	24.982,43	450.626,84	437	0,00	31/10/17
Outubro	2,26	1,57	18	886	522.616,33	30.674,02	548.302,44	492	4.987,91	04/12/17
Novembro	1,92	1,39	19	894	458.407,69	26.905,41	485.313,10	544	0,00	28/12/17
Dezembro	1,51	1,59	20	901	527.461,31	30.958,39	558.419,70	2018/021	0,00	31/01/17
Total 2017	35,18	30,31			R\$ 5.791.978,55	R\$ 336.991,06	R\$ 6.099.286,69		R\$ 4.987,91	

Percentuais de alíquotas prevista no contrato: COFINS: 3,00% / PIS: 0,65% / ISS: 2,00% / CPRB: 2,00%

Percentuais de Reajustes Anuais: 2016: 5.8693192% / 2017: / 2018: / 2019: / 2020:

↑ **Total Inicial do Contrato = R\$ 33.398.124,45 (100%)**



Aumento de 0,3282546604200105% Art. 65, §§ 1º e 2º LLC

Novo Total pós 2º Aditivo = R\$ 33.500.806,35 (100%)

Aumento de 5,088211% (reajuste 2016)

Novo Total pós 3º Aditivo = R\$ 35.205.398,22 (100%)

Novo Total Após 4º Aditivo = 3,05% de acréscimo (R\$ 1.079.392,28) e 4,03% de supressão (R\$ 1.424.675,55) = Novo Valor Contratual = R\$ 34.860.638,35

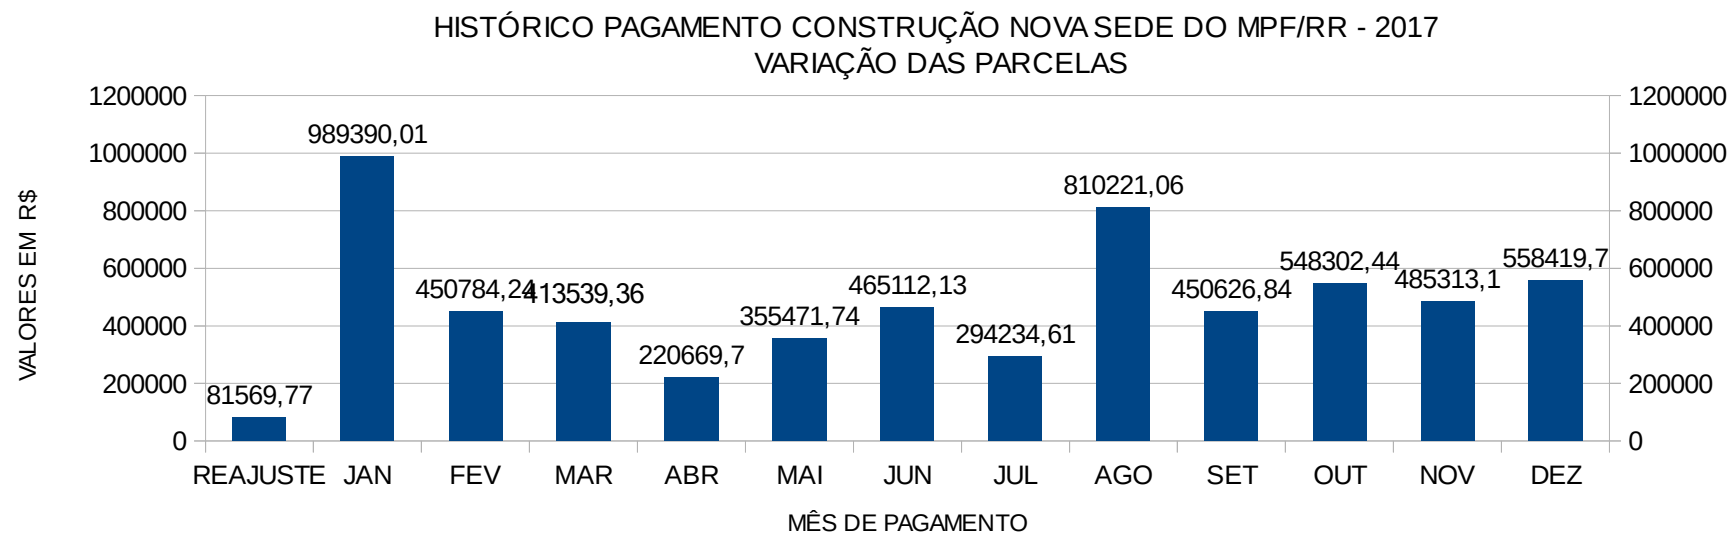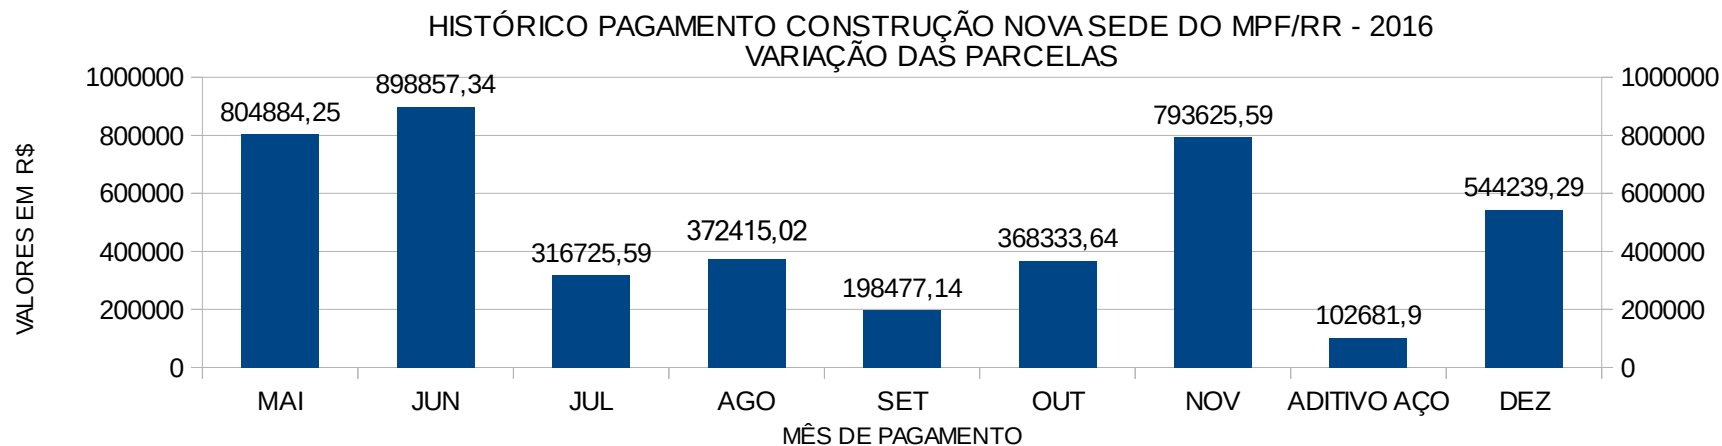



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE DE PAGAMENTO DA OBRA SEDE 2017

PROCESSO Nº 1.32.000.000189/2017-28 – CONTRATO Nº 15/2015 – OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA

CRONOGRAMA APÓS 4º ADITIVO – ALTERAÇÕES DE PERCENTUAIS MÊS DE EXECUÇÃO DEVIDO A SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO

Mês	% previsto no cronograma	% Medido	Parcela nº	NF	Valor Parcela R\$	Vlr. Reajuste R\$	Total Pago R\$	OB 2017	Glosa/Multa (Valor) - Motivo	Pago em
Execução 2016	14,23	12,99	1 a 8	-	4.400.239,76	0,00	0,00	-	N/A	2016
Reajuste Dez/2016-Jan/Fev/2017	N/A	N/A	8, 9 e 10	827	0,00	81.569,77	81.569,77	173	N/A	04/5/17
4º Aditivo	N/A	N/A	Junto a 16	880	0,00	0,00	0,00	407	Acréscimo de 3,05% = + R\$ 1.079.392,28 Supressão de 4,03% = - R\$ 1.424.675,55	28/9/17
Janeiro	1,63	2,99	9	817	989.390,01	0,00	989.390,01	057	0,00	21/2/17
Fevereiro	1,46	1,36	10	822	450.784,24	0,00	450.784,24	105	0,00	29/3/17
Março	1,30	1,18	11	826	390.613,03	22.926,33	413.539,36	173	0,00	04/5/17
Abril	1,41	0,63	12	837	208.744,80	12.251,90	220.996,70	225	0,00	02/6/17
Maio	1,48	1,02	13	847	335.764,64	19.707,10	335.764,64	255	0,00	30/6/17
Junho	1,56	1,33	14	852	439.326,65	25.785,48	465.112,13	309	0,00	28/7/17
Julho	1,44	0,84	15	859	277.922,45	16.312,16	294.234,61	375	0,00	08/9/17
Agosto	1,22	2,31	16	870	765.302,99	44.918,07	810.221,06	407	0,00	28/9/17
Setembro	3,97	1,29	17	880	425.644,41	24.982,43	450.626,84	437	0,00	31/10/17
Outubro	2,26	1,57	18	886	522.616,33	30.674,02	548.302,44	492	4.987,91	04/12/17
Novembro	1,92	1,39	19	894	458.407,69	26.905,41	458.313,10	544	0,00	28/12/17
Dezembro	1,51	1,59	20	901	527.461,31	30.958,39	558.419,70	2018/021	0,00	31/01/17
Total 2017	35,39	30,49			R\$ 5.791.978,55	R\$ 336.991,06	R\$ 6.072.286,69		R\$ 4.987,91	
