

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2022

Responsável pela Edição

ROBSON GUIMARAES COSTA

Data de Criação

27/09/2022 16:41

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para retomada da execução da obra de construção da nova sede do MPF em Roraima.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/09/2022 13:52	2.0	Ajustes revisionais da Matriz de Riscos do PGEA de Contratação da Obra da Nova Sede da PRRR/MPF.	ROBSON GUIMARAES COSTA
28/09/2022 21:26	1.0	Revisão da Matriz de Riscos do PGEA de Contratação da Obra da Nova Sede da PRRR/MPF.	ROBSON GUIMARAES COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS SEREEM DESENVOLVIDAS	Má especificação do projeto básico, projetos e/ou memorial descritivo.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados; Retrabalho.

Ações Preventivas

P-01 Realizar Estudo Técnico Preliminar apurado e um Projeto Básico tecnicamente robusto, com a participação de equipe capacitada e com o auxílio da SEA/PGR formalizar um bom caderno de especificações e planilhamento de preços; Garantir a participação dos integrantes da no processo de contratação. Responsáveis: ROBSON GUIMARAES COSTA, SIMIZAL SIQUEIRA SANTA ROSA, Marcos Eduardo Silva Madureira

P-02 Revisão técnica, administrativa e jurídica do Projeto Básico e projetos antes do lançamento do edital de licitação. Responsáveis: ROBSON GUIMARAES COSTA, Marcos Eduardo Silva Madureira

Ações de Contingência

C-01 Eventual correção posterior de projetos e planilhas e previsão de aditivo de acréscimo e/ou decréscimo (caso excepcional). Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERROS NA ELABORAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO BÁSICO	Falta de capacitação dos colaboradores responsáveis pela elaboração da especificação técnica do projeto básico.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.

2 Impugnação de edital ou necessidade de futuros aditivos contratuais.

3 Atraso na realização do certame e consequentemente da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Garantir que as especificações técnicas sejam feitas por profissionais capacitados da área. Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira

P-02 Revisão do Projeto Básico. Responsáveis: Marcos Eduardo Silva Madureira, ROBSON GUIMARAES COSTA, Igor José Barbosa Duarte Lopes

Ações de Contingência

C-01 Corrigir a especificação técnica falhas, obscuras ou alheias a realidade de mercado. Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira

C-02 Retificação do edital e relançamento da licitação. Responsável: Nazareno Nunes Rodrigues

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INEXEQUIBILIDADE O ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO OBJETO	Falta de conhecimento técnico ao elaborar o cronograma da obra (no caso de não concordância com o cronograma apresentado na licitação).	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos						
1	Frustração na área técnica e do Procurador Chefe da unidade;					
2	Prejuízo à credibilidade da área técnica e atraso na contratação com possível perda de orçamento ou arrolamento de recursos em restos a pagar.					
3	Inviabilidade da contratação;					
4	Não solução do problema na data pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega ou de vigência contratual compatível com o mercado e logística do estado de Roraima.			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
Ações de Contingência						
C-01	Renegociar requisitos, prazos e valores com área técnica (Engenharia).			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
C-02	Formalizar parecer técnico que subsidie eventual termo aditivo para ajustar o cronograma da obra.			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM LICITAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA	O não levantamento em projeto de todos os serviços ou surgimento de patologias ou problemas advindos da execução parcial da obra anterior ao início do novo contrato.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	Atraso no cronograma de execução da obra.				
	2	Aumento de custos e de orçamento que carece de aprovação legislativa ou contrapartida orçamentária não prevista do próprio MPF.				
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento na obra de todos os serviços e itens necessários para execução remanescente da obra.			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
P-02	Revisão de todos os projetos e planilhas de preços dos itens da obra.			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
P-03	Realização dos levantamentos por profissionais técnicos e capazes na elaboração dos documentos técnicos.			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração no cronograma físico-financeiro;			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
C-02	Alteração dos projetos e planilhas e previsão de aditivo de acréscimo e/ou decréscimo (caso excepcional)			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	a) Falta de preparo da equipe ou quantidade de atribuições muito alta para cada servidor. b) Quantidade de servidores aquém do necessário. c) Procedimentos burocráticos além do necessário.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Demora no lançamento do edital de licitação e consequente atraso na contratação.				
	2	Não cumprimento dos prazos acordados (cronograma) e arrolamento de recursos orçamentários em restos a pagar.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento e apoio junto à área técnica e Grupo de Trabalho responsável pelos trabalhos da fase interna do certame.			Responsável: ROBSON GUIMARAES COSTA		
P-02	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises técnicas e administrativas de questões que precisem ser dirimidas na contratação.			Responsável: ROBSON GUIMARAES COSTA		
P-03	Encaminhar o processo de contratação para análise jurídica com edital de licitação já revisado pela PGR e PRRR (GT da Obra), respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.			Responsável: Igor José Barbosa Duarte Lopes		
Ações de Contingência						
C-01	Designação de servidores para que possam executar os processos administrativos e jurídicos sem dificuldades e retrabalhos.			Responsável: Igor José Barbosa Duarte Lopes		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	M A L DIMENSIONAMENTO DO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	Falta de conhecimento técnico ou falha na elaboração da planilha de custos da obra.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	Se houver sobre dimensionado, o impacto será desperdício de dinheiro público.				
	2	Se houver sub dimensionado, a licitação poderá restar deserta ou fracassada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do BDI pela área técnica e pela Secretária de Engenharia e Arquitetura da PGR/MPF.			Responsável: Marcos Eduardo Silva Madureira		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o edital e relançar a licitação com inevitável prejuízo acessório advindo do			Responsável: Nazareno Nunes Rodrigues		

atraso da contratação dentro do exercício 2022.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Falta de divulgação. Valores aquém do mercado. Documentação exigida não condizente com a realidade. crise humanitária ou calamidade pública que assole o mercado interno e/ou externo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Impossibilidade de contratação.
- 2 Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.
- 3 Atraso na contratação.
- 4 Perda orçamentária e de credibilidade da equipe responsável pelo planejamento e contratação do objeto.

Ações Preventivas

- P-01 Divulgar amplamente a licitação em todos os jornais de maior circulação do país. **Responsável:** Nazareno Nunes Rodrigues
- P-02 Realizar um bom levantamento de preços com uma planilha de preços condizente com a realidade pós pandemia do COVID-19 e localização geográfica do estado de Roraima, considerando as dificuldades logísticas de bens e serviços. **Responsável:** Marcos Eduardo Silva Madureira
- P-03 Prever a possibilidade de pagamento antecipado de equipamentos de grande vulto financeiro na obra. **Responsável:** SIMIZAL ROSA SIQUEIRA SANTA
- P-04 Definir tecnicamente regras de Capital Circulante Líquido mínimo como critério de habilitação econômico-financeira. **Responsável:** SIMIZAL ROSA SIQUEIRA SANTA
- P-05 Adotar o Regime de contratação por empreitada por preço unitário, de forma a otimizar e desburocratizar a execução contratual dentro de parâmetros técnicos e de rígido controle interno. **Responsável:** ROBSON GUIMARAES COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Relançar a licitação com prévia análise técnica, jurídica e administrativa da causa para fins de garantir o sucesso do relançamento do certame. **Responsável:** Nazareno Nunes Rodrigues

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO	a) Grande quantidade de empresas concorrendo ao certame. b) Falta de experiência e/ou competência da empresa em licitações (empresas aventureiras). c) falta de conhecimento regional de onde a obra será executada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Inexecução parcial ou total da obra.
- 2 Obra paralisada e inacabada, gerando custos de manutenção e segurança.
- 3 Necessidade de nova licitação e contratação.
- 4 Caso a obra seja executada, pode eventualmente ter má qualidade dos materiais fornecidos e/ou mão de obra desqualificada empregada na execução dos serviços e consequente recusa do objeto pela fiscalização.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar uma precisa verificação da proposta da empresa vencedora e analisar o risco na execução em detrimento de preços inexequíveis. **Responsáveis:** Nazareno Nunes Rodrigues, Marcos Eduardo Silva Madureira
- P-02 Definir regras claras no edital de licitação para casos de desclassificação de propostas. **Responsável:** Nazareno Nunes Rodrigues

Ações de Contingência

- C-01 Realizar uma precisa verificação da proposta da empresa vencedora e analisar o risco na execução em detrimento de preços inexequíveis e desclassificar a empresa se entender que os valores estejam inexequíveis, conforme § 1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93 e definido no edital de licitação e anexos. **Responsável:** Nazareno Nunes Rodrigues

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ATRASO NO INÍCIO DA OBRA	a) Falta de compromisso da empresa com o contrato; b) Dificuldades Orçamentárias ou Logísticas da empresa; c) Dificuldades da empresa junto ao CREA e Prefeitura para renovação do Alvará de Construção;	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos

- 1 Atraso no início da execução da obra;
- 2 Atraso na entrega da obra;
- 3 Necessidade de alteração do cronograma da obra;
- 4 Necessidade de apuração de penalidades contra a empresa.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar reunião pré contrato com a empresa e alinhar todas as diretrizes necessárias para um bom início de contrato e eventual esclarecimento que facilitem a logística da empresa na região e em sua instalação no canteiro de obra. **Responsáveis:** ROBSON GUIMARAES COSTA, Igor José Barbosa Duarte Lopes, Marcos Eduardo Silva Madureira, Sidney Wanderley de Oliveira
- P-02 Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. **Responsável:** Marcos Eduardo Silva Madureira
- P-03 Solicitar aplicação das penalidades cabíveis por falta de atendimento ao cronograma da obra. **Responsáveis:** Sidney Wanderley de Oliveira, Marcos Eduardo Silva Madureira

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar **Responsáveis:** Sidney Wanderley de Oliveira,

com o MPF);

ROBSON GUIMARAES COSTA ,
Igor José Barbosa Duarte Lopes
Responsável: ROBSON GUIMARAES COSTA
Responsáveis: Sidney Wanderley de Oliveira,
Marcos Eduardo Silva Madureira

- C-02 Execução da garantia contratual e paralisação da obra.
- C-03 Analisar se a prorrogação do prazo inicial de execução da obra, trará prejuízo ao contrato, especialmente se derivar se demora dos órgãos de fiscalização (CREA, SMOU, Meio Ambiente ect), do qual deve ser levado em consideração a existência de culpabilidade ou não da empresa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EXECUTAR CONTRATO	a) Não verificação da capacidade econômico-financeira da empresa ou caso fortuito ou força maior. b) Não elaboração de análise técnica de exequibilidade da proposta da empresa ganhadora, do qual é salutar constar em peça técnica própria do pregoeiro no relatório de proposta de adjudicação e homologação do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Atraso na execução da obra
- 2 Abandono da obra

Ações Preventivas

- P-01 Prever no edita, projeto básico e contrato, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados. **Responsável:** SIMIZAL SIQUEIRA SANTA ROSA
- P-02 Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada. **Responsável:** ROBSON GUIMARAES COSTA
- P-03 Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado, ao menos 30%; **Responsável:** SIMIZAL SIQUEIRA SANTA ROSA
- P-04 Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. **Responsável:** ROBSON GUIMARAES COSTA
- P-05 Prever na licitação exigência de capital circulante líquido mínimo para fins de assegurar a contratação de uma empresa com capacidade técnica e financeira suficientemente adequada para a execução da obra. **Responsável:** Igor José Barbosa Duarte Lopes

Ações de Contingência

- C-01 Acompanhar com rigor o Boletim de Medição, de forma a avaliar o cumprimento do cronograma físico-financeiro; **Responsável:** Marcos Eduardo Silva Madureira
- C-02 Avaliar a qualidade dos serviços prestados com o auxílio da SEA/PGR; **Responsável:** Marcos Eduardo Silva Madureira
- C-03 Requerer a aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual. **Responsáveis:** Sidney Wanderley de Oliveira, ROBSON GUIMARAES COSTA
- C-04 Cancelar contrato e adjudicar nova empresa ou promover nova contratação. **Responsável:** Igor José Barbosa Duarte Lopes

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	FALÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA	Avaliação ineficiente da capacidade econômico-financeira da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

Impactos

- 1 Atraso na entrega da obra. Desperdício de verba pública.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir requisitos de habilitação mínima relativos à qualificação econômica financeira. **Responsável:** Nazareno Nunes Rodrigues
- P-02 Exigir garantia contratual. **Responsável:** Nazareno Nunes Rodrigues

Ações de Contingência

- C-01 Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o MPF) e reincidir o contrato e adjudicar novo fornecedor em chamamento remanescente da ordem de classificação do certame ou promover nova contratação. **Responsável:** Igor José Barbosa Duarte Lopes

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	FALTA DE PESSOAL PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO	Número de servidores aquém do necessário para acompanhamento do contrato e das atividades de execução da obra. Má distribuição de tarefas entre os servidores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

- 1 Atraso no cronograma da obra.
- 2 Baixa qualidade técnica do serviço.
- 3 Baixa qualidade dos materiais empregados na execução da obra.
- 4 Execução não compatível com os projetos e caderno técnico.

Ações Preventivas

- P-01 Nomear fiscais e possíveis substitutos desonerados de funções e responsabilidades anteriores. **Responsável:** Igor José Barbosa Duarte Lopes
- P-02 Contratar profissional ou empresas de suporte para auxiliar na fiscalização da obra e do contrato. **Responsável:** ROBSON GUIMARAES COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Desonerar os fiscais da obra de suas atividades regulares, para fins de atender especificamente o acompanhamento da obra. **Responsável:** Igor José Barbosa Duarte Lopes

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA	Fiscalização ineficiente dos fiscais e gestores do contrato ou incapacidade técnica e gerencial da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1	Necessidade de recorrentes apurações de infração e penalidade contra a empresa.				
	2	Dano social e a imagem do MPF				
	3	Atraso no pagamento de fornecedores e colaboradores da empresa.				
4	Responsabilização subsidiária da Administração quanto a débitos previdenciários, sociais e trabalhistas.					
5	Eventual rescisão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no termo de referência por descumprimento de cláusulas contratuais;			Responsável:	SIMIZAL SIQUEIRA SANTA ROSA	
P-02	Realizar pagamentos conforme resultado ou serviço realizado.			Responsável:	Marcos Eduardo Silva Madureira	
P-03	Realizar recorrente e efetiva fiscalização administrativa do contrato.			Responsável:	Sidney Wanderley de Oliveira	
P-04	Suspender atividades e serviços que por ventura venham a causar problemas ou prejuízos a Administração.			Responsável:	Marcos Eduardo Silva Madureira	
P-05	Realizar reuniões periódicas com as equipes técnicas e administrativas das partes contratuais, de forma a balizar e alinhar todos os pontos e insurgências do contrato, antevendo problemas e sanando-os antes de serem preciso tratá-los.			Responsáveis:	Sidney Wanderley de Oliveira, Marcos Eduardo Silva Madureira	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades (multas, rescisão contratual e suspensão de contratar com o MPF).			Responsáveis:	Igor José Barbosa Duarte Lopes, ROBSON GUIMARAES COSTA	
C-02	Executar a garantia contratual.			Responsável:	Sidney Wanderley de Oliveira	
C-03	Formalizar denúncia contra a empresa a órgãos competentes no caso de descumprimento de direitos trabalhistas.			Responsável:	Igor José Barbosa Duarte Lopes	
C-04	Encaminhar valores de dívidas provenientes de multas da contratada à Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa ou execução e/o protesto junto ao cartório de valores inferiores ao mínimo necessário para execução ou inscrição em dívida ativa.			Responsável:	Igor José Barbosa Duarte Lopes	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA LOA PARA MANTER A EXECUÇÃO DA OBRA	Contingenciamento do orçamento federal, redução da arrecadação e meta fiscal e consequente redução do repasse constitucional do MPU.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Paralisação da obra.				
	2	Rescisão do contrato por parte da Administração com eventual necessidade de indenização a empresa contratada.				
	3	Degradação da estrutura da obra, com desgaste e eventual furto de materiais, equipamentos e demais itens da obra.				
4	Dano a imagem do Ministério Público Federal frente a sociedade.					
5	Necessidade de nova licitação com todo retrabalho das atividades de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Licitar a obra com a garantia de recursos orçamentário na LOA e eventualmente com remanejamento de recursos do próprio MPF para atender minimamente os valores previstos de dotação orçamentária do cronograma da obra.			Responsável: Igor José Barbosa Duarte Lopes		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração amigável do contrato de forma a dimensionar os recursos orçamentários previstos para atender o primeiro e segundo ano de obra, conforme cronograma inicial, de forma a possibilitar eventual alteração na execução dos serviços em ritmo mais lento.			Responsável: Igor José Barbosa Duarte Lopes		
C-02	Suspender o contrato pelo prazo de 120 dias para fins de ajustes orçamentários do contrato.			Responsável: Igor José Barbosa Duarte Lopes		
C-03	Reincidir amigavelmente o contrato para fins de paralisação da obra sem que haja necessidade de pagamento de indenização.			Responsável: ROBSON GUIMARAES COSTA		
C-04	Atuar junto a SEA e SPOC da PGR para remanejamento de orçamento do próprio MPF para atender minimamente o cronograma anual previsto para execução da obra.			Responsável: Igor José Barbosa Duarte Lopes		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ROBSON GUIMARAES COSTA
Coordenador de Administração

IGOR JO´SE BARBOSA
DUARTE LOPES
Secretário Estadual

PUBLICADO



SEÇÕES DO DOCUMENTO

- Matriz de Riscos
- Acompanhamento da Matriz de Riscos

Historico de Revisões



Painel

 > [Matrizes de Riscos](#) > **Matriz de Riscos Nº 1/2022**

7. Painel



Volar

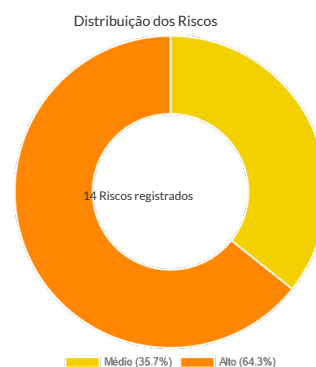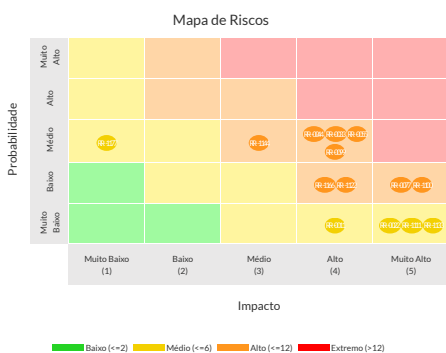

Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS	Planejamento	1	4	Médio	Administração
2	ERROS NA ELABORAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO BÁSICO	Planejamento	1	5	Médio	Administração
4	INEXEQUIBILIDADE NO ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO OBJETO	Planejamento	3	4	Alto	Administração
3	IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS EM LICITAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA	Planejamento	3	4	Alto	Administração
17	ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento	3	1	Médio	Administração
14	MAL DIMENSIONAMENTO DO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	Planejamento	3	3	Alto	Administração
5	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Seleção do Fornecedor	3	4	Alto	Administração
7	PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO	Seleção do Fornecedor	2	5	Alto	Administração
9	ATRASO NO INÍCIO DA OBRA	Gestão de Contrato	3	4	Alto	Contratada
10	INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO	Gestão de Contrato	2	5	Alto	Administração

1 2 > >>

Volar

REDES SOCIAIS



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.

Matriz de Riscos

PUBLICADO



SEÇÕES DO DOCUMENTO

Matriz de Riscos

Acompanhamento da Matriz de Riscos

Histórico de Revisões



Painel

Matrizes de Riscos > Matriz de Riscos Nº 1/2022

6. Histórico de Revisões



Voltar

Criar Revisão

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor	Ações
30/09/2022 12:52	2.0	Ajustes revisionais da Matriz de Riscos do PGEA de Contratação da Obra da Nova Sede da PRRR/MPF.	ROBSON GUIMARAES COSTA	
28/09/2022 20:26	1.0	Revisão da Matriz de Riscos do PGEA de Contratação da Obra da Nova Sede da PRRR/MPF.	ROBSON GUIMARAES COSTA	

Voltar

REDES SOCIAIS



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-RR-00024811/2022 MAPA DE RISCO**

.....
Signatário(a): **IGOR JOSE BARBOSA DUARTE LOPES**

Data e Hora: **30/09/2022 16:42:40**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **ROBSON GUIMARAES COSTA**

Data e Hora: **30/09/2022 13:59:11**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 57edde7f.8141b6a0.95c83b93.438fa65b
