



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA
CONTROLE DE PAGAMENTO DA OBRA SEDE 2018

PROCESSO Nº 1.32.000.000122/2018-74 – CONTRATO Nº 15/2015 – OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA

Mês	% previsto no cronograma	% Medido	Parcela nº	NF	Valor Parcela R\$	Vlr. Reajuste R\$	Total Pago Com Reajuste R\$	OB 2018	Glosa/Multa (Valor) - Motivo	Pago em
Execução 2016	14,23	12,99	1 a 8	-	4.400.239,76	0,00	4.400.239,76	-	0,00	2016
Execução 2017	21,16	17,50	9 a 20	-	5.791.978,55	336.991,06	6.099.286,69	-	0,00	2017
Reajuste Dez/2017-Jan/Fev/2018										
5º Aditivo									Acréscimo de 0,65 % = + R\$ 218.416,22 Supressão de 0,17% = - R\$ 57.785,61	
Janeiro	1,41	0,92	21	909	304.232,06	17.856,35	322.088,41	047	0,00	28/02/18
Fevereiro	1,31	2,51	22	918	828.781,82	56.116,05	884.897,87	082	0,00	23/03/18
Março	5,45	2,57	23	931	856.235,61	121.707,56	977.943,17	167	0,00	17/5/18
Abril	4,47	4,25	24	950	1.416.986,99	158.956,93	1.575.943,92		0,00	
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
Total 2018	48,03	40,74			R\$ 3.406.236,48	R\$ 354.636,89	R\$ 14.260.399,82		R\$ 0,00	

Percentuais de alíquotas prevista no contrato: COFINS: 3,00% / PIS: 0,65% / ISS: 2,00% / CPRB: 2,00%

Percentuais de Reajustes Anuais: 2016: 5.8693192% / 2017: 10,6714754% / 2018: / 2019: / 2020:

↑ **Total Inicial do Contrato = R\$ 33.398.124,45 (100%)**

Aumento de 0,3282546604200105% Art. 65, §§ 1º e 2º LLC

Novo Total pós 2º Aditivo = R\$ 33.500.806,35 (100%)

Aumento de 5,088211% (reajuste 2016)


Novo Total pós 3º Aditivo = R\$ 35.205.398,22 (100%)

Novo Total Após 4º Aditivo = 3,05% de acréscimo (R\$ 1.079.392,28) e 4,03% de supressão (R\$ 1.424.675,55) = Novo Valor Contratual = R\$ 34.860.638,35


Aumento de 10,6714754% (reajuste 2017)

↓ **Novo Total Após 5º Aditivo = 0,65% de Acréscimo (R\$ 218.416,22) e 0,17% de supressão (R\$ 57.785,61) = Novo Valor Contratual: R\$ 35.638.016,68**

HISTÓRICO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DO MPF/RR - 2018
VARIAÇÃO DAS PARCELAS

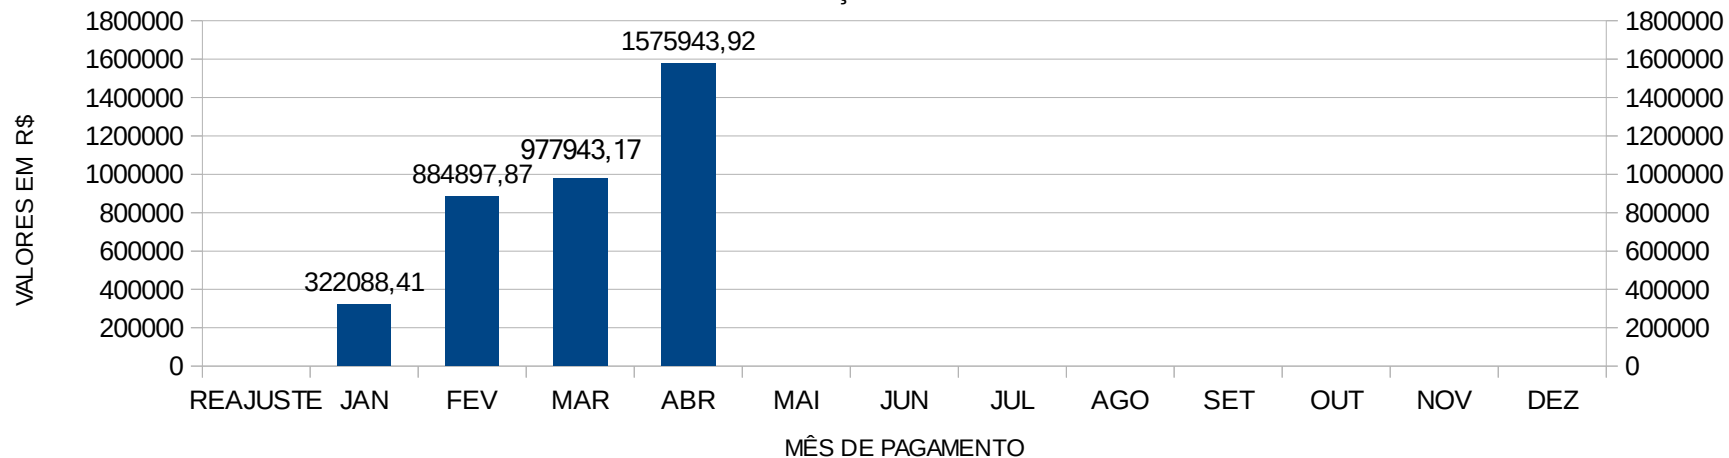

HISTÓRICO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DO MPF/RR - 2017
VARIAÇÃO DAS PARCELAS

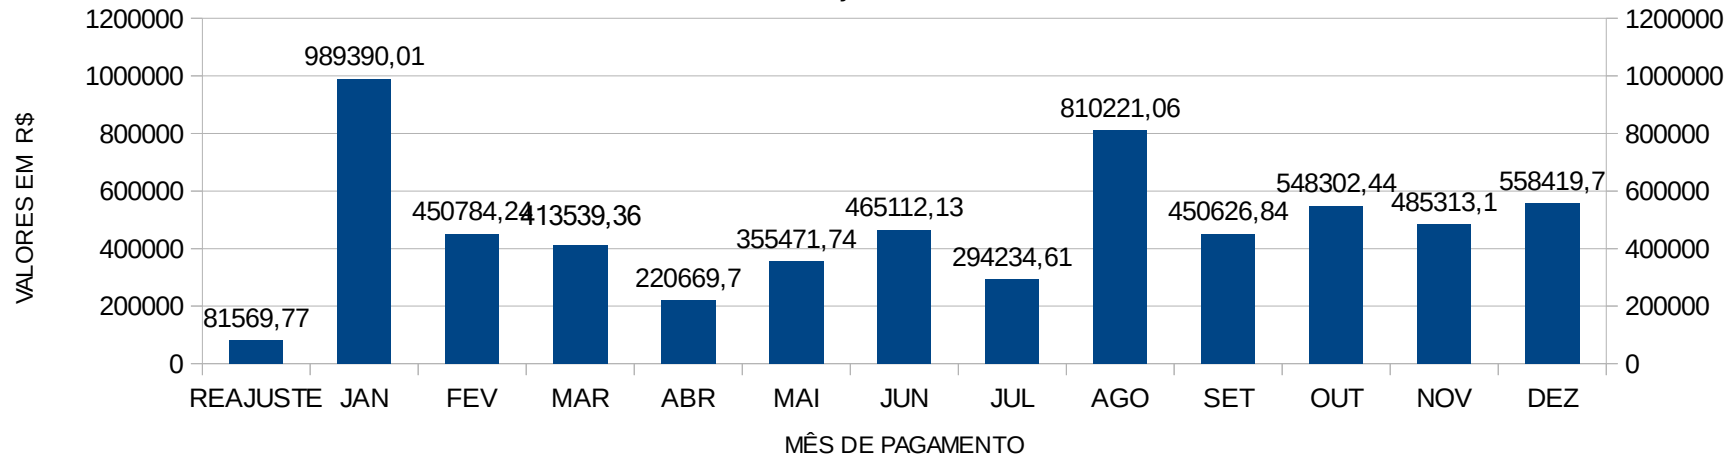

HISTÓRICO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DO MPF/RR - 2016
VARIAÇÃO DAS PARCELAS

