



RAMBOLL

RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS ENTRE FUNDÃO E CANDONGA

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 10



STATUS DO PROGRAMA: PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)



ORÇAMENTO



Orçamento Total Planejado

R\$ 570,80 milhões



Orçamento Gasto

R\$ 415,12 milhões

73%

CRONOGRAMA

O cronograma geral não foi apresentado pela Fundação Renova. Em 2020, o planejamento do programa prevê executar apenas 13 intervenções*, além de manter as condições de uso das vias pavimentadas e não pavimentadas.

*Relatório realizado mensalmente pela Fundação Renova nas reuniões da Câmara Técnica de Infraestrutura (CT-Infra).
Dados da reunião de 24/06/2020.

Vários municípios apresentaram solicitações de reforma ou reconstrução de imóveis com trincas ou outros problemas estruturais. São mais de **1.100 famílias** que precisam ter seus imóveis reparados. Esse número é duas vezes maior que o número de famílias a serem reassentadas em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.

Município	Nº de imóveis danificados	Documento de referência
Rio Doce	87	Lista elaborada pela comissão de atingidos/ Rosa Fortini/Defesa Civil Municipal
Santa Cruz o Escalvado	28	Lista elaborada pela comissão de atingidos/ Rosa Fortini/Defesa Civil Municipal
Barra Longa	627	Lista elaborada pelos atingidos e AEDAS, por meio de processo metodológico de autorreconhecimento coletivo dos danos à moradia
Mariana (Monsenhor	257	Lista referente ao levantamento de imóveis a serem periciados, elaborada pela Fundação Renova
Sooretama (Patrimônio da Lagoa)	57	Lista elaborada pelo município de Sooretama
Linhares	87	Lista elaborada pelo município de Linhares
TOTAL	1.143	

OBJETIVO RESUMIDO


Recuperar, manter, reconstruir e reformar todas as infraestruturas danificadas pelo desastre, tanto em área urbana quanto em área rural, localizadas entre Fundão e Candonga, a exemplo de: acessos pavimentados e não pavimentados; pontes; muros de gabião; casas, quintais e lotes; estabelecimentos comerciais; equipamentos públicos; campos de futebol, praças e espaços de lazer; redes de esgoto, de drenagem e de iluminação; currais, paióis, cercas, porteiras, galinheiros, cochos e chiqueiros.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA

Até dezembro de 2018, o programa previa executar a manutenção, reforma, reconstrução ou recuperação de 1.752 edificações atingidas. Porém, as obras relacionadas à manutenção, reforma e reconstrução de edificações aguardam definição para serem realizadas, pois foram alvo de um processo judicial, sendo retiradas do plano de obras da Fundação Renova.

Segundo a Fundação Renova, até o momento 1.143 obras estariam concluídas. A Ramboll fez uma vistoria em 190 dessas obras e observou que existem diferentes problemas. Classificando-os da seguinte maneira:


- **14% (27 obras)** foram, de fato, concluídas;
- **74% (140 obras)** apresentam inadequações por estarem localizadas em áreas de risco mapeadas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), estão situadas em locais inadequados à ocupação, de acordo com as leis federais, ou em área onde há risco de rompimento da barragem;
- **11% (21 obras)** foram classificadas como “não se aplica” (N/A), ou seja, não tiveram uma classificação definida por qualquer um dos seguintes motivos: o endereço não foi encontrado; o cadastro da obra estava errado ou em duplicidade; e não foi possível verificar a obra realizada;
- **1% (2 obras)** está em andamento.

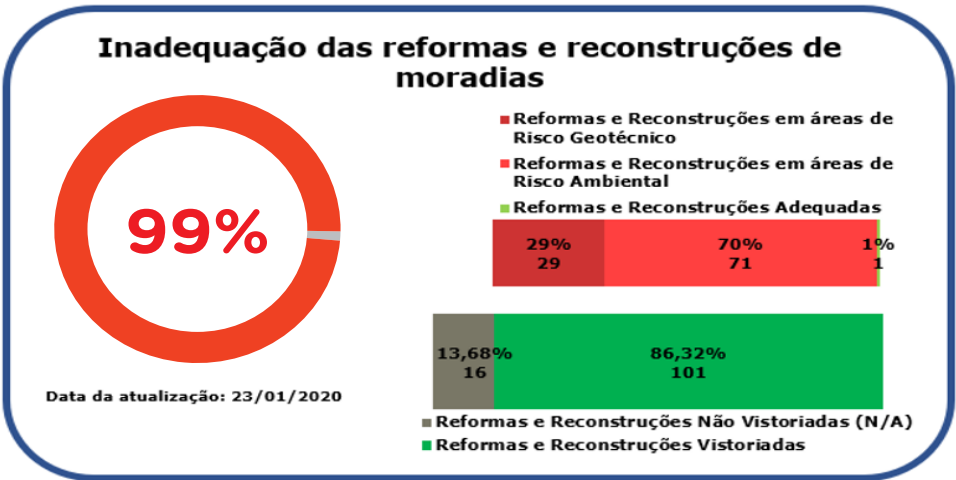

*Todas as informações constantes foram compiladas no primeiro trimestre de 2020 no âmbito do processo de judicialização.

*Todas as informações constantes foram compiladas no primeiro trimestre de 2020 no âmbito do processo de judicialização.

Adequação das intervenções em acessos pavimentados



2 de 6

Data da atualização: 23/01/2020


- Acessos pavimentados sem inadequações
- Acessos pavimentados com buracos na pista, erosão nos taludes laterais e/ou ausência de elementos de drenagem



- Acessos Pavimentados Não Vistoriados (N/A)
- Acessos Pavimentados Vistoriados




Adequação das intervenções em acessos não pavimentados



19 de 39

Data da atualização: 23/01/2020

- Acessos não pavimentados sem inadequações
- Acessos não pavimentados com buracos na pista, erosão nos taludes laterais e/ou ausência de elementos de drenagem



- Acessos Não Pavimentados Não Vistoriados (N/A)
- Acessos Não Pavimentados Vistoriados



Adequação das intervenções em pontes de cabo de aço



0 de 9

Data da atualização: 23/01/2020

- Pontes de cabo de aço com inadequações no tabuleiro e/ou no guarda-corpo



- Pontes de cabo de aço vistoriadas




Adequação das intervenções em pontes



4 de 11

Data da atualização: 23/01/2020

- Pontes sem inadequações
- Pontes com inadequações no tabuleiro, no engate com via de acesso e/ou no guarda-corpo



- Pontes vistoriadas



PONTOS CRÍTICOS:

Durante os primeiros oito (8) meses de 2020, o Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga ficou paralisado. Primeiro, porque uma ação judicial exigiu o reajuste da abrangência do programa. Depois, devido ao período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, se tornou necessário o replanejamento das ações e adiamento, para agosto de 2020, das atividades que originalmente seriam iniciadas em março de 2020.

*Todas as informações constantes foram compiladas no primeiro trimestre de 2020 no âmbito do processo de judicialização.
