

A black bird with a crest is perched on a thin branch. The bird is facing left, and its crest is raised. The background is a soft-focus natural setting with green foliage and a tree trunk. The overall tone is naturalistic and documentary.

RAMBOLL

FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 29



PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

OBJETIVO RESUMIDO

Construir e aparelhar dois Centros de Triagem / Reabilitação de Animais Silvestres, sendo uma unidade localizada em Minas Gerais (Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS) e outra no Espírito Santo (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS). Além disso, está previsto o custeio da manutenção operacional desses Centros por um período de três (3) anos a partir da entrega de cada unidade.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA

As principais etapas do programa são:

-  Definição do local de implantação do CETAS/MG e do CETRAS/ES
-  Elaboração do projeto conceitual e definição do cronograma de obras
-  Construção dos CETAS/MG e do CETRAS/ES
-  Operação e manutenção dos Centros por três (3) anos

O CETAS/MG será instalado no município de Nova Lima. O projeto conceitual está pronto, mas o início da construção depende da conclusão dos projetos básico e executivo, que estavam em produção até esta data.

O CETRAS/ES ainda não tem seu projeto conceitual pronto, e os próximos passos dependem da conclusão desta etapa inicial.

Os prazos dessas ações iniciais do programa já haviam sido ajustados para março de 2019, mas estão atrasados e isso também irá adiar o começo da etapa de construção dos Centros.

	CETAS - MG NOVA LIMA	CETRAS - ES SERRA
PROJETO CONCEITUAL	100%	45%
PROJETO BÁSICO	86%	0%
PROJETO EXECUTIVO	25%	0%
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0%	0%
CONSTRUÇÃO	0%	0%
OPERAÇÃO	0%	0%



A Ramboll reitera, que a construção tem maior importância que o planejamento ou a operação, sendo assim, foi determinado um peso maior. Aplicando essa ponderação, o programa como um todo cumpriu apenas 5% das ações estabelecidas para o CETRAS/MG e 1% para o CETRAS/ES.

STATUS DO PROGRAMA: PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)

!



	Cronograma original (set/2017)	Cronograma atual (jun/2020)
Início	02/03/2016	09/01/2016
Término	02/09/2022	27/02/2023

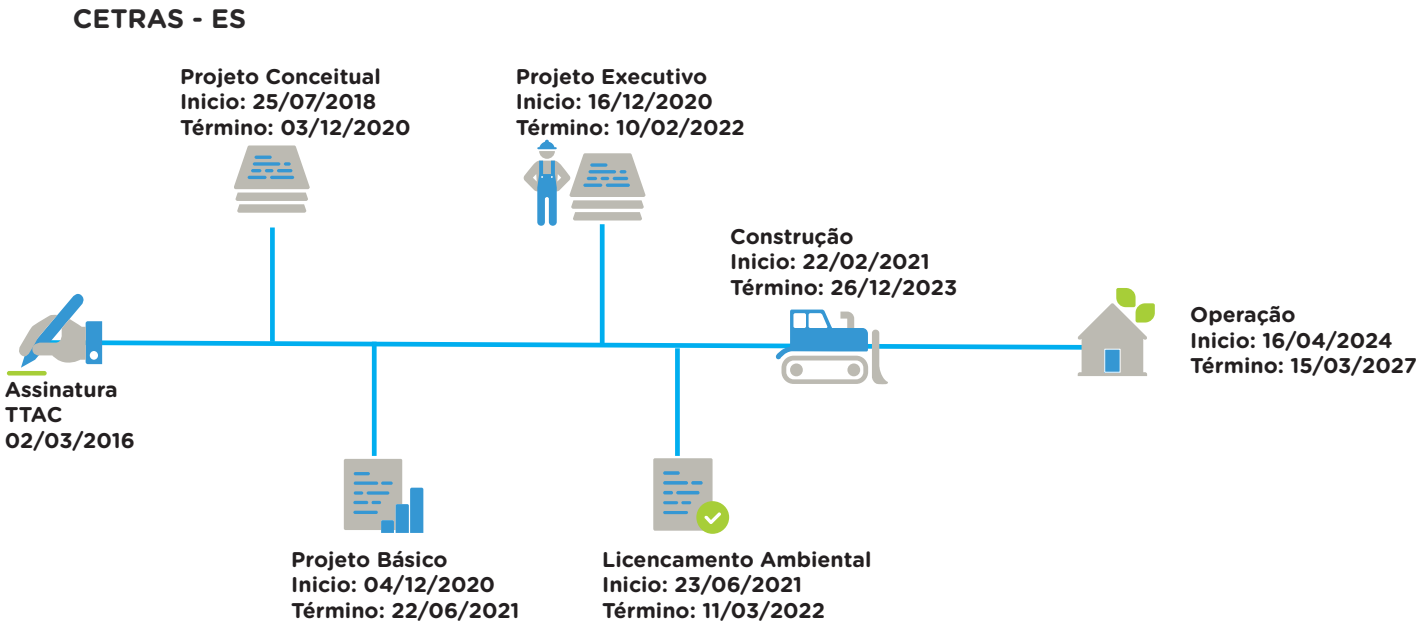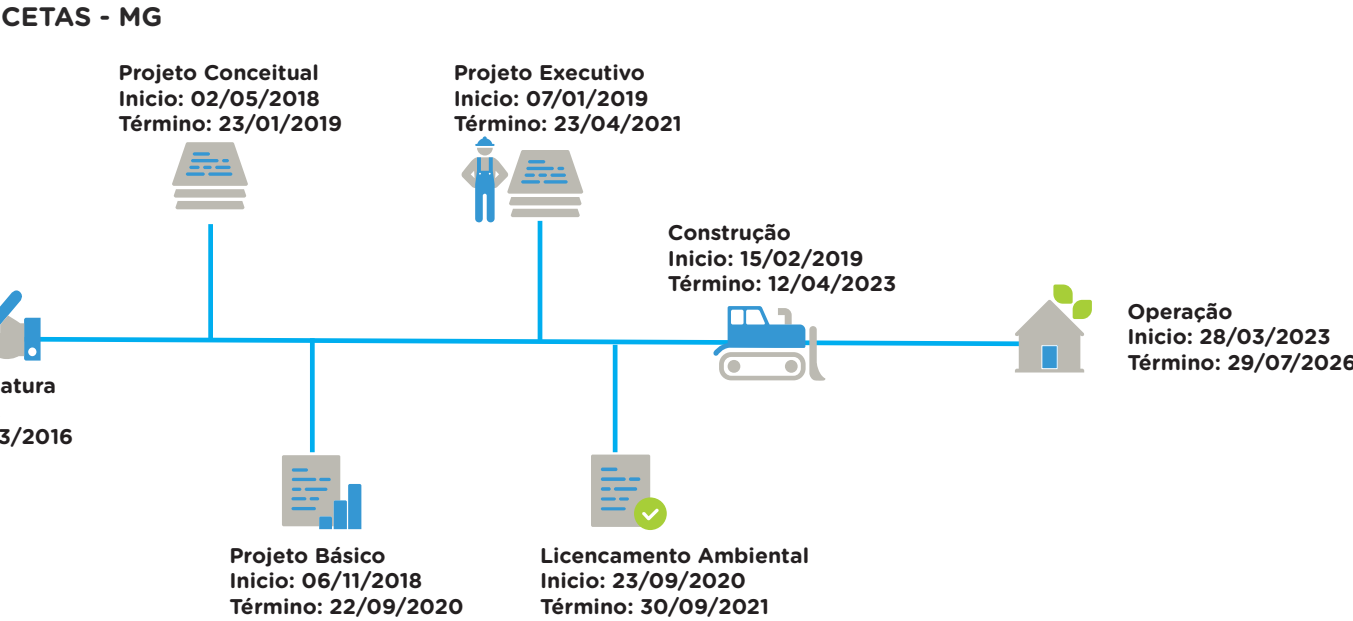

O programa ainda está na fase inicial de planejamento, com processos muito lentos. Seus indicadores ainda não foram aprovados pelo CIF. Como não há um cronograma oficial pela Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade não é possível fazer um acompanhamento adequado. Por todos esses motivos, fica claro que não será cumprido o prazo inicialmente proposto para sua realização.

Atuais instalações do CETAS/ES:

