



RAMBOLL

MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 32

PROGRAMA DE MELHORIAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVO RESUMIDO

Garantir o reestabelecimento do abastecimento de água de 24 localidades (em 17 municípios), implantar sistemas alternativos de captação e adução de água (redução de 30% a 50% de dependência de captação no rio Doce) e Melhorar as Estações de Tratamento de Água (ETAs), que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA

Captações alternativas: apenas sete (7) localidades, menos de 30% do previsto, mas somente **duas que não apresentam inadequação**.

Adutora de Governador Valadares: o atraso das obras já supera 56% do planejado, com déficit de 18 km (18.000 metros) de tubulação que não foram implantadas nos últimos meses.

Melhorias das Estações de Tratamento de Água (ETA): para 26 unidades, até **julho** de 2020, **41%** das ações foram finalizadas (153 de 374), sendo Galileia (MG) e Linhares-Regência (ES) as únicas localidades com todas as melhorias na ETA executadas e sem pendências.

Entrega de projetos básicos: o índice de entrega de projetos básicos é de 70% (58 de 83 projetos), sendo assim, o programa segue com o descumprimento de cláusula, considerando que o prazo original de entrega, estabelecido no TTAC, era março de 2018.

ABASTECIMENTO EMERGENCIAL:

População abastecida por caminhão pipa
Data de atualização: agosto/2020

NOV/2015
70%
432.505 habitantes

NOV/2018
4,73%
29.129 habitantes

AGO/2020
4,71%
29.039 habitantes

IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS ETAs:

Data de atualização: agosto/2020

153 de 374 AÇÕES

41%

FINALIZADAS **153**

EM ANDAMENTO **28**

NÃO INICIADAS **184**

EXECUTADO PELO OPERADOR DO SISTEMAS **9**

- 1 - Mariana (MG)
- 2 - Barra Longa (MG)
- 3 - Rio Doce (MG)
- 4 - Santa Cruz do Escalvado (MG)
- 5 - Rio Casca (MG)
- 6 - Sem-Peixe (MG)
- 7 - São Domingos do Prata (MG)
- 8 - São Pedro dos Ferros (MG)
- 9 - São José do Goiabal (MG)
- 10 - Dionísio (MG)
- 11 - Raul Soares (MG)
- 12 - Córrego Novo (MG)
- 13 - Pingo-d'Água (MG)
- 14 - Marliéria (MG)
- 15 - Bom Jesus do Galho (MG)
- 16 - Timóteo (MG)
- 17 - Caratinga (MG)
- 18 - Ipatinga (MG)
- 19 - Santana do Paraíso (MG)
- 20 - Ipaba (MG)
- 21 - Belo Oriente (MG)
- 22 - Bugre (MG)
- 23 - Naque (MG)
- 24 - Iapu (MG)
- 25 - Periquito (MG)
- 26 - Sobrália (MG)
- 27 - Fernandes Tourinho (MG)
- 28 - Alpercata (MG)
- 29 - Governador Valadares (MG)
- 30 - Tumiritinga (MG)
- 31 - Galiléia (MG)
- 32 - Conselheiro Pena (MG)
- 33 - Resplendor (MG)
- 34 - Itueta (MG)
- 35 - Aimorés (MG)
- 36 - Baixo Guandu (ES)
- 37 - Colatina (ES)
- 38 - Marilândia (ES)
- 39 - Linhares (ES)
- 40 - Aracruz (ES)
- 41 - Serra (ES)
- 42 - São Mateus (ES)
- 43 - Conceição da Barra (ES)
- 44 - Fundão (ES)
- 45 - Sooretama (ES)

STATUS DO PROGRAMA: PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)



ORÇAMENTO



Orçamento Total Planejado

R\$ 358 milhões



Orçamento Gasto

R\$ 294.58 milhões


• 82%

Alerta! - Muitas obras não foram iniciadas e quase 80% dos recursos já foram consumidos, o cronograma físico indica status do programa inferior a 50%.

CRONOGRAMA


	ELABORAÇÃO DE PROJETOS (Básicos e Executivos)	OBRAS
Início	MAR/2016	NOV/2015
Término	ABR/2021	MAR/2021

CAPTAÇÕES ALTERNATIVAS E AÇÕES DE MELHORIAS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

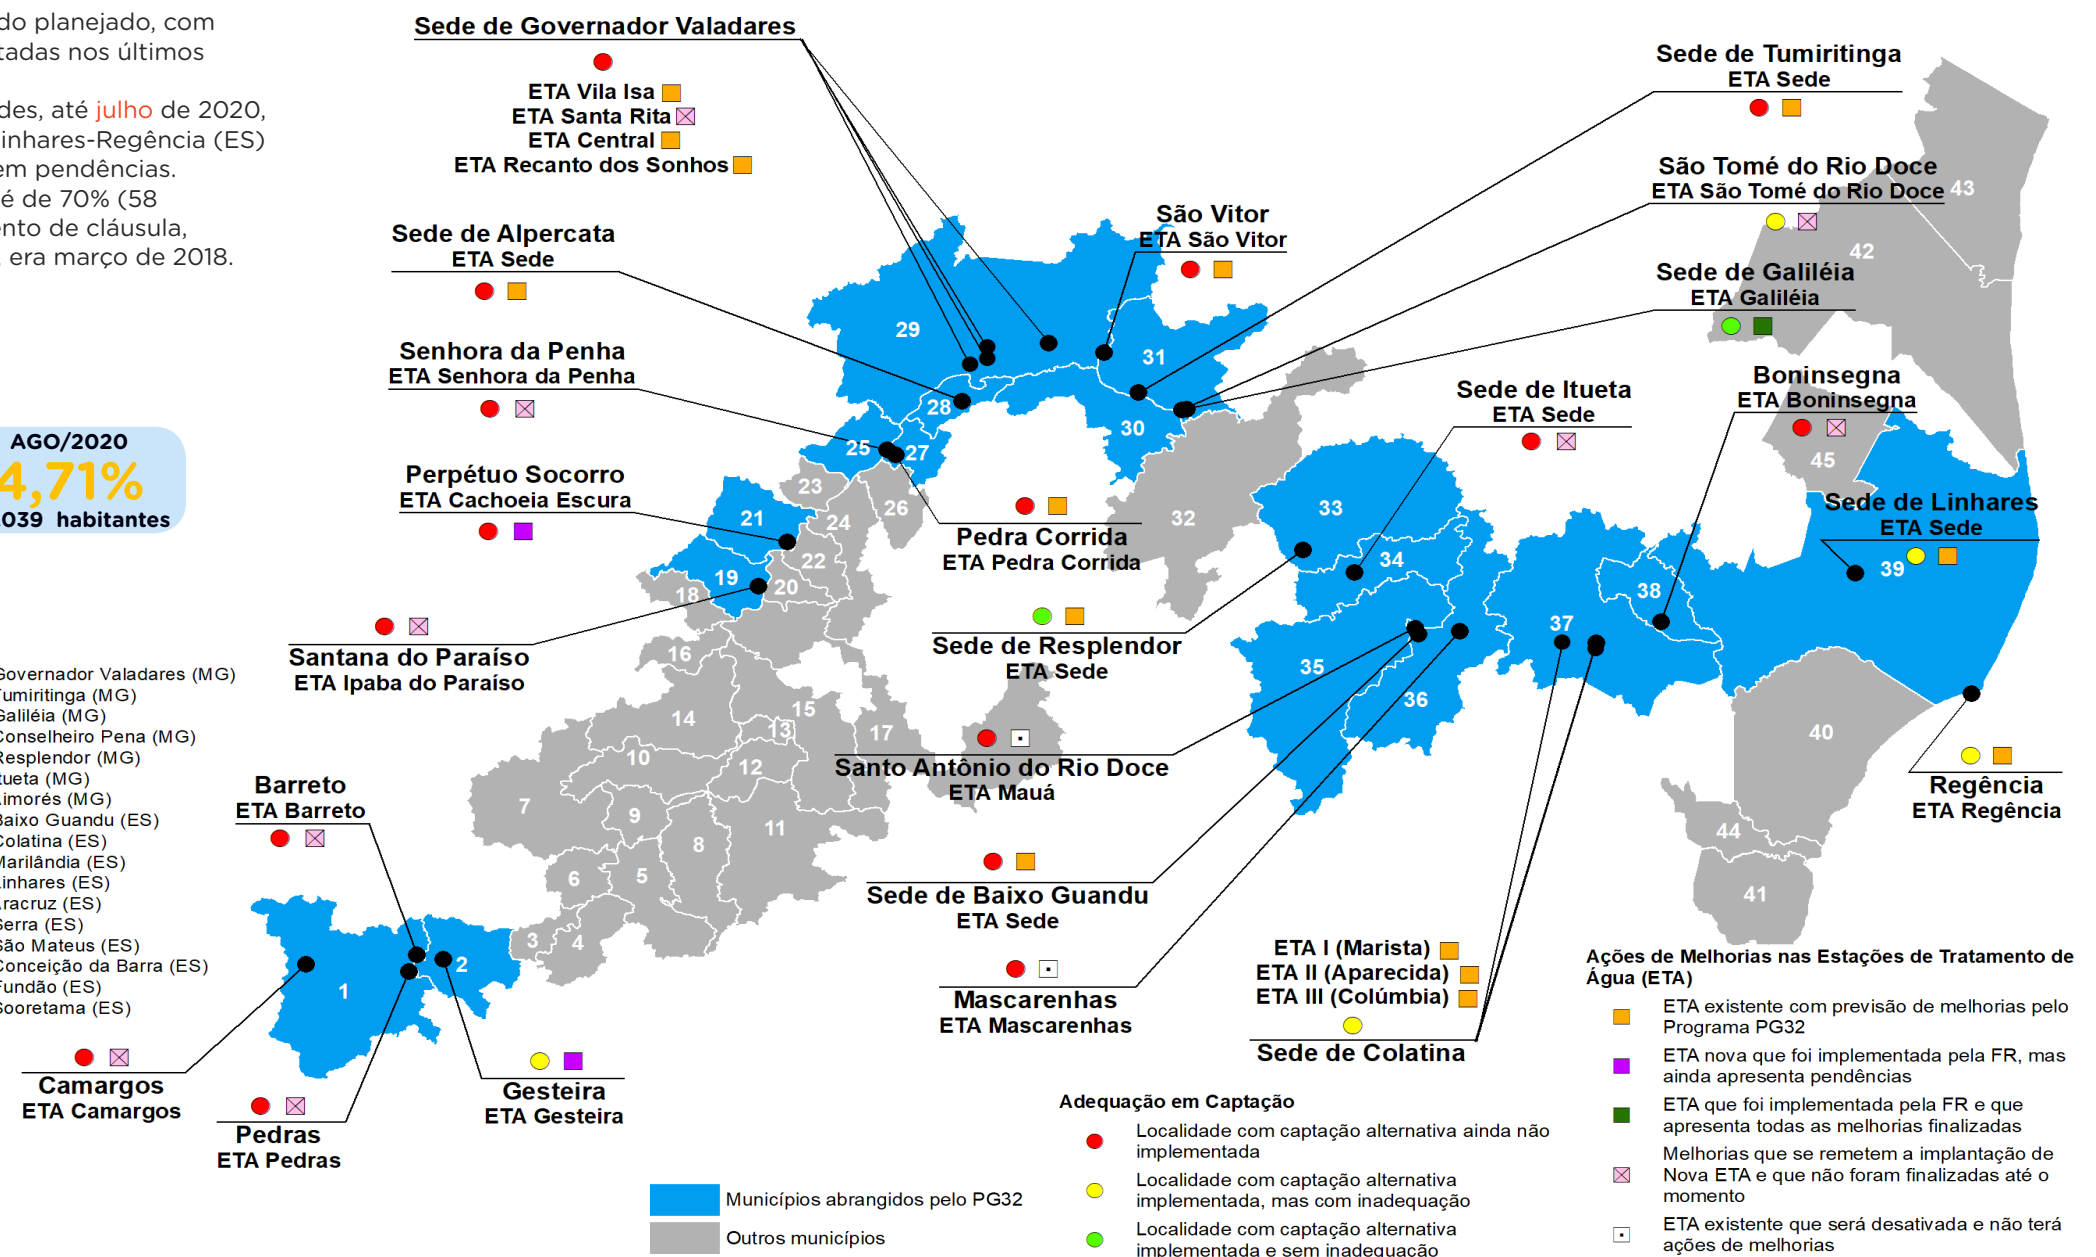

STATUS DA ENTREGA DOS PROJETOS BÁSICOS

Data de atualização: agosto/2020

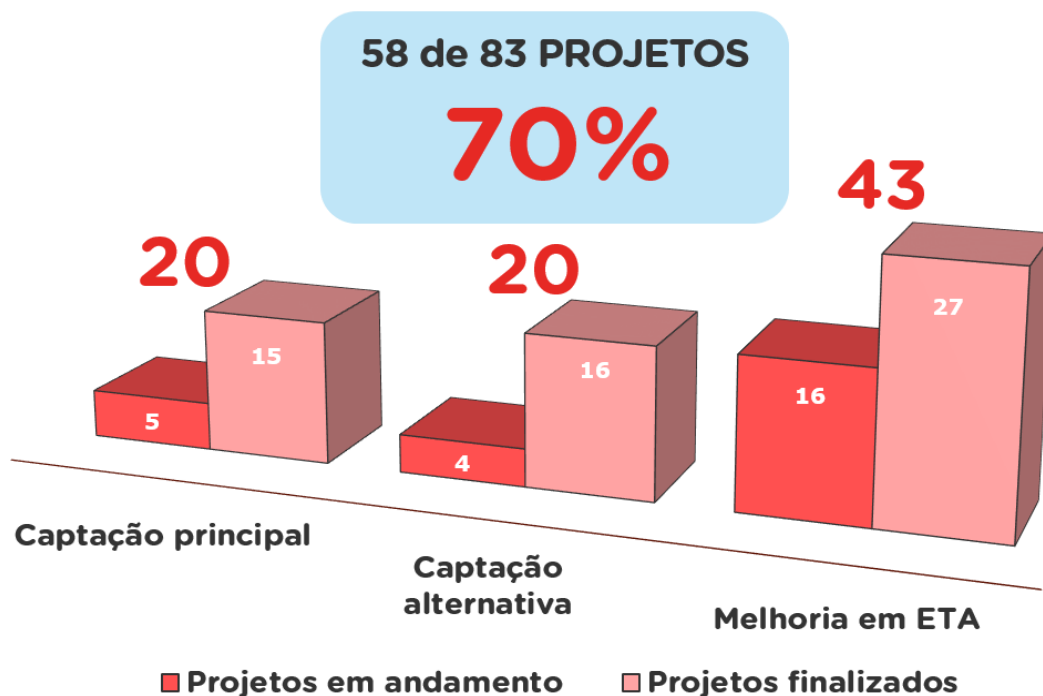

ÍNDICE DE ADEQUAÇÕES EM CAPTAÇÃO ALTERNATIVA

Data de atualização:
agosto/2020

2 de 7 LOCALIDADES

29%



QUALIDADE

1. Gesteira-Barra Longa
2. Regência-Linhares



DOCUMENTAÇÃO


1. Gesteira-Barra Longa
2. Colatina
3. São Tomé do Rio Doce-Tumiritinga



INFRAESTRUTURA

1. Gesteira-Barra Longa
2. Colatina
3. Linhares-Sede
4. Regência-Linhares
5. São Tomé do Rio Doce-Tumiritinga

ADUTORA DE GOVERNADOR VALADARES

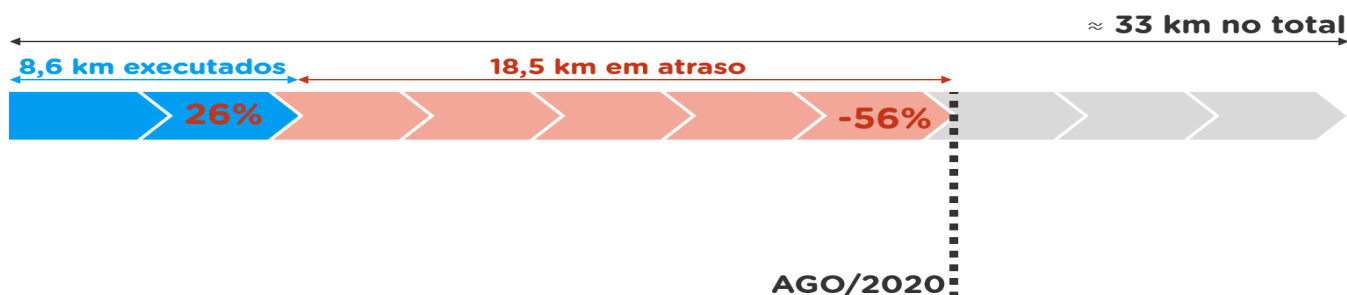

Ramboll Brasil | São Paulo
Telefone [11] 2832 8000
Rua Princesa Isabel, 94 12º Andar — Brooklin
São Paulo — SP
04601-000
