

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 31

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PG 31 - PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Destinar verba compensatória, no valor de R\$ 517 milhões, para 39 municípios originalmente reconhecidos como atingidos pelo Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) em ações de tratamento de esgoto e gestão de resíduos. O repasse das verbas aos municípios e acompanhamento dos investimentos deve ser gerido por instituições financeiras. Para a implementação do programa a Fundação Renova dará apoio técnico aos municípios na elaboração dos projetos.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:

Os municípios submetem a solicitação das ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos na forma de “pleitos” ao CIF e, somente após a sua aprovação, inicia-se o processo de repasse das verbas solicitadas (demandam quantos pleitos se fizerem necessários para implementar as ações).

Até setembro de 2019, dos 182 pleitos aptos apresentados, apenas 4 (2,2%) receberam verba da Fundação Renova; 82 foram reprovados por apresentarem falhas técnicas; e 38 aprovados aguardam a liberação da verba há mais de 2 anos.

Em 2017, para assegurar uma adequada implementação das ações do programa, foi solicitado pelo sistema CIF que a Fundação Renova providenciasse apoio técnico e capacitação aos municípios para elaboração dos projetos. A previsão de início desses serviços era dezembro de 2018, no entanto, a empresa somente foi contratada em abril de 2019 e as oficinas de capacitação iniciaram-se apenas em outubro de 2019.

Até o momento, foram depositados em conta da Fundação Renova, aproximadamente, R\$ 375 milhões (73%) da verba que será destinada aos municípios.

A implementação das ações e a aplicação da verba continuam praticamente sem avanços, visto que menos de 1% dos recursos destinados ao programa foi utilizado pelos municípios. Do valor previsto para repasse aos municípios até o mês de agosto de 2019 (aproximadamente R\$ 3,7 milhões), foram repassados apenas 13%, o que demonstra um desvio a menor de 87% dos repasses. Cabe destacar que a utilização dos recursos financeiros pelos municípios teve início com 11 meses de atraso em relação ao planejamento inicial.

PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)



ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado

R\$ 665,78 milhões

Orçamento Gasto

R\$ 5,11 milhões

1%

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

DEZ/2016 a
DEZ/2019



REPASSE DOS RECURSOS EM CONTA SEGREGADA

A Fundação Renova solicitou postergação para depósito das parcelas (Prazo inicial para última parcela era dezembro de 2018).

ABRIL
2019



INÍCIO DO APOIO TÉCNICO

Era previsto e deliberado pelo sistema CIF o início das atividades de apoio técnico em dezembro de 2018


OUTUBRO
2019



INÍCIO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Era previsto e deliberado pelo sistema CIF o início das atividades de capacitação em dezembro de 2018


DEZ/2018 a
DEZ/2023



INÍCIO DO REPASSE AOS MUNICÍPIOS

Era previsto e deliberado pelo sistema CIF o início das atividades de repasse aos municípios em janeiro de 2019.

PANORAMA DO PROGRAMA:

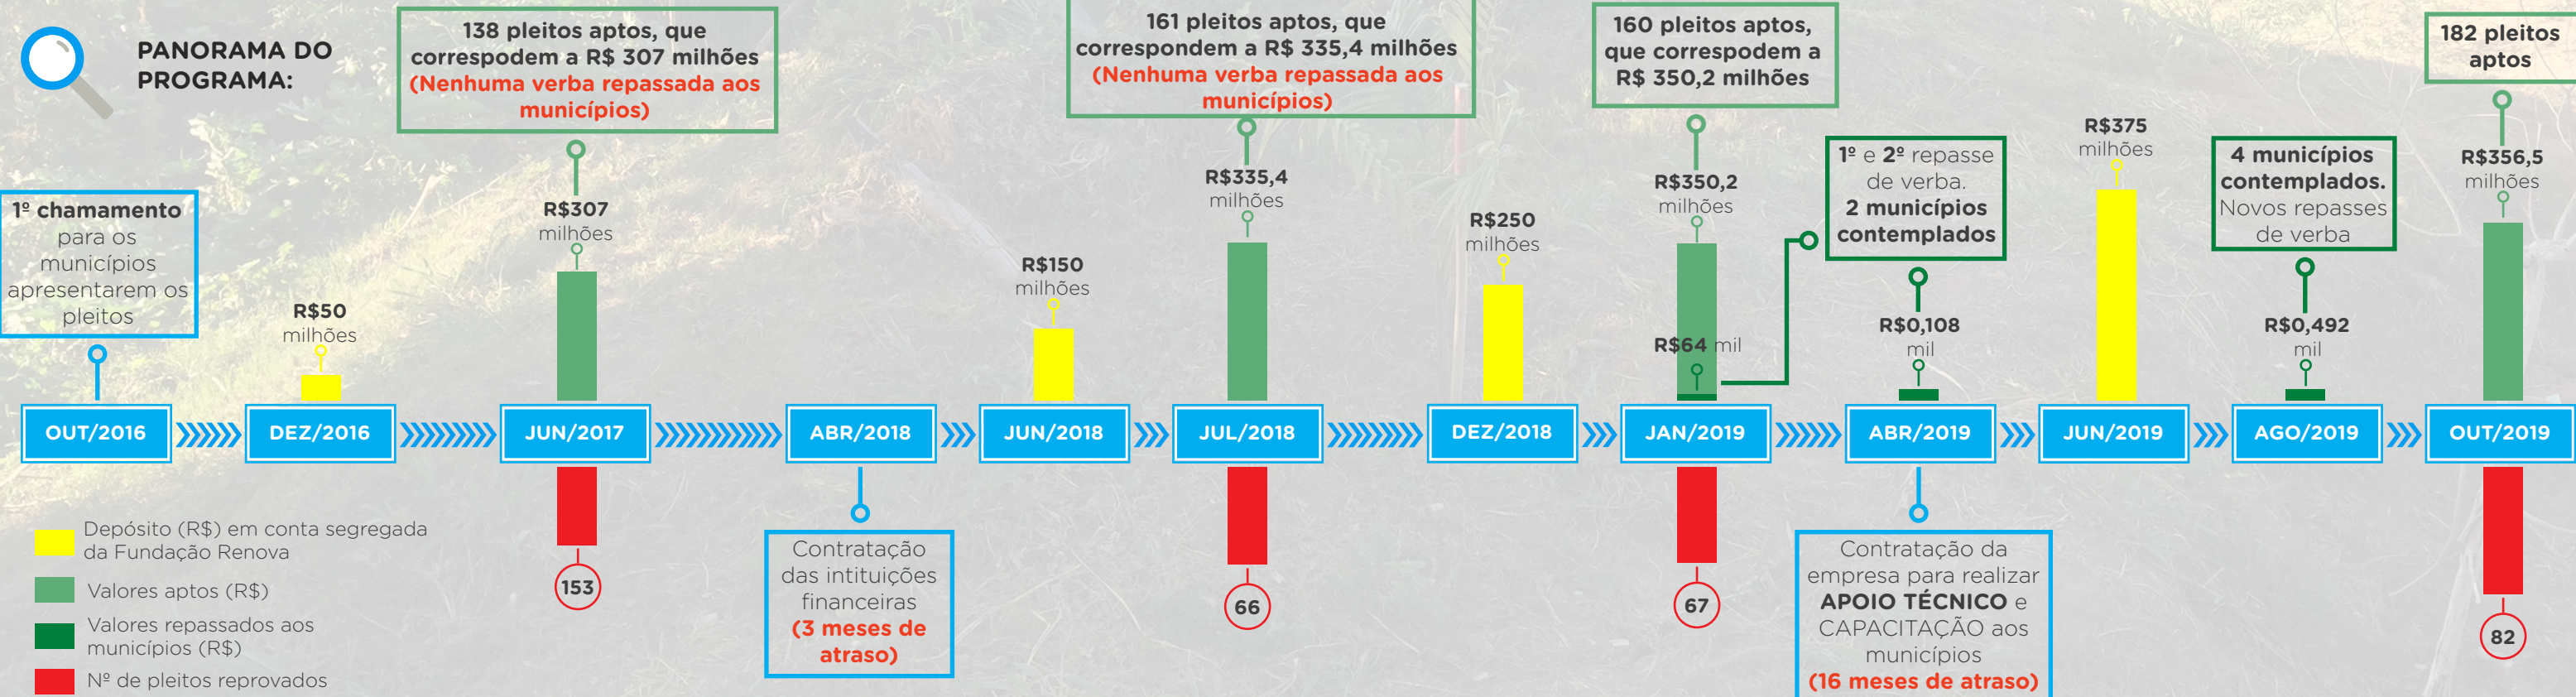





SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:

	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Municípios com ao menos 1 ação apta	39 de 39 (100%)	32 de 39 (82%)
Municípios que receberam recursos	Colatina São José do Goiabal Rio Casca	São Domingos do Prata

Situação da disponibilização dos recursos financeiros aos municípios

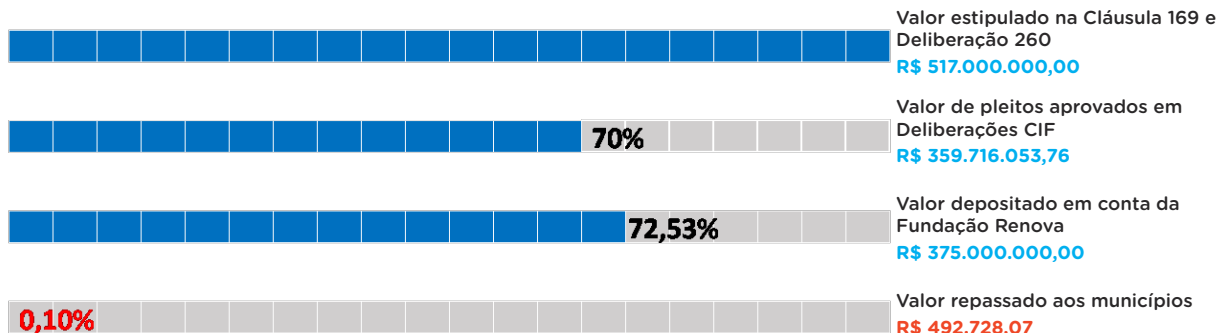

ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

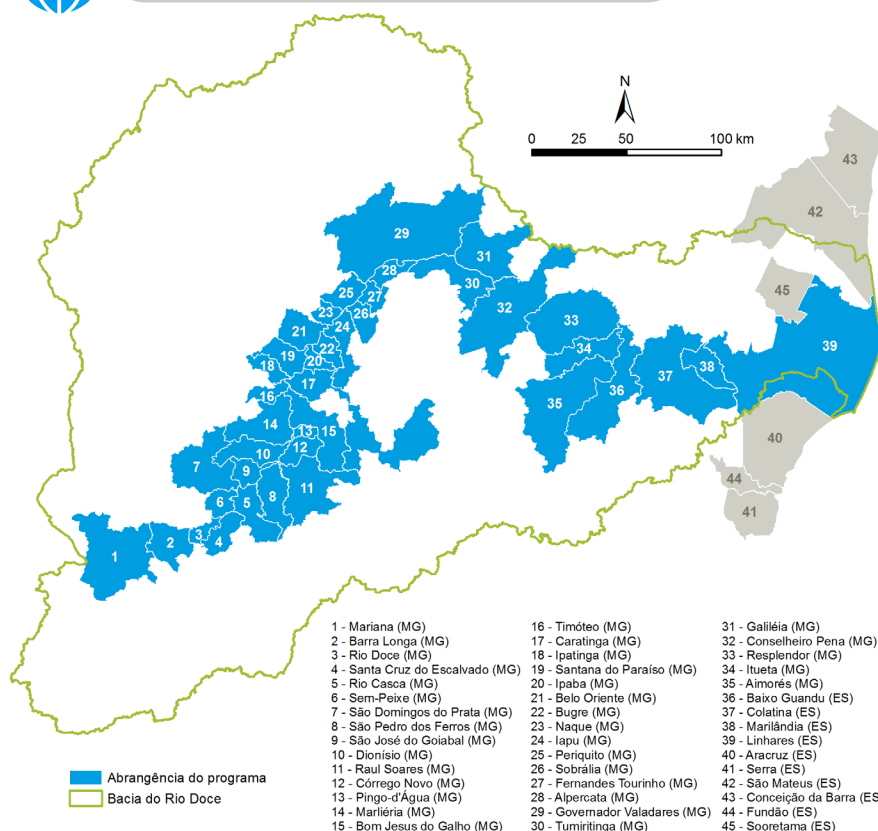

31 municípios SEM
tratamento de esgoto.

Nenhum município trata
100% do esgoto coletado.

8 municípios COM
tratamento de esgoto
superior a 50% do esgoto
coletado.

26 municípios SEM
disposição adequada de
resíduos sólidos.

13 municípios COM
disposição adequada de
resíduos sólidos.

Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000

Rua Princesa Isabel, 94

12º Andar — Brooklin

São Paulo — SP

04601-000

RAMBOLL
