

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 29

FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE TRIAGEM E REINTRODUÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

PG 29 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE TRIAGEM E REINTRODUÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Construir e aparelhar dois Centros de Triagem / Reabilitação de Animais Silvestres, sendo uma unidade localizada em Minas Gerais (Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS) e outra no Espírito Santo (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS). Além disso, é previsto o custeio da manutenção operacional desses centros por um período de 3 anos a partir da entrega de cada unidade.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:

As principais etapas do Programa são apresentadas a seguir:

-  Definição do local de implantação do CETAS/MG e do CETRAS/ES
-  Elaboração do projeto conceitual e definição do cronograma de obras
-  Construção dos CETAS/MG e do CETRAS/ES
-  Operação e manutenção dos centros por 3 anos.

Até o presente momento, quanto ao CETAS/MG, foi definido que será localizado no município de Nova Lima, tendo sido iniciada a elaboração do projeto básico de engenharia e do projeto arquitetônico, mas não concluída.

Para a construção do CETRAS/ES, permanecem as negociações sobre a doação de terreno pela Prefeitura Municipal de Serra. A Prefeitura assinou o Termo de Cessão em julho de 2019, contudo, ainda não houve registro da cessão em cartório.

Dessa forma, **as ações iniciais do programa apresentam atraso em relação ao prazo repactuado (março de 2019), não tendo sido iniciada a etapa de construção de nenhum dos Centros.**

**CETAS - MG**
NOVA LIMA

**CETRAS - ES**
SERRA

 **Elaboração do Projeto Técnico**

50%

0%

 **Área pretendida para construção**

7.450m²

14.500m²


1.850m² de área de intervenção ambiental
Previsão de supressão de **270m²** de APP (Área de Preservação Permanente).

PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)




ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado **R\$ 10,60 milhões**

Orçamento Gasto **R\$ 0,85 milhões**

 **8%**

CRONOGRAMA CETAS/MG E CETRAS/ES

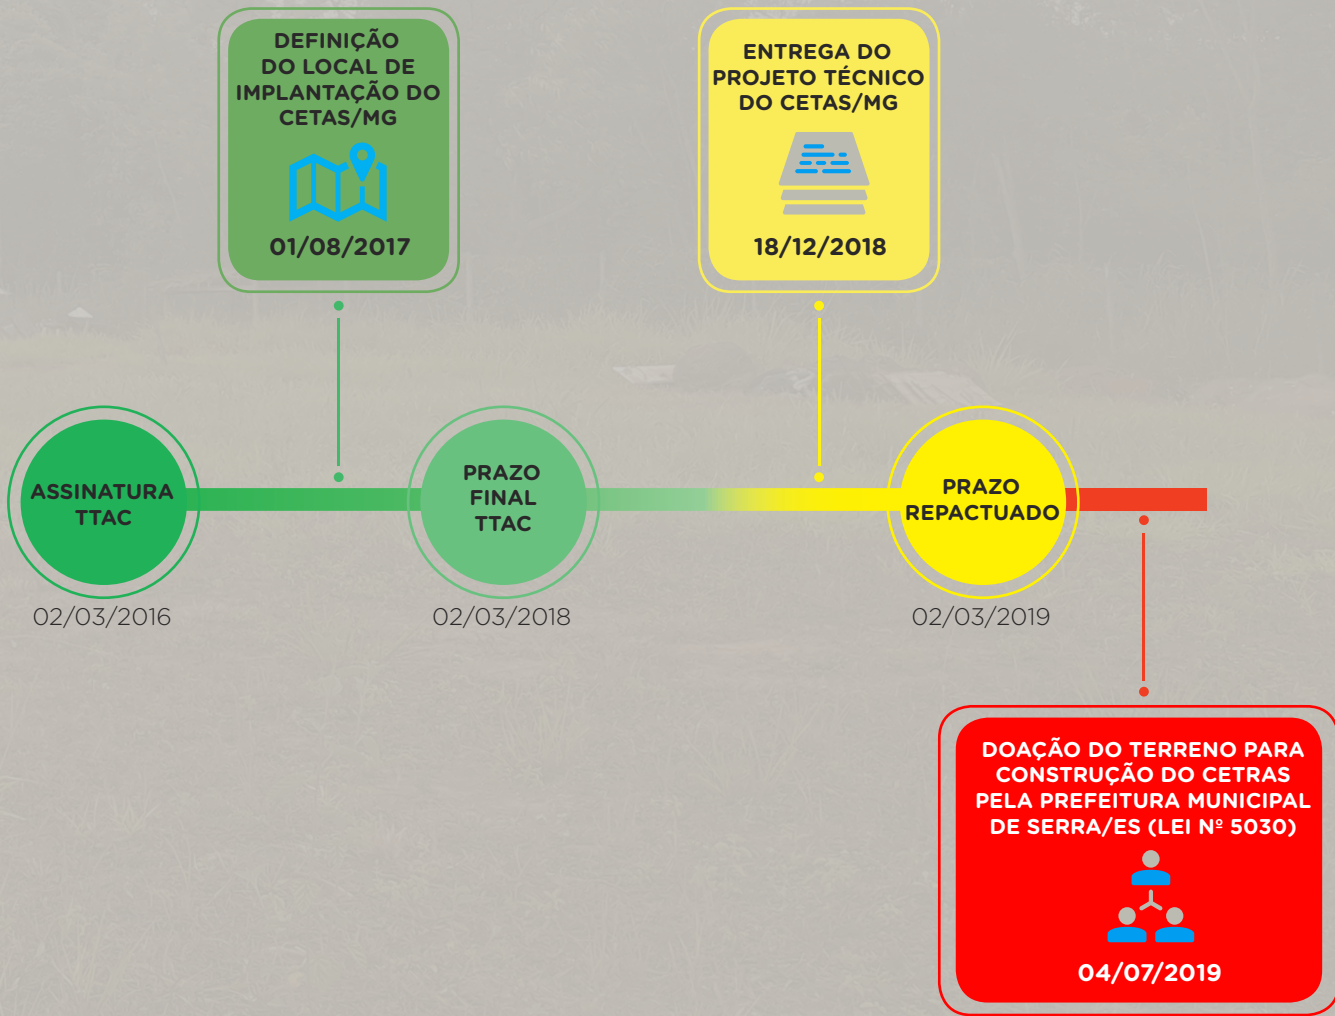

- As atividades do CETRAS/ES tinham início previsto para julho de 2018, representando mais de um ano de atraso.
- O alto custo de implantação do CETAS/MG e a proposta do IBAMA/ES de que a Fundação Renova se responsabilize pela manutenção dos Centros por um período de 10 anos ao invés de 3 anos, conforme definido no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), agrava a percepção de que o IBAMA terá dificuldades na manutenção e continuidade operacional desses Centros.

Atuais instalações do CETAS/ES:



Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000

Rua Princesa Isabel, 94

12º Andar — Brooklin

São Paulo — SP

04601-000

RAMBOLL
