


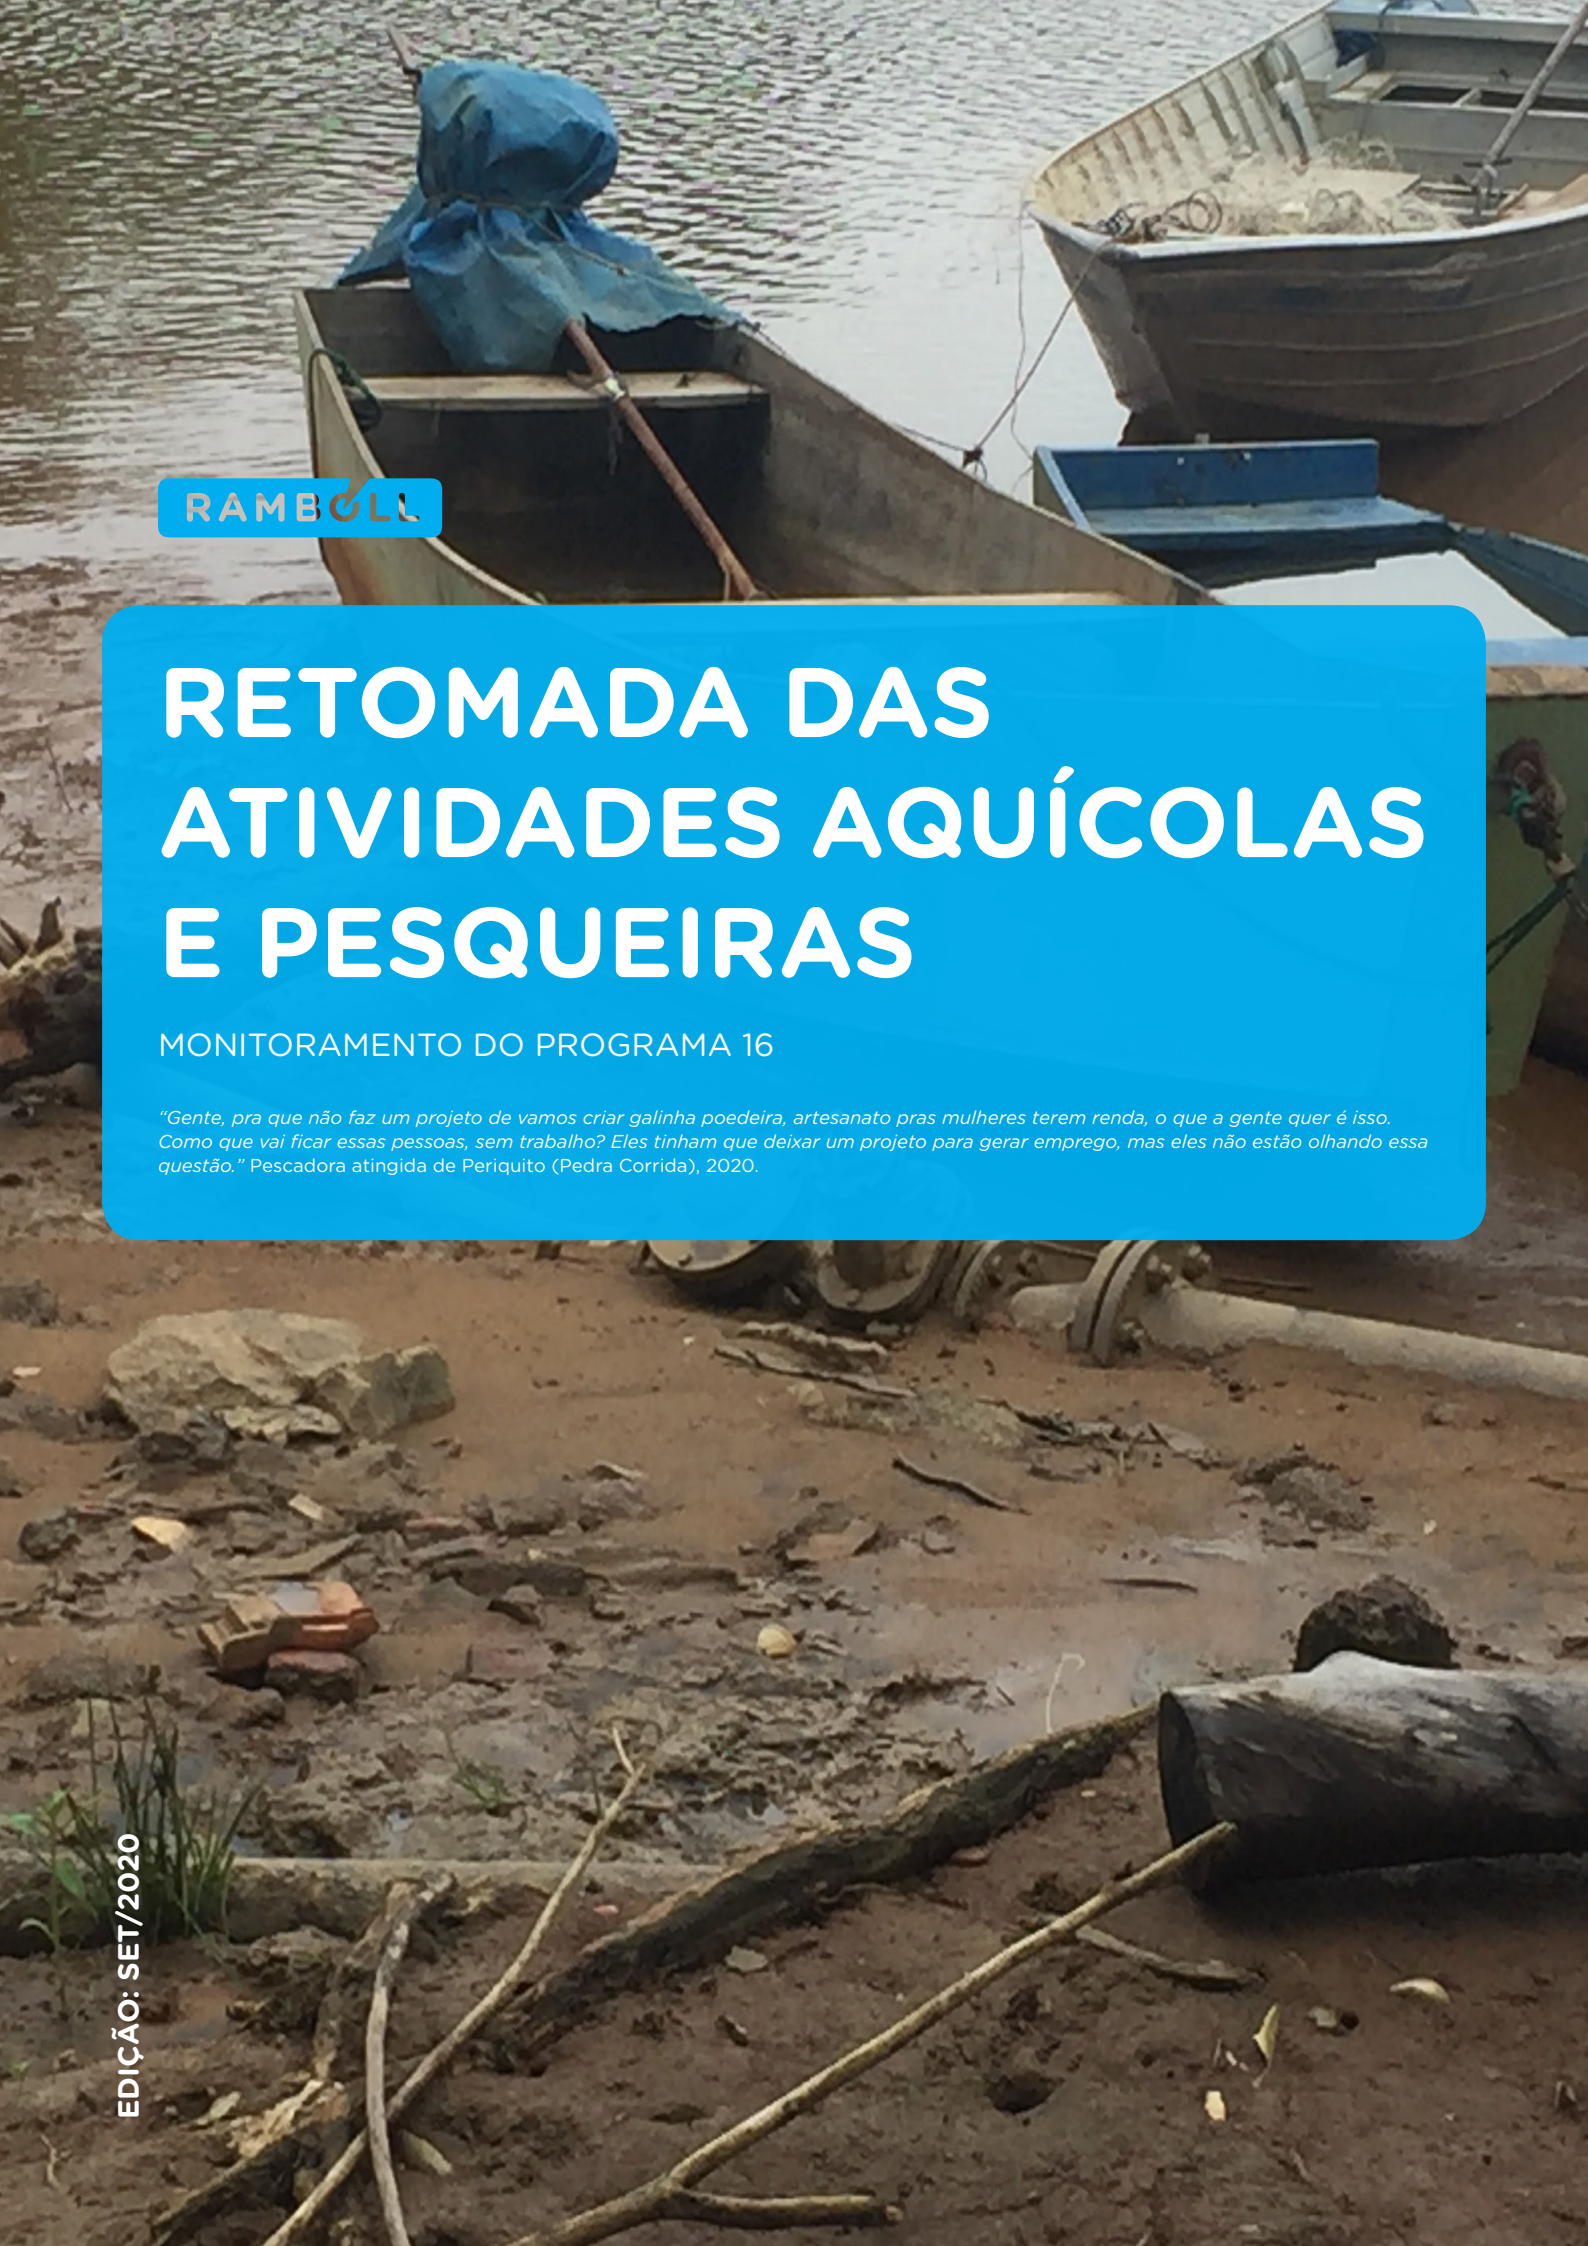

RAMBOLL

RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 16

"Gente, pra que não faz um projeto de vamos criar galinha poedeira, artesanato pras mulheres terem renda, o que a gente quer é isso. Como que vai ficar essas pessoas, sem trabalho? Eles tinham que deixar um projeto para gerar emprego, mas eles não estão olhando essa questão." Pescadora atingida de Periquito (Pedra Corrida), 2020.




OBJETIVO GERAL



Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras de forma segura através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:

Adesão Acumulada ao PG 16 dos Atingidos Cadastrados

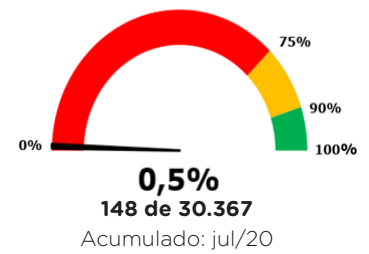

Nível de Satisfação com o PG16 pelos Atingidos Atendidos

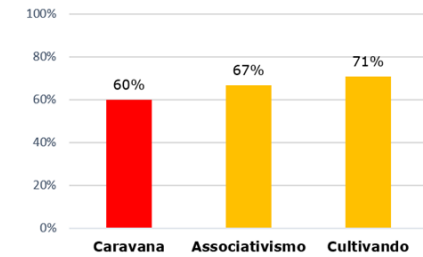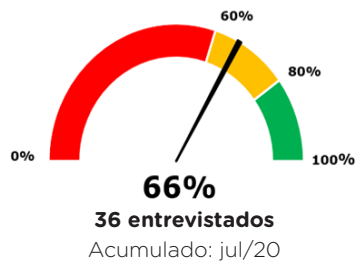

- 30.367 pescadore(a)s e aqüicultore(a)s cadastrado(a)s
- 4.529 pescadore(a)s e aqüicultore(a)s elegíveis ao PG16 de acordo com a Fundação Renova
- 148 atendimentos no PG 16

O programa atualmente possui três frentes de atendimento direto e coletivo:

Caravana - ações de comunicação de atividades da Fundação Renova nos territórios. Foi combinado que a Fundação deverá validar o conteúdo junto às Câmaras Técnicas antes de novas apresentações. Ação paralisada.

Associativismo - 4 associações, prestando atendimento focado em questões administrativas.

Cultivando - Projeto-Piloto Cultivando Para Pescar, restrito a poucas comunidades em Linhares/ES. O seu objetivo é desenvolver um modelo de criação de peixes juntamente a hortaliças. Atualmente, encontra-se em fase de capacitação, sendo que não houve implantação de **nenhuma unidade produtiva**.


LINHA DO TEMPO



STATUS DO PROGRAMA: NÃO APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)




ORÇAMENTO



Com 12% do orçamento do PG16 gasto até 2020, **quase nada se avançou na reparação** da principal atividade econômica atingida, a pesca, e aquelas que precisam do rio para existirem, aquicultura e extração de areia. Das ações colocadas em prática até o momento, apenas o Projeto-Piloto Cultivando Para Pescar (aprovado em 2017), em Linhares/ES, possui a finalidade direta de geração de renda, mas devido a diversos atrasos, até o momento nem os tanques foram instalados.

CRONOGRAMA

	Masteplan Setembro/2017	Masteplan Junho/2020	Diferença em dias
Início	01/08/2016	01/07/2016	-31
Término	30/05/2026	30/12/2026	214

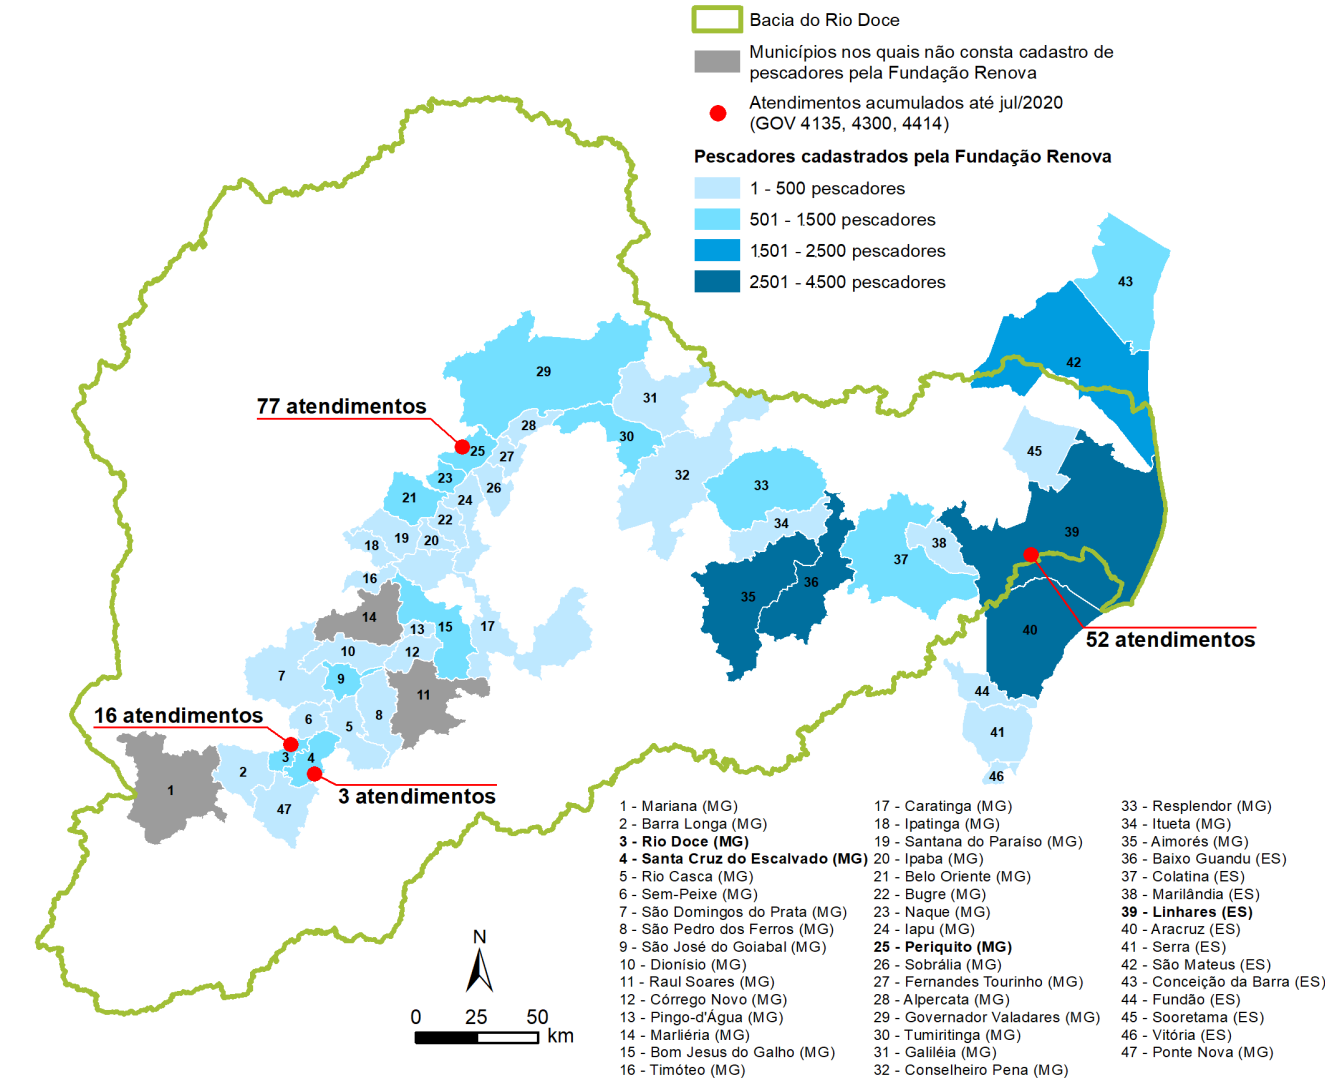

A definição do programa (agosto/2019) limita o público-alvo a pescadore(a)s profissionais e aqüicultore(a)s regularizados, além daqueles pescadores contemplados pelo programa Pescador de Fato (ainda em estágio piloto). Uma vez que o TTAC não impõe tal limitação, a Ramboll entende que o público do programa deva ser todo o grupo da pesca e aquicultura atingidos. A Fundação Renova irá apresentar proposta à CT-EI para realização do atendimento do público areeiro por outro programa, entretanto, até o momento, não há Deliberação que regularize o atendimento.


O PG16 encontra-se dividido em **Eixo 1** e **Eixo 2** (de acordo com a Oficina de Revisão dos Programas - dez/2019)

Os gráficos abaixo mostram a porcentagem do orçamento destinado a cada uma das ações/Eixos

**E
I
X
O
1**

Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas

Caracterização Socioeconômica da Aquicultura e Pesca e Monitoramento Pesqueiro




Hoje: Contratação finalizada, não foram iniciados ainda os trabalhos de campo.

**E
I
X
O
2**

Processo de estruturação produtiva e alternativas de produção e geração de renda




Mapeamento das Potencialidades econômicas locais



Hoje: Elaborados relatórios iniciais (dados secundários), de Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura. Não foram iniciados ainda os trabalhos de campo.




Alternativas Produtivas e geração de renda (Editais, Piscicultura, Empreendedorismo, Cultivando para Pescar)



Hoje: Apenas o Projeto-Piloto Cultivando Para Pescar, aprovado em 2017, está em execução, sendo que ele atende a apenas 4 comunidades em Linhares/ES e não houve implantação das unidades produtivas até o momento




Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo, ATER e Estímulo ao Consumo



Hoje: Apenas ações em Fortalecimento do Associativismo em execução (4 Associações, 2 em MG e 2 no ES).




Projetos da Foz (Rampa, energia solar, Miniestação de energia limpa, beneficiamento de pescado)



Hoje: Ações pontuais, com maiores desembolsos realizados e previstos para o município de Linhares/ES.



Outros (Intervenções diretas nos empreendimentos, comunicação, consultorias, oficinas, outros)



Hoje: Projetado, não há evidências da realização de ações neste âmbito.



LIMITAÇÕES À PESCA

- Potencial contaminação de pescado e Risco à Saúde Humana (em avaliação de perícia, Eixo 6)
- Impactos ambientais a populações de peixes nativos (em avaliação de perícia, Eixo 12)
- Impactos na água, sedimento e nos organismos aquáticos das áreas marinhas (Conceição da Barra até Serra) e de água doce em toda a extensão do Rio Doce, evidenciados, dentre outros, por estudos do Instituto Lactec e pela Rede Rio Doce Mar.
- Proibições à Pesca (IEF nº40/2017 e ACP Linhares)
- Mercado consumidor inseguro sobre o pescado
- Desestruturação da cadeia da pesca

RAMBOLL

Bright ideas. Sustainable change.

Ramboll Brasil | São Paulo
Telefone [11] 2832 8000
Rua Princesa Isabel, 94 12º Andar — Brooklin
São Paulo — SP
04601-000
