

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 27

RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

OBJETIVO RESUMIDO:

Recuperar 500 nascentes por ano, durante 10 anos, totalizando 5.000 nascentes a serem definidas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce).

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA:

A atuação de recuperação de nascentes é composta das seguintes fases:


FASES	SITUAÇÃO
Definição de áreas prioritárias	Concluído (entregue com atraso)
Elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Em andamento
Fomento à cadeia de viveiros e mudas	Em andamento
Inventário Florestal	Em andamento
Mobilização e engajamento de proprietários	Em andamento
Pagamento por serviços ambientais – PSA	Em andamento
Pesquisa e desenvolvimento	Em andamento
Elaboração de projetos	Em andamento
Implantação e manutenção	Em andamento
Monitoramento	Em andamento

Definição das áreas prioritárias

A definição das áreas leva em consideração os rios alternativos para captação de água para abastecimento público, contando com o suporte do CBH-Doce. Para cada região selecionada é definida a quantidade de nascentes a serem recuperadas por ano, sendo que para cada sub-bacia já houve aprovação dos 5 primeiros anos, totalizando 2.500 nascentes.

Tendo em vista que o programa está no terceiro ano de cadastramento das nascentes, até o momento, deveriam ter sido incorporadas 1.500 nascentes.

Mobilização e engajamento - Número de nascentes cadastradas



PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF (Comitê Interfederativo)



ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado

R\$ 269,54 Milhões



Orçamento Gasto R\$ 28,63 Milhões

11%

Implantação e Manutenção



Nascentes vistoriadas pela RAMBOLL até outubro de 2019



*A taxa de mortalidade esperada pela Fundação Renova era de até 20%.

A Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR) emitiu uma nota técnica determinando que a Fundação Renova refaça a contagem das nascentes em função de falhas encontradas em vistorias de campo realizadas pelo IBAMA (Operação Águas, Fase Olhos D'água), tais como:

- Nascentes duplamente cadastradas;
- Contabilização de nascentes que já se encontravam em fragmento florestal bem conservado, sem necessidade de recuperação;
- Divergência nas localizações apresentadas;
- Divergência no tamanho de áreas em recuperação.

DATA DE INÍCIO DO PROGRAMA
02/03/2016

APENAS 511 NASCENTES POSSUEM PLANTIO EM ANDAMENTO
10/2019

DATA ORIGINALMENTE PREVISTA PARA FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA
02/03/2026

NOVA DATA PREVISTA PELA FUNDAÇÃO RENOVA PARA FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA
3/2036

2016

2019

2022

2025


2028

2031

2034

ACRÉSCIMO DE 10 ANOS

MUNICÍPIOS CONSIDERADOS PELO PROGRAMA ATÉ O MOMENTO (ANOS 1, 2 E 3)

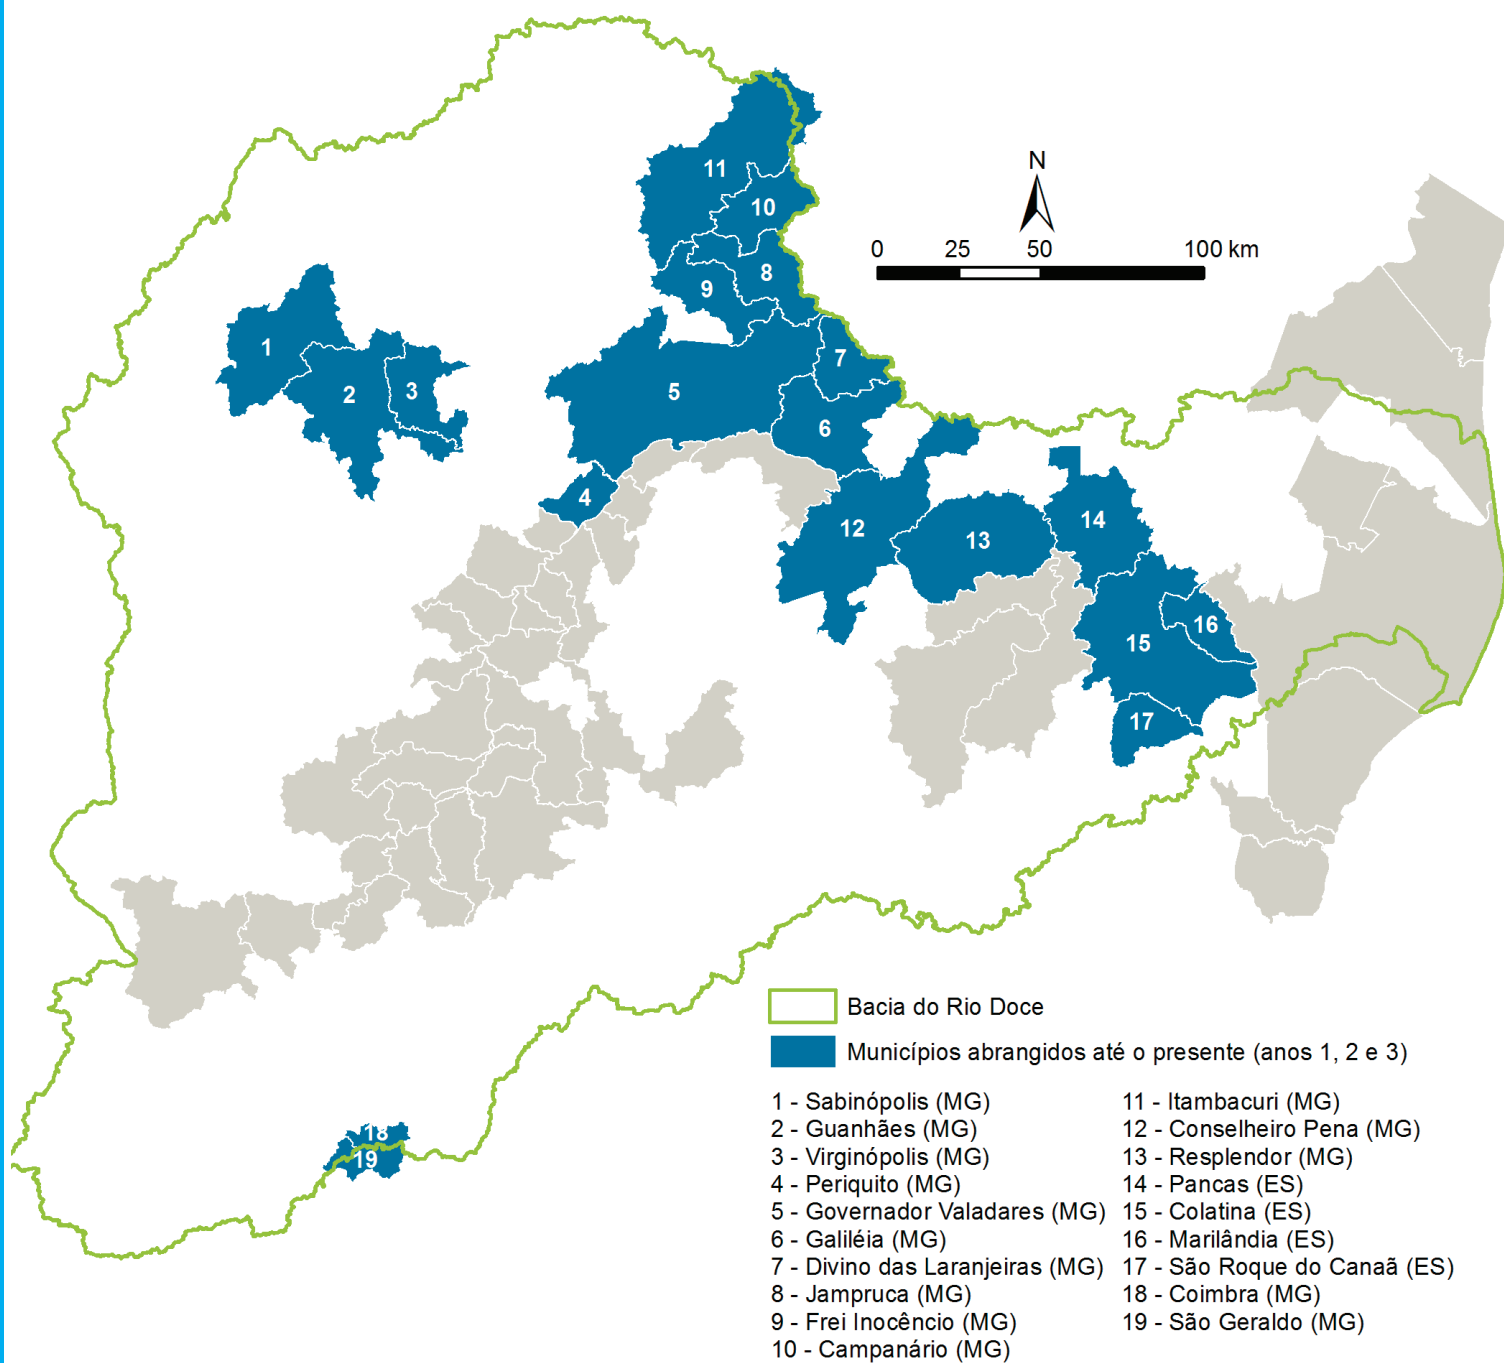

WWW.RAMBOLL.COM

Ramboll Brasil | São Paulo

Telefone [11] 2832 8000

Rua Princesa Isabel, 94

12º Andar — Brooklin

São Paulo — SP

04601-000

RAMBOLL
